



T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ



Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

31 Aralık 2021

Katılımcı Listesi

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Babaeski Kaymakamlığı | 1 0201 Aile ve Sosyal Hiz. İl Md.lüğü | 29 1506 İstanbul Orman Bölge Md.lüğü |
| 2 Demirköy Kaymakamlığı | 2 0302 Çalışma ve İş Kurumu İl Md.lüğü | 30 1507 Kırklareli Orman İşletme Md.lüğü |
| 3 Kofçaz Kaymakamlığı | 3 0302 Sosyal Güvenlik İl Md.lüğü | 31 1508 Demirköy Orman İşletme Md.lüğü |
| 4 Lüleburgaz Kaymakamlığı | 4 0401 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md.lüğü | 32 1509 Vize Orman İşletme Md.lüğü |
| 5 Pehlivanköy Kaymakamlığı | 5 0402 Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Md.lüğü | 33 1510 L.burgaz Fidanlık Md.lüğü |
| 6 Pınarhisar Kaymakamlığı | 6 0402 Kadastro Md.lüğü | 34 1503 TMO Şube Müdürlüğü |
| 7 Vize Kaymakamlığı | 7 0404 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü | 35 1701 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü |
| 8 3000 İl Özel İdaresi | 8 0601 BOTAŞ Şube Md.lüğü | 36 1701 Karayolları 15. Şube Şefliği |
| 9 3001 Kırklareli Belediye Bşk.lığı | 9 0602 MTA Marmara Bölge Md.lüğü | 37 1702 PTT Başmüdürlüğü |
| 10 3002 İnece Belediye Bşk.lığı | 10 0603 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü | 38 1703 TCDD 1. Bölge Md.lüğü |
| 11 3003 Kavaklı Belediye Bşk.lığı | 11 0604 TP Trakya Bölge Md.lüğü | 39 1704 Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Md.lüğü |
| 12 3004 Üsküp Belediye Başkanlığı | 12 0701 Gençlik ve Spor İl Md.lüğü | 40 2900 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü |
| 13 3005 Babaeski Belediye Bşk.lığı | 13 0801 Defterdarlık | 41 TREDAS Kırklareli İşletme Md.lüğü |
| 14 3006 Alpullu Belediye Bşk.lığı | 14 1001 İl Kültür ve Turizm Md.lüğü | |
| 15 3007 Büyükmandıra Belediye Bşk.lığı | 15 1002 Edirne Vakıflar Bölge Md.lüğü | 1 Kırklareli Baro Bşk.lığı |
| 16 3008 Karahalil Belediye Bşk.lığı | 16 1101 İl Milli Eğitim Md.lüğü | 2 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası |
| 17 3009 Demirköy Belediye Bşk.lığı | 17 1301 İl Sağlık Md.lüğü | 3 Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası |
| 18 3010 İğneada Belediye Bşk.lığı | 18 1401 Sanayi ve Teknoloji İl Md.lüğü | 4 Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası |
| 19 3011 Kofçaz Belediye Bşk.lığı | 19 1402 Trakya Kalkınma Ajansı | 5 Kırklareli Ticaret Borsası |
| 20 3012 Lüleburgaz Belediye Bşk.lığı | 20 1403 Kırklareli OSB Müdürlüğü | 6 Babaeski Ticaret Borsası |
| 21 3013 Ahmetbey Belediye Bşk.lığı | 21 1403 Büyükkarıştiran OSB Müdürlüğü | 7 Lüleburgaz Ticaret Borsası |
| 22 3014 Büyükkarıştiran Belediye Bşk.lığı | 22 1403 Evrensekiz OSB Müdürlüğü | 8 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği |
| 23 3015 Evrensekiz Belediye Bşk.lığı | 23 1501 İl Tarım ve Orman Md. lüğü | |
| 24 3016 Pehlivanköy Belediye Bşk.lığı | 24 1502 Atatürk TSTMA Enstitüsü Md.lüğü | |
| 25 3017 Pınarhisar Belediye Bşk.lığı | 25 1504 Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Böl. Md.lüğü | |
| 26 3018 Kaynarca Belediye Bşk.lığı | 26 1504 Doğa koruma ve Milli Parklar Şube Md.lüğü | |
| 27 3019 Vize Belediye Bşk.lığı | 27 1505 DSI 11. Bölge Md.lüğü | |
| 28 3020 Çakıllı Belediye Bşk.lığı | 28 1505 DSI 112. Sube Md.lüğü | |
| 29 3021 Kırıkköy Belediye Bşk.lığı | | |



Gündem

Açılış Konuşması
Kuruluşların Yatırımları Hakkında Bilgi Vermesi
Kapanış

Görüşme Sırası

- 1 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
- 2 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü
- 3 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü
- 4 Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü
- 5 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
- 6 Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü
- 7 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
- 8 MTA Marmara Bölge Müdürlüğü
- 9 Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü
- 10 Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü
- 11 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü
- 12 TP Trakya Bölge Müdürlüğü
- 13 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
- 14 İl Özel İdaresi
- 15 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
- 16 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
- 17 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- 18 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 19 İl Sağlık Müdürlüğü
- 20 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- 21 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- 22 Atatürk TSTMA Enstitüsü Müdürlüğü



KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2021

İl Adı

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

286

Toplam Proje Sayısı

5.178.475.279

Toplam Proje Tutarı

1.350.005.516


Toplam Yıl Ödeneği

%45,28

Nakdi Gerçekleşme Oranı

%81,50

Yılı Harcama Oranı

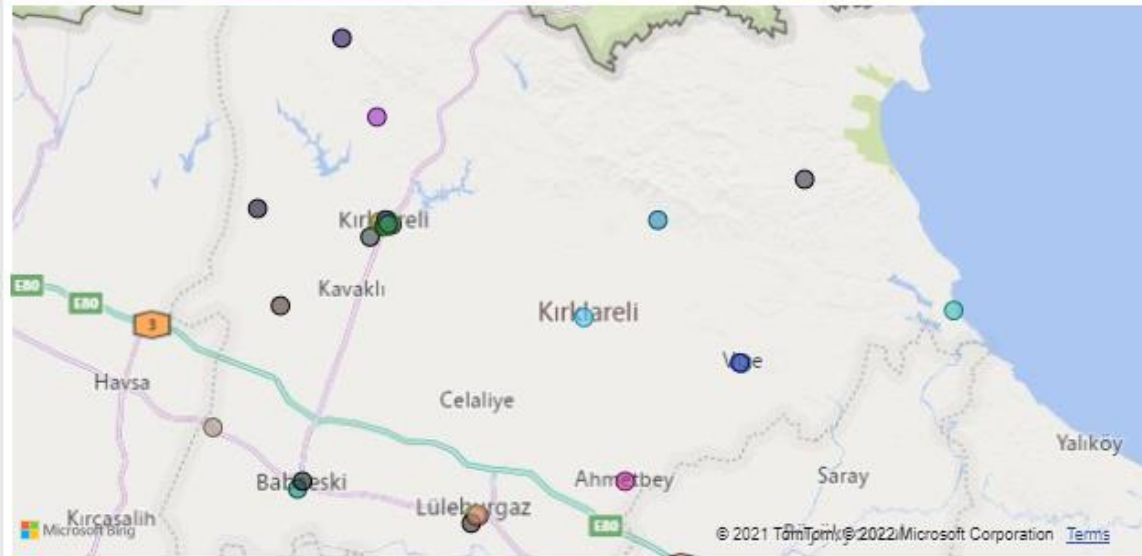

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı
İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	30	42.845.448	149.152.038	39.551.439	
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	28	41.237.225	154.268.021	100.009.935	
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	23	20.793.061	28.784.587	6.766.770	
KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	16	98.205.537	101.205.537	3.000.000	
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	15	17.842.686	333.117.197	55.012.823	
TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	14	46.371.709	147.078.246	5.207.137	
Toplam	286	1.350.005.516	5.178.475.279	1.244.561.918	

Proje Sektörü	Proje Sayısı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	12
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	109
Eğitim	54
Enerji	14
İmalat	1
Konut	1
Madencilik	8
Sağlık	13
Tarım	29
Turizm	5
Ulaştırma - Haberleşme	40
Toplam	286

Proje Yeri İlçe	Toplam Proje Tutarı	Proje Sayısı
BABAESKİ	111.829.524	35
DEMİRKÖY	38.634.344	9
KOÇAZ	15.170.988	2
LÜLEBURGAZ	677.234.152	66
MERKEZ	1.000.098.870	63
MUHTELİF İLÇE	3.113.666.784	62
Toplam	5.178.475.279	286

Bakanlık Adı
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Toplam

Sektör Bazında Dağılım

Sektörel Dağılım

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2021

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

İlçe	Toplam Proje Tutarı	Proje Sayısı
BABAESKİ	111.829.524	35
DEMİRKÖY	38.634.344	9
KOÇGAZ	15.170.988	2
LÜLEBURGAZ	677.234.152	66
Toplam	5.178.475.279	286

%45,28

Nakdi Gerçekleşme Oranı

286

Toplam Proje Sayısı

5.178.475.279

Toplam Proje Tutarı


1.350.005.516

Toplam Yıl Ödeneği

Proje Sektörü	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oran
Ulaştırma - Haberleşme	40	655.602.883	3.056.941.581	901.230.187	646.775.740	1.548.005.927	
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	109	131.646.924	706.464.441	237.444.202	86.261.518	323.705.720	
Tarım	29	28.792.801	344.904.494	55.600.009	28.376.291	83.976.300	
Eğitim	54	208.810.953	341.531.632	33.306.249	101.149.115	134.455.364	
Sağlık	13	48.954.689	339.955.194	0	31.454.423	31.454.423	
Madencilik	8	214.419.000	214.419.000	0	167.289.452	167.289.452	
Enerji	14	46.371.709	147.078.246	5.207.137	25.141.106	30.348.243	
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	12	10.766.125	21.474.805	10.708.680	9.123.131	19.831.811	
Turizm	5	3.130.435	4.195.889	1.065.454	3.118.494	4.183.948	
Konut	1	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	
İmalat	1	9.997	9.997	0	9.997	9.997	
Toplam	286	1.350.005.516	5.178.475.279	1.244.561.918	1.100.199.267	2.344.761.185	

< >

Toplam Proje Sayısı

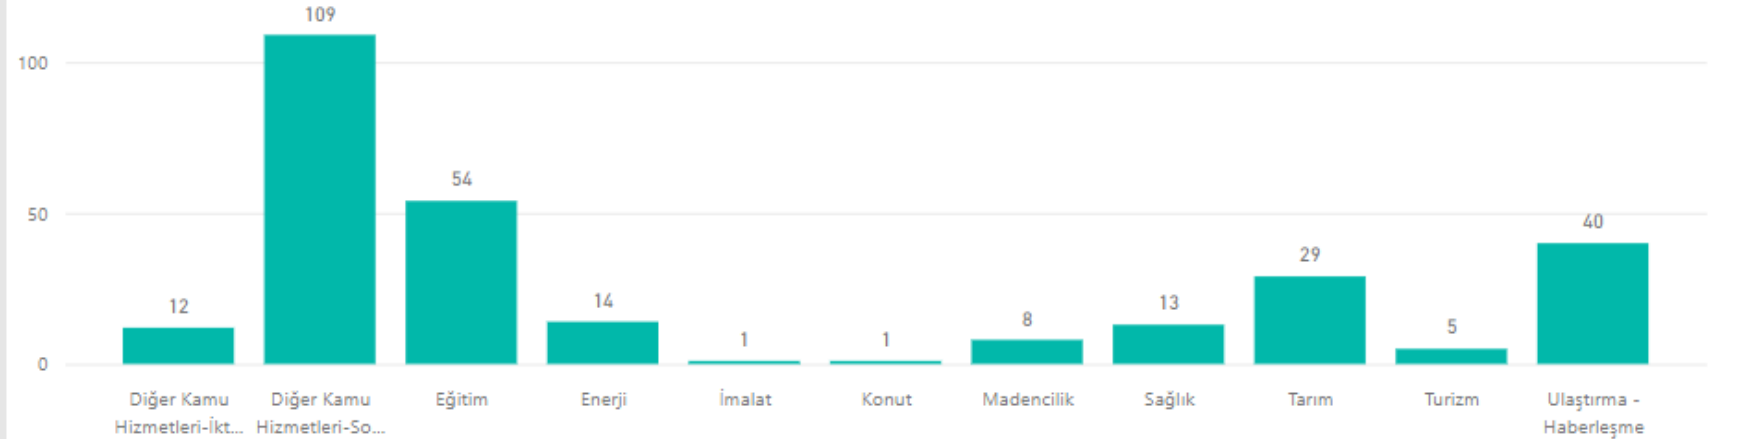

İlçe Bazında Dağılım

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İlçe	Harcama Yılı
Tümü	2021

Proje Sahibi Kuruluş
Tümü

Proje Durumu
Tümü

Proje Alt Durumu
Tümü

Proje İzlemede Mi ?
E

Proje Sektörü	Proje Sayısı
Ulaştırma - Haberleşme	40
Turizm	5
Tarım	29
Sağlık	13
Madencilik	8
Toplam	286

%45,28

Nakdi Gerçekleşme Oranı

286

Toplam Proje Sayısı

5.178.475.279


Toplam Proje Tutarı

1.350.005.516

Toplam Yıl Ödeneği

İlçe	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Dön
MUHTELİF İLÇE	62	858.276.011	3.113.666.784	749.802.602	791.308.361	1.541.110.963	%49,50	
MERKEZ	63	231.536.995	1.000.098.870	313.945.896	172.174.426	486.120.322	%48,61	
LÜLEBURGAZ	66	151.141.500	677.234.152	108.709.725	58.769.342	167.479.067	%24,73	
PINARHİSAR	23	21.335.035	121.727.679	20.002.761	11.381.773	31.384.534	%25,78	
BABAEŞKİ	35	37.103.527	111.829.524	22.387.310	33.284.650	55.671.960	%49,78	
VİZE	20	34.120.669	89.080.653	5.768.985	20.078.938	25.847.923	%29,02	
DEMİRKÖY	9	10.091.996	38.634.344	14.092.130	7.523.361	21.615.491	%55,95	
KOÇGAZ	2	2.499.872	15.170.988	4.120.908	2.497.301	6.618.209	%43,62	
PEHLİVANKÖY	6	3.899.911	11.032.285	5.731.601	3.181.115	8.912.716	%80,79	
Toplam	286	1.350.005.516	5.178.475.279	1.244.561.918	1.100.199.267	2.344.761.185	%45,28	

İlçe Bazında Proje Sayısı

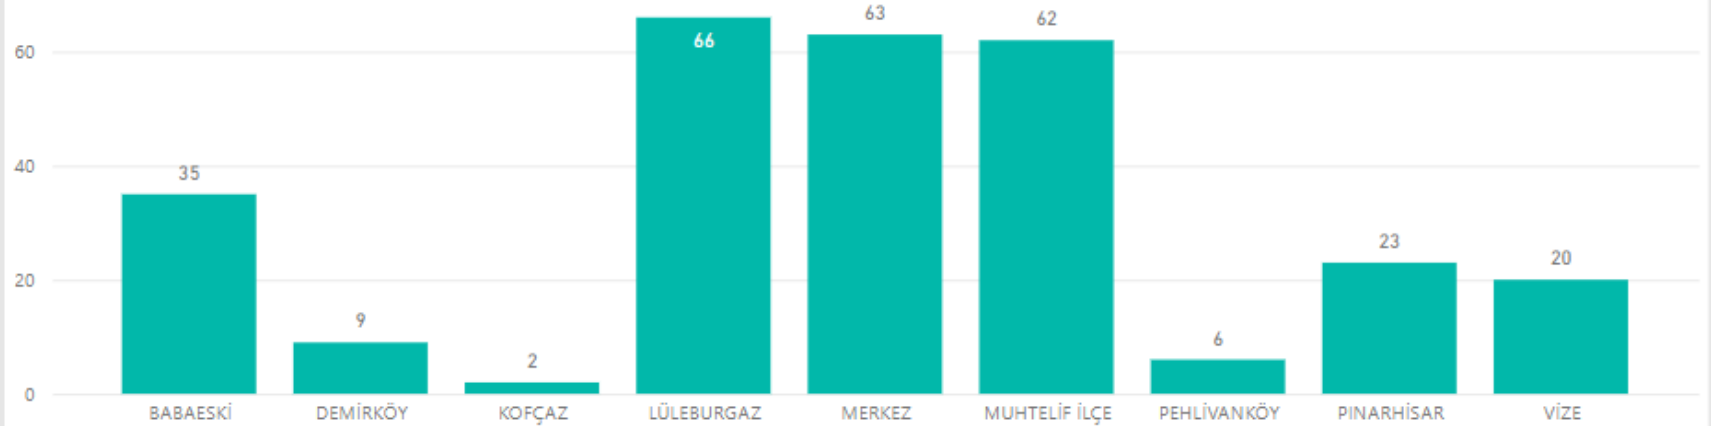

Dönemsel Harcama Dağılımı

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü


Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



286

Proje Sayısı

5.178.475.279

Toplam Proje Tutarı

2.344.761.185

Toplam Harcama Tutarı

1.350.005.516

Toplam Yıl Ödeneği

1.100.199.267

Yılı Harcama Tutarı

134.955.284

1.Dönem Harcama Tutarı

175.049.361

2.Dönem Harcama Tutarı

394.387.577

3.Dönem Harcama Tutarı

395.516.883

4.Dönem Harcama Tutarı

%10,00

%12,97

%29,21

%29,30

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	55.671.960
DEMİRKÖY	21.615.491
KOÇAZ	6.618.209
LÜLEBURGAZ	167.479.067
MERKEZ	486.120.322
MUHTELİF İLÇE	1.541.110.963
PEHLİVANKÖY	8.912.716
PINARHİSAR	31.384.534
Toplam	2.344.761.185

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	1.548.005.927
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	323.705.720
Madencilik	167.289.452
Eğitim	134.455.364
Tarım	83.976.300
Sağlık	31.454.423
Enerji	30.348.243
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	19.831.811
Toplam	2.344.761.185

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	1.531.048.361
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	195.513.695
YEREL YÖNETİMLER	158.460.277
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	101.803.966
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	96.248.017
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	83.091.084
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI	32.580.351
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	32.465.800
Toplam	2.344.761.185

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu
(BABAESKİ-HAMİTABAT) BRŞ N.-LÜLEBURGAZ ENERJİ İLETİM HATTI	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında
(EDİRNE - HAVSA) AYRIMI - HASKÖY - KIRKLARELİ BÖLÜNMÜŞ YOLU (2...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
(PINARHİSAR - TRAÇİM) BRŞ. N. - PAGDER ASLAN OSB EİH (TTFO)	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında
(PINARHİSAR-VİZE) AYR.-DEMİRKÖY-İĞNEADA DEVLET YOLU YAPIMI (9...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
ACİL ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti
ANA KANALİZASYON HATTI DÖŞENMESİ VE TAŞ TAMİRLERİ YAPIMI	LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Bitti
ARAŞTIRMA PROJELERİ	KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
ARAZİ VE ARSA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI	AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Devam Ediyor
Toplam		

Yatırımcı Kuruluş Dağılımı

Arama Filtreleri

Proje Yeri İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2021

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

%44,47

Nakdi Gerçekleşme Oranı

206

Toplam Proje Sayısı

4.971.093.665

Toplam Proje Tutarı

1.284.405.966

Toplam Yıl Ödeneği

Yikob/Özel İdare/Diğer

Tümü

KIRDES Projesi Mi?

Tümü

KÖYDES Projesi Mi?

Tümü

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması
55'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI	1	500.000	500.000	0
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	15	17.842.686	333.117.197	55.012.823
EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	5.292.954	14.753.140	9.460.186
İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	30	42.845.448	149.152.038	39.551.439
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	5.350.900	5.350.900	0
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	11	256.913.441	921.710.524	241.722.624
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	967.010	34.612.493	147.222
KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	1	494.984	1.077.482	377.500
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	3	13.699.220	13.699.220	0
KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	16	98.205.537	101.205.537	3.000.000
KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	2	710.595	715.690	5.095
KIRKLARELİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	153.983	305.000	151.017
Toplam	206	1.284.405.966	4.971.093.665	1.138.981.430

Proje Adı

Search

Yatırımcı Kuruluş	Proje Adı	Proje Sektörü
55'İNCİ MEKANİZE PİYADE TUGAY KOMUTANLIĞI	ORG.N.K.ERSUN KIŞLASI ZIRHLI ARAÇ GARAJLARI YAPIMI VE KANALİZASYONU	Diğer Kamu Hi
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	Tarım
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	DEMİRKÖY SIVRILAR GÖLETİ VE SULAMASI (390.000 M3)(1.260 DEKAR)	Tarım
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	Tarım
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	KAYALIKÖY BARAJI SULAMASI KANALET DEPLASMANI İLAVESİ	Tarım
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	KIRKLARELİ DOKUZHÖYÜK VE BABAESKİ KARAHALİL (TEKE DERE) TAŞKIN KORUMASI	Tarım
Toplam		

Arama Filtreleri

Proje Sahibi Beledi...

Tümü

Harcama Yılı

2021

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

%64,62

Nakdi Gerçekleşme Oranı

80

Toplam Proje Sayısı

207.381.614


Toplam Proje Tutarı

65.599.550

Toplam Yıl Ödeneği

Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Proje Sayısı	Toplam Y
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ARAZİ VE ARSA DÜZENLEME ÇALIŞMALARI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Devam Ediyor	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAMULAŞTIRMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Bitti	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAPALI PAZAR YERİ YAPIMI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Bitti	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	PARK YAPIMI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Projeye Başlanmadı	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	SPOR TESİSLERİ İNŞAATI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Projeye Başlanmadı	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	STABLİZE YOL YAPIMI	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİRİÇİ YOLLAR ÜSTYAPI TRETUVAR DÜZENLENMESİ	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİRİÇİ YOLLARI SATHI KAPLAMA YAPIMI	Ulaştırma - Haberleşme	Projeye Başlanmadı	1	
ALPULLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KAMULAŞTIRMA	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Projeye Başlanmadı	1	
ALPULLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ŞEHİRİÇİ YOLLAR ÜSTYAPI TRETUVAR DÜZENLENMESİ	Ulaştırma - Haberleşme	Projeye Başlanmadı	1	
Toplam				80	

Belediye Bazında Proje Sayısı



Proje Durum Bazında Dağılım

Proje Durum Dağılımı

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2021

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

%45,28

Nakdi Gerçekleşme Oranı

286

Toplam Proje Sayısı

5.178.475.279



Toplam Proje Tutarı

1.350.005.516

Toplam Yıl Ödeneği

Proje Durumu	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Bitti	102	147.704.257	189.402.620	40.170.303	135.844.740	176.015.043	%92,93
Devam Ediyor	94	1.062.385.979	4.067.426.118	1.145.940.020	947.250.753	2.093.190.773	%51,46
İhale Aşamasında	25	34.736.433	254.283.544	58.321.795	2.480.697	60.802.492	%23,91
Projeye Başlanmadı	65	105.178.847	667.362.997	129.800	14.623.077	14.752.877	%2,21
Toplam	286	1.350.005.516	5.178.475.279	1.244.561.918	1.100.199.267	2.344.761.185	%45,28

Proje Durumu

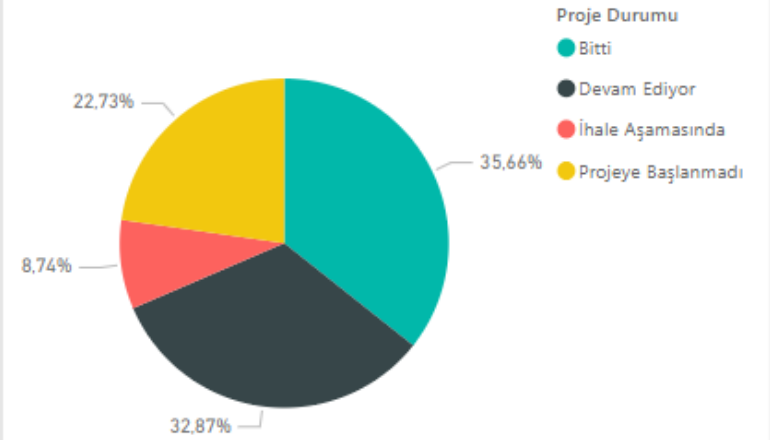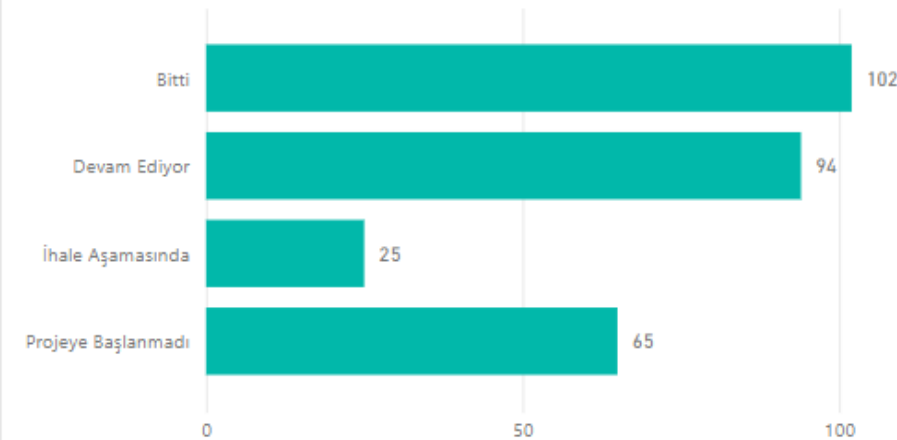

Kırklareli İli 2021 Yılı Kamu Yatırımları, 31 Aralık 2021

		Yatırımcı Kurum	Proje Sayısı	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Toplam Yıl Ödeneği	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Dönem nakdi gerçekleşme oranı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
		Toplam	286	5.178.475.279	1.244.561.918	1.350.005.516	1.101.477.300	2.346.039.218	81,59	45,30	
		Kamu Kuruluşları	206	4.971.093.665	1.138.981.430	1.284.405.966	1.073.051.528	2.212.032.958	83,54	44,50	
1	201	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	34.612.493	147.222	967.010	78.944	226.166	8,16	0,65	33,33%
2	401	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	3	13.699.220	0	13.699.220	11.733.223	11.733.223	85,65	85,65	72,73%
3	402	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	9.965.167	3.420.981	4.260.683	3.858.986	7.279.967	90,57	73,05	79,71%
4	404	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	30	149.152.038	39.551.439	42.845.448	38.961.421	78.512.860	90,93	52,64	78,36%
5	602	MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	10.653.000	0	10.653.000	8.969.515	8.969.515	84,20	84,20	97,00%
6	603	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	14	147.078.246	5.207.137	46.371.709	25.141.106	30.348.243	54,22	20,63	22,29%
7	604	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	5	201.566.000	0	201.566.000	156.195.937	156.195.937	77,49	77,49	100,00%
8	701	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	16	101.205.537	3.000.000	98.205.537	29.206.244	32.206.244	29,74	31,82	48,56%
9	900	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	7	19.574.915	9.913.839	9.661.076	8.496.471	18.410.310	87,95	94,05	41,54%
10	905	KIRKLARELİ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI	1	480.000	0	480.000	475.491	475.491	99,06	99,06	100,00%
11	906	KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	2	715.690	5.095	710.595	336.969	342.064	47,42	47,79	0,00%
12	907	KIRKLARELİ İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ	1	305.000	151.017	153.983	153.000	304.017	99,36	99,68	100,00%
13	1001	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	9	29.906.504	12.897.341	10.091.855	4.991.853	17.889.194	49,46	59,82	55,56%
14	1002	EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	14.753.140	9.460.186	5.292.954	5.116.420	14.576.606	96,66	98,80	100,00%
15	1101	KIRKLARELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	10	125.945.684	210.571	62.129.513	32.369.780	32.580.351	52,10	25,87	41,08%
16	1200	ASKERİ BİRLİKLER	1	500.000	0	500.000	76.713	76.713	15,34	15,34	100,00%
17	1301	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	13	339.955.194	0	48.954.689	31.454.423	31.454.423	64,25	9,25	10,58%
18	1401	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	4	295.000.000	92.943.997	8.859.972	8.859.969	101.803.966	100,00	34,51	22,50%
19	1501	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	4	2.603.023	0	2.603.023	2.602.356	2.602.356	99,97	99,97	100,00%
20	1502	KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ	1	1.077.482	377.500	494.984	494.984	872.484	100,00	80,97	81,00%
21	1504	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	1.685.000	41.418	1.643.582	1.631.625	1.673.043	99,27	99,29	100,00%
22	1505	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	15	333.117.197	55.012.823	17.842.686	17.842.011	72.854.834	100,00	21,87	42,93%
23	1506	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	5.350.900	0	5.350.900	5.088.367	5.088.367	95,09	95,09	100,00%
24	1701	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	11	921.710.524	241.722.624	256.913.441	256.913.435	498.636.059	100,00	54,10	30,82%
25	1703	TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	2.106.338.480	654.850.641	379.114.993	377.319.289	1.032.169.930	99,53	49,00	23,00%
26	1704	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	242.372	196.321	46.051	46.051	242.372	100,00	100,00	100,00%
27	2900	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	10	75.116.272	3.104.508	34.200.001	26.949.698	30.054.206	78,80	40,01	58,26%
28	3000	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	23	28.784.587	6.766.770	20.793.061	17.687.247	24.454.017	85,06	84,96	57,47%
		Belediyeler	80	207.381.614	105.580.488	65.599.550	28.425.772	134.006.260	43,33	64,62	
1	3001	KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	3.336.194	0	3.336.194	1.258.560	1.258.560	37,72	37,72	55,80%
2	3002	İNECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	180.000	130.000	50.000	0	130.000	0,00	72,22	100,00%
3	3003	ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	711.504	0	711.504	695.634	695.634	97,77	97,77	100,00%
4	3005	BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	5.211.099	59.420	40.582	0	59.420	0,00	1,14	0,00%
5	3006	ALPULLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	2	0	2	0	0	0,00	0,00	0,00%
6	3007	BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	12	1.975.425	0	1.975.425	695.425	695.425	35,20	35,20	30,00%
7	3008	KARAHALİL BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	4.393.959	2.669.872	1.724.087	1.724.087	4.393.959	100,00	100,00	100,00%
8	3009	DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	3.821.365	0	3.821.365	1.639.430	1.639.430	42,90	42,90	45,67%
9	3010	İĞNEADA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	1.600.000	0	1.600.000	1.577.971	1.577.971	98,62	98,62	100,00%
10	3012	LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	28	154.268.021	100.009.935	41.237.225	17.203.822	117.213.757	41,72	75,98	60,65%
11	3013	AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	8	4.099.699	2.019.335	2.077.867	1.637.709	3.657.044	78,82	89,20	60,00%
12	3014	BÜYÜKKARİŞTİRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	332.153	0	332.153	332.153	332.153	100,00	100,00	100,00%
13	3016	PEHLIVANKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	2.000.000	691.926	765.301	765.301	1.457.227	100,00	72,86	100,00%
14	3017	PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	23.685.029	0	6.160.681	895.680	895.680	14,54	3,78	0,00%
15	3018	KAYNARCA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0,00	0,00	0,00%
16	3021	KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	707.164	0	707.164	0	0	0,00	0,00	0,00%

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

256.913.441

256.913.435

11

Proje Sayısı

921.710.524

Toplam Proje Tutarı

498.636.059

Toplam Harcama Tutarı

256.913.441

Toplam Yıl Ödeneği

256.913.435

Yılı Harcama Tutarı

23.941.920

1.Dönem Harcama Tutarı

22.823.800

2.Dönem Harcama Tutarı

51.295.781

3.Dönem Harcama Tutarı

158.851.934

4.Dönem Harcama Tutarı

%9,32

%8,88

%19,97

%61,83

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	0
LÜLEBURGAZ	32.000
MERKEZ	235.561.344
MUHTELİF İLÇE	263.042.715
Toplam	498.636.059

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	498.636.059
Toplam	498.636.059

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	498.636.059
Toplam	498.636.059

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar
(EDİRNE - HAVSA) AYRIMI - HASKÖY - KIRKLARELİ BÖLÜNMÜŞ YOLU (2...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	70.930.720	250.000.000	
(PINARHİSAR-VİZE) AYR.-DEMİRKÖY-İĞNEADA DEVLET YOLU YAPIMI (9...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	2.573.191	95.000.000	
ASFALT, BAKIM, ONARIM VE TRAFİK ÇALIŞMALARI	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	39.398.931	39.398.931	
BABAESKİ (IV.MURAT) KÖPRÜSÜ (80M)	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1.200.000	
KAMULAŞTIRMALAR	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	11.242.593	11.242.593	
KINALI AYRIMI - ÇERKEZKÖY - SARAY - KIRKLARELİ DEVLET YOLU	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	132.768.000	385.000.000	
KIRKLARELİ-BABAESKİ DEVLET YOLU ÜST KAPLAMA YENİLEME VE ONA...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	34.542.000	
LÜLEBURGAZ ÇEVRE YOLU (BY 10 KM)	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	25.858.000	
O-1, O-2, O-3, O-4 OTYOLLARINDA KAPIKULE-GÜMÜŞOVA ARASIND...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	65.905.000	
Toplam			256.913.441	921.710.524	



T.C. ULAŖTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĐI



KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĐÜ

Kırklareli

KIRKLARELİ İLİ KARAYOLU YATIRIMLARI

1.


Bölge Müdürlüğü

Çidemediğin yer senin değildir.

Halil Rifat Paşa


11 OCAK 2022

YER Rektörlük Kültür Merkezi
(Şahinler Sokak, Otogar arkası)
SAAT: 14:00

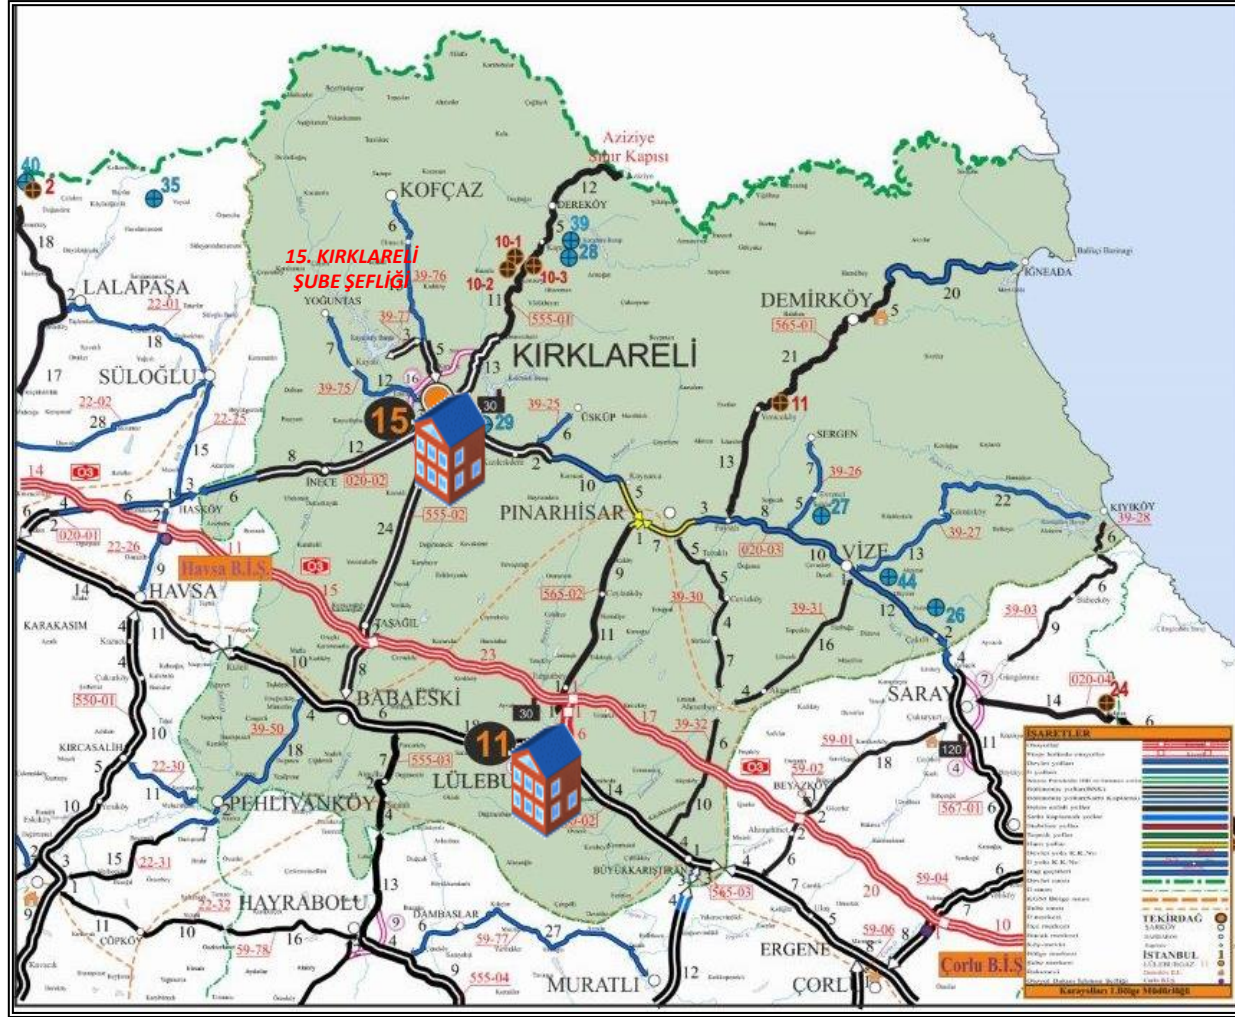


KIRKLARELİ İLİ
587 km


YOL AĞI

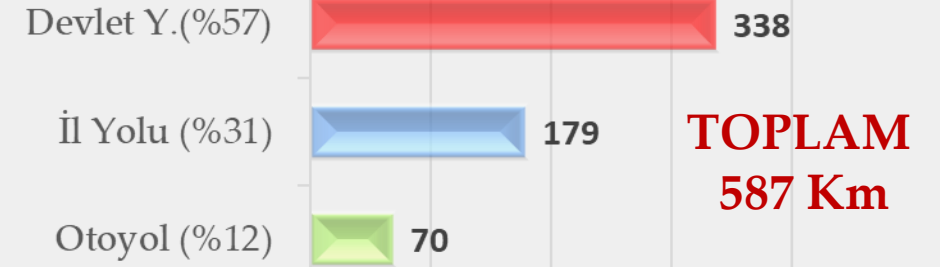

SATIŞ CİNSİ

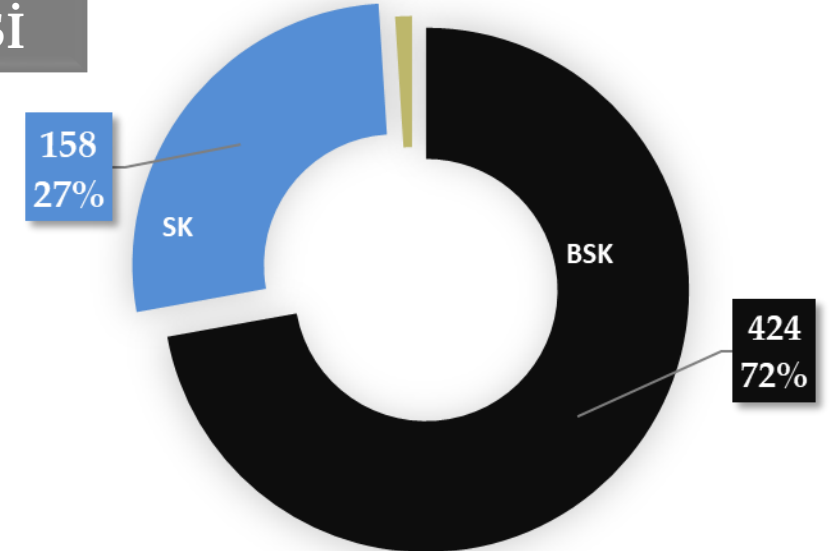

DEVAM EDEN PROJELER

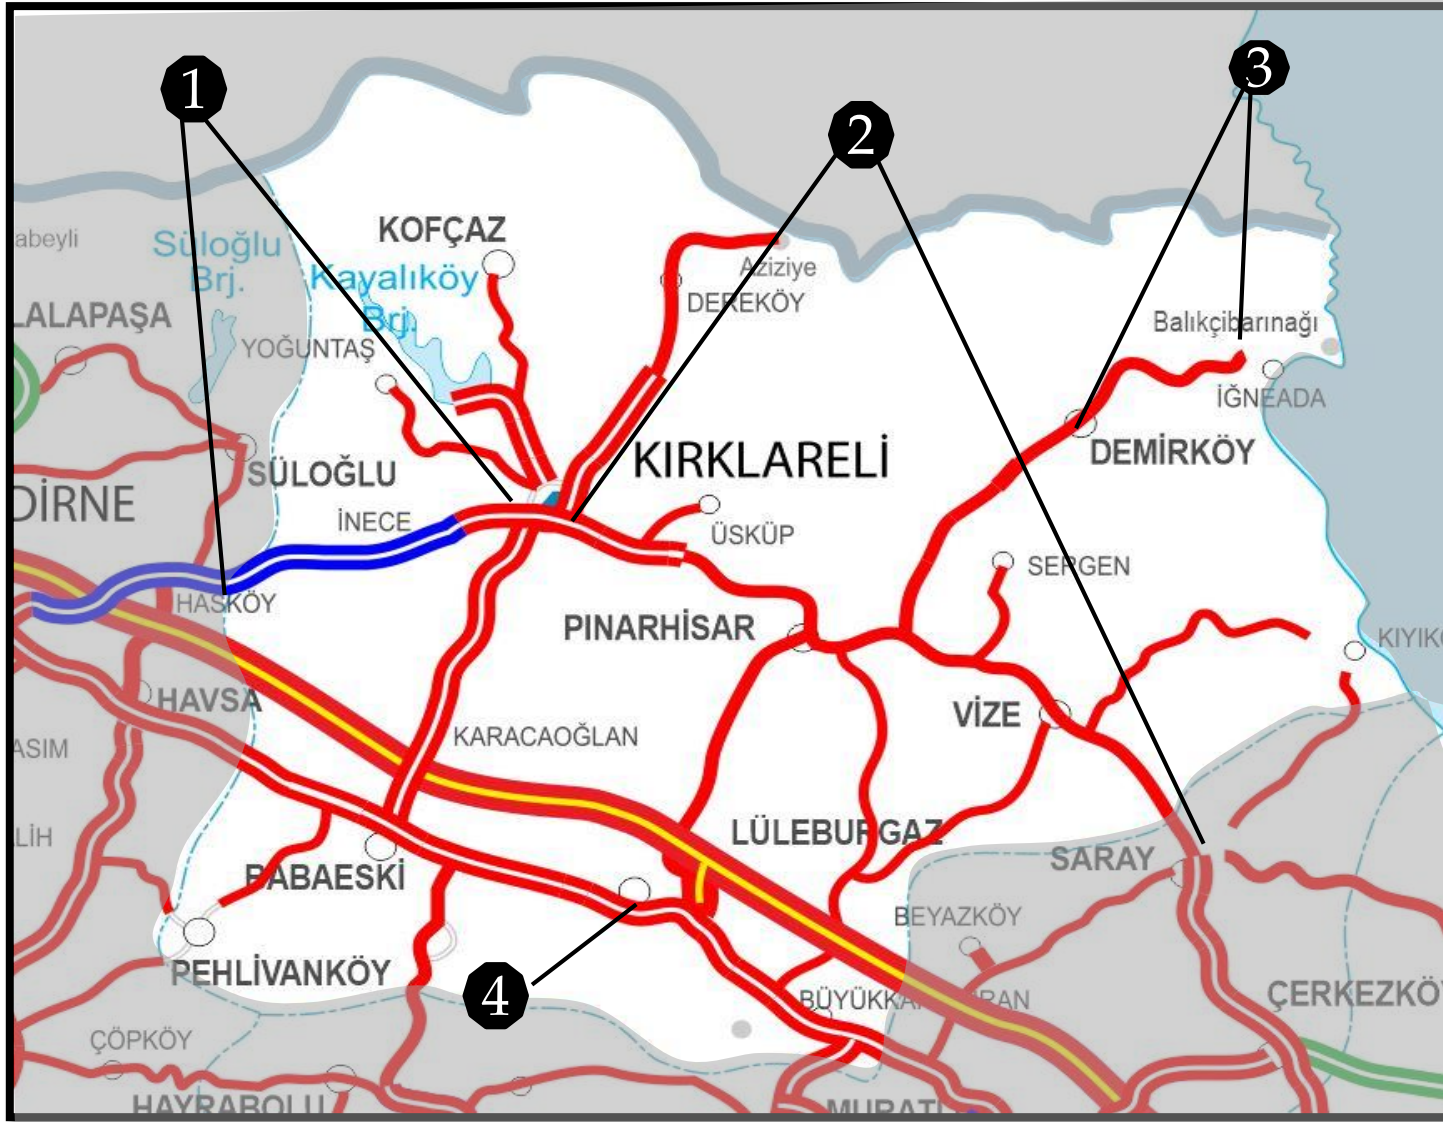

1. EDİRNE – KIRKLARELİ BY YAPIM

2. SARAY– KIRKLARELİ (PINARHİSAR Ç.Y DAHİL) BY YAPIM

3. DEMİRKÖY-İĞNEADA TY ONARIM

4-(KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ
(SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON
UYGULAMASI İŞİ

Hizmete Açık Otoyollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Otoyollar	
Hizmete Açık Bölünmüş Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Bölünmüş Yollar	
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar	
Projesi Devam Eden Bölünmüş Yollar	
Hizmete Açık Tek Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Tek Yollar	
İhale Edilecek Tek Yollar	


1-EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU

YÜKLENİCİ: ASTRO İNŞ.

1.000 TL

2021 Yılı
Hedefi : 14.100
İmalat : 102.565
% 727

2020 SONU
2021 YILI
2021 SONRASI

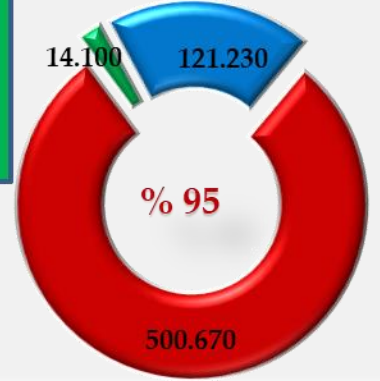

Proje Bedeli
(1.000 TL)


636.000
279.840 Edirne



Başlama
Bitiş Tarihi

2017
2021

		KAPSAM	BİTEN	2021 HEDEF
BY		47,5 km	28,0 km	1 km
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü		6 adet 382 m	5 adet 352 m	
Tek Köprü		3 adet 199 m	1 adet 39 m	
KöprülÜ Kavşak				

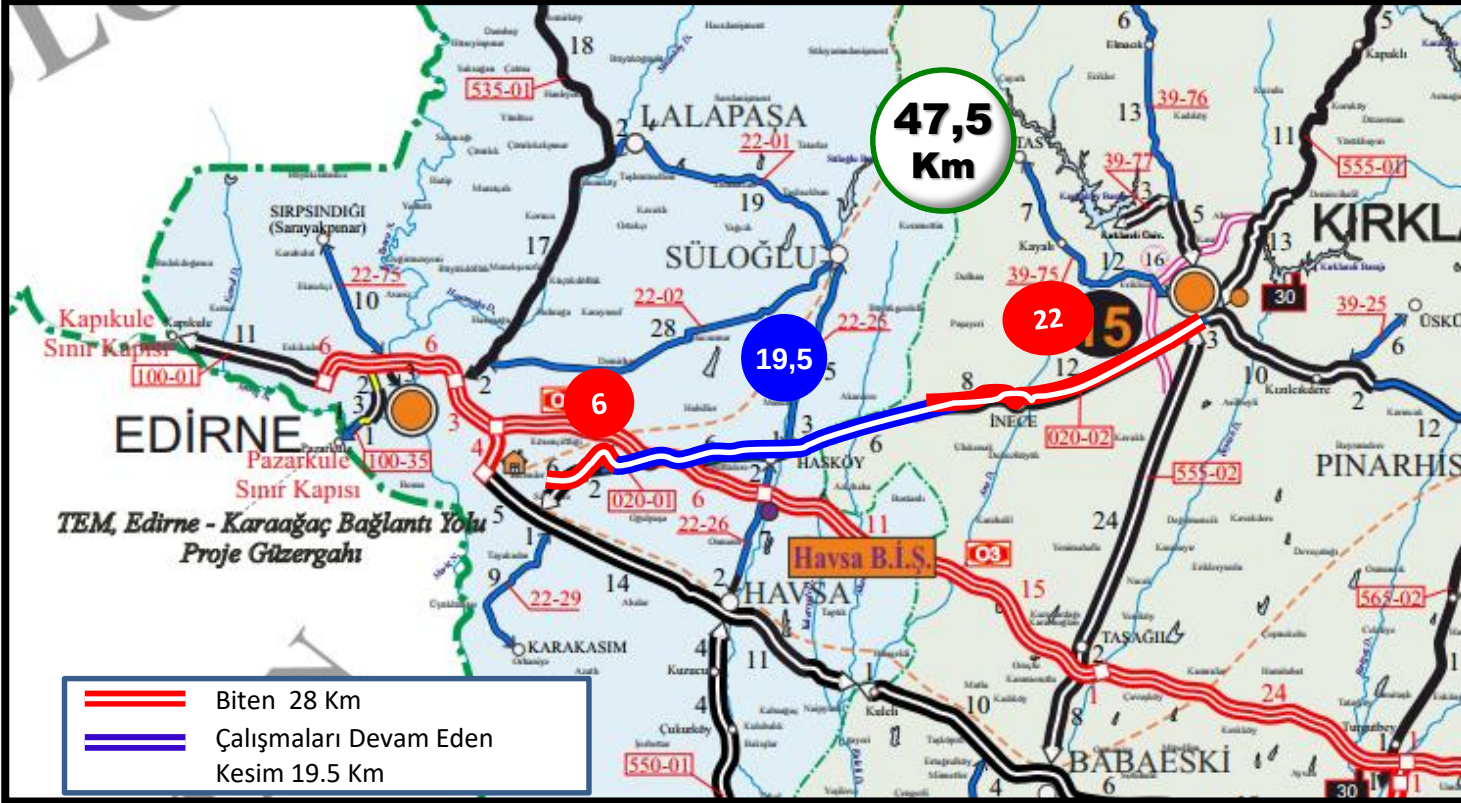


MEVCUT	52,5 km/63dk	PROJELİ	47,5 km/24dk.	YOGT	3.694	AĞIR TAŞIT	% 10
--------	--------------	---------	---------------	------	-------	------------	------

- Proje uzunluğu 47,5 km BY-BSK'dır. Projenin 21 km.si Edirne sınırları içerisinde 26,5 km.si Kırklareli sınırları içerisinde yer almaktadır.
- Bugüne kadar 26 km.lik kesim BY-BSK seviyesinde, 6 adet köprü (İnece, Dolapdere, Bostanlı, Akardere, Hasköy, Sazlıdere Köprüleri) tamamlanmıştır.
- Km: 20+000-24+000 arası kesimde üstyapı çalışmalarına devam edilmekte olup sağ taşıma binder seviyesinde tamamlanmıştır.

1) EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU




Km 11+377 İnece geçiş

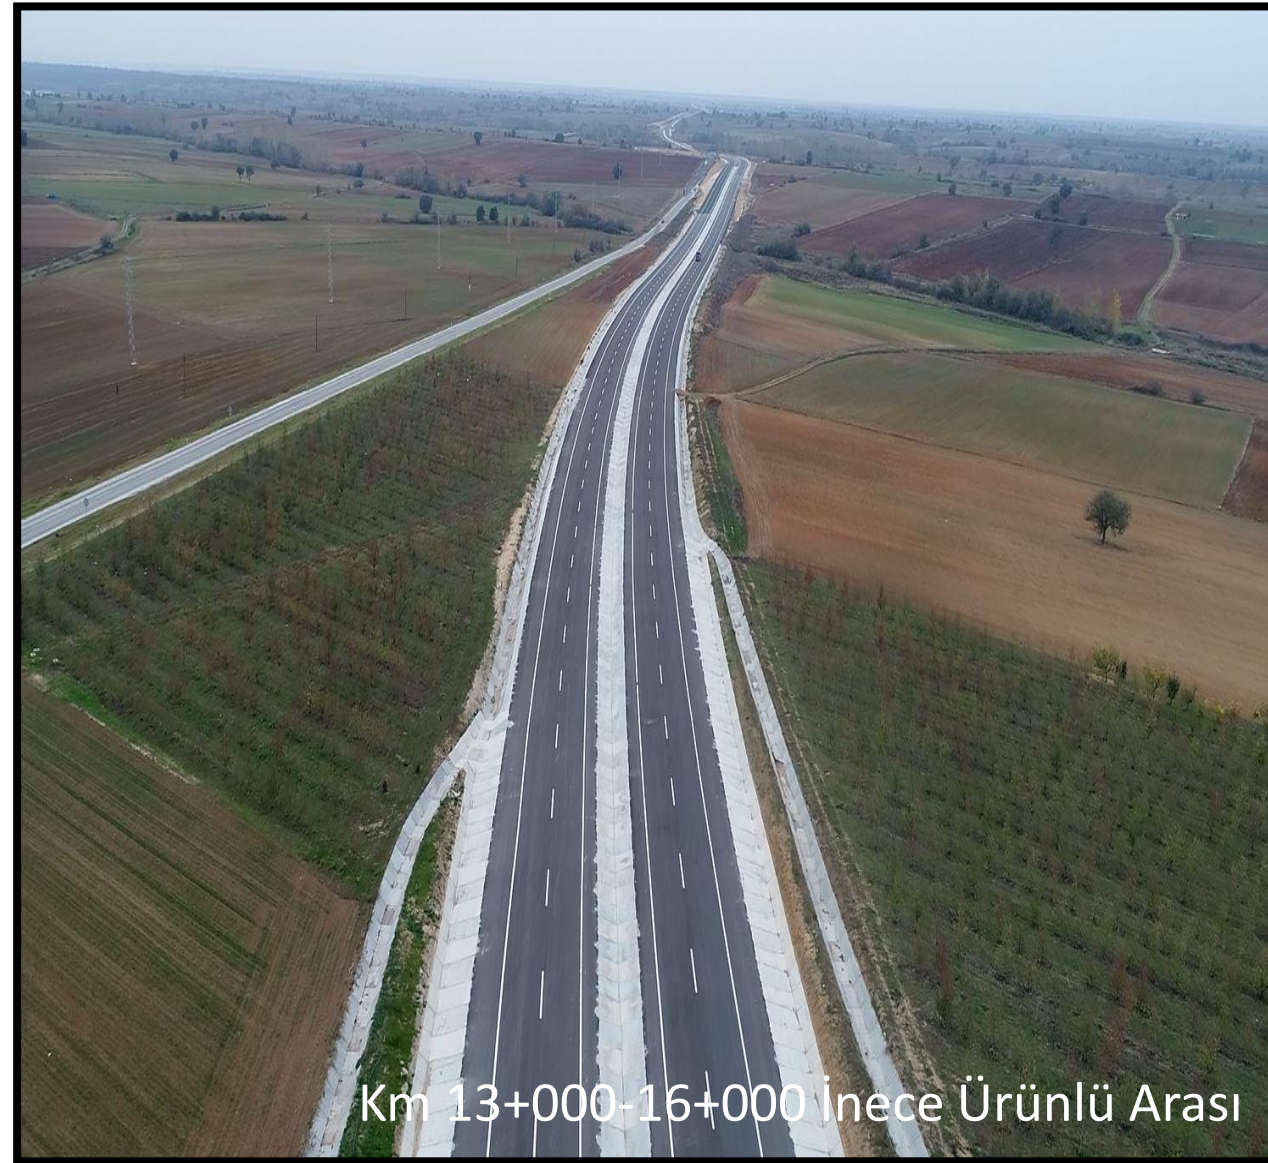

Km 13+000-16+000 İnece Ürünü Arası

2) SARAY - KIRKLARELİ YOLU

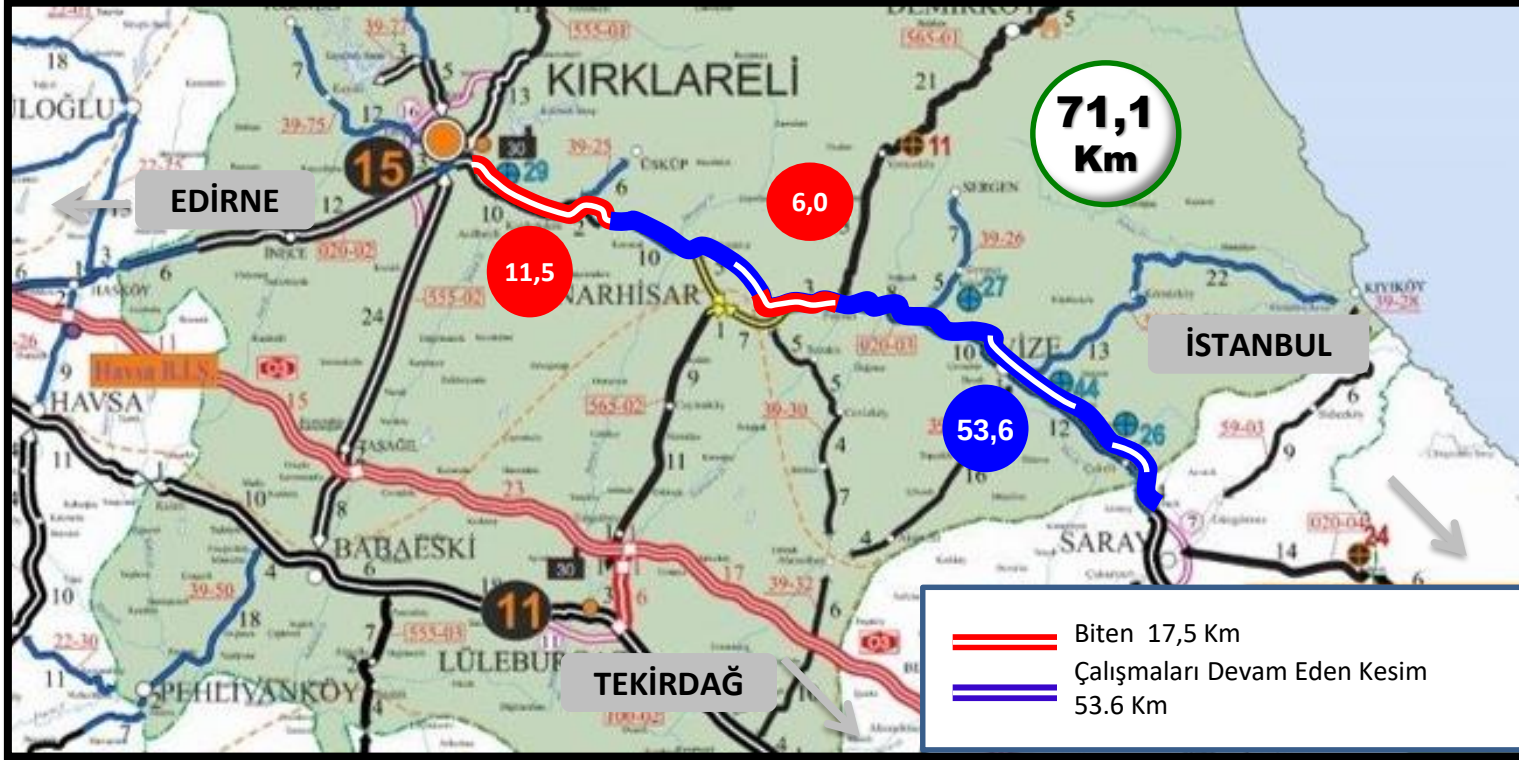

YÜKLENİCİ: ATİS&İSPA İŞ ORT.

2021Yılı
Hedefi : 61.363
İmalat : 198.278
% 323

2020 SONU
2021 YILI
2021 SONRASI

1.000 TL

% 45

482.785



Proje Bedeli
(1.000 TL)

632.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2019
2022

		KAPSAM	BİTEN	2021 HEDEF
BY		27,5 km	17,5 km	7 km
TY		43,6 km		
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü		4 adet 186 m		
Köprülü Kavşak				

- ❑ Proje uzunluğu 71,1 km BY BSK dir.
- ❑ 2020 yılında sonuna kadar 14,5 Km' lik kesim BY-BSK ' ılı olarak tamamlanmıştır.
- ❑ 2021 yılında Km:48+000 – 52+150 arası Pınarhisar Çevreyolu 4,0 Km'lik kesimi ve Km:11+655 - 14+610 arası Çakıllı Çevreyolu 3,0 Km'lik kesimi olmak üzere toplam 7,0 Km'lik kesimin bölünmüş yol olarak Aşınma seviyesinde tamamlanması hedeflenmektedir.
- ❑ 2021 yılında Pınarhisar Çevreyolunun 4 km 'lik kesim BY-BSK olarak tamamlanmıştır. Km:11+655 - 14+610 arası Çakıllı Çevreyolu'nda üstyapı çalışmalarına devam edilmektedir.
- ❑ Yol genelinde muhtelif kesimlerinde kamulaştırma çalışmalarına devam edilmektedir.
- ❑ KM 55+000-57+000 arası kesimde DSİ kapalı boru sistemi sulama kanalı deplasesi bulunmaktadır.

2) SARAY - KIRKLARELİ YOLU




Pınarhisar Çevre Yolu Km:46+500-47+500 Arası

3- DEMİRKÖY – İĞNEADA TEK YOL

YÜKLENİCİ: YAZICIOĞLU Yol Yapı İnş.

2021Yılı
Hedefi :
İmalat : 2.573

1.000 TL

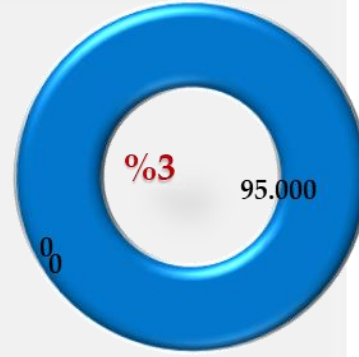

2020 SONU

2021 YILI

2021 SONRASI




Proje Bedeli
(1.000 TL)

95.000



Başlama
Bitiş Tarihi 2021
2022

		KAPSAM	BİTEN	2021 HEDEF
BY				
TY		9,3 TY SK>BSK		
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü				
Köprülülü Kavşak				

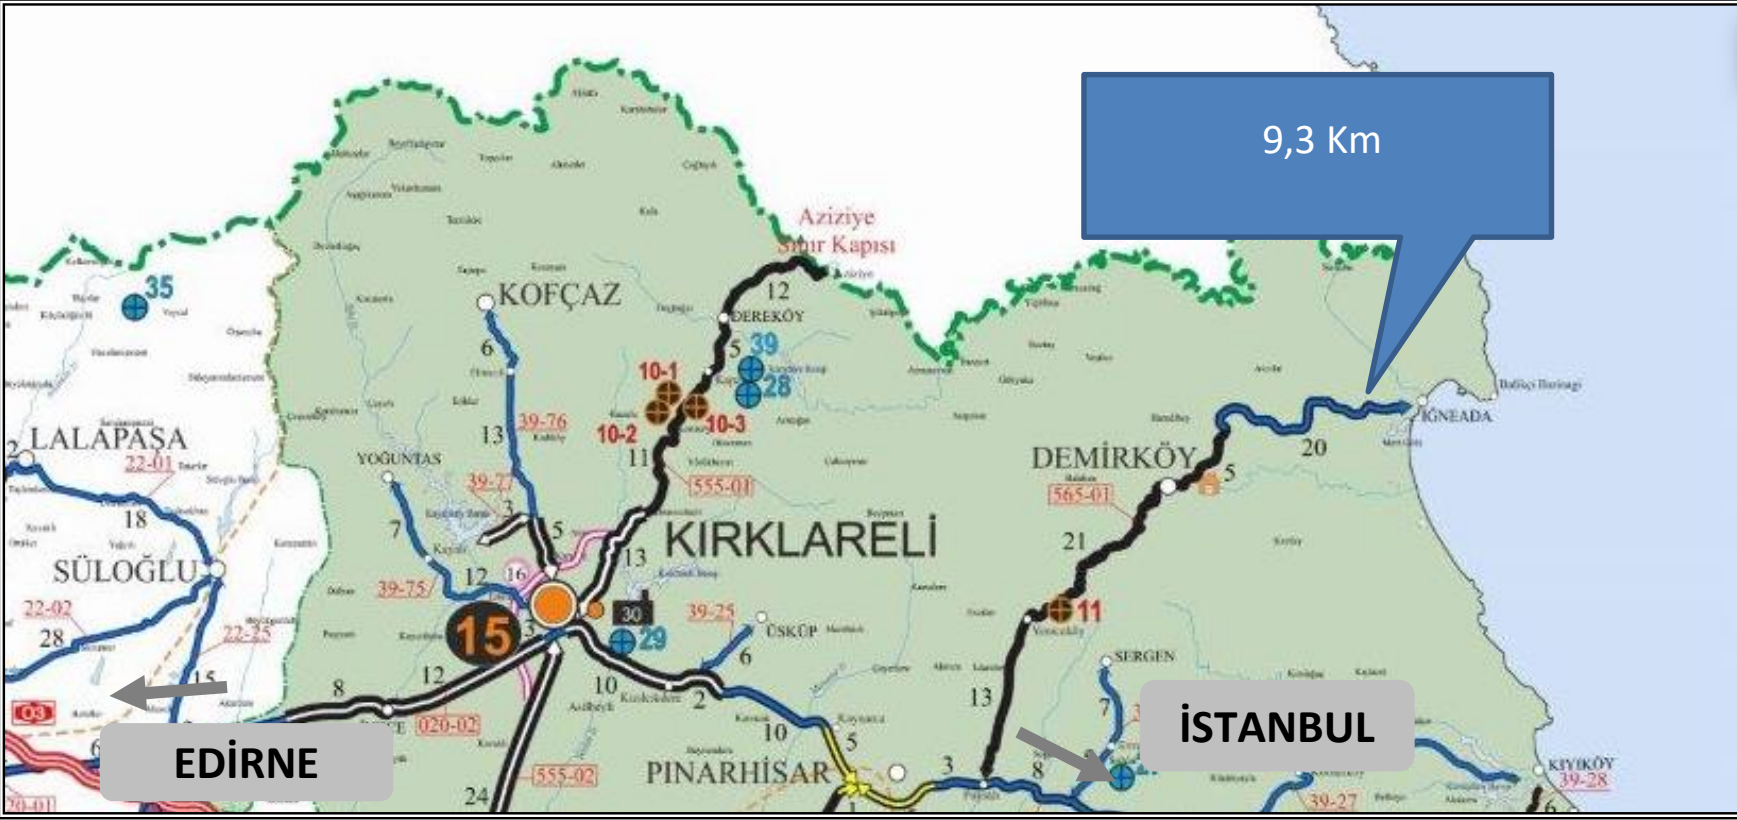

2021 HEDEFİ

MEVCUT 9,3 Km PROJELİ 9,3 Km YOGT 1.374 AĞIR TAŞIT 161

Demirköy-İğneaa Yolu Km: 0+000-5+450 arasında bulunan 'Demirköy Çevre Yolu' ve Km:21+000-24+850 arasında yol yapım çalışmaları yapılacaktır.

03.08.2021 tarihinde sözleşme imzalanmış ve yer teslimi yapılmıştır. Km:0+000 – 18+000 arası kesimde orman izinleri ve kamulaştırma çalışmalarına başlanılmıştır.

3) DEMİRKÖY – İĞNEADA TEK YOL



Mevcut yol Demirköy girişi Km:+0+600




Mevcut yol Demirköy çıkışı Km:+5+000

KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKOLLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ

YÜKLENİCİ: KÜBRA İNŞAAT

2021Yılı
Hedefi :2.524
İmalat: 0

2020 SONU
2021 YILI
2021 SONRASI

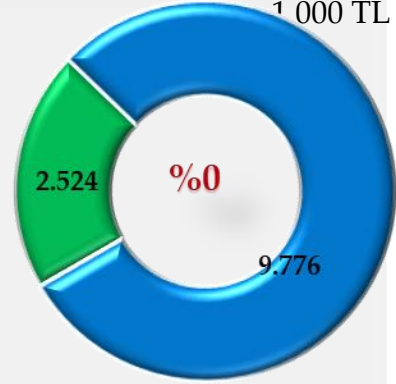


Proje Bedeli
(1.000 TL)

12.300



Başlama
Bitiş Tarihi
2021
2022

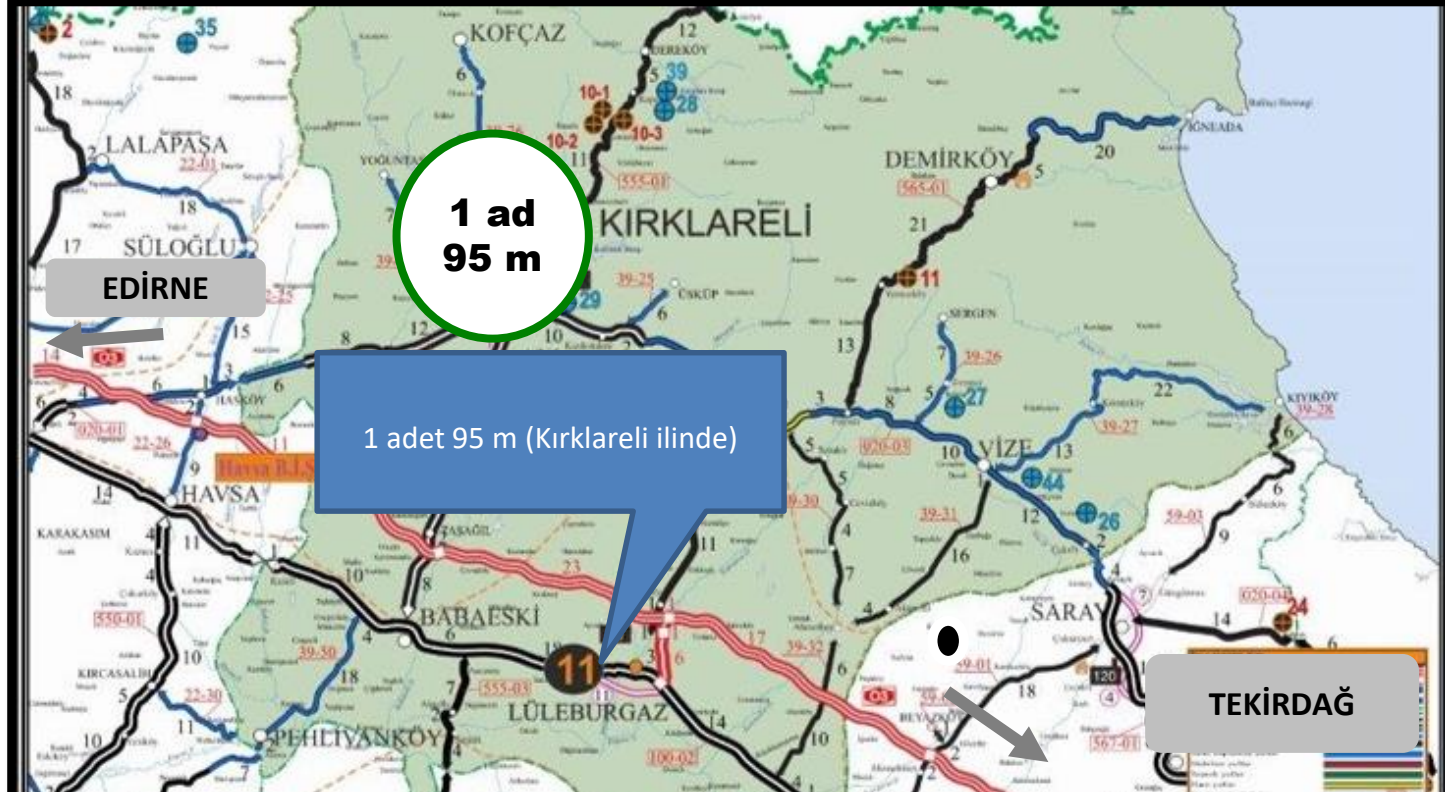

MEVCUT	95 m	PROJELİ	95 m	YOGT	AĞIR TAŞIT
--------	------	---------	------	------	------------

- ❑ Proje 1 adet 95 m uzunluğunda tarihi köprüden oluşmaktadır.
- ❑ 2020 yılında herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
- ❑ 2021 yılında, köprüde kazı ve temizlik imalatları yapılması hedeflenmektedir.
- ❑ 21.04.2021 tarihinde ihalesi gerçekleştirilmiş olup 05.07.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Araç trafiğine açık olan köprüde çalışma yapılması halinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için Kırklareli Valiliği'nin talebi üzerine DSI tarafından yapılacak alternatif 2 adet köprü tamamlandıktan sonra çalışmalara başlanabilmektedir.

		KAPSAM	BİTEN	2021 HEDEF
BY	AA			
TY	A			
Çift Tüp Tünel	BB			
Tek Tüp Tünel	B			
Çift Köprü	YY			
Tek Köprü	Y	1 adet 95 m		
Köprülü Kavşak	CC			

KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKOLLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ



Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü
Genel Görünüm-1



Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü
Genel Görünüm-2

- ❑ Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi'nde yer alan tarihi Sokollu Mehmet Paşa Köprüsü, H.973 (M.1565) yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Takriben 95 m. uzunluğunda, 5,5 m. genişliğindedir. Kesme taş örgülü 4 sivri kemer, orta ayakta hafifletme gözü ve yanlarda boşaltma gözlerinden teşkil edilmiştir.

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ


YAPILAN TOPLAM HARCAMA: 25.000.000 TL



EDİRNE – KIRKLARELİ YOLU YAMA ÇALIŞMALARI

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI

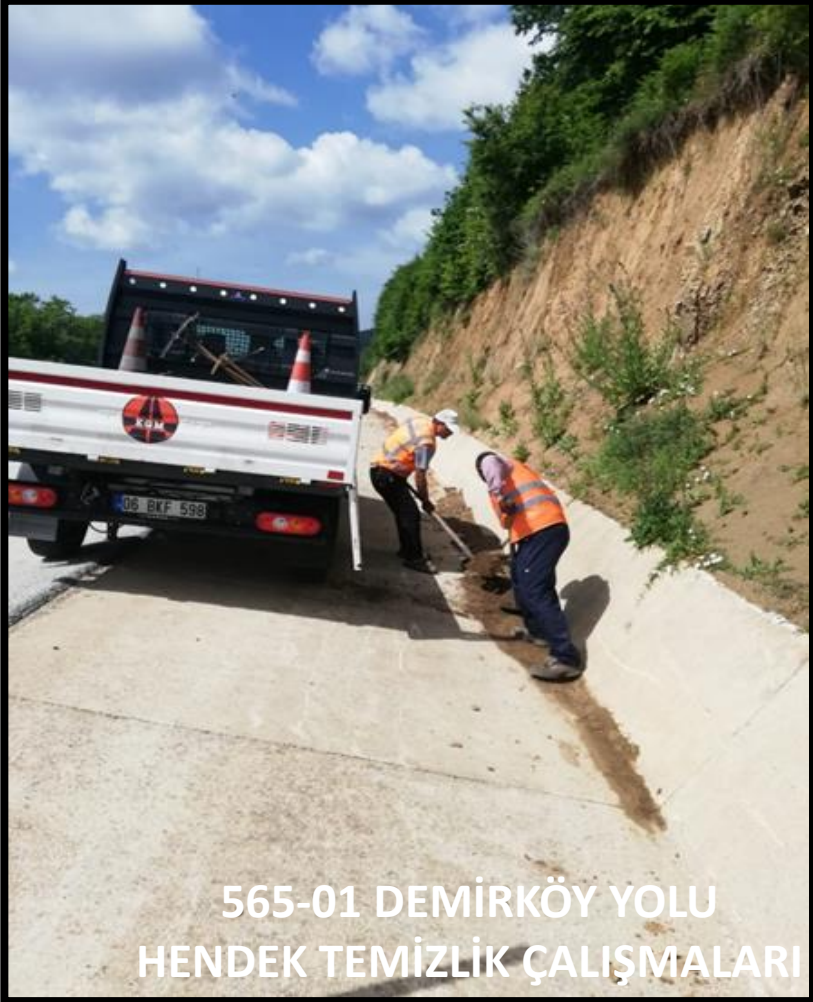

565-01 DEMİRKÖY YOLU
HENDEK TEMİZLİK ÇALIŞMALARI



565-01 29+400 İĞNEADA DEMİRKÖY

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI



RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM ÇALIŞMALARI



DEVLET VE İL YOLLARINDA OT TEMİZLİĞİ





RUTİN YAPILAN ÇALIŖMALARIMIZ

RUTİN BAKIM ONARIM ÇALIŖMALARI



DEVLET VE İL YOLLARINDA SÜPÜRGE VE ÇALI TEMİZLİđİ ÇALIŖMALARI





T.C. ULAŞTIRMA VE
ALTYAPI BAKANLIĞI




KARAYOLLARI
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

KAR MÜCADELESİ ÇALIŞMALARI

565-01 Demirköy yolu 38.km 30.12.2019 09:35

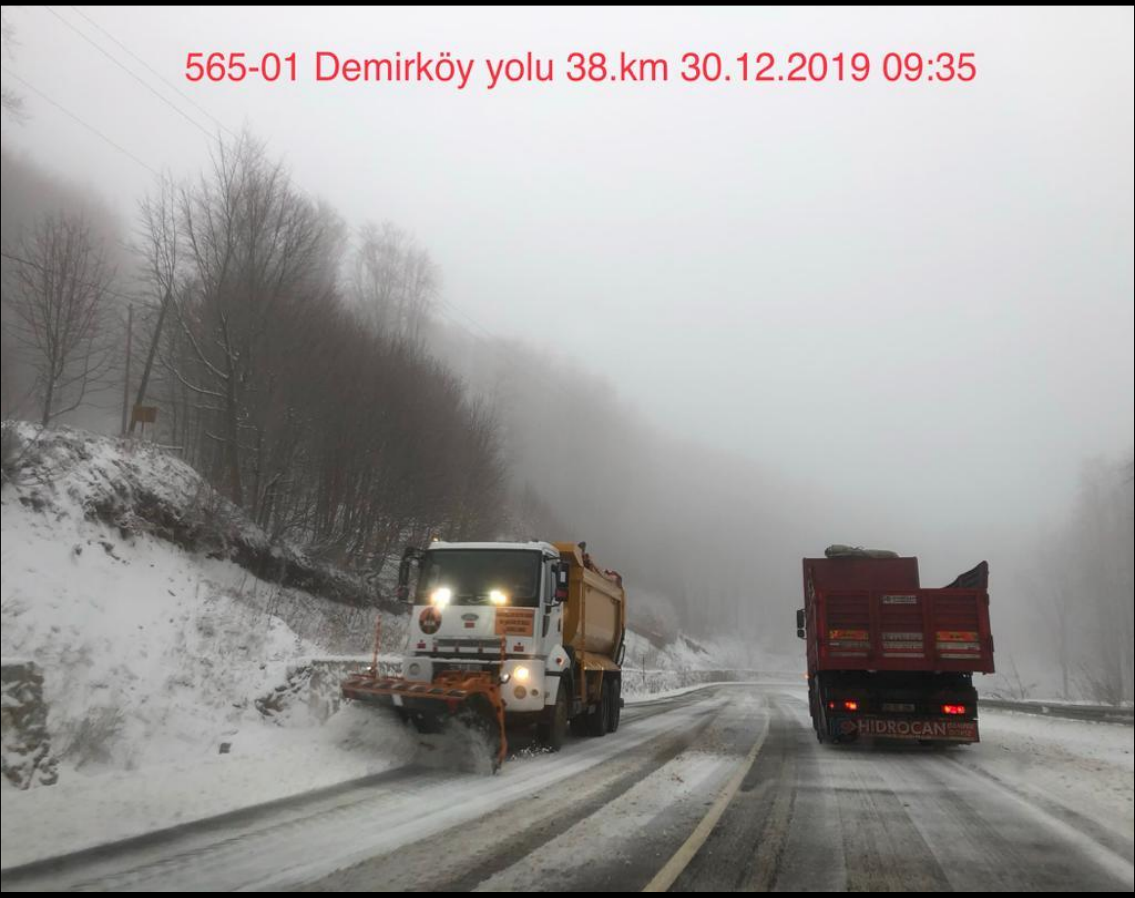

565-01 Demirköy jandarma kule mevki 30.12.2019 09:30



İĞNEADA-(KIRKLARELİ-VİZE)(020-03)DYA

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

YAPILAN TOPLAM HARCAMA 15.000.000 TL

TRAFİK GÜVENLİĞİ SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI



KIRKLARELİ



KIRKLARELİ




RUTİN YAPILAN ÇALIŖMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİđİ ÇİZGİ ÇALIŖMALARI



BABAESKİ

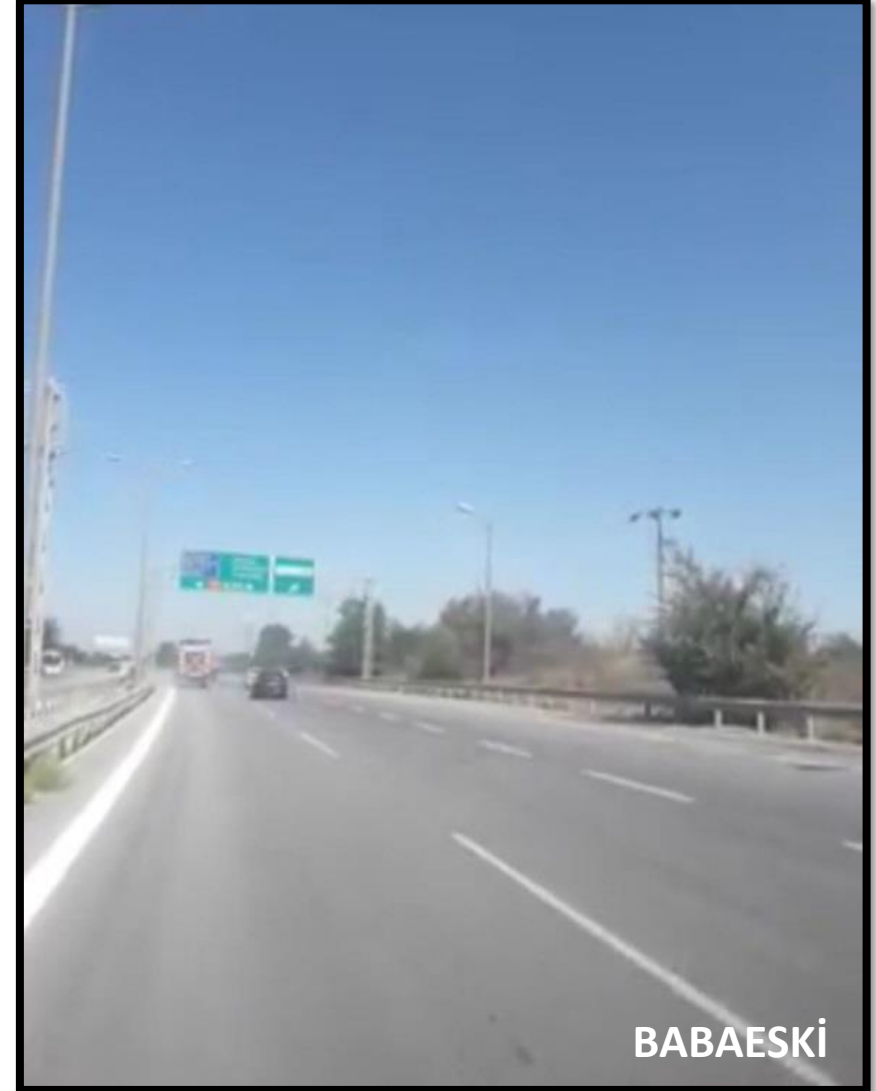

BABAESKİ

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI



BABAESKİ/KIRKLARELİ

D100-02 KM: 13+500

DÜŞEY İŞARETLEME ÇALIŞMALARI



D100-02 KM: 22+300



RUTİN YAPILAN ÇALIŖMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİđİ ÇALIŖMALARI



KIRKLARELİ CEZAEVİ

D555-02 KM: 16+500

YAYA ÜST GEÇİT ÇALIŖMALARI



D020-02 KM: 30+050

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİĞİ OTOKORKULUK ÇALIŞMALARI



BABAESKİ-KIRKLARELİ YOLU



SARAY-KIRKLARELİ YOLU

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI

OTOKORKULUK



D550-01 KM: 00+500



D020-02 KM: 10+950

ULAŞTIRMA VE A...
Proje Sahibi Bakanlık

KARAYOLLARI 1. BÖ...
Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma - Habe...
Proje Sektörü

İnşaat
Proje Karakteristiği

Proje Karakteristiği ...
Özel Bütçe

Bütçe Türü

MERKEZ
İlçe Adı

Proje Adı

(EDİRNE - HAVSA) AYRIMI - HASKÖY - KIRKLARELİ BÖLÜNMÜŞ YOLU (26,5/47,5)



2013

Proje Başlangıç Yılı

2024

Proje Bitiş Yılı

Proje Durumu
Devam Ediyor
İhalesi Yapıldı

250.000.000

Toplam Proje Tutarı

164.630.624


Önceki Yıllar Toplam Harcaması

70.930.720

Dönemsel Harcama Tutarı

70.930.720

Toplam Yıl Ödeneği

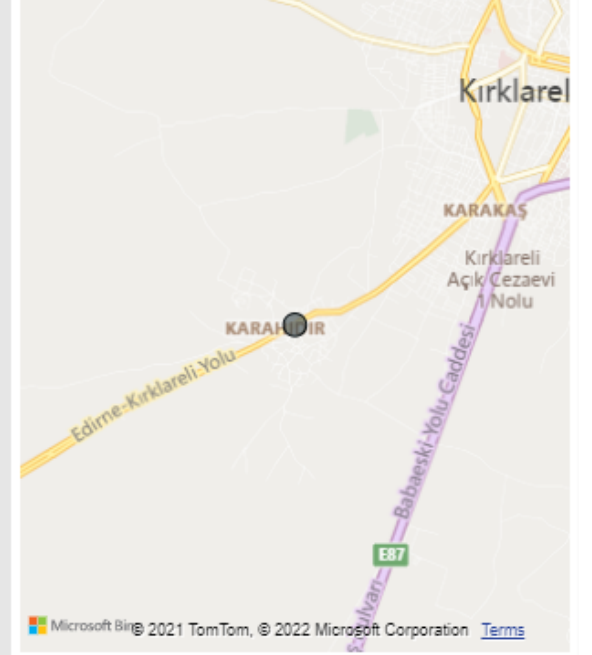


Kamu İhale Kanu...
İhale Usulü


a
İhaleyi Alan Firma

153.821.432
İhale Tutarı


Nakdi Gerçekleşme Oranı

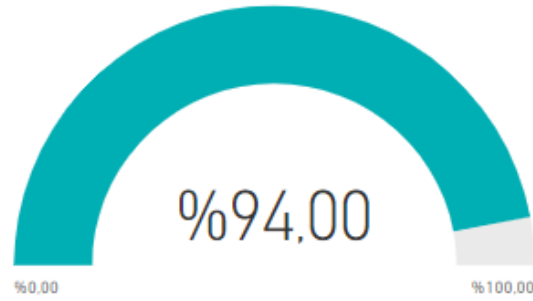

Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

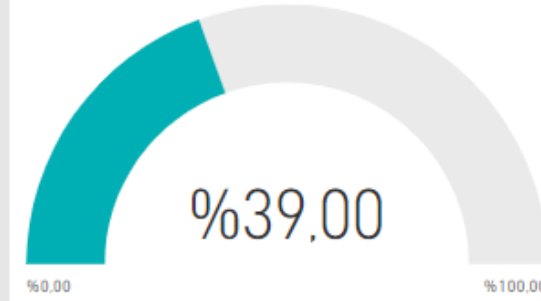

Ortalama Proje Fiziki Gerçekleşme Oranı

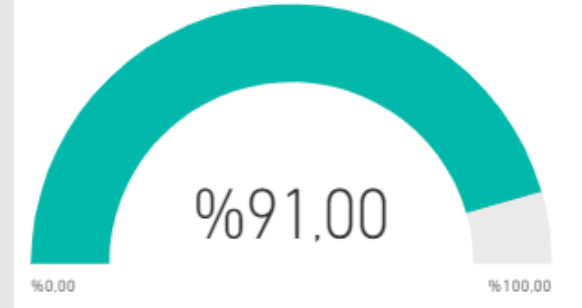

Kırklareli – Edirne Bölünmüş Yolu



← (Boş)

PROJE DETAYI

ULAŞTIRMA VE A...
Proje Sahibi Bakanlık

KARAYOLLARI 1. BÖ...
Proje Sahibi Kuruluş

Ulaştırma - Habe...
Proje Sektörü

İnşaat
Proje Karakteristiği

Proje Karakteristiği ...
(Boş)
İlçe Adı

Özel Bütçe
Bütçe Türü

Proje Adı

KINALI AYRIMI - ÇERKEZKÖY - SARAY - KIRKLARELİ DEVLET YOLU



2013

Proje Başlangıç Yılı

2024

Proje Bitiş Yılı

Proje Durumu
Devam Ediyor
(Boş)

385.000.000

Toplam Proje Tutarı

20.734.000


Önceki Yıllar Toplam Harcaması

132.768.000


Dönemsel Harcama Tutarı

132.768.000


Toplam Yıl Ödeneği

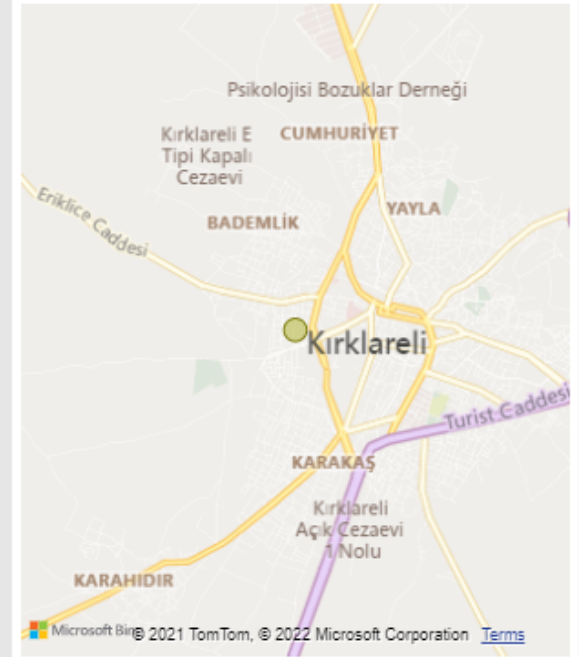


Nakdi Gerçekleşme Oranı

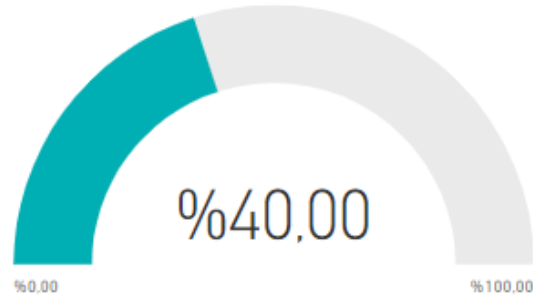

Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

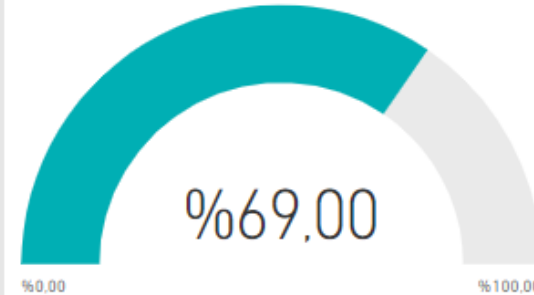

Ortalama Proje Fiziki Gerçekleşme Oranı

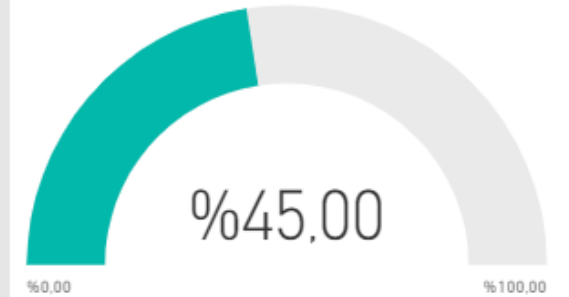

Saray - Kırklareli Bölünmüş Yolu



← (Boş)

ULAŞTIRMA VE A...
Proje Sahibi Bakanlık
Ulaştırma - Habe...
Proje Sektörü
Proje Karakteristiği ...
(Boş)
İlçe Adı

KARAYOLLARI 1. BÖ...
Proje Sahibi Kuruluş
İnşaat
Proje Karakteristiği
Özel Bütçe
Bütçe Türü

PROJE DETAYI

Proje Adı
(PINARHİSAR-VİZE) AYR.-DEMİRKÖY-İĞNEADA DEVLET YOLU YAPIMI (9,3 KM)

2021

Proje Başlangıç Yılı

2024

Proje Bitiş Yılı

Proje Durumu
Devam Ediyor
(Boş)

95.000.000

Toplam Proje Tutarı

0

Önceki Yıllar Toplam Harcaması

2.573.191

Dönemsel Harcama Tutarı

2.573.191

Toplam Yıl Ödeneği



Nakdi Gerçekleşme Oranı

%3,00

%0,00

%100,00

Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

%100,00

%0,00

%100,00

Ortalama Proje Fiziki Gerçekleşme Oranı

%3,00

%0,00

%100,00

Demirköy - İğneada Yolu





KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

17.842.686

17.842.011

15

Proje Sayısı

333.117.197

Toplam Proje Tutarı

72.854.834

Toplam Harcama Tutarı

17.842.686

Toplam Yıl Ödeneği

17.842.011

Yılı Harcama Tutarı

1.088.041

1.Dönem Harcama Tutarı

5.491.917

2.Dönem Harcama Tutarı

3.046.899

3.Dönem Harcama Tutarı

8.215.154

4.Dönem Harcama Tutarı

%6,10

%30,78

%17,08

%46,04

Proje Yeni İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	0
DEMİRKÖY	927.701
KOÇAZ	6.120.907
LÜLEBURGAZ	9.557.994
MERKEZ	20.208.165
MUHTELİF İLÇE	23.520.529
PINARHİSAR	12.519.538
Toplam	72.854.834

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	72.854.834
Toplam	72.854.834

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	72.854.834
Toplam	72.854.834

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam H
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	6.758.429	52.582.832	
BABAESKİ YENİMAHALLE TAŞKIN KORUMASI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	7.500.000	
DEMİRKÖY SİVRİLER GÖLETİ VE SULAMASI (390.000 M3)(1.260 DEKAR)	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	15.000.000	
ETÜD, PLAN, PLANLAMA, JEOTEKNİK HİZMETLER VE YAS	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.034.061	1.034.061	
İŞLETME VE ONARIM HİZMETLERİ	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.890.471	1.890.471	
KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1.193.230	1.193.230	
KAYALIKÖY BARAJI SULAMASI KANALET DEPLASMANI İLAVESİ	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	1.129.845	
KIRKLARELİ DOKUZHÖYÜK VE BABAESKİ KARAHALİL (TEKE DERE) TAŞKI...	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	16.550.345	
KIRKLARELİ DOLHAN TAŞKIN KORUMASI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	5.500.000	
Toplam			17.842.686	333.117.197	55



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KIRKLARELİ

11. BÖLGE



MÜDÜRLÜĞÜ

11 OCAK 2022
KIRKLARELİ



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE

Tarım Orman Soruşturmaları



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



KIRKLARELİ İLİ GENEL BİLGİLER



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Nüfus (2020 Yılı)	Yüzölçümü (km ²)	Rakım (m)	Yıllık Ortalama Yağış (mm)
368 171	6 459	232	651
Yerüstü Su Potansiyeli (Milyon m ³)	Yeraltı Su Potansiyeli (Milyon m ³)	Toplam Potansiyel (Milyon m ³)	
1 039	142	1 181	



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE

Tarım Orman Bakanlığı



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KIRKLARELİ İLİ TOPRAK POTANSİYELİ VE KULLANIMI

(ha)



Tarım Elverişli Arazi	309 096
Çayır - Mera	19 644
Orman - Fundalık	283 018
Diğer Arazi	25 662
DSİ'ce Etüt Edilen Arazi	152 815
DSİ'ce Sulamaya Elverişli Arazi	129 078
DSİ Etütlerine Göre Ekonomik Olarak Sulanabilir Arazi	57 206
İşletmeye Açılan Saha %72	40 982
Yatırım Programında Bulunan Saha % 6	3 702
Proje Aşamasındaki Saha % 0	0
Etüt Aşamasındaki Saha %22	12 522



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TOPLANTI DÖNEMİ	4			
KURULUŞUN ADI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
PROJELERİN GENEL DURUMU				
SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2021 YILI ÖDENEĞİ (TL)
TARIM	13	398 541 414	36 904 748	16 649 452
TRANSFER (KAMULAŞTIRMA GİD.)	1	20 750 000	6 697 873	900 000
TOPLAM	14	419 291 414	43 602 621	17 549 452

PROJELERİN PARASAL GERÇEKLEŞME DURUMU				
SEKTÖRÜ	2021 YILINDA GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	2021 YILI HARCAMALARI (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	2021 YILI ÖDENEK İHTİYACI (TL)
TARIM	16 649 452	16 648 781	100	
TRANSFER (KAMULAŞTIRMA GİD.)	900 000	1 193 230	100	
TOPLAM	17 549 452	17 842 011		



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım ve Orman Bakanlığı



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TOPLANTI DÖNEMİ	4
KURULUŞUN ADI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJELERİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU						
SEKTÖRÜ	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	BİTMEDEN TASFİYE	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	BİTEN PROJE SAYISI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
TARIM	3	4		6		13
TRANSFER				1		38
AÇIKLAMALAR						
PROJELERE BAŞLANMAMA NEDENLERİ						
Proje Çalışmaları Devam Ediyor						



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım ve Orman Bakanlığı



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI



**03
ARALIK
2022**

BARAJIN ADI	2022 YILI DOLULUK ORANI %	2021 YILI DOLULUK ORANI %
ARMAĞAN	58	33
ÇAYIRDERE	45	15
KAYALIKÖY	51	-1
KIRKLARELİ	71	17
KIRKLARELİ TOPLAMI	58	12



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI BÜYÜK SU İŞLERİ



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE

Tarım Orman Suyla Buluşuyor



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BSİ PROJE İCMALİ (3 Adet)



SIRA NO	2021 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası (ha, hm ³ , hm ³ /yıl vb)	2021 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2021 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama-Bitiş
1	KIRKLARELİ PROJESİ					
	Kırklareli Kızılcıkdere Sulaması İkmali Eksik İmalatların Tamamlanması	1 422 ha	1	-	(bütününde) 44	2021 - 2023
2	PINARHİSAR YENİCE BARAJI VE SULAMASI PROJESİ					
	Kırklareli Pınarhisar Yenice Göleti ve Sulaması	1 407 ha 3,80 hm ³	595	-	55	2017 - 2023
3	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ					
	Kırklareli Merkez 1.Kısım AT ve TİGH	40 000 ha 15 yerleşim yeri	6 758 429	6 758 429	27	2017 - 2022



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Bakanlığı



ATADAN TORUNLARA
TORUN SEFERBERLİĞİ

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KIRKLARELİ PROJESİ



KIRKLARELİ KIZILCIKDERE SULAMASI İKMALİ EKSİK İMALATLARIN TAMAMLANMASI

İhale aşamasındadır.
1 422 hektar alan sulanacaktır.



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Buluşuyor



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK

DİJİTAL
TARIM PAZARI



PINARHİSAR YENİCE BARAJI VE SULAMASI PROJESİ



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

PINARHİSAR YENİCE GÖLETİ VE SULAMASI



1 407 hektar alan sulanacaktır.

%55 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Gövde ve seddenin sıyırma kazıları tamamlandı.
Batardo dolgusu, gövde ve sedde enjeksiyon çalışmaları, dolusavak ve derivasyon konduvisi betonarme imalatları tamamlandı.

Kapama seddesi dolgu hacmi 77 000 m³ olup, 13 000 m³ lük dolgu imalatı tamamlanmıştır.

Sulama hattının toplam uzunluğu 38 500 m olup 32 861 m'si yapıldı.



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Bakanlığı



ATADIN TORUNU
TARIM SEFERBERLİĞİ

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI KÜÇÜK SU İŞLERİ



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE

Tarım Orman Bakanlığı



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KSİ PROJE İCMALİ (8 Adet)



SIRA NO	2021 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası (ha, hm ³ , hm ³ /yıl vb)	2021 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2021 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama-Bitiş
	GÖLET VE SULAMALARI (4 ADET)					
1	Kırklareli Merkez Kadıköy Göleti ve Sulaması İkmali	418 ha 1,93 hm ³	1	-	(bütününde) 41	2021 - 2023
2	Kırklareli Demirköy Sivrilir Göleti ve Sulaması İkmali	126 ha 0,39 hm ³	1	-	(bütününde) 19	2021 - 2023
3	Kırklareli Kofçaz-2 Göleti ve Sulaması	217 ha 0,86 hm ³	2 000 000	1 999 999	59	2017 - 2023
4	Kırklareli Lüleburgaz Ahmetbey Göleti Yükseltilmesi	270 ha 10,34 milyon m ³ içmesuyu 12,52 hm ³	4 959 486	4 959 486	27	2017 - 2023



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Bakanlığı



ATADAN TORUNLARA
TORUN SEFERBERLİĞİ

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KSİ PROJE İCMALİ (8 Adet)



SIRA NO	2021 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası (ha, hm ³ , hm ³ /yıl vb)	2021 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2021 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama-Bitiş
	TAŞKIN KORUMA (4 ADET)					
1	Kırklareli Lüleburgaz Merkez 1.Kısım	1 ilçe	-	-	-	2017 - 2023
2	Kırklareli Merkez Dokuzhöyük Köyü ve Karahalil Kasabası Tarım Arazilerinin Teke Dere İkmali	325 ha 2 mah.	1	-	-	2021 - 2023
3	Kırklareli Merkez Dolhan Köyiçi Deresi	1 köy	-	-	-	2021 - 2023
4	Kırklareli Babaeski Yenimahalle Köyü Ana Deresi	1 köy	-	-	-	2021 - 2023



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KÜÇÜK SU İŞLERİ



KIRKLARELİ MERKEZ KADIKÖY GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ

418 hektar alan sulanacaktır.

14.12.2021 tarihinde ihale edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir.



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Bakanlığı



ATADAN TORUN
TORUN SEFERBERLİĞİ

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KIRKLARELİ DEMİRKÖY SİVRİLER GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ

KÜÇÜK SU İŞLERİ



126 hektar alan sulanacaktır.
27.12.2021 tarihinde ihale edilmiş
olup ihale süreci devam etmektedir.



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Bakanlığı



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KÜÇÜK SU İŞLERİ



KIRKLARELİ KOFÇAZ-2 GÖLETİ VE SULAMASI

217 hektar alan sulanacaktır.

%59 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır.

Toplam 100 000 m³ gövde dolgusunun 70 000 m³'ü tamamlandı.

Sulama hattının toplam uzunluğu 14 028 m olup 13 908 m'si tamamlandı.

Pompa binası ve dolusavak perde duvarı betonarme imalatları devam etmektedir.



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Bakanlığı



ATADIN TORUNU
TORUN SEFERBERLİĞİ

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

KÜÇÜK SU İŞLERİ



KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY GÖLETİ YÜKSELTİLMESİ

270 hektar alan sulanacaktır.
10,34 milyon m³ içmesuyu verilecektir.
%27 fiziki gerçekleştirme sağlanmıştır.
Gövde sıyırma, dolusavak ve derivasyon kazıları ile
dipsavak betonarme ve enjeksiyon imalatları tamamlandı.
Ulaşım yolları imalatı devam etmektedir.



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



SÖZ SİZDE
Tarım Orman Seferberliği



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI PLANLAMA VE PROJE ÇALIŞMALARI



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PLANLAMA VE PROJE İŞLERİ (6 Adet)



SIRA NO	2021 YILI DEVAM EDEN İŞLER
	PLANLAMALAR (3 ADET)
1	Kırklareli Kofçaz Projesi (Edirne İçmesuyu) Çağlayık Barajı Planlama Raporu
2	Kırklareli-Babaeski Büyükmandıra Barajı ve Sulaması Planlama Raporu
3	Kırklareli 3.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu

SIRA NO	2021 YILI DEVAM EDEN İŞLER
	PROJE YAPIMI (3 ADET)
1	Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı
2	Kırklareli Pınarhisar İlçesi ve Üsküp Beldesi Yukarı Havza Islahı ve Mansap Şartı Proje Yapımı
3	Kırklareli 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

42.845.448

38.961.421

30

Proje Sayısı

149.152.038

Toplam Proje Tutarı

78.512.860

Toplam Harcama Tutarı

42.845.448

Toplam Yıl Ödeneği

38.961.421

Yılı Harcama Tutarı

2.427.173

1.Dönem Harcama Tutarı

2.431.661

2.Dönem Harcama Tutarı

6.821.365

3.Dönem Harcama Tutarı

27.281.222

4.Dönem Harcama Tutarı

%5,66

%5,68

%15,92

%63,67

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	20.563.644
DEMİRKÖY	15.585.516
KOÇCAZ	497.302
LÜLEBURGAZ	14.848.539
MERKEZ	2.546.606
PEHLİVANKÖY	7.151.472
PINARHİSAR	9.390.594
VİZE	7.929.187
Toplam	78.512.860

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	75.456.064
Ulaştırma - Haberleşme	3.056.796
Toplam	78.512.860

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	78.512.860
Toplam	78.512.860

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıl
B.ESKİ ALPULLU KANALİZASYON İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	4.808.533	14.295.641	
B.ESKİ ALPULLU ŞEHİRÇİ YOLLARI PARKE VE DİĞER YOL YAPIM MALZE...	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	392.999	392.999	
BABAESKİ ALPULLU ATIKSU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	238.870	6.190.455	
BABAESKİ ALPULLU İÇMESUYU VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	6.236.076	9.196.228	
BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA İÇMESUYU BORU ALIMI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	300.000	334.020	
BABAESKİ BÜYÜKMANDIRA ŞEHİRÇİ YOLLARI PARKE ALIMI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	399.696	399.911	
BABAESKİ İMAR PLANI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	71.940	141.482	
DEMİRKÖY İĞNEADA İÇMESUYU VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	2.285.741	15.450.170	
DEMİRKÖY ŞEHİRÇİ YOLLARI PARKE TAŞI ALIMI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	500.000	877.920	
Toplam			42.845.448	149.152.038	

Sıra no	Proje numarası	Sektör	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2021 Yılı programı (TL)	2021 Yılında gönderilen ödenek (TL)	2021 Yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar	
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü					149.152.038	39.551.440	42.845.448	38.961.421	38.961.421	91			
Ulaştırma / Kentiçi Ulaşım					4.486.302	0	3.932.073	3.056.796	3.056.796	78			
1	0000000-000	K.eli Demircihalil Köyüci Yolları Sıcak Asfalt Kaplaması, Meydan Düzenlemesi, Parketaş ve Bordür Yapımı	İB	2021	2021	1.139.506	0	1.139.506	983.903	983.903	86	100	BT
2	0000000-000	B.eski Alpullu Şehiriçi Yolları Parke ve Diğer Yol Yapım Malzemesi Alımı	İB	2021	2021	392.999	0	392.999	392.999	392.999	100	100	BT
3	0000000-000	B.eski Büyükmandıra Şehiriçi Yolları Parke Alımı	İB	2021	2021	399.911	0	399.696	399.696	399.696	100	100	BT
4	0000000-000	D.köy Şehiriçi Yolları Parke Taşı Alımı	İB	2021	2021	877.920	0	500.000	500.000	500.000	100	100	BT
5	0000000-000	Koçaz Şehiriçi Yolları Parke Taşı ve Bordür Yapımı	İB	2021	2021	499.872	0	499.872	497.302	497.302	99	100	BT
6	0000000-000	Pehlivan köy Şehiriçi Yolları ve Kaldırım Yapımı	İB	2021	2022	1.176.094	0	1.000.000	282.896	282.896	28	24	DE
DKH / Sosyal / İçmesuyu					62.420.902	17.925.193	19.161.690	17.672.860	17.672.860	92			
7	0000000-000	K.eli Kavaklı İçmesuyu İnşaatı	İB	2017	2022	1.787.817	1.562.703	225.114	0	0	0	88	YK
8	0000000-000	B.eski Alpullu İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2020	2022	9.196.228	2.960.153	6.236.076	5.787.787	5.787.787	93	94	DE
9	0000000-000	B.eski Büyükmandıra İçmesuyu Boru Alımı	İB	2020	2021	334.020	0	300.000	298.542	298.542	100	100	BT
10	0000000-000	D.köy İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2019	2022	15.450.170	13.164.429	2.285.741	1.921.087	1.921.087	84	98	DE
11	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2023	13.000.000	0	6.250.000	6.000.000	6.000.000	96	39	DE
12	0000000-000	L.burgaz Evrensekiz İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2022	2.561.015	0	2.561.015	2.515.854	2.515.854	98	97	DE
13	0000000-000	Pınarhisar İçmesuyu Kuyu Sondajı	İB	2020	2021	455.126	237.908	217.218	113.064	113.064	52	100	BT
14	0000000-000	Pınarhisar İçmesuyu Depo ve Şebeke Kesin Projesi	İB	2020	2021	136.526	0	136.526	136.526	136.526	100	100	BT
15	0000000-000	Pınarhisar İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2023	19.500.000	0	950.000	900.000	900.000	95	4	DE
DKH / Sosyal / Kanalizasyon					75.061.372	21.370.192	18.461.011	17.227.803	17.227.803	93			
16	0000000-000	B.eski Alpullu Kanalizasyon İnşaatı	İB	2021	2022	14.295.641	0	4.808.533	4.626.361	4.626.361	96	28	DE
17	0000000-000	B.eski Alpullu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2018	2021	6.190.455	5.951.576	238.870	75.789	75.789	32	100	BT
18	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	İB	2021	2023	13.234.366	0	6.250.000	6.247.820	6.247.820	100	39	DE
19	0000000-000	Pehlivan köy Kanalizasyon İnşaatı	İB	2020	2022	6.469.284	4.888.658	1.580.626	1.579.918	1.579.918	100	100	BT
20	0000000-000	P.hisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	İB	2021	2023	19.708.686	0	950.000	907.532	907.532	96	4	DE
21	0000000-000	P.hisar Kaynarca Atısu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2019	2021	6.669.808	5.345.749	1.324.059	1.249.815	1.249.815	94	100	BT
22	0000000-000	Vize Çakılılı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2021	2022	2.916.336	0	2.916.336	2.473.190	2.473.190	85	82	DE
23	0000000-000	Vize Kıyıköy Kanalizasyonu	İB	2016	2021	5.576.796	5.184.209	392.587	67.378	67.378	17	100	BT
DKH / Sosyal / Belediye Hizmetleri					6.731.487	0	1.136.000	900.000	900.000	79			
24	0000000-000	Pehlivan köy İtfaiye Binası Yapımı	İB	2020	2021	483.387	0	400.000	400.000	400.000	100	100	BT
25	0000000-000	Pınarhisar İtfaiye Binası ve Müstemilatı Yapımı	İB	2021	2021	6.012.100	0	500.000	500.000	500.000	100	73	DE
26	0000000-000	Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Ön İşlem Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması	İB	2021	2021	236.000	0	236.000	0	0	0		DE
DKH / Sosyal / Şehirleşme					451.975	256.055	154.674	103.962	103.962	67			
27	0000000-000	B.eski İmar Planı	İB	2018	2021	141.482	28.297	71.940	42.445	42.445	59	50	DE
28	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey İmar Planı	İB	2017	2021	106.082	84.865	21.217	0	0	0	80	YK
29	0000000-000	Vize İmar Planı	İB	2016	2021	121.870	97.496	24.374	24.374	24.374	100	100	BT
30	0000000-000	Vize Kıyıköy İmar Planı	İB	2019	2021	82.541	45.397	37.143	37.143	37.143	100	100	BT

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI I. ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

46.051

46.051

1

Proje Sayısı

242.372

Toplam Proje Tutarı

242.372

Toplam Harcama Tutarı

46.051

Toplam Yıl Ödeneği

46.051

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

29.084

3.Dönem Harcama Tutarı

16.967

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%63,16

%36,84

Proje Yeri İlçe

Toplam Harcama Tutarı

VİZE

242.372

Toplam

242.372

Proje Sektörü

Toplam Harcama Tutarı

Tarım

242.372

Toplam

242.372

Bakanlık Adı

Toplam Harcama Tutarı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

242.372

Toplam

242.372

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
KIYIKÖY BALIKÇI BARINAĞI ETÜD PROJE İŞLERİ	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	46.051	242.372
Toplam			46.051	242.372

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

5.350.900

5.088.367

4

Proje Sayısı

5.350.900

Toplam Proje Tutarı

5.088.367

Toplam Harcama Tutarı

5.350.900

Toplam Yıl Ödeneği

5.088.367

Yılı Harcama Tutarı

153.500

1.Dönem Harcama Tutarı

719.000

2.Dönem Harcama Tutarı

1.192.064

3.Dönem Harcama Tutarı

3.023.803

4.Dönem Harcama Tutarı

%2,87

%13,44

%22,28

%56,51

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	5.088.367
Toplam	5.088.367

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	5.088.367
Toplam	5.088.367

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	5.088.367
Toplam	5.088.367

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplamı
FIDAN ÜRETİMİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.211.000	1.211.000	
ORMAN KADASTROSU VE TESCİLİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	50.000	50.000	
ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIM	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.494.500	1.494.500	
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.595.400	2.595.400	
Toplam			5.350.900	5.350.900	



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ İLİ
İL KOORDİNASYON TOPLANTISI



31/12/ 2021



Sunuş Planı



❖ GENEL TANITIM

❖ Ormanlık Alan

❖ YATIRIM PROJELERİ

❖ Orman Kadastro ve Tescil Projesi

❖ Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi

❖ Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi

❖ Fidan Üretim Projesi






Genel Tanıtım



3 Orman İşletme
Müdürlüğü
1 Orman Fidanlık
Müdürlüğü
35 Orman İşletme Şefliği
1 KDM Şefliği
1 ATM Şefliği
2 Fidanlık Şefliği



Ormanlık Alan

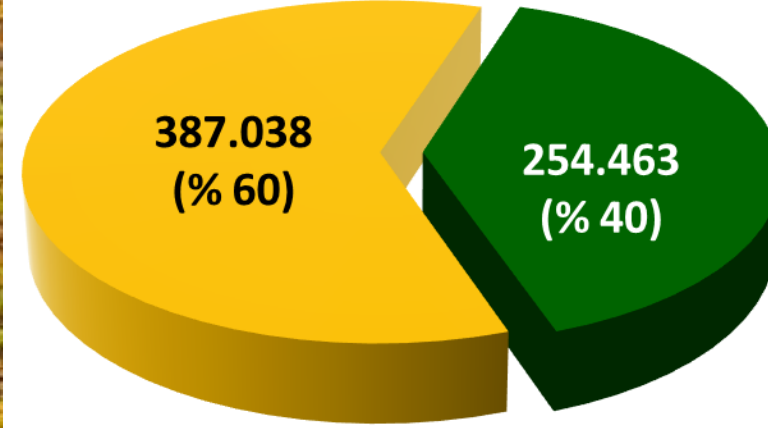

Ormanlık Alan : 254.463 Hektar

Ormansız Alan : 387.038 Hektar

Genel Toplam : 641.501 Hektar




Yatırım Projeleri



Proje Adı ve Karakteristiği	Bütçe Türü	Projenin Yeri (İlçe)	Proje Tutarı (TL)	2021 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Proje Durumu
Orman Kadastro ve Tescili Projesi (2B)	ÖB	Merkez, Pınarhisar, Vize	50.000	50.000	100	100	BT.
Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi	ÖB	Merkez Lüleburgaz	2.595.400	2.334.570	90	100	BT.
Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi	DS	Merkez, Pınarhisar, Demirköy, Vize	1.494.500	1.492.797	100	100	BT.
Fidan Üretim Projesi	DS	Lüleburgaz	1.211.000	1.211.000	100	100	BT.
TOPLAM			5.350.900	5.088.367	95	100	



Orman Kadastro ve Tescil Projesi

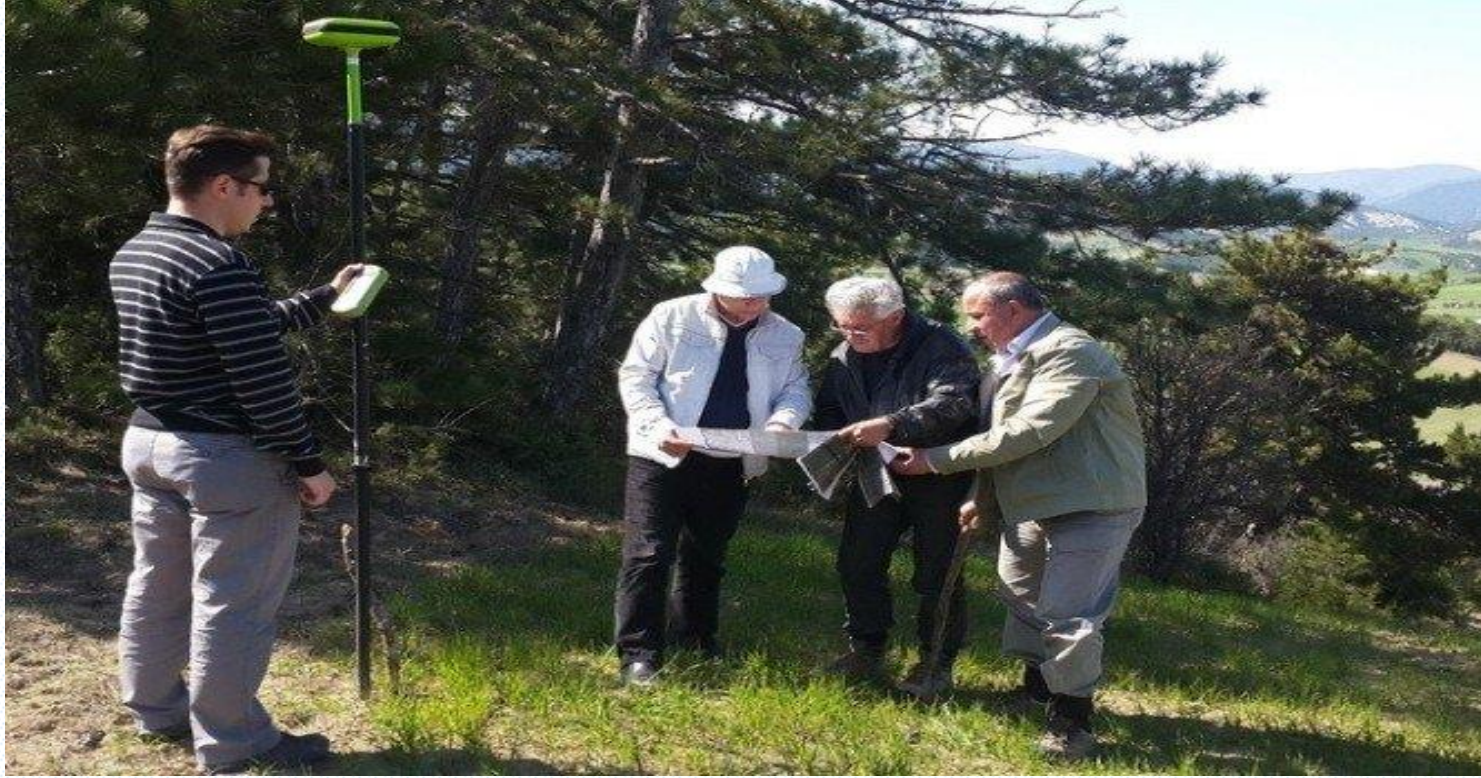

FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
2B	5 Birim	50.000	Merkez, Pınarhisar, Vize	5 Birim	50.000



Ormanların Geliştirilmesi ve Geniřletilmesi Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŐME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Ağaçlandırma Tesis	100 Ha.	1.143.000	Merkez, Lüleburgaz	100 Ha.	1.138.570
Ağaçlandırma Bakımı	500 Ha.	500.000	Merkez, Lüleburgaz	500 Ha.	500.000
Rehabilitasyon Bakım	150 Ha.	20.000	Merkez, Lüleburgaz	150 Ha.	20.000
Etüd Proje	500 Ha.	8.000	Merkez, Lüleburgaz	500 Ha.	8.000
Fidan Üretimi	694.000 Ad.	659.400	Lüleburgaz	694 .000 Ad.	527.000
Fidan Bakımı	471.000 Ad.	265.000	Lüleburgaz	471.000 Ad.	141.000
PROJE TOPLAMI		2.595.400			2.334.570



Ormanların Geliştirilmesi ve Geniřletilmesi Projesi





Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Yol Şebeke Planı	10 Adet	362.500	Demirköy	10 Adet	362.448
Orman Yolu Yapımı	12 Km.	247.000	Demirköy	12 Km.	246.795
Orman Yolu B.Onarım	20 Km.	301.000	Merkez, Demirköy, Vize	20 Km.	300.098
Stablize Yol Kaplaması	10 Km.	238.000	Merkez, Demirköy, Vize	10 Km.	237.703
Sanat Yapısı	9 Km.	346.000	Merkez, Demirköy, Vize	9 Km.	345.753
PROJE TOPLAMI		1.494.500			1.492.797



Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi



Yeni Yol



Büyük Onarım



Sanat Yapısı



Üst Yapı



Fidan Üretim Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Fidan Üretimi	581.000 Ad.	565.000	Lüleburgaz	581.000 Ad.	565.000
Fidan Bakımı	1.739.000 Ad.	546.000	Lüleburgaz	1.739.000 Ad.	546.000
Tohum Üretimi	2 Ton	90.000	Lüleburgaz	2 Ton	90.000
Ağaç ve Tohum Islahı (Ağaç ve Tohum Islahı Bakımı)	5 Ha.	10.000	Lüleburgaz	5 Ha.	10.000
PROJE TOPLAMI		1.211.000			1.211.000



Fidan Üretim Projesi



KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖL...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.643.582

1.631.625

3

Proje Sayısı

1.685.000

Toplam Proje Tutarı

1.673.043

Toplam Harcama Tutarı

1.643.582

Toplam Yıl Ödeneği

1.631.625

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

365.676

2.Dönem Harcama Tutarı

339.850

3.Dönem Harcama Tutarı

926.099

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%22,25

%20,68

%56,35

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
DEMİRKÖY	1.519.984
MUHTELİF İLÇE	14.999
VİZE	138.060
Toplam	1.673.043

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	1.519.984
Turizm	153.059
Toplam	1.673.043

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	1.673.043
Toplam	1.673.043

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Öncelik
BİYOÇEŞİTLİLİK İZLENMESİNDE KAPASİTE ARTIRIMI	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	15.000	15.000	
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI ALAN DÜZENLEMESİ	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.520.000	1.520.000	
KASATURA KÖRFEZİ TABİAT KORUMA ALANI YÖNETİM PLANI HAZIRLA...	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	108.582	150.000	
Toplam			1.643.582	1.685.000	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

379.114.993

377.319.289

2

Proje Sayısı

2.106.338.480

Toplam Proje Tutarı

1.032.169.930

Toplam Harcama Tutarı

379.114.993

Toplam Yıl Ödeneği

377.319.289

Yılı Harcama Tutarı

69.211.036

1.Dönem Harcama Tutarı

73.055.690

2.Dönem Harcama Tutarı

184.202.587

3.Dönem Harcama Tutarı

50.849.976

4.Dönem Harcama Tutarı

%18,26

%19,27

%48,59

%13,41

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHELİF İLÇE	1.032.169.930
Toplam	1.032.169.930

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	1.032.169.930
Toplam	1.032.169.930

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	1.032.169.930
Toplam	1.032.169.930

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması
DEMİRYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARI	TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1.896.319	10.983.457	
HALKALI-KAPIKULE YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU İNŞAATI (60/230 ...	TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	377.218.674	2.095.355.023	654.850.6
Toplam			379.114.993	2.106.338.480	654.850.6




KIRKLARELİ İLİ 2021 YILI 4. DÖNEM YATIRIM SUNUMU

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ PERSONEL DURUMU

İller	Kadrolu Memur	Sözleşmeli Memur	Toplam Memur	Daimi İşçi	Geçici İşçi	Toplam İşçi	Toplam Personel
Bilecik	1	39	40	47	2	49	89
Edirne	3	54	57	19	2	21	78
Eskişehir	0	2	2	2	0	2	4
İstanbul	49	527	576	233	13	246	822
Kırklareli	0	20	20	15	3	18	38
Kocaeli	2	126	128	145	9	154	282
Sakarya	3	57	60	47	2	49	109
Tekirdağ	0	43	43	30	6	36	79
Toplam	58	868	926	538	37	575	1501

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL HAT BİLGİLERİ

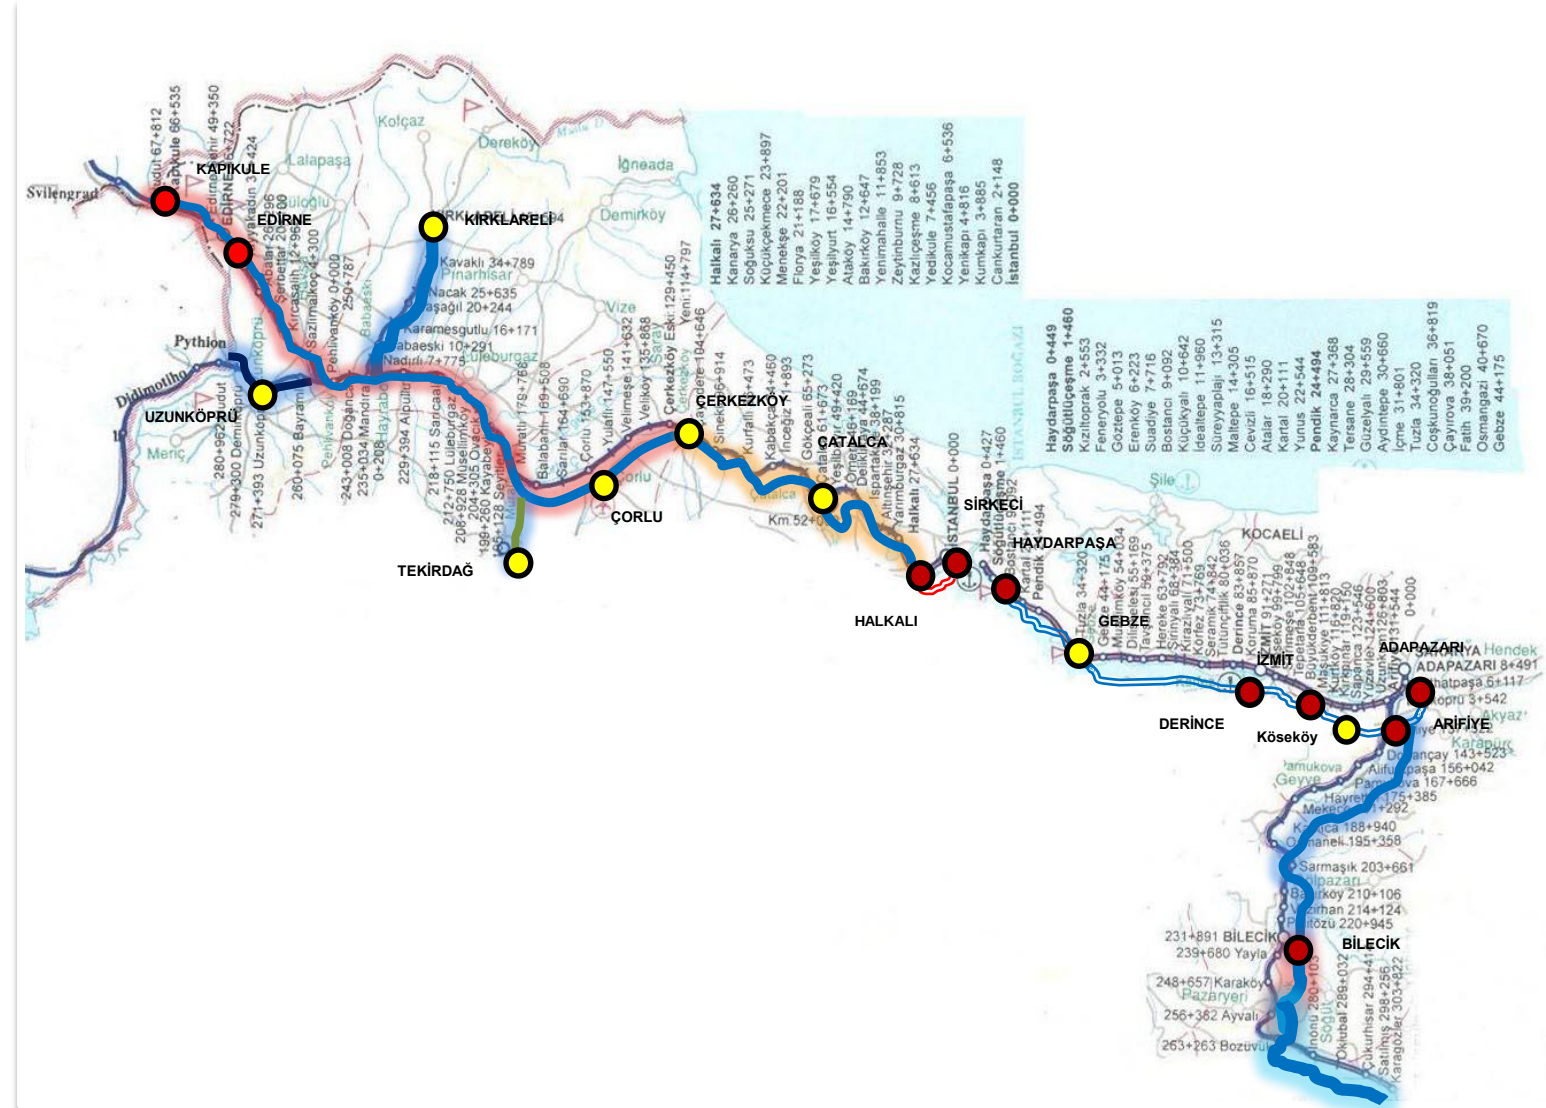

İLLERE GÖRE GÜZERGAH UZUNLUKLARI (M)

İstanbul	305.357
Kocaeli	263.270
Sakarya	170.644
Bilecik	121.429
Eskişehir	59.436
Tekirdağ	146.683
Kırklareli	115.046
Edirne	127.189
Toplam	1.309.054



İŞYERLERİ/DURAK	
GAR ŞEF.	1
İSTASYON ŞEF.	2
DURAK	7
SAYDİNG	2
TOPLAM	12

2021 YILI İÇERİSİNDE

Ödeneği Çıkan Ancak İhale Dosyası Hazırlanmaya Başlanmayan İş Sayısı	İhale Dosyası Hazırlama Sürecinde Olan İş Sayısı	İhale Aşamasında Olan İş Sayısı	Devam Eden İş Sayısı	Geçici Kabul Aşamasında Olan İş Sayısı	İptal Olan İş Sayısı	Biten İş Sayısı
0	1	0	7	1	0	1

Toplam Proje Sayısı	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Toplam Harcaması (TL)	2021 Yılı Toplam Ödenek Tutarı (TL)	2021 Yılı Toplam Harcama Tutarı (TL)	2021 Yılı Fiziki İlerleme (%)	2021 Yılı Nakdi İlerleme (%)
10	2.589.159.566	206.683.154	266.904.520	129.176.256	45	13

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ İLİ

2021 YILI YATIRIMLARI

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2021 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2021 YILI HARCAMALARI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	PROJE DURUMU	AÇIKLAMALAR	YÜKLENİCİ FİRMA
1	Ulaştırma	1. Bölge Sınırları Dahilinde İstasyonların Kompanzasyon Sistemlerinin Yapılması	Kırklareli %15	11.03.2021	26.12.2021	107.557	0	107.557	55.089	51%	99%	Geçici kabul aşamasındadır.	Geçici kabul aşamasındadır.	Başar Elekt. İnşaat Müh. Tur. Gıda Nak. Paz. Tic. San. Ltd. Şti.
2	Ulaştırma	Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri İçin 9 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Temini	Kırklareli %33	30.09.2021	2022	4.340.366	0	1.000	0	0%	0%	Devam ediyor	03.08.2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup 17.09.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. 30.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Firma ile görüşülmüş olup Malzeme teminleri 2022 yılının ilk aylarında olacağı belirtilmiştir.	Netta Elektronik Ticaret Ltd. Sti.
3	Ulaştırma	Muratlı - Büyükkarıştıran Çift Hat Ve Babaeski - Kırklareli - Mandıra Müselleşi İle Bağlantısı Hattı Etüt, proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri İşi	Kırklareli %90	-	-	0	0	1.127.353	0	0%	0%	İhale dosyası hazırlanmaktadır	İhale dosyası hazırlanmakta olup, 2022 yılında ihaleye çıkılması planlanmaktadır.	-
4	Ulaştırma	Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy - Kapıkule Kesiminin Altyapı, Üstyapı, Elektrik, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon İşlerinin Yapılması	Kırklareli %40	11.06.2019	9.06.2023	2.584.043.600	206.683.154	265.308.122	129.075.641	57%	52%	Devam ediyor	Devam ediyor	Salini İmpregilo - Kolin Adi Ortaklığı
5	Ulaştırma	Çerkezköy - Kapıkule Arasındaki 100 Adet Blok ve KBS Sinyallerinin Ledli Sinyalle Değişiminin Yapılması	Kırklareli %10	23.11.2020	2022	262.000	0	262.000	0	0%	0%	Devam ediyor	TCDD Genel Müdürlüğü tarafından tüm bölgeleri kapsayan ihaleye çıkmış olup sözleşmeler imzalanmıştır. Mal alımı olup temin işlemleri devam etmektedir.	Ortana Elektronik Yazılım Taahhüt San. ve Tic. A.Ş

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

KIRKLARELİ İLİ

2021 YILI YATIRIMLARI

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2021 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2021 YILI HARCAMALARI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	PROJE DURUMU	AÇIKLAMALAR	YÜKLENİCİ FİRMA
6	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Trakya Hat Kesiminde Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemlerine Ait Bilgilerin F/O Kablo İle Çerçezköy Kumanda Merkezine Taşınması İşİ	Kırklareli %32	25.11.2021	24.05.2022	300.832	0	1.000	0	0%	0%	Devam ediyor	22.10.2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 15.11.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır. Yer teslimi 25.11.2021 tarihinde yapılmıştır. Sözleşme bedeli: 940.100,00 TL, İşin süresi: 180 gündür. Emniyet planı ve firma eğitimlerine başlamıştır.	Abaküs Mühendislik Turizm İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd. Şti.
7	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Alpullu Erişilebilirlik Projeleri Yaptırılması 1.Etap İşİ	Kırklareli %4,88	23.12.2019	2022	13.900	0	13.900	0	0%	60%	Devam ediyor	Projeler onaydadır	Mir Mimarlık İnşaat
8	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Lüleburgaz Erişilebilirlik Projeleri Yaptırılması 1.Etap İşİ	Kırklareli %4,88	23.12.2019	2022	7.900	0	7.900	0	0%	60%	Devam ediyor	Projeler onaydadır	Ramazan Demir Mimarlık Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
9	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Pehlivan köy Erişilebilirlik Projeleri Yaptırılması 1.Etap İşİ	Kırklareli %4,88	23.12.2019	2022	14.328	0	14.328	0	0%	80%	Devam ediyor	Projeler onaydadır	Kıymet İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
10	Ulaştırma	1. Bölge Mıntıkasındaki Merkezi Isıtma İle Çalışan İşyeri ve Hizmetevine Isı Pay Ölçer Takılması	Kırklareli %9	20.01.2021	1.01.2022	69.083	0	61.360	45.526	66%	100%	Bitti	İş tamamlandı.	İbrahim Güney

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

Projenin Planlanan Bitiş Tarihi	: 31.12.2023
Toplam Güzergah Uzunluğu	: 229 km
Proje Bedeli	: 5,474 Milyar TL
Revize Proje Bedeli	: 7, 414 Milyar TL

Ülkemiz, Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumundadır. Halkalı-Kapıkule demiryolu projesi, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu projenin tamamlanması ile birlikte İpek Demiryolu güzergâhının Ülkemizden geçen bölümünü Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir.

229 km güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edilecektir.

229 km uzunluğundaki projenin yaklaşık 55 km’si Edirne, yaklaşık 62 km’si Kırklareli, 36 km Tekirdağ il sınırları içerisinde kalmaktadır. Tekirdağ’da Çerkezköy Yolcu ve Çerkezköy Yük İstasyonu olmak üzere 2 istasyon olacaktır. Kırklareli’nde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran olmak üzere 3 istasyon, Edirne ilimizde ise Edirne ve Kapıkule’de 2 istasyon olacaktır.

Hızlı tren projesi ile eş zamanlı olarak Kırklareli-Babaeski arasındaki 35 km’lik mevcut demiryolu hattının da yenilenmesi yapılarak Kırklareli il merkezinin hızlı tren ile bağlantısı planlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla;

- Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşmesi,
- Mevcut durumda yıllık 1,53 milyon ton yük taşınmakta olup yıllık 9,6 milyon yük taşınması,
- Mevcut durumda yıllık ortalama 600 bin yolcudan yıllık 3,4 milyona çıkması,
- Mevcut hat kapasitesinin 42 trenden 200 tren üzerine çıkması hedeflenmektedir.

Proje iki kesimden oluşmaktadır.

Cerkezköy-Kapıkule(153 km);

İşin sözleşmesi 30.04.2019 tarihinde Salini Impregilo & Kolin Adi Ortaklığı tarafından imzalanmış ve 09.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İşin %26,53 tamamlanmıştır. İhale bedeli 529.899.70,00 Euro olan işin süresi 1460 gün olup iş bitiş tarihi 31.12.2023 ‘tür.

Halkalı-Ispartakule(8 km)/Ispartakule-Çerkezköy(68 km);

Proje Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Altyapı Genel Müdürlüğüne yürütülmekte olup dış finansman temini yapılmış, yapım ihale aşamasındadır.


Projenin 2026 tarihinde bitmesi öngörülmektedir.

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

TOPLAM PROJE BEDELİ = 529,9 Milyon Avro

AB Hibesi = 275 Milyon Avro TR Katkısı = 255 Milyon Avro

KIRKLARELİ	1. Babaeski	1. Ağayeri 2. Çavuşköy	3. Çengerli 4. Çiğdemli	5. Düğüncülü 6. Eriklyurdu	
	2. Lüleburgaz	1. Akçaköy 2. Alacaoğlu 3. Ayvalı	5. Çengelli 6. Çeşmekolu 7. Ceylanköy	9. Yıldırım Beyazıt 10. Gazi M. Kemal Paşa 11. Celaliye	

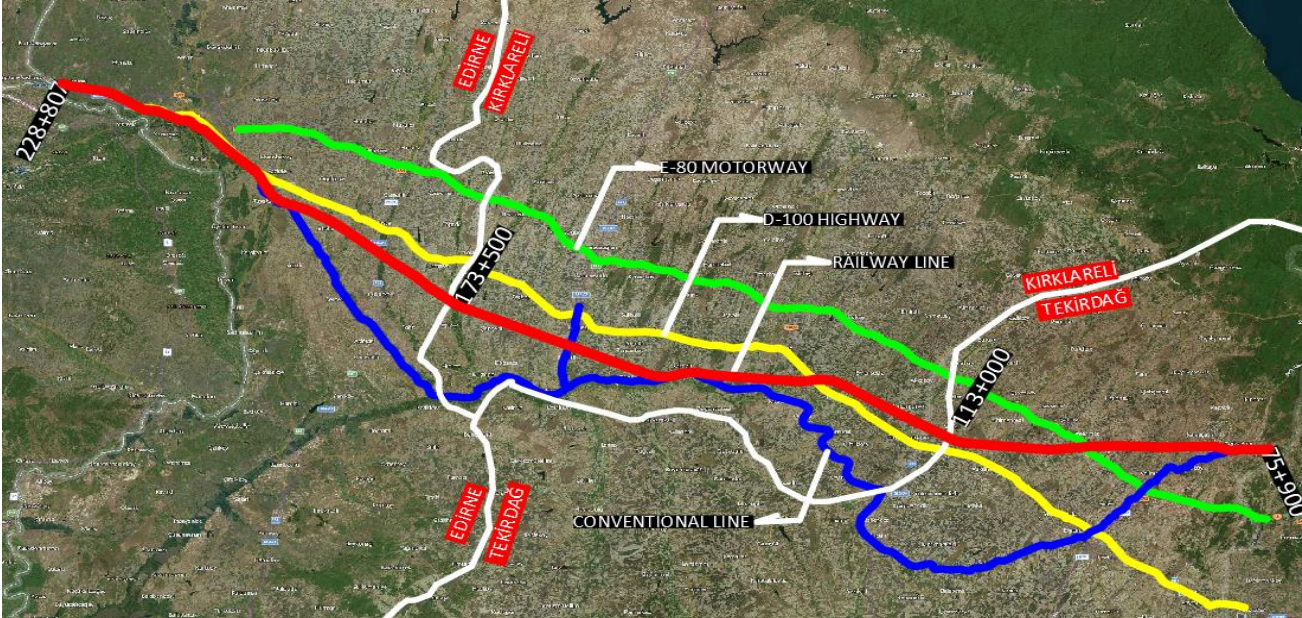

Toplam Hat Uzunluğu: 54,2 km

Tüm Hattın %24'ü

Ana Arter Geçişleri:

- 1 adet D565 Karayolu
- 1 adet D100 Karayolu
- 1 adet E80 Otoyolu

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

	KIRKLARELİ (Adet)	KIRKLARELİ BİTEN (Adet)	PROJE TOPLAM (Adet)
MENFEZ	69	42	184
AÇ-KAPA TÜNEL	1	1	3
KARAYOLU ALTGEÇİT	27	21	52
KARAYOLU ÜSTGEÇİT	19	11	63
DEMİRYOLU KÖPRÜ	10	1	29
VİYADÜK	-	-	2

Yapılarının %60'ı BİTTİ

Toplam Sanat Yapılarının
%36'sı

NAKDİ İLERLEME : %57

FİZİKİ İLERLEME : %52

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



183+000 AÇ KAPA RAY SERİM

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



179+770 ÜST GEÇİDİ

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



176+055 ÜST GEÇİDİ

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



173+375 DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ

← (Boş)

ULAŞTIRMA VE A...
Proje Sahibi Bakanlık

Ulaştırma - Habe...
Proje Sektörü

Proje Karakteristiği ...
(Boş)
İlçe Adı

TCDD 1. BÖLGE MÜ...
Proje Sahibi Kuruluş

İnşaat
Proje Karakteristiği

Genel Bütçe
Bütçe Türü

PROJE DETAYI

Proje Adı

HALKALI-KAPIKULE YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU İNŞAATI (60/230 KM)



2007

Proje Başlangıç Yılı

2023

Proje Bitiş Yılı

Proje Durumu
Devam Ediyor
(Boş)

2.095.355.023

Toplam Proje Tutarı

654.850.641

Önceki Yıllar Toplam Harcaması

377.218.674

Dönemsel Harcama Tutarı


377.218.674

Toplam Yıl Ödeneği



Microsoft Bing © 2021 TomTom, © 2022 Microsoft Corporation [Terms](#)


Nakdi Gerçekleşme Oranı

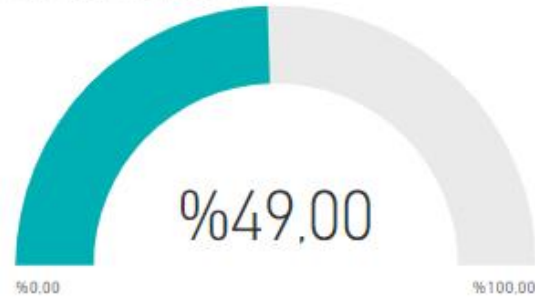

Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı



Ortalama Proje Fiziki Gerçekleşme Oranı

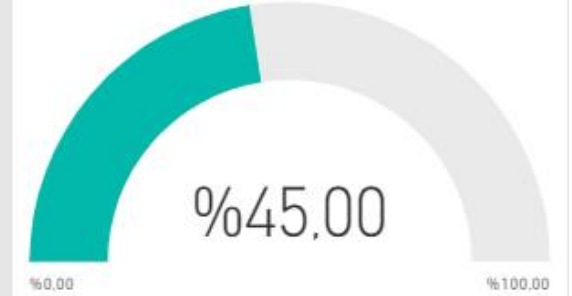

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

MADEN TETKİK VE ARAMA MARMAR...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

10.653.000

8.969.515

2

Proje Sayısı

10.653.000

Toplam Proje Tutarı

8.969.515

Toplam Harcama Tutarı

10.653.000

Toplam Yıl Ödeneği

8.969.515

Yılı Harcama Tutarı

654.543

1.Dönem Harcama Tutarı

3.755.994

2.Dönem Harcama Tutarı

4.558.978

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%6,14

%35,26

%42,80

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	8.969.515
Toplam	8.969.515

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Madencilik	8.969.515
Toplam	8.969.515

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	8.969.515
Toplam	8.969.515

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
TRAKYA BÖLGESİNİN ENERJİ HAMMADDE YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI...	MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	10.000.000	10.000.000
TRAKYA YÖRESİ İNTRÜZİFLERLE İLİŞKİLİ POLİMETAL MADEN ARAMALA...	MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	653.000	653.000
Toplam			10.653.000	10.653.000





KURULUŐ



MTA Genel M¼d¼rl¼ę¼ 1935 yılında 2804 sayılı kanunla kurulmuş, özel hukuk hük¼mlerine tabi, tüzel kişilięi olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına baęlıdır. 2006 yılından itibaren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda (II) sayılı Cetvelde «Özel Bütçeli İdareler» Bölümünde yer almış olup hesap ve işlemleri Sayıştay Denetimine tabi bulunmaktadır.

MTA Marmara Bölge M¼d¼rl¼ę¼ 17 Ağustos 1999 Kocaeli Depremi ile 12 Kasım 1999 Düzce Depreminin yörede oluşturduęu yüksek can kaybı ve ağır hasar dikkate alınarak, Bakanlar Kurulu'nun 14.01.2000 Tarih ve 2000/8 Sayılı Kararnamesi ile kurulmuş olup Kocaeli, Tekirdaę, Edirne, Kırklareli, İstanbul, Sakarya, Düzce, Yalova, Çanakkale (Trakya kesimi) ve Bolu illerini kapsayan bir bölgede faaliyetlerini sürdürmektedir.



T.C.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Toplam 10 ili kapsayan, 44.902 km² lik geniş bir bölgede faaliyet göstermektedir.



KIRKLARELİ İLİ YATIRIM BİLGİLERİ



1- Marmara Bölgesi Enerji Hammadde Aramaları Projesi

2- Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi



KIRKLARELİ İLİ YATIRIM BİLGİLERİ



Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Projenin Yeri	Başlama Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2021 yılı ödeneği (TL)	2021 yılında gönderilen ödenek (TL)	2021 yılı harcamaları (TL)	Nakdi ger. (%)	Fiziki ger. (%)	Açıklamalar
	Toplam			15.349.000	10.653.000	10.653.000	8.969.515	84		
1	Marmara Bölgesi Enerji Hammadde Aramaları Projesi	Kırklareli ve diğer iller	2021	10.696.000	10.000.000	10.000.000	8.969.515	90	120	Kırklareli ilinde 11.999,80 m. sondaj gerçekleştirilmiştir.
2	Trakya Yöresi İntrüziflerle ilişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi	Kırklareli ve diğer iller	2021	4.653.000	653.000	653.000	0	0	112	Kırklareli ilinde 13.453,70 m. sondaj gerçekleştirilmiştir.



ARAZİ ÇALIŞMALARI



1- Marmara B lgesi Enerji Hammadde Aramaları Projesi

Projenin Amacı:

Proje K rklareli, Tekirda , Edirne,  anakkale ve Balıkesir illerini kapsamaktadır.  nceki yıllarda yapılan et tler sonucunda sahadaki birimlerin enerji hammadde a ısından  mitli oldu u g r lm  t r.  lkemizin enerji ihtiyacının b y k bir kısmını kar ılayarak dı a ba ımlılı ımızı en aza indirmek projenin amacını olu turmaktadır.

Ger ekle me : K rklareli ilinde 11.999,80 m. sondaj ger ekle tirilmi tir.  alı malar tamamlanmı tır.





ARAZİ ÇALIŞMALARI



2- Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi

Projenin Amacı:

Istranca Masifi içerisinde proje üretilmemiş veya prospeksiyon aşamasında bırakılmış polimetal cevherleşmelerine yönelik sahalardan ruhsat problemleri nedeniyle uzun zamandır çalışılmayan sahalardan ruhsatı alınanlarda, günümüz bilim ve teknoloji imkanlarıyla değerlendirmeler yaparak, eksik kalan çalışmaları tamamlamak, yeni rezervler ortaya koymak, gömülü yatakları aramaya yönelik modeller geliştirmek ve ruhsatı kurumumuzda bulunan veya gelecekte alınacak olan sahalardan, polimetal cevherleşmeleri bakımından potansiyellerini ortaya koymak projenin temel amacını oluşturmaktadır. Özellikle öncel dönemde işletilen skarn tip cevherleşmelerden bazılarının Bulgaristan'daki devamlılıkları, yıllardır işletilmiş ve bazıları halen işletilmektedir. Skarn tip cevherleşmelerin ülkemizde kalan kesimlerinde detay etüdlerinin tamamlanarak olası potansiyellerini ortaya çıkarmak ve bu tip cevherleşmelerle ilişkili olarak olması beklenen ancak Dereköy dışında ortaya çıkarılamamış porfiri cevherleşmeleri aramak bu projenin amaçları arasındadır.

Gerçekleşme : Kırklareli ilinde 13.453,70 m. sondaj gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar tamamlanmıştır.



ARAZİ ÇALIŞMALARI





ARAZİ ÇALIŞMALARI





ARAZİ ÇALIŞMALARI



KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

5.292.954

5.116.420

4

Proje Sayısı

14.753.140

Toplam Proje Tutarı

14.576.606

Toplam Harcama Tutarı

5.292.954

Toplam Yıl Ödeneği

5.116.420

Yılı Harcama Tutarı

152.510

1.Dönem Harcama Tutarı

2.418.784

2.Dönem Harcama Tutarı

859.858

3.Dönem Harcama Tutarı

1.685.268

4.Dönem Harcama Tutarı

%2,88

%45,70

%16,25

%31,84

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	11.622.633
MERKEZ	377.187
PINARHİSAR	2.576.786
Toplam	14.576.606

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	14.576.606
Toplam	14.576.606

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	14.576.606
Toplam	14.576.606

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Topla
BABAESKİ CEDİT ALİ PAŞA CAMİ RESTORASYONU	EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	4.147.982	11.622.633	
KIRKLARELİ BİNA YAPIMI PROJE TEMİNİ (68 ADA 26 PARSEL)	EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	55.637	80.830	
KIRKLARELİ HIZIRBEY BEDESTENİ BAKIM VE ONARIMI	EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	222.929	338.660	
PINARHİSAR HUNDİ HATUN CAMİSİ RESTORASYONU	EDİRNE VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	866.406	2.711.017	
Toplam			5.292.954	14.753.140	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

4.260.683

3.858.986

4

Proje Sayısı

9.965.167

Toplam Proje Tutarı

7.279.967

Toplam Harcama Tutarı

4.260.683

Toplam Yıl Ödeneği

3.858.986

Yılı Harcama Tutarı

570.228

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

2.628.476

3.Dönem Harcama Tutarı

660.282

4.Dönem Harcama Tutarı

%13,38

%0,00

%61,69

%15,50

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	2.328.853
MUHTELİF İLÇE	4.951.114
Toplam	7.279.967

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	7.279.967
Toplam	7.279.967

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	7.279.967
Toplam	7.279.967

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
KIRKLARELİ 1. GRUP KADASTRO GÜNCELLEMESİ (21 BİRİM)	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	78.850	2.328.853
KIRKLARELİ 2. GRUP KADASTRO GÜNCELLEMESİ	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	3.003.851	3.355.012
LÜLEBURGAZ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	2.283.504
VİZE KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1.177.981	1.997.798
Toplam			4.260.683	9.965.167

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



14

Proje Sayısı

147.078.246

Toplam Proje Tutarı

30.348.243

Toplam Harcama Tutarı

46.371.709

Toplam Yıl Ödeneği

25.141.106

Yılı Harcama Tutarı

1.438.370

1.Dönem Harcama Tutarı

1.519.248

2.Dönem Harcama Tutarı

6.931.208

3.Dönem Harcama Tutarı

15.252.280

4.Dönem Harcama Tutarı

%3,10

%3,28

%14,95

%32,89

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	14.556.803
LÜLEBURGAZ	13.159.928
MUHTELİF İLÇE	242.400
VİZE	2.389.112
Toplam	30.348.243

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Enerji	30.348.243
Toplam	30.348.243

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	30.348.243
Toplam	30.348.243

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam H
(BABAESKİ-HAMİTABAT) BRŞ N.-LÜLEBURGAZ ENERJİ İLETİM HATTI	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	60.000	3.300.000	
(PINARHİSAR - TRAÇİM) BRŞ. N. - PAGDER ASLAN OSB EİH (TTFO)	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	4.200.000	5.200.000	
BABAESKİ TRAFÖ MERKEZİ YENİLEME	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	11.313.461	16.000.000	
BALKAYA RES YEKA - VİZE 380 HAVZA EİH (TTFO)(154 KV, 1272 MCM, 1...	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	150.000	12.000.000	
DEMİRKÖY-KIYIKÖY RES ENERJİ İLETİM HATTI	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	5.000.000	13.000.000	
HAMİTABAT TRAFÖ MERKEZİ YENİLEME	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	5.000.000	40.000.000	
HAMİTABAT TRAFÖ MERKEZİ YENİLEME (400 KV, HAT FİDER)	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	674.012	674.012	
KIYIKÖY RES TRAFÖ MERKEZİ YENİLEME	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	1.300.000	
LÜLEBURGAZ TRAFÖ MERKEZİ YENİLEME	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	4.266.255	4.266.255	
Toplam			46.371.709	147.078.246	5



TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YILI KIRKLARELİ 1.DÖNEM
RAPORU



2022 YILI KIRKLARELİ 1. DÖNEM RAPORU

- BİTEN PROJE SAYISI : **1**
- DEVAM EDEN PROJE SAYISI : **3**
- İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : **9**
- TOPLAM PROJE TUTARI : **145.775.246 TL**
- 2021 YILI ÖDENEĞİ (TOPLAM) : **41.060.246 TL**
- 2021 YILI YAPILAN TOPLAM HARCAMA : **25.141.106 TL**
- NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI : **% 61**
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI : **% 24**

Kırklareli İlinde Bulunan Trafo Merkezleri






KIRKLARELİ İLİ ENERJİ VERİLERİ VE KURULU GÜCÜ

	TÜKETİM (MWh)	ÜRETİM (MWh)	KURULU GÜÇ (MW)
EYLÜL	219.860,998	820.875,672	2075
EKİM	222.677,495	806.471,969	2075
KASIM	236.976,256	486.416,784	2075



2021 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KIRKLARELİ İLİNE AİT PROJELER

- Vize 380 Havza TM Tevsiat (154 kV, 3 fider (Balkaya RES-1, Balkaya RES-2, Sergen RES))
- Babaeski TM (Tevsiat) (154/33 kV, 50 MVA Trafo +154 kV 4 Fider (Edirne-2, Hayrabolu, Transfer, 2. Trafo Fideri) +OG Metal Clad İlavesi)
- Hamitabat TM Tevsiat (380 kV, 2 Fider (Alibeyköy, Reaktör) + 380/154 kV, Ototrafo Fideri + 250 MVA Ototrafo + 420 kV, 160-250 MVA Ayarlanabilir Reaktör)
- (Babaeski - Hamitabat) Brş. N. - Lüleburgaz EİH (154 kV 2x1272 MCM, 4 km)
- Demirköy - Kıyıköy RES EİH (TTFO) (154 kV, 1272 MCM, 32 km)
- Balkaya RES YEKA - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 14+14 km(İki Ayrı Hat))
- Sergen RES - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 22 km)
- Sergen RES - Evrencik RES EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 9 km)
- Pagder Aslan OSB TM(154/33 kV, 100 MVA + 2. Trafo Fideri)
- (Pınarhisar - Traçım) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH (TTFO) 154 kV, 1272 MCM, (6 + 6) km (İki Ayrı Hat)
- Hamitabat TM Tevsiat (400 Kv Hat Fideri)
- LÜLEBURGAZ TM TEVSIAT (154 kV, 2 Fider ,Babaeski Hamitabat)
- 380 kV Verbana-Alibeyköy Brş.N Hamitabat.(Çift Devre 1272 mcm)



Devam Eden Projeler

- **Babaeski TM Tevsiat** (154/33 kV, 50 MVA Trafo +154 kV 4 Fider (Edirne-2, Hayrabolu, Transfer, 2. Trafo Fideri) +OG Metal Clad İlavesi) 09.03.2020 Tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup 18.03.2020 Tarihinde Yer Teslim yapılmıştır.
- **Pagder Aslan OSB TM** (154/33 kV, 100 MVA + 2. Trafo Fideri) 30.05.2021 Tarihinde Yer Teslimi yapılmıştır.
- **380 kV Verbana-Alibeyköy Brş.N Hamitabat** (Çift Devre 1272 mcm) 30.06.2021 Tarihinde Yer Teslimi Yapılmıştır.

Biten Projeler

- **400 kV Hamitabat Tevsiat** (400 kV Hat Fideri) 27.10.2021 Geçici Kabülü Yapıldı.

Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Projenin yeri (ilçe)	Başlam a tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2021 yılı ödeneği (TL)	2021 yılı har.
17D000490	Hamitabat TM Tevsiat	KİT	Lüleburgaz	2019	2021	774.043,6	674.012	674.012
12D030340	Babaeski TM (Tevsiat)	KİT	Babaeski	2012	2021	16.000.000	6.000.000	11.313.460,95
2020D00-149430-149508	Pagder Aslan OSB TM	<u>KİT</u>	Vize	2021	2022	21.000.000	4.000.000	2389111,79
15D030980	380 kV Verbana-Alibeyköy Brş.N Hamitabat	KİT	Lüleburgaz	2021	2021	11.537.978.99	11.537.978.99	10.672.935,6



BABAESKİ TM (TEVSIAT)



BABAESKİ TM TEVSIAT



PAGDER ASLAN TM

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



5

Proje Sayısı

201.566.000

Toplam Proje Tutarı

156.195.937

Toplam Harcama Tutarı

201.566.000

Toplam Yıl Ödeneği

156.195.937

Yılı Harcama Tutarı

20.278.419

1.Dönem Harcama Tutarı

27.533.080

2.Dönem Harcama Tutarı

39.614.960

3.Dönem Harcama Tutarı

68.769.478

4.Dönem Harcama Tutarı

%10,06

%13,66

%19,65

%34,12

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	156.195.937
Toplam	156.195.937

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Madencilik	156.195.937
Toplam	156.195.937

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	156.195.937
Toplam	156.195.937

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harc
İDAME YENİLEME VE MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	857.000	857.000	
KUYU TAMAMLAMA YATIRIMLARI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	37.653.000	37.653.000	
PETROL VE DOĞAL GAZ SAHALARI GELİŞTİRME YATIRIMLARI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	71.972.000	71.972.000	
SONDAJ ÖNCESİ ARAMA YATIRIMLARI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	26.251.000	26.251.000	
SONDAJ YATIRIMLARI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	64.833.000	64.833.000	
Toplam			201.566.000	201.566.000	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

34.200.001

26.949.698

10

Proje Sayısı

75.116.272

Toplam Proje Tutarı

30.054.206

Toplam Harcama Tutarı

34.200.001

Toplam Yıl Ödeneği

26.949.698

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

175.171

2.Dönem Harcama Tutarı

11.523.436

3.Dönem Harcama Tutarı

15.251.091

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,51

%33,69

%44,59

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MERKEZ	20.234.945
MUHTELİF İLÇE	9.819.261
Toplam	30.054.206

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	30.054.206
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	0
Toplam	30.054.206

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÜNİVERSİTELER	30.054.206
Toplam	30.054.206

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıl
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	100.000	100.000	
DİĞER KAMPÜS ALTYAPI ÇALIŞMALARI	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	3.000.000	
GIDA ODAK ALAN İHTİSASLAŞMA PROJESİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	5.000.000	15.000.000	
KAYALI YERLEŞKESİ KAMPÜS GİRİŞİNDEN CAMİYE KADAR OLAN HATTI...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1.000.000	1.500.000	
KAYALI YERLEŞKESİ TIP FAKÜLTESİ İNŞAATI (... DERSLİK, 15.000 M2)	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Devam Ediyor	16.500.000	43.916.272	
KESİN KABUL ÖDEMELERİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Bitti	100.000	100.000	
MAKİNE TEÇHİZAT, OKUL VE BÜRO MEFRUŞATI, DEMİRBAŞ, BİLGİSAYAR...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	8.100.000	8.100.000	
MUHTELİF BAKIM VE ONARIMLAR	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.350.000	1.350.000	
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİ MEKANİK VE ELEKTRİK BAKIM VE ONA...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	650.000	650.000	
Toplam			34.200.001	75.116.272	

Kırklareli Tıp Fakóltesi



Başlama bitiş tarihi : 2020 - 2023

Proje tutarı : 43.916.272

Önceki yıllar harcaması : 3.104.508

2021 ödeneđi : 16.500.000

2021 gönderilen ödenek : 16.500.000

2021 harcaması : 14.916.925

Nakdi gerçekleşme : % 57

Fiziki gerçekleşme : % 38

2.9.2020 tarihinde yer teslim yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 18.6.2023'dür.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

20.793.061

17.687.247

23

Proje Sayısı

28.784.587

Toplam Proje Tutarı

24.454.017

Toplam Harcama Tutarı

20.793.061

Toplam Yıl Ödeneği

17.687.247

Yılı Harcama Tutarı

1.895.809

1.Dönem Harcama Tutarı

2.182.284

2.Dönem Harcama Tutarı

7.978.246

3.Dönem Harcama Tutarı

5.630.908

4.Dönem Harcama Tutarı

%9,12

%10,50

%38,37

%27,08

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	0
LÜLEBURGAZ	22.302
MERKEZ	12.378.275
MUHTELİF İLÇE	9.708.544
PINARHİSAR	2.344.896
VİZE	0
Toplam	24.454.017

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	11.307.273
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	5.941.937
Ulaştırma - Haberleşme	2.170.961
Madencilik	2.124.000
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	2.103.946
Tarım	805.900
Toplam	24.454.017

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
YEREL YÖNETİMLER	24.454.017
Toplam	24.454.017

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam H
ACİL ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	661.330	661.330	
BABAESKİ SİNANLI OSMANLI ÇEŞMESİ BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	93.500	93.500	
BİTİKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJESİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	145.000	145.000	
COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE SAYISALLAŞTIRMA PROJESİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	814.200	814.200	
HAYVAN İÇMESUYU GÖLETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	140.002	185.000	
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	124.969	138.334	
KIRKLARELİ ASAĞIPINAR AÇIK HAVA MÜZESİ KAMULAŞTIRMASI	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	279.582	279.582	
KIRKLARELİ İLİM YAYMA CEMİYETİ BİNASI RESTORASYONU	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	796.987	876.136	
KIRKLARELİ KOCAHİDİR İLKÖĞRETİM OKULU RÖLEVE RESTİTÜSYON VE ...	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	1	1.071.000	
Toplam			20.793.061	28.784.587	6.

	Proje sayısı	Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Harcamaları (TL)	2021 Yılı Programı (TL)	2021 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2021 Yılı Harcamaları (TL)	Parasal Gerçekleşme (%)
Toplam	258	42.483.807	6.766.770	34.492.281	29.889.640	29.420.470	85
İl Özel İdaresi	151	28.784.587	6.766.770	20.793.061	18.156.417	17.687.247	85
Tarım / Sulama	1	535.183	0	535.183	535.183	535.183	100
Tarım / Bitkisel üretim	3	145.000	0	145.000	145.000	144.038	99
Tarım / Hayvancılık	9	323.334	13.365	264.971	113.314	113.314	43
Madencilik	1	2.200.000	0	2.200.000	2.124.000	2.124.000	97
Ulaştırma	56	2.479.926	15.232	2.464.694	2.214.685	2.155.729	87
Eğitim / Kültür	10	13.847.784	5.657.679	7.110.346	5.649.594	5.649.594	79
DKH İktisadi / Genel idare	2	1.314.200	0	1.314.200	1.314.200	1.314.200	100
DKH İktisadi / Güvenlik hizmetleri	1	890.000	789.746	100.254	0	0	0
DKH Sosyal / İçmesuyu	17	955.092	0	855.093	845.893	845.893	99
DKH Sosyal / Kanalizasyon	7	756.540	0	756.540	756.540	756.540	100
DKH Sosyal / Kırsal alan planlaması	43	4.676.198	290.748	4.385.450	4.384.216	3.974.964	91
DKH Sosyal / Afetler	1	661.330	0	661.330	73.792	73.792	11
KÖYDES	107	13.699.220	0	13.699.220	11.733.223	11.733.223	86
Ulaştırma	71	8.765.130	0	8.765.130	8.511.569	8.511.569	97
DKH Sosyal / İçmesuyu	24	2.960.000	0	2.960.000	1.653.459	1.653.459	56
DKH Sosyal / Kanalizasyon	12	1.974.090	0	1.974.090	1.568.195	1.568.195	79

258 projenin 206'sı tamamlanmıştır. 21'i devam etmektedir. 10'u ihale aşamasındadır.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Kırklareli 100 Kişilik Huzurevi İnşaatı	Projeye başlanmadı	Huzurköy Projesi olarak revize edilmiştir.Projenin gerçekleştirileceği arazinin tahsisi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvuruda bulunulmuş ve ön tahsis işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu araziye projenin kaydırılması için Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğüne talepte bulunulmuş olup talebimiz uygun görülmüştür. Ayrıca proje iş ve işlemleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığında alınarak İl Özel İdaresine verilmiştir. Proje Hizmet Alımı İşine ilişkin gönderilen 180.233,59.-TL tutarında ödenek İl Özel İdaresine aktarılmıştır. 25.10.2021 tarihli ve 1513217 sayılı yazımız ile Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünden 509.106,72 TL ödenek talep edilmiştir. 500.000,00TL ödenek İl Özel İdaresine aktarılmıştır.
Kırklareli İl Müdürlüğü ve B Tipi SHM Binası Yapım İşİ" ne ait projelerin tanzimine ilişkin Proje Danışmanlık Hizmet Alımı işi	Projeye başlanmadı	Projenin B Tipi SHM olarak revize edilmesi için Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğüne talepte bulunulmuş olup talebimiz uygun görülmüştür. Proje Danışmanlık Hizmeti için 498.263,00.-TL ödeneye ihtiyaç duyulduğu ÖdenekTeminine Esas Tahmini Bedel Hesabı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmiştir.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının 10.06.2019 tarihli ve E.118 sayılı Makam Oluru ile projeyi yapacak ihale makamı olarak İl Özel İdaresi yetkilendirilmiştir.
Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi Büro Mefruşatı Alımı	Bitti	Müdürlüğümüze bağlı olarak faaliyet göstermekte olan Kırklareli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Büro Mefruşatı Alımı İşine ilişkin 60.000 TL tutarında ödenek gönderilmiştir. Söz konusu ödenegin 30.444,00.-TL'lik kısmı ile 6 adet bilgisayar ile yazıcı ve 29.433,01 .-TL'lik kısmı ile Mefruşat alımı gerçekleştirilmiştir.
Vize Sosyal Hizmet Merkezi Tefrişatı İşİ	Devam ediyor	Vize Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tefrişatı işine ilişkin gönderilen 100.000,00.-TL tutarında ödenek İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Tefrişat işlemleri devam etmektedir.
Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Büro Mefruşatı Alımı	Devam ediyor	İl Müdürlüğümüz ihtiyacı olan Arşiv Dolabı Alımı işine ilişkin avans DMO'ya aktarılmıştır. Satın alma süreci devam etmektedir.
Kırklareli Huzurevi Müdürlüğü İhata Duvarı Yapımı İşİ	Devam ediyor	Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ödenek 14/12/2021 tarihinde İl Özel İdaresine aktarılmıştır.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

13.699.220

10.455.190

3

Proje Sayısı

13.699.220

Toplam Proje Tutarı

10.455.190

Toplam Harcama Tutarı

13.699.220

Toplam Yıl Ödeneği

10.455.190

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

5.397.895

3.Dönem Harcama Tutarı

4.767.133

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%39,40

%34,80

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	10.455.190
Toplam	10.455.190

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	10.455.190
Toplam	10.455.190

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	10.455.190
Toplam	10.455.190

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje
KÖY İÇMESULARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI (KÖYDES)	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.960.000	2
KÖY KANALİZASYONLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI (KÖYDES)	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.974.090	1
KÖY YOLLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	8.765.130	8
Toplam			13.699.220	13.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜD... ▼

Harcama Yılı

2021 ▼

Proje Durumu

Tümü ▼

Proje Alt Durumu

Tümü ▼

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



16

Proje Sayısı

101.205.537

Toplam Proje Tutarı

32.206.244

Toplam Harcama Tutarı

98.205.537

Toplam Yıl Ödeneği

29.206.244

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

2.620.293

2.Dönem Harcama Tutarı

19.743.061

3.Dönem Harcama Tutarı

6.842.890

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%2,67

%20,10

%6,97

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	3.780.076
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	20.933.817
MUHTELİF İLÇE	4.932.400
PINARHİSAR	2.157.040
VİZE	402.911
Toplam	32.206.244

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	32.078.623
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	127.621
Toplam	32.206.244

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	32.206.244
Toplam	32.206.244

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Öncelik
BABAESKİ SPOR KOMPLEKSİ YENİLEMESİ	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.928.170	2.928.170	
BABAESKİ SPOR KOMPLEKSİ YENİLEMESİ	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.003.000	1.003.000	
KIRKLARELİ ARMAĞAN SPOR ALANI ÜZERİNİN KAPATILMASI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	82.600	82.600	
KIRKLARELİ GENÇ OFİS DÜZENLEMESİ	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	212.400	212.400	
KIRKLARELİ HAYDAR SÜKAN KIŞLASI AÇIK SPOR TESİSLERİ YAPIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	674.530	674.530	
KIRKLARELİ HOKEY SAHASI TRİBÜN, SOYUNMA ODALARI VE AYDINLAT...	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1.597.000	1.597.000	
KIRKLARELİ MUSTAFA YAMAN SPOR TESİSİ TENİS KORTLARI BAKIM VE ...	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	762.037	762.037	
KIRKLARELİ SPOR SALONU YAPIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	35.775.240	38.775.240	
LÜLEBURGAZ 8 KASIM STADI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	8.260.000	8.260.000	
Toplam			98.205.537	101.205.537	

**T.C.
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI**



KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



2021

İÇİNDEKİLER

➤ BİTEN PROJELERİMİZ

- *Babaeski İlçesi 100.Yıl Stadı Betonarme Tribün Bakım Onarımı, Atletizm Pisti, Soy Odaları, İstinat Duvarı ve Çelik Tribün Yapım İşİ*
- *Babaeski Spor Kompleksi Yağmur Suyu Toplama Alt Yapısı ve Saha Betonu Yapım İşİ*
- *Pınarhisar Çim Yüzeyli Futbol Sahası Soyunma Odası, Aydınlatma, Portatif Tribün Yapım İşİ*
- *Vize Spor Salonu Elektrik, Su Tesisatı ve Çatısının Yenilenip Diğer Bakım Onarım ve Yapım İşİ*
- *Yurt Binaları Bakım Onarım ve Yapım İşİ*
- *Genç Ofis Düzenlemesi Yapım İşİ*

➤ DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

- *Kırklareli Vali Mustafa Yaman Tesisleri Tenis Kortları Bakım Onarım İşİ*
- *Vize İlçe Tesisleri Çevre İhata Duvarı Ve Panel Çit Yapım İşİ*



İÇİNDEKİLER

➤ YAPIM AŞAMASINDA BULUNAN PROJELERİMİZ

- *Lüleburgaz 2000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapım İşi*
- *Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi*
- *Lüleburgaz 8 Bakım Onarım ve Yapım İşi*
- *Pınarhisar Soyunma Odası, Çelik Tribün ve Saha Aydınlatma Yapım İşi*
- *Merkez Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahası Soyunma Odaları, Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi*
- *Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor Tesisi Yapım İşi*
- *Armağan Köyü Spor Alanının Üzerinin Kapatılma Yapım İşi*
- *Vize İlçe Gençlik Merkezi Yapım İşi*
- *Üsküp Beldesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi*
- *Demirköy İlçesi Spor Salonu Yapım İşi*



BİTEN PROJELERİMİZ

- *Babaeski 100. Yıl Stadı Betonarme Tribün Bakım Onarımı, Atletizm Pisti, Soyunma Odaları, İstinat Duvarı ve Çelik Tribün Yapım Projesi*
- *Babaeski Spor Kompleksi Yağmur Suyu Toplama Alt Yapısı Ve Saha Betonu Yapım İşi*
- *Pınarhisar Çim Yüzeyli Futbol Sahası Soyunma Odası, Aydınlatma, Portatif Tribün Yapım Projesi*
- *Vize Spor Salonu Elektrik, Su Tesisatı Ve Çatısının Yenilenip Diğer Bakım, Onarım Ve Yapım Projesi*
- *Kırklareli Merkez Yurtlar Bakım Onarım Yapım İşi*
- *Genç Ofis Düzenlemesi Yapım Projesi*



BABAESKİ 100. YIL STADI BETONARME TRİBÜN BAKIM ONARIMI, ATLETİZM PİSTİ, SOYUNMA ODALARI, İSTİNAT DUVARI VE ÇELİK TRİBÜN YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Babaeski ilçemizde bulunan spor kompleksimizde mevcut yapıların deforme olması, malzemelerin kullanım ömrünü tamamlamış olması ve halkımıza daha iyi bir hizmet sunabilmek adına Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bir projedir.

İşin Adı : Babaeski 100.Yıl Stadı Betonarme Tribün Bakım Onarımı, Atletizm Pisti, Soyunma Odaları, İstinat Duvarı ve Çelik Tribün Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 01.02.2021

Geçici Kabul Tarihi : 11.10.2021

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 2.283.000,00 TL + KDV

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 2.481.500,00 + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100



BABAESKİ 100. YIL STADI BETONARME TRİBÜN BAKIM ONARIMI, ATLETİZM PİSTİ, SOYUNMA ODALARI, İSTİNAT DUVARI VE ÇELİK TRİBÜN YAPIM PROJESİ

SPORTOTO



SPORTOTO



BABAESKİ SPOR KOMPLEKSİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA ALT YAPISI VE SAHA BETONU YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : İlimizdeki eski tesislerin sadece görsel olarak değil aynı zamanda eskiyen alt yapılarında yenilenmesi ve spora engel teşkil eden alanların yeniden revize edilerek yenileme amaçlı planlamış olduğumuz projemizdir.

İşin Adı : Babaeski Spor Kompleksi
Yağmur Suyu Toplama Alt Yapısı ve Saha Betonu Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 09.07.2021

Geçici Kabul Tarihi : 29.09.2021

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 723.723,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100



PINARHİSAR ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODASI, AYDINLATMA, PORTATİF TRİBÜN YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : İlimizdeki eski tesislerin yenilenmesi, modernleştirilmesi ve gereksinimleri karşılamayan noktaların yeniden düzenlenmesi ve aynı zamanda gençlerimizden geleceğin sporcularını yetiştirmek amaçlı başlattığımız uygulamalar çerçevesinde ele aldığımız ve şuanda fizibilite çalışmalarını yaptığımız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bir projedir.

SPORTOTO

İşin Adı : Pınarhisar Çim Yüzeyle Futbol Sahası Soyunma Odası, Aydınlatma, Portatif Tribün Yapım İş

Sözleşme Tarihi : 04.08.2021

Geçici Kabul Tarihi : 19.11.2021

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 1.828.000,00 TL + KDV

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 2.200.000,00 + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100



SPORTOTO



PINARHİSAR ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI SOYUNMA ODASI, AYDINLATMA, PORTATİF TRİBÜN YAPIM PROJESİ

SPORTOTO



SPORTOTO



VİZE SPOR SALONU ELEKTRİK, SU TESİSATI VE ÇATISININ YENİLENİP DİĞER BAKIM, ONARIM VE YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Vize ilçemizde bulunan spor tesisimizin yenilenmesi, modernleştirilmesi ve gereksinimleri karşılamayan noktaların yeniden düzenlenmesine yönelik başlattığımız ve şuanda fizibilite aşamasında olan, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz bir başka projemizdir.

İşin Adı : Vize Spor Salonu Elektrik, Su Tesisatı ve Çatısının Yenilenip Diğer Bakım Onarım ve Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 07.07.2021

Geçici Kabul Tarihi : 14.09.2021

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 341.450,00 TL + KDV

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 450.000,00 + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100



VİZE SPOR SALONU ELEKTRİK, SU TESİSATI VE ÇATISININ YENİLENİP DİĞER BAKIM, ONARIM VE YAPIM PROJESİ

SPORTOTO



SPORTOTO



YURT BİNALARI BAKIM ONARIM VE YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : İlimizdeki eski yurtların yenilenmesi, modernleştirilmesi ve gereksinimleri karşılamayan noktaların yeniden düzenlenmesi ve aynı zamanda öğrencilerimize daha verimli hizmetler sunmak amacıyla ele aldığımız ve şu anda fizibilite çalışmalarını yaptığımız bir projedir.

İşin Adı : Yurt Binaları Bakım Onarım ve Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 20.08.2021

Geçici Kabul Tarihi : 18.11.2021

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 4.180.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100



GENÇ OFİS DÜZENLEMESİ YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Kırklareli Üniversitesi Kayalı yerleşkesinde kampüs alanında yer alacak olan genç ofisimiz amacı üniversite öğrencilerimizin zamanlarını verimli bir şekilde geçirebilecekleri, ders çalışabilecekleri ve sportif faaliyetlerde bulunmalarına olanaklar sunularak sosyal gelişimlerine katkı sağlayabilecekleri bir ofis düzenleme projemizdir.

İşin Adı : Genç Ofis Düzenlemesi Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 05.07.2021

Geçici Kabul Tarihi : 22.09.2021

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 108.153,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100



DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

- *Kırklareli Vali Mustafa Yaman Tesisleri Tenis Kortları Bakım Onarım İŖi*
- *Vize İle Tesisleri evre İhata Duvarı Ve Panel it Yapım İŖi*



MERKEZ KAPALI TENİS KORTLARI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan kapalı tenis kortlarının eskiyen zeminin yenilenmesi ve çevre düzenlenmesinin yapılarak tenis branşında yetenekli sporcuların yetişmesine yönelik yürüttüğümüz bir projedir.

İşin Adı : Merkez Kapalı Tenis Kortları Bakım
Onarım ve Yapım İşİ


Sözleşme Tarihi : 10.11.2021

Geçici Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 619.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %95

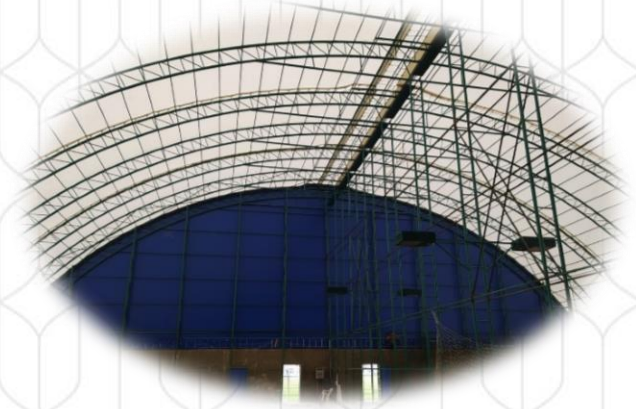

VİZE İLÇE TESİSLERİ ÇEVRE İHATA DUVARI VE PANEL ÇİT YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Vize ilçemizde bulunan spor tesisimizin daha güvenli ve modern bir yapıya dönüşmesi için Spor Toto sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bir başka projemizdir.

İşin Adı : Vize İlçe Tesisleri Çevre İhata Duvarı ve
Panel Çit Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 17.08.2021

Geçici Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 749.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %30



SPORTOTO



YAPIM AŞAMASINDA BULUNAN PROJELERİMİZ

- *Lüleburgaz 2000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapım İşi*
- *Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi*
- *Lüleburgaz 8 Bakım Onarım ve Yapım İşi*
- *Pınarhisar Soyunma Odası, Çelik Tribün ve Saha Aydınlatma Yapım İşi*
- *Merkez Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahası Soyunma Odaları, Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi*
- *Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor Tesisi Yapım İşi*
- *Armağan Köyü Spor Alanının Üzerinin Kapatılma Yapım İşi*
- *Vize İlçe Gençlik Merkezi Yapım İşi*
- *Üsküp Beldesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi*
- *Demirköy İlçesi Spor Salonu Yapım İşi*



LÜLEBURGAZ 2000 SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONU YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Trakya bölgesinde kavşak niteliği taşıyan Lüleburgaz ilçemizde büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak, bölgemizi spor alanında cazibe merkezi olmasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Şuanda fizibilite çalışmalarını yaptığımız projemizi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğu ile gerçekleştirilecektir.



İşin Adı : Lüleburgaz 2000 Seyirci Kapasiteli
Spor Salonu Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 25.000.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



LÜLEBURGAZ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Trakya bölgesinde kavşak niteliği taşıyan Lüleburgaz ilçemizde büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için başlattığımız projelerimizden bir tanesi olan yarı olimpik yüzme havuzu projemizle hem ülke genelinde yüzme yarışlarını organize etmek hem de ilçemizde ilk büyük çaplı yüzme havuzu inşa ederek gençlerimizi yüzmeye teşvik ederek uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız ve şu anda fizibilite çalışmalarını yaptığımız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bir projedir.

SPOR TOTO

İşin Adı	: Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşİ
Sözleşme Tarihi	: Proje Aşamasında
İş Bitim Tarihi	: -
Spor Toto Sözleşme Bedeli	: 4.300.000,00 TL + KDV
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %0



LÜLEBURGAZ 8 KASIM STADI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

İl Müdürlüğümüze bağlı Lüleburgaz İlçesinde bulunan İlçe Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezimiz bölge halkını sporla iç içe yaşamasının yönünde düzenlediği spor etkinlikleriyle gerek yerel gerek ulusal basında ön plana çıkan teşkilatımızın önemli bir parçasıdır.

İşin Adı : Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım
Onarım ve Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 7.000.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



PINARHİSAR SOYUNMA ODASI, ÇELİK TRİBÜN VE SAHA AYDINLATMA YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Pınarhisar ilçesine yapılması planlanan projemizde herkesi spor yapmaya teşvik etmek ve geleceğe yönelik milli sporcular yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlamak amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda yürüttüğümüz bir projedir.

SPORTOTO

İşin Adı : Pınarhisar Soyunma Odası, Çelik Tribün ve Saha Aydınlatma Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 20.12.2021 tarihinde ihalesi yapıldı ve ihaleye katılım olmadığı için ihale iptal edildi.

İş Bitim Tarihi : -

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 2.208.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



MERKEZ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ HOKEY SAHASI SOYUNMA ODALARI, TRİBÜN VE AYDINLATMA YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı : Merkez Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahası Soyunma Odaları, Tribün ve Aydınlatma Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 28.12.2021 tarihinde ihalesi yapıldı ve ihaleye yeterli katılım olmadığı için ihale iptal edildi.

İş Bitim Tarihi : -

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 1.353.390 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



ORG. HAYDAR SÜKAN KIŞLASI AÇIK SPOR TESİSİ YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan askeri kışlamıza spor tesisi yaparak yaşamın her alanında modern spor tesislerini vatandaşımıza sunma çerçevesinde yürüttüğümüz bir projedir.

SPORTOTO

İşin Adı : Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor
Tesis Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : İhalesi 23.12.2021 tarihinde yapılmış
olup yasal süreler çerçevesinde sözleşme imzalanması bekleniyor.

İş Bitim Tarihi : -

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 511.301,79 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



ARMAĞAN KÖYÜ SPOR ALANININ ÜZERİNİN KAPATILMA YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Merkez Armağan köyü belde halkının yılın her mevsiminde spor yapma imkanı sunmak amacıyla bölgede mevcut bulunan spor alanının üzerinin kapatılmasına yönelik başlattığımız ve şuanda fizibilite aşamasında olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bir projedir.



İşin Adı : Armağan Köyü Spor Alanının Üzerinin Kapatılma Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 70.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0

NOT: Bu projemiz için yapılan yaklaşık maliyet çalışması belirlenen sözleşme bedelinin üzerinde olması sebebiyle başlatılamamıştır.



VİZE İLÇESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı : Vize İlçe Gençlik Merkezi Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 1.832.785,54 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



ÜSKÜP BELDESİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı : Üsküp Beldesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol
Sahası Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 2.623.564,45 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



DEMİRKÖY İLÇESİ SPOR SALONU YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı	: Demirköy İlçesi Spor Salonu Yapım İşİ
Sözleşme Tarihi	: Proje Aşamasında
İş Bitim Tarihi	: -
Sözleşme Bedeli	: 6.000.000,00 TL + KDV
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %0



KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

9.661.076

8.496.471

7

Proje Sayısı

19.574.915

Toplam Proje Tutarı

18.410.310

Toplam Harcama Tutarı

9.661.076

Toplam Yıl Ödeneği

8.496.471

Yılı Harcama Tutarı

819.510

1.Dönem Harcama Tutarı

480.097

2.Dönem Harcama Tutarı

5.576.977

3.Dönem Harcama Tutarı

1.619.887

4.Dönem Harcama Tutarı

%8,48

%4,97

%57,73

%16,77

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	13.058.780
MUHTELİF İLÇE	3.851.530
PINARHİSAR	1.500.000
VİZE	0
Toplam	18.410.310

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	16.910.310
Konut	1.500.000
Toplam	18.410.310

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	18.410.310
Toplam	18.410.310

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı H
BULGARİSTAN SINIR BÖLGESİNE ENERJİ HATTI ÇEKİLMESİ	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	1.160.476	3.594.550	2.434.074	
DOĞAL AFET GİDERLERİ	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	5.959.359	13.350.613	7.391.254	
İL VE İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ YENİ KONSEPT PROJESİ	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Bitti	553.441	553.441	0	
KIRKLARELİ HÜKÜMET BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	350.870	439.381	88.511	
LÜLEBURGAZ HÜKÜMET KONAĞI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	116.601	116.601	0	
RHİSAR KAYMAKAMEVİ İNŞAATI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	1.500.000	1.500.000	0	
VİZE HÜKÜMET KONAĞI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	20.329	20.329	0	
Toplam			9.661.076	19.574.915	9.913.839	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



2

Proje Sayısı

715.690

Toplam Proje Tutarı

342.064

Toplam Harcama Tutarı

710.595

Toplam Yıl Ödeneği

336.969

Yılı Harcama Tutarı

76.379

1.Dönem Harcama Tutarı

177.913

2.Dönem Harcama Tutarı

82.677

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%10,75

%25,04

%11,63

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	342.064
Toplam	342.064

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	342.064
Toplam	342.064

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	342.064
Toplam	342.064

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam
HİZMET BİNASI VE LOJMAN ONARIMLARI	KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	395.945	401.040	
MALZEME ALIMI İLE DİĞER BAKIM VE ONARIMLAR	KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	314.650	314.650	
Toplam			710.595	715.690	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü


Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



9

Proje Sayısı

29.906.504

Toplam Proje Tutarı

17.889.194

Toplam Harcama Tutarı

10.091.855

Toplam Yıl Ödeneği

4.991.853

Yılı Harcama Tutarı

1.522.130

1.Dönem Harcama Tutarı

613.004

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

2.856.719

4.Dönem Harcama Tutarı

%15,08

%6,07

%0,00

%28,31

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
DEMİRKÖY	364.889
LÜLEBURGAZ	93.692
MERKEZ	17.430.613
MUHTELİF İLÇE	0
VİZE	0
Toplam	17.889.194

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	13.858.305
Turizm	4.030.889
Toplam	17.889.194

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	17.889.194
Toplam	17.889.194

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Ön
DEMİRKÖY SİSLİOBA KÜLTÜREL HAZİNE EVİ PROJE YAPIMI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	364.889	364.889	
ESKİ ESER RESTORASYONLARINA YARDIM	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
KIRKLARELİ AŞAĞIPINAR ARKEOPARK YAPIMI (YAŞAYAN TARİHİ KENTLE...	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.180.964	2.916.000	
KIRKLARELİ AŞAĞIPINAR KAZI ÇALIŞMALARI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	500.000	500.000	
KIRKLARELİ AŞAĞIPINAR ÖREN YERİ ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ Y...	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	461.000	750.000	
KIRKLARELİ İL HALK KÜTÜPHANESİ İNŞAATI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.485.000	13.264.613	
LÜLEBURGAZ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ İNŞAATI (2.555 M2)	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	5.000.000	11.600.000	
VİZE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLAT VE TEFRİŞATI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	100.000	511.000	
YEREL KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE YARDIM ÇALIŞMALARI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
Toplam			10.091.855	29.906.504	



TURİZMDE MARKA ŞEHİR KIRKLARELİ

2021 YILINA AİT YATIRIMLAR



KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2021 YATIRIMLARI

BAŞLIKLAR

- Aşağı Pınar Ören Yeri ve Ziyaretçi Karşılama Merkezi Uygulama Projesi
- Yaşayan Tarihi Kentler; Kırklareli Aşağı Pınar ve Bulgaristan Rusokastro Projesi
- Kırklareli Aşağı Pınar Kazı Çalışmaları
- Sisli Oba Kültürel Hazine Evi Projesi
- Kırklareli İl Halk Kütüphanesi Yapımı
- Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi Proje Yapımı
- Demirköy Halk Kütüphanesi
- Eski Eser Restorasyonlarına Yardım
- Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadilat ve Tefriş Uygulaması Projesi



AŞAĞI PINAR ÖREN YERİ VE ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ UYGULAMA PROJESİ

Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2021
Proje Tutarı	750.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	289.000 TL
2021 yılı ödeneği	461.000 TL
2021 yılında gönderilen ödenek	461.000 TL
2021 yılı harcamaları	461.000 TL
Nakdi Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%90

YAŞAYAN TARİHİ KENTLER; KIRKLARELİ AŞAĞI PINAR VE BULGARİSTAN



Başlama Tarihi	2019
Bitiş Tarihi	2021
Proje Tutarı	2.916.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	735.036 TL
2021 yılı ödeneği	2.180.964 TL
2021 yılında gönderilen ödenek	2.180.964 TL
2021 yılı harcamaları	2.180.964 TL
Nakdi Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100

YAŞAYAN TARİHİ KENTLER PROJESİNİN TOPLAM TUTARI

487.000 £

414.000 £ AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN, 73.000 £ İKİ ÜLKENİN ORTAK
BÜTÇESİNDEN SAĞLANMIŞTIR.

ÖREN YERİ ZİYARETÇİ KARŞILAMA MERKEZİ

750.000 TL

TRAKYA KALKINMA AJANSININ MADDİ DESTEĞİYLE YAPILMAKTADIR.

KIRKLARELİ AŞAĞIPINAR KAZI ÇALIŞMALARI



Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Proje Tutarı	500.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	-
2021 yılı ödeneği	500.000 TL
2021 yılında gönderilen ödenek	500.000 TL
2021 yılı harcamaları	500.000 TL
Nakdi Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



SİSLİ OBA KÜLTÜREL HAZİNE EVİ PROJESİ



Başlama Tarihi 2020

Bitiş Tarihi 2021

Proje Tutarı 364.889 TL

Önceki Yıllar Harcamaları 0

2021 yılı ödeneği 364.889 TL

2021 yılında gönderilen
ödenek 364.889 TL

2021 yılı harcamaları 364.889 TL

Nakdi Gerçekleşme %100

Fiziki Gerçekleşme %100

KIRKLARELİ İL HALK KÜTÜPHANESİ YAPIMI



Başlama Tarihi	2016
Bitiş Tarihi	2021
Proje Tutarı	12.985.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	11.500.000 TL
2021 yılı ödeneği	1.485.000 TL
2021 yılında gönderilen ödenek	1.485.000 TL
2021 yılı harcamaları	1.485.000 TL
Nakdi Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



LÜLEBURGAZ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ YAPIMI

Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Proje Tutarı	11.600.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	-
2021 yılı ödeneği	5.000.000 TL
2021 yılında gönderilen ödenek	5.000.000 TL
2021 yılı harcamaları	0
Nakdi Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%0



DEMİRKÖY İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ

Demirköy İlçe Halk Kütüphanesi Kırklareli Valiliği ve Hayırseverlerin katkılarıyla yapılarak 2020 yılında Bakanlığımıza bedelsiz olarak tahsisi gerçekleştirilmiştir. Kütüphane 2021 yılında hizmete açılmıştır.



ESKİ ESER RESTORASYONLARINA

Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2021
Proje Tutarı	100.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	100.000 TL
2021 yılı ödeneği	0
2021 yılında gönderilen ödenek	-
2021 yılı harcamaları	0
Nakdi Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	

VİZE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLAT VE TEFRİŞ UYGULAMASI PROJESİ



Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	511.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	-
2021 yılı ödeneği	100.000 TL
2021 yılında gönderilen ödenek	100.000 TL
2021 yılı harcamaları	0
Nakdi Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%0



VICE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ AÇMA ÇALIŞMALARI

Vize İlçemiz 28.541 nüfuslu, Kırklareli'nin gerek turizm gerek eğitim açısından önemli ilçelerinden biridir.

İlçemizde halen Bakanlığımıza ait bir kütüphane bulunmamaktadır.

Vize Kaymakamlığı himayesinde restorasyon proje çalışmaları tamamlanan tarihi Vize Pratik Kız Sanat Okulu Kültür ve Turizm Bakanlığına kütüphane yapılmak üzere bedelsiz olarak tahsis edilmiştir.

PROJELERİN GENEL DURUMU

	Turizm	Eğitim/Kültür	Toplam
Proje Sayısı	3	5	8
Proje Tutarı (TL)	4.030.889	12.711.000	16.741.889
Önceki Yıllar Harcamaları	1.024.036	100.000	1.124.036
2021 yılı ödeneği (TL)	3.006.853	5.600.000	8.606.853

PROJELERİN PARASAL GERÇEKLEŞME DURUMU

	Turizm	Eğitim/Kültür	Toplam
2021 yılında gönderilen ödenek (TL)	3.006.853	5.600.000	8.606.853
2021 yılı harcamaları (TL)	3.006.853	500.000	3.506.853
Parasal gerçekleşme (yüzde)	100	5	28
2021 yılı ödenek ihtiyacı (TL)	0		

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



10

Proje Sayısı

125.945.684

Toplam Proje Tutarı

32.580.351

Toplam Harcama Tutarı

62.129.513

Toplam Yıl Ödeneği

32.369.780

Yılı Harcama Tutarı

2.796.309

1.Dönem Harcama Tutarı

3.165.137

2.Dönem Harcama Tutarı

10.522.858

3.Dönem Harcama Tutarı

15.885.476

4.Dönem Harcama Tutarı

%4,50

%5,09

%16,94

%25,57

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	0
LÜLEBURGAZ	82.128
MERKEZ	13.991.684
MUHTELİF İLÇE	3.856.137
VİZE	14.650.402
Toplam	32.580.351

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	32.580.351
Toplam	32.580.351

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	32.580.351
Toplam	32.580.351

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıl
BABAESKİ ANAOKULU İNŞAATI (6 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1.000.000	3.500.000	
BABAESKİ ŞEHİT ERSAN YENİCİ ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	629.200	3.160.000	
İLKÖĞRETİM VE GENEL ORTAÖĞRETİM BAKIM ONARIMLARI	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	5.420.000	5.420.000	
K.ELİ CAMİKEBİR MAH. İLKOKULU YAPIMI (20 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	2.500.000	11.000.000	
KIRKLARELİ BİLİM SANAT MERKEZİ İNŞAATI (8 DERSLİK)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1.265.200	5.960.000	
KIRKLARELİ KARAKAŞ MAH. İLKOKULU YAPIMI (16 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	13.925.486	13.991.684	
KIRKLARELİ OSB MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ (16 DRS + 3 ATÖLYE + SPO...	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	4.320.000	28.800.000	
LÜLEBURGAZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İNŞAATI (24 DERSLİK)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	9.063.892	30.000.000	
MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM BAKIM ONARIMLARI	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	520.000	520.000	
Toplam			62.129.513	125.945.684	



KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü

**2022 Yılı 1. Dönem
İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı
11.01.2022**

SUNUM



KIRKLARELİ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımın türü	Toplam Proje Sayısı	2021 Yılı Ödeneği(TL)	2021 Yılı Gönderilen Ödenek (TL)	2021 Yılı Harcamaları (TL)	Devam Eden Proje Sayısı
Toplam Proje Tutarı: 135.203.949,00 TL	10	71.279.513,00	42.563.234,00	32.369.781,00	2
Anaokulu İnşaatı	1	1.000.000,00	0	0	-
İlkokul İnşaatları	2	16.425.486,00	13.925.486,00	13.925.486,00	-
Ortaöğretim İnşaatı (Kapalı Spor Salonu)	1	629.200,00	250.000,00	0	-
Özel Eğitim ve Rehberlik İnşaatı (BİL-SEM)	1	1.265.200,00	550.000,00	0	-
Meslek Lisesi İnşaatları	3	36.869.627,00	21.897.748,00	14.588.158,00	1
Bakım ve Onarımlar	2	15.090.000,00	5.940.000,00	3.856.137,00	1

*Verilerin tarihi: 31 Aralık 2021'dir.





KIRKLARELİ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımcı kuruluş	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adı	: Merkez Karakaş Mah. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Yapım
Yeri	: Merkez Karakaş Mah. 1451 ada,3 parsel
Karakteristiği	: 16 Derslik
Finansman kaynağı	: İl Özel İdare + Genel Bütçe
Başlama ve bitiş tarihi	: 2019 – 2021
Proje tutarı	: 13.991.684,00 TL
İhale bedeli	: 10.041.126,00+KDV
Önceki yıllar harcaması	: 66.198,00
Program yılı ödeneği	: 13.925.486,00 TL
Harcama	: 13.925.486,00 TL
Fiziki durumu	: Bitti.
Açıklamalar	: İnşaat Tamamlanmıştır. Geçici Kabulü Yapılmıştır. Eski Okul Binası Yıkılmış Olup, Bahçe Düzenlemesi de Yapılan Yeni Okul Binasında Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Başlanmıştır.

Görseller





Yatırımcı kuruluş : İl Milli Eğitim
Müdürlüğü

Adı : **Merkez Camikebir
Mah. İlkokulu Yapım**

Yeri : Merkez Camikebir
Mah. 1277 ada 1
parsel

Karakteristiği : 16 Derslik

Finansman kaynağı : İl Özel İdare

Başlama ve bitiş tarihi : 2021 – 2022

Proje tutarı : **13.000.000,00**

İhale bedeli : -

Önceki yıllar harcaması : 0

Program yılı ödeneği : 2.500.000,00

Harcama : 0

Fiziki durumu : İhale Hazırlık Aşamasında.

Açıklamalar : Bakanlığımızdan İhale Onay izni Alınmıştır. Proje Alanının Zemin Etüd Çalışmalarına Başlanmıştır. Güncel Yaklaşık Maliyeti Hazırlatılacaktır.

Görseller





KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımcı kuruluş : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Adı : **Spor Salonu**
(Babaeski Şehit Ersan
Yenici Anadolu Lisesi)

Yeri : **Babaeski Dindoğru Mah.**
287 ada,39 parsel

Karakteristiği : **Spor Salonu**

Finansman kaynağı : **Genel bütçe**

Başlama ve bitiş tarihi : **2018 – 2023**

Proje tutarı : **3.160.000,00**

İhale bedeli : **-**

Önceki yıllar
harcaması : **0**


Program yılı ödeneği : **629.200,00**

Harcama : **0**

Fiziki durumu : **Proje Aşamasında.**

Açıklamalar : **Zemin Etüdü Yaptırılacak ve**
Güncel Yaklaşık Maliyeti
Hazırlatılacaktır.

Görseller

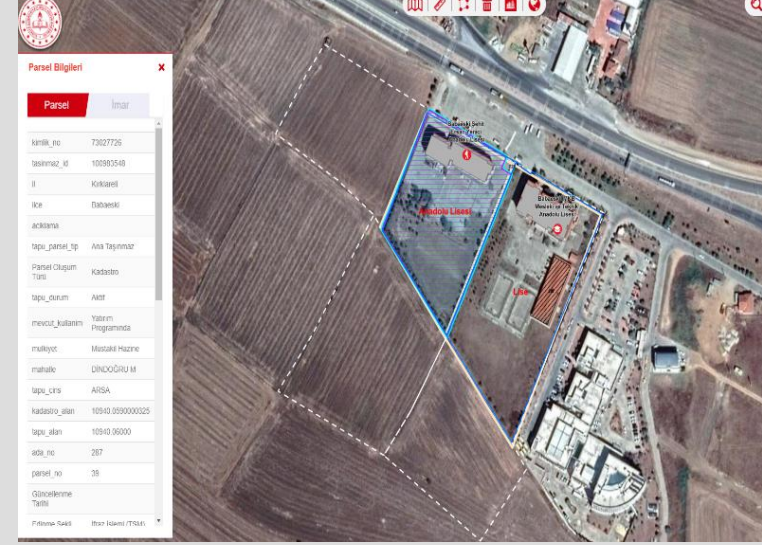



KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımcı kuruluş : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Adı : **Bilim Sanat Merkezi**

Yeri : **Merkez Hamidiye Mah.
1633 ada, 1 parsel**

Karakteristiği : **8 Derslik**

Finansman kaynağı : **Genel bütçe**

Başlama ve bitiş tarihi : **2017 – 2023**

Proje tutarı : **5.960.000,00**

İhale bedeli : **-**

Önceki yıllar harcaması : **0**

Program yılı ödeneği : **1.265.200,00**

Harcama : **0**

Fiziki durumu : **Proje Aşamasında**

Açıklamalar : **Zemin Etüdü Yaptırılacak ve
Güncel Yaklaşık Maliyeti
Hazırlanacaktır.**

Görseller





KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımcı kuruluş : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Görseller

Adı : **Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yık-Yap)**

Yeri : **Lüleburgaz Kurtuluş Mah. 418 ada, 31 parsel**

Karakteristiği : **24 Derslik + 3 Atölye + Spor Salonu**

Finansman kaynağı : **Genel Bütçe**

Başlama ve bitiş tarihi : **2015-2023**

Proje tutarı : **30.000.000,00**

İhale bedeli : **-**

Önceki yıllar harcaması : **36.108,00**

Program yılı ödeneği : **9.063.892,00**

Harcama : **46.020,00 (Deprem Perf.)**

Fiziki durumu : **İhale Hazırlık Aşamasında.**

Açıklamalar : Bakanlığımızdan ihale onayı alınmıştır. Proje Mimari Uygulama Projesinin Tamamlanması Beklenmektedir. Proje alanının Zemin Etüd İşlemi Yaptırılacak. 2021 yılı güncel yaklaşık maliyeti hazırlatılacak.





KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımcı kuruluş : İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Adı : **Mesleki ve Teknik Lise**

Yeri : Vize Devlet Mah. 45 ada,
232 parsel

Karakteristiği : **16 Derslik + Atölye**

Finansman kaynağı : **Genel Bütçe**

Başlama ve bitiş tarihi : **2016-2021**

Proje tutarı : **21.702.265,00**

İhale bedeli : **18.300.000,00+KDV**

Önceki yıllar harcaması : **108.235,00**

Program yılı ödeneği : **23.485.735,00**

Harcama : **14.542.138,00**

Fiziki durumu : **%80 Seviyesinde.**

Açıklamalar : **İnşaat Devam Ediyor.**

Görseller

Okul Binası



Atölye Binası





KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Yatırımcı kuruluş	: İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Adı	: OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Yeri	: Merkez Kızılcıkdere Mevkii 128 ada, 3 parsel
Karakteristiği	: 16 Derslik + 3 Atölye + Sp.SI
Finansman kaynağı	: Genel Bütçe
Başlama ve bitiş tarihi	: 2021 – 2023
Proje tutarı	: 28.800.000,00
İhale bedeli	: -
Önceki yıllar harcaması	: 0
Program yılı ödeneği	: 4.320.000,00
Harcama	: 0
Fiziki durumu	: Proje Aşamasında.
Açıklamalar	: Projenin ihale edilebilmesi için Bakanlığımızdan ihale izin onayı talep edilmiştir. Projenin Mimari Uygulama Projesi Hazırdır. Söz konusu proje alanının Zemin Etüd Şartnamesi Hazırlatılacak ve Zemin Etüd İşlemi Yaptırılacaktır. Güncel Yaklaşık Maliyeti Hazırlatılacaktır.

Görseller





KIRKLARELİ VALİLİĞİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü



Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürlüğü						
2021 Yılı Bakım-Onarımlar						
Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Bütçe Türü	Projenin yeri (İlçe)	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)
	GENEL TOPLAM:					15.090.000
	Ortaöğretim-Mesleki-H.E.M.(5 Okul / Kurum)					1.150.000
	Temel Eğitim Okulları (21 Okul-1 Okul İptal)					13.940.000
1	AHMET MİTHAT ORTAOKULU	Öİ	Merkez	2021	2021	110.000
2	ATATÜRK İLKOKULU	Öİ	Merkez	2021	2021	100.000
3	DOĞAN IŞIKALP İLKOKULU	Öİ	Merkez	2021	2021	105.000
4	İSTİKLAL ORTAOKULU	Öİ	Merkez	2021	2021	215.000
5	KARAHIDIR İLKOKULU	Öİ	Merkez	2021	2021	435.000
6	ÜSKÜP ATATÜRK İLKOKULU (EK BİNA)	Öİ	Merkez	2021	2021	425.000
7	KIRKŞEHİTLER İLKOKULU (EK BİNA) RESTORASYON	GB	Merkez	2021	2023	9.150.000
8	BAHÇELİEVLER İLKOKULU	Öİ	Lüleburgaz	2021	2021	230.000
9	BÜYÜKKARIŞTIRAN ORTAOKULU	Öİ	Lüleburgaz	2021	2021	255.000
10	DÜĞÜNCÜBAŞI İLKOKULU	Öİ	Lüleburgaz	2021	2021	150.000
11	DÜĞÜNCÜBAŞI ORTAOKULU	Öİ	Lüleburgaz	2021	2021	175.000
12	CUMHURİYET İLKOKULU	Öİ	Lüleburgaz	2021	2021	575.000
13	ALPULLU ŞEKER İLKOKULU	Öİ	Babaeski	2021	2021	180.000
14	ALPULLU ŞEKER ORTAOKULU	Öİ	Babaeski	2021	2021	260.000
15	BÜYÜKMANDIRA ATATÜRK İLKOKULU	Öİ	Babaeski	2021	2021	245.000
16	CUMHURİYET İLKOKULU	Öİ	Babaeski	2021	2021	195.000
17	BABAESKİ ORTAOKULU - İPTAL	Öİ	Babaeski	2021	2021	140.000
18	NAMIK KEMAL ORTAOKULU	Öİ	Vize	2021	2021	360.000
19	MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU	Öİ	Pınarhisar	2021	2021	195.000
20	YILDIZ ANAOKULU	Öİ	Pınarhisar	2021	2021	145.000
21	ATATÜRK İLKOKULU	Öİ	Pehlivanköy	2021	2021	190.000
22	ATATÜRK ORTAOKULU	Öİ	Pehlivanköy	2021	2021	105.000
23	DÜVENCİLER ANADOLU LİSESİ	GB	Lüleburgaz	2021	2021	461.000
24	PEHLİVANKÖY ANADOLU LİSESİ	GB	Pehlivanköy	2021	2021	169.000
25	YAHYA KEMAL BEYATLI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	GB	Merkez	2021	2021	295.000
26	İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ	GB	Babaeski	2021	2021	165.000
27	PEHLİVANKÖY HALK EĞİTİM MERKEZİ	GB	Pehlivanköy	2021	2021	60.000

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



13

Proje Sayısı

339.955.194

Toplam Proje Tutarı

31.454.423

Toplam Harcama Tutarı

48.954.689

Toplam Yıl Ödeneği

31.454.423

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

9.863.894

2.Dönem Harcama Tutarı

21.590.529

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%20,15

%44,10

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	0
LÜLEBURGAZ	8.479.530
MERKEZ	22.974.893
PEHLİVANKÖY	0
Toplam	31.454.423

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Sağlık	31.454.423
Toplam	31.454.423

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
SAĞLIK BAKANLIĞI	31.454.423
Toplam	31.454.423

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Tutarı
BABAESKİ GAZİOSMANPAŞA 4 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 AS...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	5.250.000	
BABAESKİ İLÇE SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ + AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (SHM + ...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	17.241.000	
KELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ (TOPLUM S...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ EK BİNA İNŞAATI (250 YATAKLI)	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	17.500.000	174.498.000	
KIRKLARELİ DOLHAN SAĞLIK EVİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	875.000	
KIRKLARELİ MERKEZ 6 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (4 AHB)	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1.750.000	
KIRKLARELİ SAĞLIK KOMPLEKSİ İNŞAATI (İDARİ HİZ. BİN. + MERKEZ TO...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	22.974.893	99.992.000	
L.BURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DONANIM MALZEMESİ ALIM	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	240.000	240.000	
L.BURGAZ ÖZDEN GÖKÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (4 AHB)	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
Toplam			48.954.689	339.955.194	



2021 YILI
KIRKLARELİ İLİ
SAĞLIK YATIRIMLARI
31.12.2021

KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TAMAMLANAN YATIRIMLAR (2 Adet)

- | | |
|---|---|
| 1 | Pınarhisar 112 ASHİ |
| 2 | Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği (Tadilatı Tamamlanmıştır) |

İNŞAAT AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR (3 Adet)

- | | |
|---|---|
| 1 | Kırklareli Sağlık Kompleksi (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi +Halk Sağlığı Laboratuvarı + Merkez ASM 6 Hekim+112 KKM+112 ASHİ |
| 2 | Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü +Sağlıklı Hayat Merkezi (A Tipi) +112 ASHİ+ Lüleburgaz 2 No'lu ASM (8 AHB) |
| 3 | Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi |

PROJE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR (6 Adet)

- | | |
|----|---|
| 6 | Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü+ Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +SHM+112 ASHİ |
| 7 | Babaeski Gaziosmanpaşa 112 ASHİ+ 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (4 Hekimli) |
| 8 | Kırklareli Merkez 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) |
| 9 | Dolhan Sağlık Evi |
| 10 | Lüleburgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+SHM (B Tipi)+112 ASHİ (2 Adet) |
| 11 | Lüleburgaz 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) |



TAMAMLANAN YATIRIMLAR



PINARHİSAR 112 ACİL YARDIM İSTASYON BİNASI



- Kapalı Alan** : 90 m²
İhale Tarihi : 02.10.2020
Sözleşme Tarihi : 21.12.2020
Yüklenici Firma : Kamil Yalçın Topkaya, Adalya Mimarlık Enerji İnşaat Turizm Gıda İletişim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Sözleşme Bedeli : 598.520 TL +KDV
İş Günü : 60 gün
Açıklama : 112 ASHİ İstasyon Binası İnşaat çalışmaları tamamlanmıştır. Geçici kabul işlemleri tamamlanma aşamasındadır. İnşaat Fiziki İlerleme % 99 seviyesindedir.

PINARHİSAR 112 ACİL YARDIM İSTASYON BİNASI





KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ




Açıklama : İlimiz mevcut Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi üniversite ile afiliasyon olduktan sonra daha iyi hizmet sunumu yapılabilmesi adına poliklinik ihtiyacı doğmuş olup ek poliklinikler planlanmıştır. Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine bağlı açılması planlanan Semt Polikliniğinin İlimiz, Merkez İlçesi, Yayla Mahallesi, 100 ada, 23 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan Eski Toplum Sağlığı Merkezi Binasında hizmet vermesi planlanmaktadır. Toplum Sağlığı Merkezi Eski Hizmet Binasının 2. ve 3 katı Müdürlüğümüz teknik elemanlarının desteği ile boya badanası ve tadilat işlemleri yapılmıştır. Psikolog, Diyetisyen, Çocuk Polikliniği , Dahiliye Polikliniği, Nöroloji Polikliniği, Genel Cerrahi Polikliniği, Endokrin Polikliniği, Psikiyatri Polikliniğinin hizmet vermesi planlanmaktadır. Ayrıca Adli Tıp Odası, Yönetici Odası (2 Adet),Doktor Dinlenme Odası, Personel Dinlenme Odası, Bekleme Odası, Rezerv, Oda, Röntgen Odası, Ultrason Odası, Emzirme Odası bulunacaktır. Sağlık Bakanlığından açılış onayı ile ilgili süreçler devam etmektedir.



İNŞAATI DEVAM EDEN YATIRIMLAR



KIRKLARELİ SAĞLIK KOMPLEKSİ
**(İDARİ HİZMET BİNALARI + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ +HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI+
MERKEZ 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU
BİNASI+TRSM+KREŞ)**

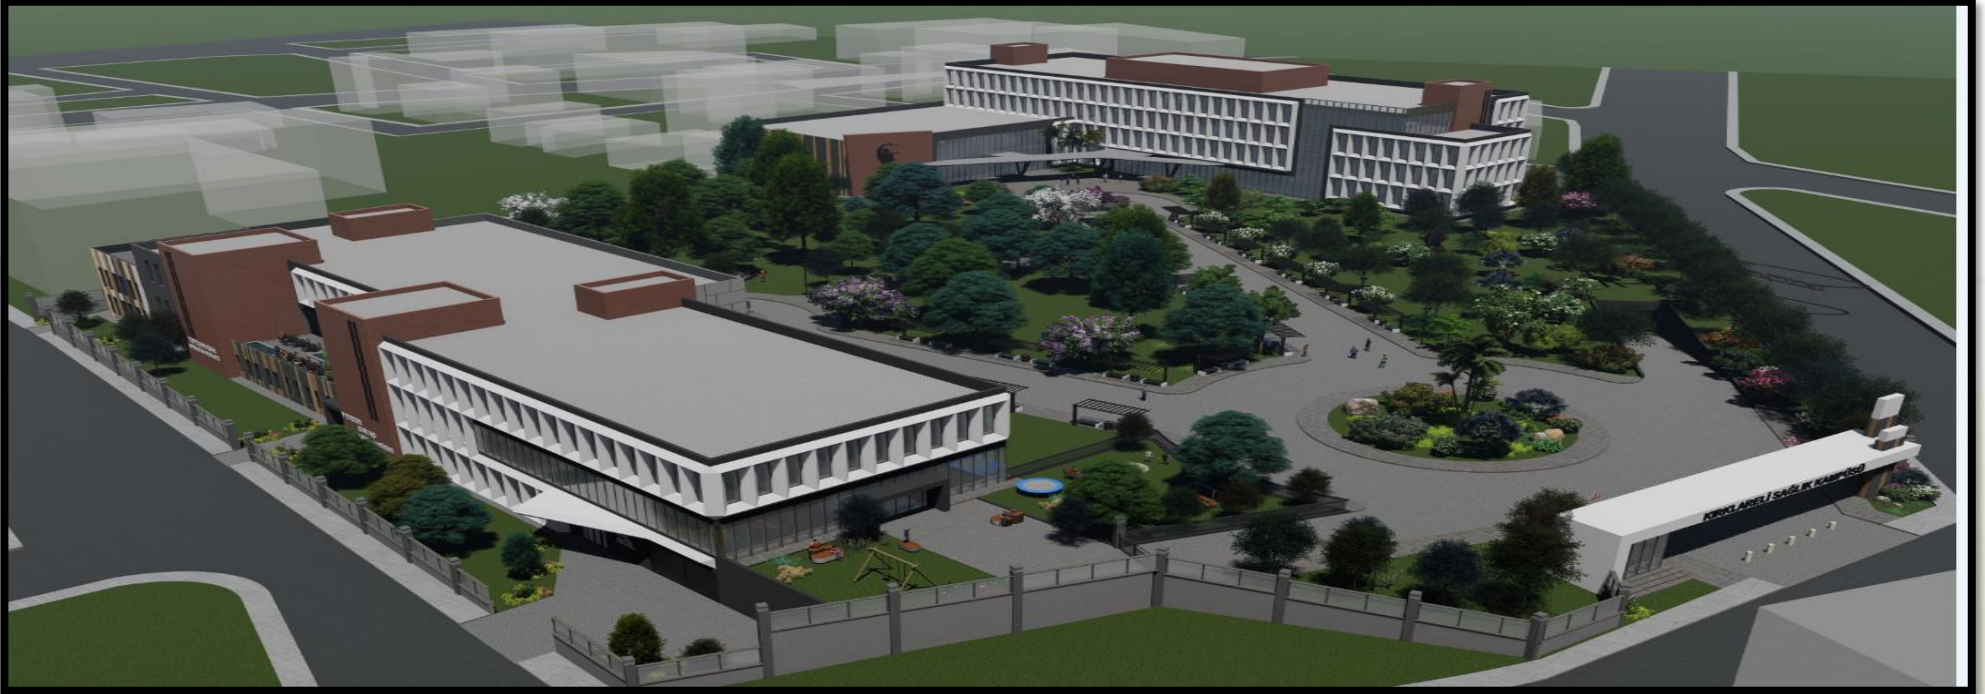

Kapalı Alan : A Blok :11.851,13 m² B Blok: 6.625,41 m² Toplam:18.477 m²

İhale Tarihi : 26.01.2021

Yer Teslim Tarihi : 17.02.2021

Yüklenici Firma : Şentürk İnş. Taah. Müh. Mim Gıda ve Tem Hizmet Nak Tic Ltd Şt- Hakan ŞENTÜRK İş Ortaklığı

Proje Tutarı : 99.992.020,00 (KDV Dahil)

Sözleşmeye Göre Bitiş Tarihi: 17.06.2023 **İş Günü:** 900 gün

Açıklama : İdari Hizmet Binası + Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu + Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin verileceği Sağlık Kompleksi İnşaatı A Blok otopark betonarme imalatları devam etmektedir. B Blok betonarme imalatları tamamlanmıştır. Duvar imalatları devam etmektedir. İnşaat fiziki ilerleme % 40 seviyesindedir.

KIRKLARELİ SAĞLIK KOMPLEKSİ (İDARİ HİZMET BİNALARI + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ +HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI+ MERKEZ 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUBİNASI+TRSM+KREŞ) A BLOK



KIRKLARELİ SAĞLIK KOMPLEKSİ (İDARİ HİZMET BİNALARI + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ + HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI+ MERKEZ 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUBİNASI+TRSM+KREŞ) B BLOK





LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 2 NO'LU ASM (8 AHB)+SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ (A TİPİ) +112 ASHİ



Kapalı Alan : 5.183,25 m²

İhale Tarihi : 01.02.2021

Yer Teslim Tarihi: 17.02.2021

Yüklenici Firma : Kılıçlar İnş Ltd Şti

Sözleşme Bedeli : 18.989.553,00 +KDV

İş Günü: 650 gün **Tahmini Bitiş Tarihi:** 01/09/2022

Açıklamalar : İlçe Sağlık Müdürlüğü +2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi+ Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 ASHİ Hizmet Binası İnşaatı 2 Kat duvar imalatı devam etmektedir. Mekanik elektrik imalatları altyapı hatları devam etmektedir .3.kat tabliye imalatı tamamlanmıştır.4.(Son) Kat kolon perde tabliye imalatı başlamıştır.İnşaat Fiziki ilerleme % 45 seviyesindedir.

**LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 2 NO'LU ASM (8 AHB)+SAĞLIKLI HAYAT
MERKEZİ (A TİPİ) +112 AŞİ**





LÜLEBURGAZ 4 HEKİMLİ ÖZDEN GÖKÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (BAĞIŞ)



Kapalı Alan : 421,48 m²

Protokol Tarihi : 24.08.2021

İnşaat Ruhsatı Tarihi : 22.09.2021

İnşaat Başlama Tarihi : 04.10.2021

Açıklamalar : *Hayırsever Miktat Gökçe tarafından yaptırılacak "Özden GÖKÇE 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi"ne ait yapım iş birliği protokolü 24 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır. 11/10/2021 tarihinde temel atma töreni yapılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir. 3. kat son betonu dökülecek olup çatı imalatına başlanacaktır. İnşaat Fiziki ilerleme % 45 seviyesindedir.



LÜLEBURGAZ 4 HEKİMLİ ÖZDEN GÖKÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (BAĞIŞ)





PROJE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR



LÜLEBURGAZ 1 NO'LU 8 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ B TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+112 AŞİ (2 ADET) PROJE GÖRSELİ



Açıklama : Lüleburgaz İlçesi Kocasinan Mahallesinde bulunan mevcut eski ASM binasının yıkılarak bulunduğu arsa üzerine 4.209,65 m² kapalı alanlı yeni hizmet binası yapılması planlanmaktadır. Uygulama proje revizyon çalışmaları tamamlanma aşamasındadır.



BABAESKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +8 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ASHİ+ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ (B TİPİ) (PROJE GÖRSELİ)



Açıklama: Eski Babaeski Devlet Hastanesinin bulunduğu arsa üzerine 5.311,34 m² kapalı alanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü + 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ ve Sağlıklı Hayat Merkezinin Hizmet vereceği yeni hizmet binası yapılması planlanmaktadır. Uygulama proje revizyonları tamamlanma aşamasındadır.



LÜLEBURGAZ 6 NOLU 8 AHB AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI



Ada/Parsel	:167/2
Kapalı Alan	: 682,5 m2
Kat Sayısı	: Z+1 NK
Açıklamalar	: Avan Projeleri tamamlanmıştır. Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir.



BABAESKİ GAZİOSMANPAŞA 112 ACİL SAĞLIK İSTASYONU+4 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (4 AHB)



Ada/Parsel	:998/2
Kapalı Alan	: 595,10 m ²
Kat Sayısı	: 1 NK
Açıklamalar	: Avan Projeleri tamamlanmıştır. Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir.



MERKEZ DOLHAN SAĞLIKEVİ+LOJMAN BİNASI



Ada/Parsel :153/6

Arsa Yüzölçümü : 723,93 m²

Kapalı Alan : 100 m²

Kat Açıklamalar : Avan projeleri tamamlanmıştır. Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir.



MERKEZ 6 NOLU PINAR MAHALLESİ (4 AHB) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ



Ada/Parsel :1877/1

Arsa Yüzölçümü : 1275,11 m²

Kapalı Alan :446 m²

Açıklamalar : Avan Projeleri tamamlandı. Uygulama proje çalışmaları devam etmektedir.



ARSA AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR



KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 250 YATAKLI EK BİNA



Açıklama:

Milli Savunma Bakanlığına Tahsisli 430 Ada 56 Parsel No'lu taşınmazın 200.000 m² alanının Bakanlığımıza tahsisi ile ilgili süreçler devam etmektedir.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

8.859.972

8.859.969

4

Proje Sayısı

295.000.000

Toplam Proje Tutarı

101.803.966

Toplam Harcama Tutarı

8.859.972

Toplam Yıl Ödeneği

8.859.969

Yılı Harcama Tutarı

2.000.000

1.Dönem Harcama Tutarı

5.927.226

2.Dönem Harcama Tutarı

932.743

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%22,57

%66,90

%10,53

%0,00

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	101.803.966
Toplam	101.803.966

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	101.803.966
Toplam	101.803.966

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	101.803.966
Toplam	101.803.966

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Ö
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. KISIM ALTYAPI İNŞAATI	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	8.859.969	105.000.000	
LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI ...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	140.000.000	
LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	40.000.000	
LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI (KANA...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	10.000.000	
Toplam			8.859.972	295.000.000	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜ...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

2.603.023

2.602.356

4

Proje Sayısı

2.603.023

Toplam Proje Tutarı

2.602.356

Toplam Harcama Tutarı

2.603.023

Toplam Yıl Ödeneği

2.602.356

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

129.541

2.Dönem Harcama Tutarı

268.390

3.Dönem Harcama Tutarı

2.204.425

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%4,98

%10,31

%84,69

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	2.602.356
Toplam	2.602.356

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	2.592.359
İmalat	9.997
Toplam	2.602.356

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	2.602.356
Toplam	2.602.356

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yılı
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.221.152	2.221.152	
GIDA HİZMETLERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	9.997	9.997	
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	363.366	363.366	
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	8.508	8.508	
Toplam			2.603.023	2.603.023	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE T...

Harcama Yılı

2021

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

494.984

494.984

1

Proje Sayısı

1.077.482

Toplam Proje Tutarı

872.484

Toplam Harcama Tutarı

494.984

Toplam Yıl Ödeneği

494.984

Yılı Harcama Tutarı

110.982

1.Dönem Harcama Tutarı

134.018

2.Dönem Harcama Tutarı

127.000

3.Dönem Harcama Tutarı

122.984

4.Dönem Harcama Tutarı

%22,42

%27,08

%25,66

%24,85

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	872.484
Toplam	872.484

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	872.484
Toplam	872.484

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	872.484
Toplam	872.484

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam
ARAŞTIRMA PROJELERİ	KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	
Toplam			



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ATATÜRK TOPRAK SU ve TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: İstanbul Yolu Üzeri 4. Km.

Tel: 0 288 214 2026

E-Posta : kirklarelitopraksu@tarimorman.gov.tr

KEP : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr



SUYUN GÜCÜ
MİLLETLE BULUŞUYOR



E-TARIM
PORTALI



TARIMDA
DİJİTAL DÖNÜŞÜM
HAMLESİ



GELECEĞE
NEFES

GIDANI KORU
SOFRANA SAHİP ÇIK



DİJİTAL
TARIM PAZARI



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

AR-GE Projeleri

- Ulusal Ürün İzleme ve Verim Tahmini
- Trakya Bölgesinde Palmer Kuraklık Şiddet İndisinin Buğday Bitkisi İçin Yeniden Modellenmesi
- Çeltik Tarımından Kaynaklı Sera Gazlarının Hesaplanması ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi
- Trakya Yöresinde FAO-SHARP Aracı ile İklim Değişikliği Dayanıklılığının Değerlendirilmesi
- Yavaş Salınlımlı Azotlu Gübreler ve Azaltılmış Dozlarının Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri
- Trakya Bölgesinde Çeltikte Yüzeyüstü ve Yüzeyaltı Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması
- Trakya Yöresinde Yapay Sinir Ağları ile Kuraklık Tahmini ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması
- Kırklareli İlinde Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politikalarının Araçlarının Geliştirilmesi
- TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Altyapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Ulusal Ürün İzleme ve Verim Tahmini

Proje Bütçesi: 187500

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2016-2021

Projenin Amacı: Bu araştırmada, Ergene Havzasında yaygın olarak yetiştirilen bitkilerden olan ayçiçeği için 5 yıl boyunca iklim koşulları, toprak özellikleri, bitki yetiştiriciliği ve verime etki eden faktörler incelenecektir. Bitki gelişim modeli ile hesaplanan veriler, uydu görüntüleri ve arazi çalışmaları ile elde edilen verilerle karşılaştırılacaktır. Gerçek bitkisel verim değerleri, tahmin edilen verim değerlerinin sınanmasında kullanılacaktır.

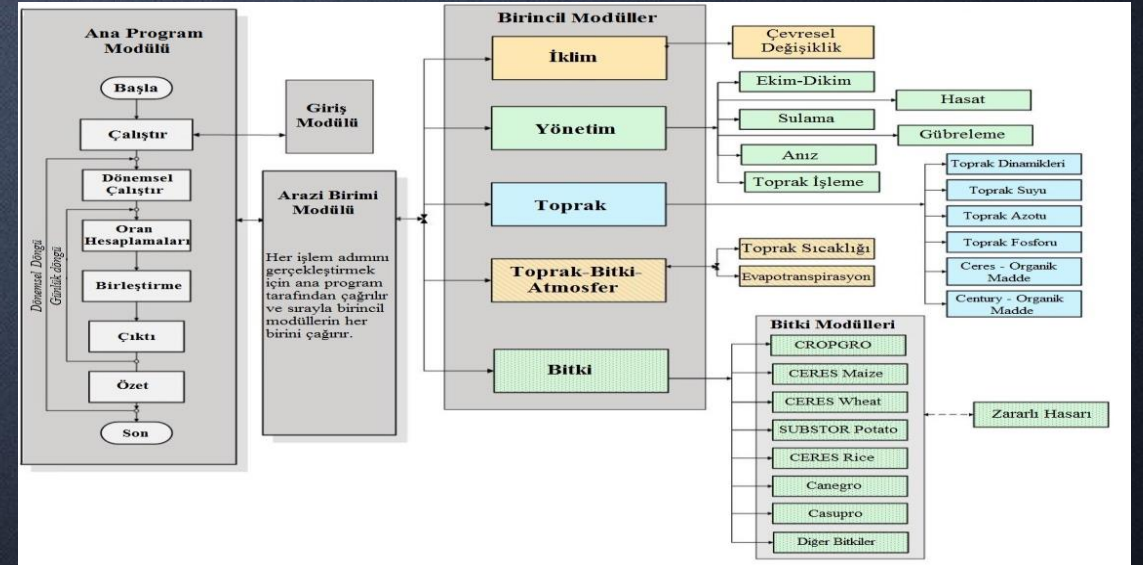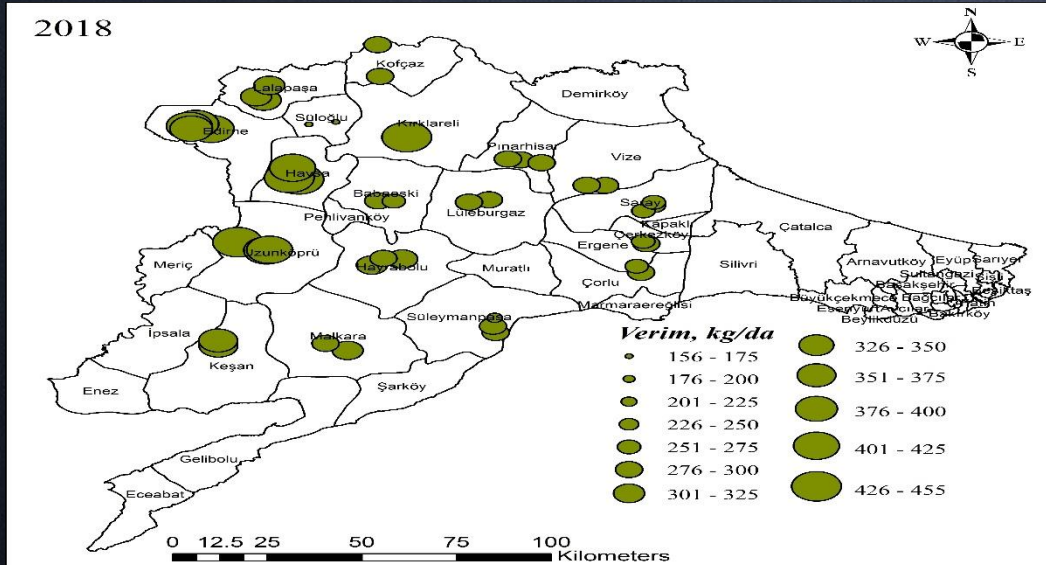



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Trakya Yöresinde Yapay Sinir Ağları ile Kuraklık Tahmini ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması

Proje Bütçesi: 20000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2020-2021

Projenin Amacı: Bu çalışmada, Kuraklık ise Standart Yağış İndisi (SYİ) ile değerlendirilecektir. SYİ yağmur verilerinden elde edilmesi ve hesaplaması kolay olduğu için bu çalışmada Trakya yöresi için kuraklık değerlendirmesinde kullanılacaktır. Kuraklığın yol açtığı zararı minimuma indirmek için yapay sinir ağları kullanılarak etkili bir kuraklık tahmini planlaması gerekmektedir.

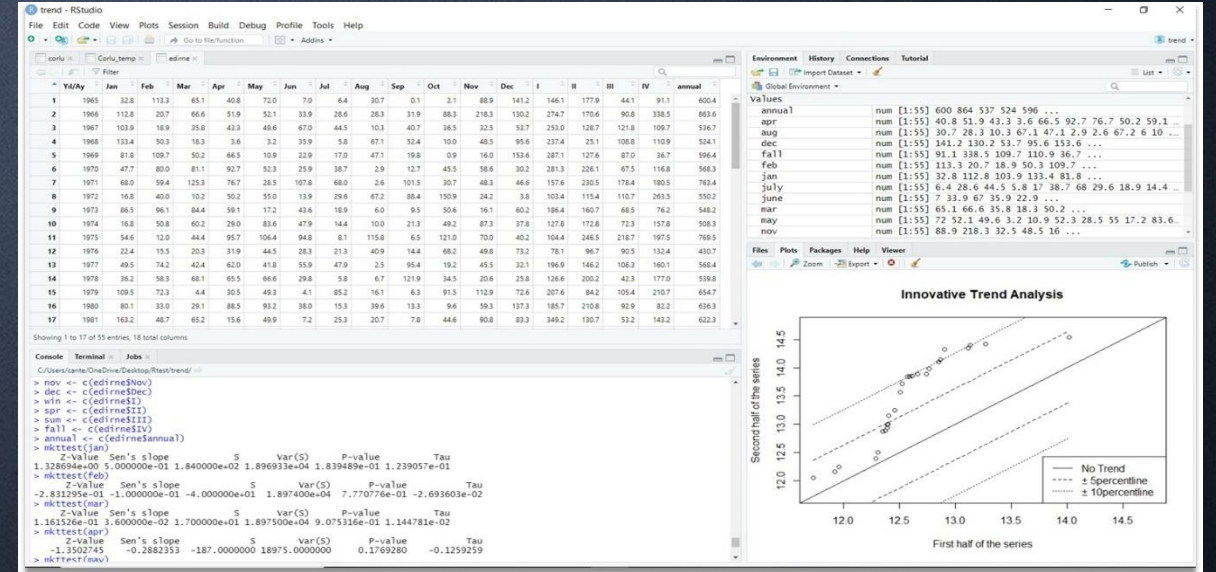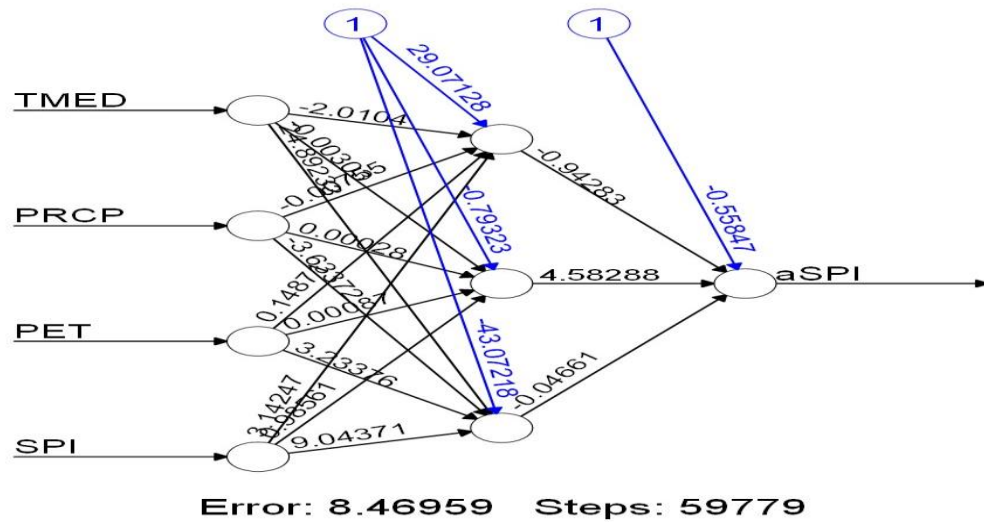



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Trakya Bölgesinde Palmer Kuraklık Şiddet İndisinin Buğday Bitkisi İçin Yeniden Modellenmesi

Proje Bütçesi: 80000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2024

Projenin Amacı: Bu proje ile kuraklığın buğday üzerindeki fizyolojik etkileri gözlemlenerek, toprak nem içeriği takip edilerek ve hesaplamada kullanılabilecek en uygun bitki su tüketimi yöntemi dikkate alınarak düzenlenecektir. Bu sayede Trakya tarımının önemli bir ürünü olan buğday için geliştirilmiştir bir kuraklık indisi elde edilecektir.





T.C.


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Çeltik Tarımından Kaynaklı Sera Gazlarının Hesaplanması ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi

Proje Bütçesi: 280000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2023

Projenin Amacı: Çeltik tarımından kaynaklı sera gazlarının azaltımı çalışmalarının yapılması uygun arazi yönetimi sisteminden geçmekte ama öncelikle durum tespiti yapılabilmesi için envanter çıkarılması gerekmektedir. Bu envanter hesaplamalarında kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Arazi de pratikliği ve ekonomik şartlar göz önüne alındığında uygulamada en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Kapalı Manuel Chamber(odacık) metodu ile örnek alınması ve gaz kromografi cihazı ile örnekler analiz edilerek çeltik tarımından kaynaklı sera gazlarının hesaplanması bu projenin amacıdır.

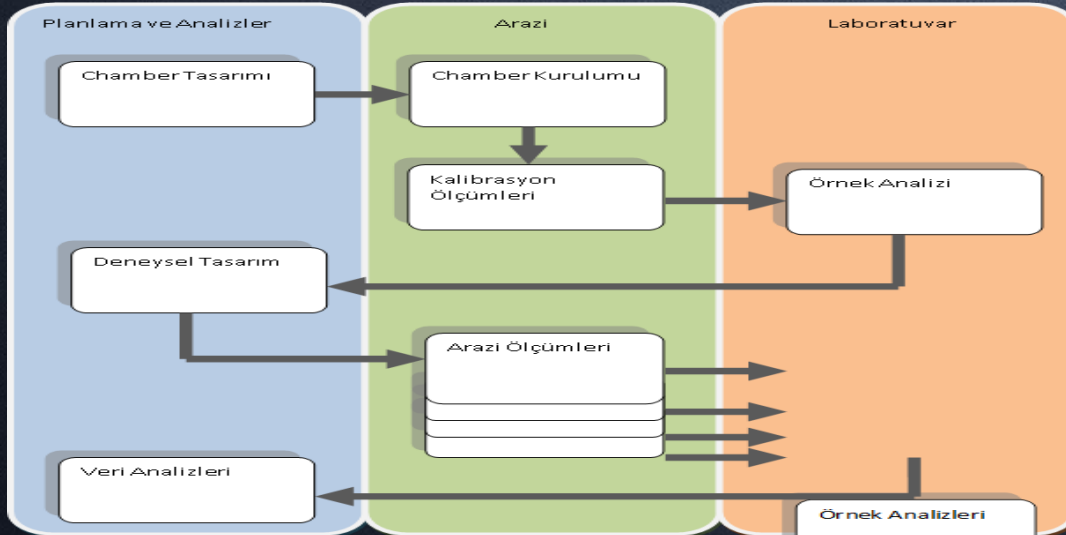



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Trakya Yöresinde FAO-SHARP Aracı ile İklim Değişikliği Dayanıklılığının Değerlendirilmesi

Proje Bütçesi: 100000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2022

Projenin Amacı: Mevcut iklim değişkenliği göz önüne alındığında, küçük üreticileri bilgilendirmek ve güçlendirmek için iklim dayanıklılığının ölçülmesi ve izlenmesi gereklidir. Dayanıklılığı ölçmenin başka yolları bulunsa da, bunlar küçük çiftlik sistemlerinde ölçülememektedir. FAO tarafından geliştirilen yeni SHARP aracı, üreticilerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak iklim direncini iyileştirici faaliyetlerin bir şekilde tanımlanmasına, ölçülmesine ve önceliklendirilmesine izin vermektedir. Bu uygulamada, iklim değişikliğinden dolayı oluşabilecek tehditleri ve fırsatları anlamak ve tartışmak için çiftçilere ve göçerlere yardım etmeyi ve ortalama dayanıklılığı geliştirmek için bireysel ve kolektif eylemleri önceliklendirmeyi hedeflemektedir.



SHARP anketi (gözden geçirilmiş sürüm)

Mevcut 40 temalı anket, 2014 yılında geliştirilen ve son 2 yılda pilotluk yapılan 54 soru SHARP standart formunun gözden geçirilmesinin bir sonucudur.

Tema adından önceki yıldız işaretleri (*), Cabelli ve Oelefse (2012) tarafından geliştirilen 13 tarımsal ekosistem gösterge çerçevesini izleyerek esneklik değerlendirmesi için kapsanması gereken modülleri göstermektedir.

Anketin tamamı beş bölüme ayrılmıştır:

- agronomik uygulamalar (gri),
- çevresel yönler (yeşil),
- sosyal etkileşimler (mavi),
- ekonomik bileşenler (kırmızı); ve,
- yönetim (sarı).result of the review of the 54 question SHARP standard form initially developed in 2014 and piloted in the last 2 years.

* 1. Genel Bilgiler	
* Katılımcının adı	Sarıyer SAK
* Katılımcının cinsiyeti	Erkek
* Katılımcının yaşı	15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-60; 61+
* Hanehalkı lideri kimdir?	Gen
* Evde başka bir karar verici var mı?	Hayır
* Coğrafi konum	Kırklareli / Kocaeli
* İl/Bölge	Kırklareli
* İlçe	Kocaeli
* Köy/topluluk	Kocaeli
* GPS	Enlem
* Ankete bağlama tarihi	22.11.2021



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Yavaş Salınlımlı Azotlu Gübreler ve Azaltılmış Dozlarının Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri

Proje Bütçesi: 95000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2023

Projenin Amacı: Azot, mısır bitkisinin sağlıklı büyümesi için mutlak gerekli bir besin elementidir. Gübreleme ile toprağa verilen azot elementinden; yıkanma, denitrifikasyon gibi durumlara bağlı olarak kayıplar yaşanmaktadır. Bu kayıpların azaltılması amacıyla, gübreleme derinliği ile yavaş salınlımlı azotlu gübrelerin mısır bitkisinde etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Trakya Bölgesinde Çeltikte Yüzeyüstü ve Yüzeyaltı Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım Olanaklarının Araştırılması

Proje Bütçesi: 100000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2019-2021

Projenin Amacı: Çeltik ekim alanlarındaki sulamadan kaynaklı enerji tasarrufu konusunda ciddi önlemlerin alınması gerekliliğinin yanında, sulanan alanlarda yaşanan yabancı ot sorunları da dahil olmak üzere karşılaşılan sorunlar konusunda AR-GE çalışmalarının yapılması ve sonuçların olumlu çıkması durumunda ilgili birimlerce su kullanıcılarına yönelik teşvik çalışmalarının yapılması hususu gündeme gelmiştir. Bu kapsamda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü talebi ve Genel Müdürlüğümüz koordinatörlüğünce Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanılması ve yaygınlaştırılması kapsamında ülkesel bir proje programa alınmıştır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Kırklareli ilinde Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politikalarının Araçlarının Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 110000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri:2020-2022

Projenin Amacı: Bu projede, Kırklareli ilinde tarımsal işletmelerin mekanizasyon planlamasının yapılması amaçlanmıştır. Tarım işletmeleri için farklı makine setleri oluşturulacak ve her makine seti için işletme arazisi büyüklüğü değişken olarak alınacak ve karı maksimize eden ürün deseni belirlenecektir.





TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Altyapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi

Proje Bütçesi: 104982

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2022

Projenin Amacı: TAGEM tarafından yürütülmekte olan bu uygulamanın amacı, enstitü ve istasyon bünyesindeki tarımsal üretim alanlarının sulama altyapılarının iyileştirilmesi ve modernize edilmesidir.



