



T.C. KIRKLARELİ VALİLİĞİ



Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

11 Ocak 2023

Katılımcı Listesi

- | | | |
|---|--|---|
| 1 Babaeski Kaymakamlığı | 1 0090 İl Müftülüğü | 29 1504 Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Md.lüğü |
| 2 Demirköy Kaymakamlığı | 2 0201 Aile ve Sosyal Hiz. İl Md.lüğü | 30 1505 DSI 11. Bölge Md.lüğü |
| 3 Kofçaz Kaymakamlığı | 3 0302 Çalışma ve İş Kurumu İl Md.lüğü | 31 1505 DSI 112. Sube Md.lüğü |
| 4 Lüleburgaz Kaymakamlığı | 4 0302 Sosyal Güvenlik İl Md.lüğü | 32 1506 İstanbul Orman Bölge Md.lüğü |
| 5 Pehlivan köy Kaymakamlığı | 5 0401 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Md.lüğü | 33 1507 Kırklareli Orman İşletme Md.lüğü |
| 6 Pınarhisar Kaymakamlığı | 6 0402 Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Md.lüğü | 34 1508 Demirköy Orman İşletme Md.lüğü |
| 7 Vize Kaymakamlığı | 7 0402 Kadastro Md.lüğü | 35 1509 Vize Orman İşletme Md.lüğü |
| 8 3000 İl Özel İdaresi | 8 0404 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü | 36 1510 L.burgaz Fidanlık Md.lüğü |
| 9 3001 Kırklareli Belediye Bşk.lığı | 9 0405 Meteoroloji Md.lüğü | 37 1503 TMO Başmüdürlüğü |
| 10 3002 İnece Belediye Bşk.lığı | 10 0601 BOTAŞ Şube Md.lüğü | 38 1701 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü |
| 11 3003 Kavaklı Belediye Bşk.lığı | 11 0602 MTA Marmara Bölge Md.lüğü | 39 1701 Karayolları 15. Şube Şefliği |
| 12 3004 Üsküp Belediye Başkanlığı | 12 0603 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü | 40 1702 PTT Başmüdürlüğü |
| 13 3005 Babaeski Belediye Bşk.lığı | 13 0604 TP Trakya Bölge Md.lüğü | 41 1703 TCDD 1. Bölge Md.lüğü |
| 14 3006 Alpullu Belediye Bşk.lığı | 14 0701 Gençlik ve Spor İl Md.lüğü | 42 1704 Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Md.lüğü |
| 15 3007 Büyükmandıra Belediye Bşk.lığı | 15 0801 Defterdarlık | 43 2900 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü |
| 16 3008 Karahalil Belediye Bşk.lığı | 16 1001 İl Afet ve Acil Durum Md.lüğü | 44 TREDAS Kırklareli İşletme Md.lüğü |
| 17 3009 Demirköy Belediye Bşk.lığı | 17 1001 İl Kültür ve Turizm Md.lüğü | |
| 18 3010 İğneada Belediye Bşk.lığı | 18 1002 Edirne Vakıflar Bölge Md.lüğü | |
| 19 3011 Kofçaz Belediye Bşk.lığı | 19 1101 İl Milli Eğitim Md.lüğü | 1 Kırklareli Baro Bşk.lığı |
| 20 3012 Lüleburgaz Belediye Bşk.lığı | 20 1301 İl Sağlık Md.lüğü | 2 Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası |
| 21 3013 Ahmetbey Belediye Bşk.lığı | 21 1401 Sanayi ve Teknoloji İl Md.lüğü | 3 Babaeski Ticaret ve Sanayi Odası |
| 22 3014 Büyükkarıştıran Belediye Bşk.lığı | 22 1402 Trakya Kalkınma Ajansı | 4 Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası |
| 23 3015 Evrensekiz Belediye Bşk.lığı | 23 1403 Kırklareli OSB Müdürlüğü | 5 Kırklareli Ticaret Borsası |
| 24 3016 Pehlivan köy Belediye Bşk.lığı | 24 1403 Büyükkarıştıran OSB Müdürlüğü | 6 Babaeski Ticaret Borsası |
| 25 3017 Pınarhisar Belediye Bşk.lığı | 25 1403 Evrensekiz OSB Müdürlüğü | 7 Lüleburgaz Ticaret Borsası |
| 26 3018 Kaynarca Belediye Bşk.lığı | 26 1501 İl Tarım ve Orman Md. lüğü | 8 Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği |
| 27 3019 Vize Belediye Bşk.lığı | 27 1502 Atatürk TSTMA Enstitüsü Md.lüğü | |
| 28 3020 Çakıllı Belediye Bşk.lığı | 28 1504 Tarım ve Orman Bakanlığı 1. Böl. Md.lüğü | |
| 29 3021 Kırıkköy Belediye Bşk.lığı | | |



Gündem

Vali Birol EKİCİ'nin Açılış Konuşması
Kuruluşların 2022 Yılı Yatırımları ve İl Afet Risk
Azaltma Planıyla ilgili Çalışmaları Hakkında Bilgi
Vermesi
Kapanış

Görüşme Sırası

- 1 Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü
- 2 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü
- 3 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü
- 4 Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü
- 5 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
- 6 Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü
- 7 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
- 8 MTA Marmara Bölge Müdürlüğü
- 9 TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü
- 10 TP Trakya Bölge Müdürlüğü
- 11 Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü
- 12 İl Özel İdaresi
- 13 Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü
- 14 Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü
- 15 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- 16 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 17 İl Sağlık Müdürlüğü
- 18 Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- 19 İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
- 20 Atatürk TSTMA Enstitüsü Müdürlüğü

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2022

İl Adı

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

H

261

Toplam Proje Sayısı

12.711.353.829

Toplam Proje Tutarı

3.341.196.575

Toplam Yıl Ödeneği

%49,24


Nakdi Gerçekleşme Oranı

%50,07

Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

%94,64

Yılı Harcama Oranı

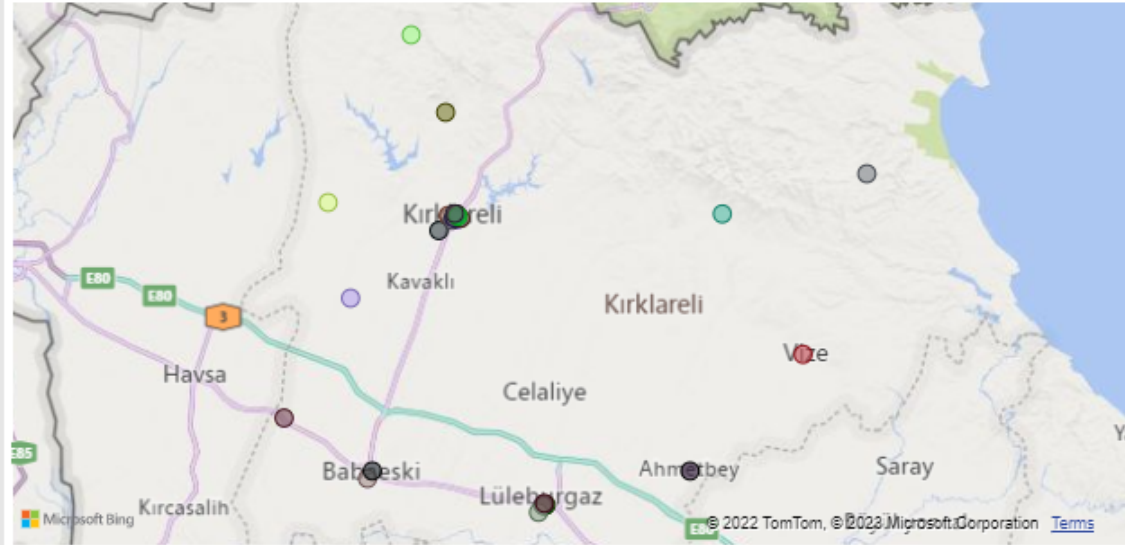

Proje Sektörü	Proje Sayısı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	10
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	78
Eğitim	46
Enerji	13
İmalat	2
Konut	2
Toplam	261

Proje Yeri İlçe	Toplam Proje Tutarı	Proje Sayısı
BABAESKİ	241.099.302	27
DEMİRKÖY	70.438.231	11
KOÇGAZ	25.413.227	2
LÜLEBURGAZ	1.376.698.208	57
MERKEZ	3.328.438.206	75
MUHTELİF İLÇE	7.238.592.338	46
Toplam	12.711.353.829	261

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı
BÜYÜKKARŞIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	4.344.960	4.344.960	0	
PEHLİVANKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	3.098.304	16.956.000	0	
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	100.000	704.861	0	
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	7	1.884.618	34.702.646	0	
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	22	53.070.295	1.279.368.158	68.737.142	
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	18	100.445.023	1.440.109.666	31.214.680	
Toplam	261	3.341.196.575	12.711.353.829	3.097.492.501	

Bakanlık Adı
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Toplam

Proje Sektörü	Proje Sayısı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	10
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	78
Eğitim	46
Enerji	13
İmalat	2
Konut	2
Madencilik	7
Sağlık	18
Tarım	37
Toplam	261

261

Proje Sayısı

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Sık Takip Edilen Mi

Tümü

Proje İzlemede Mi?

E


H

Proje Sayısı

Proje Tutarı

Yıllar İtibariyle Sektörel Dağılım (Proje Sayısı)

Harcama Yılı ● 2022

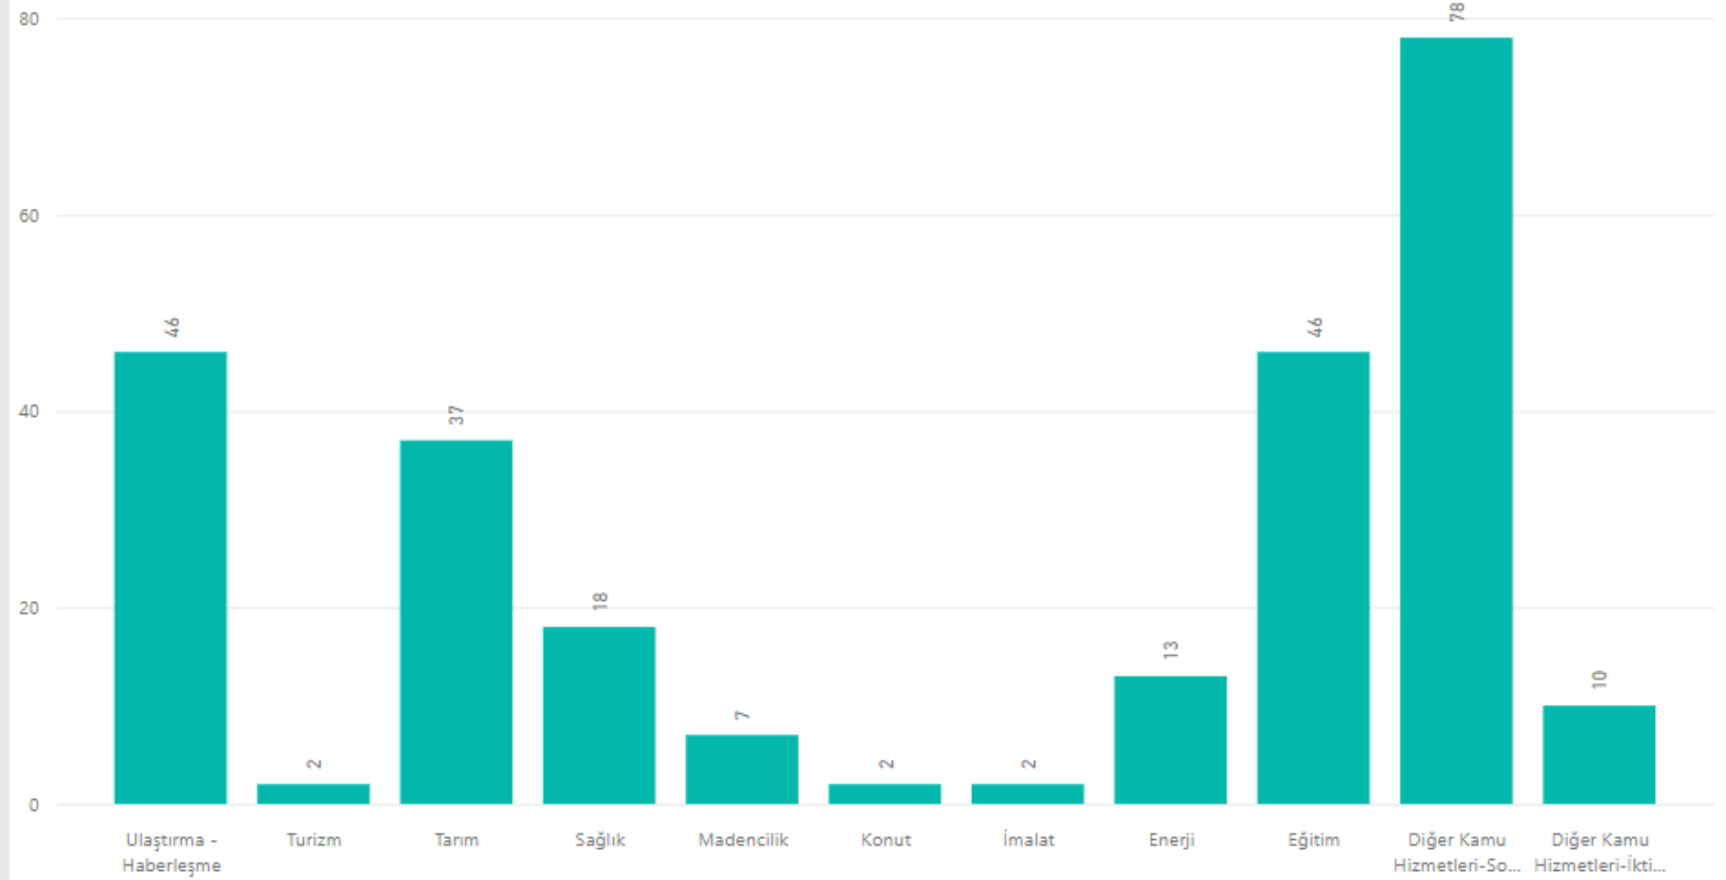

Yıllara Göre Karşılaştırma

Sektöre Göre Karşılaştırma

İlçe Bazında Dağılım

Sektörel Dağılım

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2022

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

H

İlçe	Toplam Proje Tutarı	Proje Sayısı
BABAESKİ	241.099.302	27
DEMİRKÖY	70.438.231	11
KOÇAZ	25.413.227	2
LÜLEBURGAZ	1.376.698.208	57
MERKEZ	3.328.438.206	75
MUHTELİF İLÇE	7.238.592.338	46
PEHLİVANKÖY	18.132.094	6
PINARHİSAR	214.357.540	18
Toplam	12.711.353.829	261

261

Toplam Proje Sayısı

12.711.353.829

Toplam Proje Tutarı

3.341.196.575

Toplam Yıl Ödeneği

%49,24


Nakdi Gerçekleşme Oranı

%94,64

Yılı Harcama Oranı

Proje Sektörü	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Ulaştırma - Haberleşme	46	1.883.726.987	7.176.516.439	2.624.461.140	1.861.705.093	4.486.166.233	
Sağlık	18	100.445.023	1.440.109.666	31.214.680	100.374.943	131.589.623	
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	78	507.795.890	1.439.190.226	266.461.130	450.402.785	716.863.915	
Tarım	37	73.446.698	1.301.645.170	69.217.142	59.950.953	129.168.095	
Eğitim	46	245.858.812	636.904.007	65.440.639	180.523.555	245.964.194	
Madencilik	7	442.416.202	447.569.200	2.124.000	439.715.534	441.839.534	
Enerji	13	71.881.605	235.129.703	19.909.710	54.968.694	74.878.404	
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	10	13.822.142	30.986.202	17.164.060	12.902.170	30.066.230	
Konut	2	346.823	1.846.823	1.500.000	337.202	1.837.202	
Turizm	2	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	
Toplam	261	3.341.196.575	12.711.353.829	3.097.492.501	3.162.077.322	6.259.569.823	

Toplam Proje Sayısı

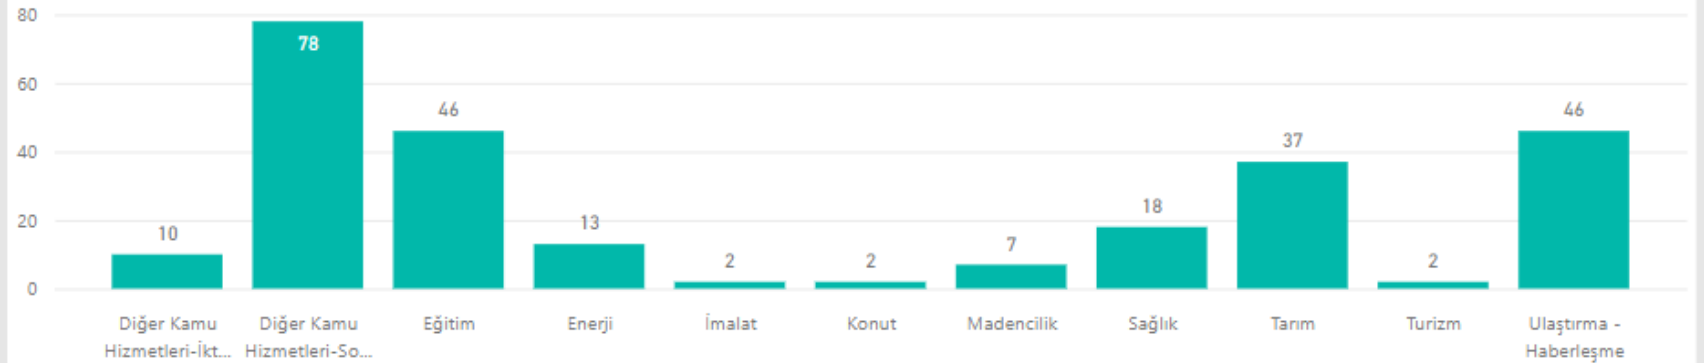

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

H

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

3.341.196.575

3.162.077.322

261

Proje Sayısı

12.711.353.829

Toplam Proje Tutarı

6.259.569.823

Toplam Harcama Tutarı

3.341.196.575

Toplam Yıl Ödeneği

3.162.077.322

Yılı Harcama Tutarı

192.001.579

1.Dönem Harcama Tutarı

598.318.168

2.Dönem Harcama Tutarı

698.800.697

3.Dönem Harcama Tutarı

1.672.956.878

4.Dönem Harcama Tutarı

%5,75

%17,91

%20,91

%50,07

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	70.245.672
DEMİRKÖY	26.424.089
KOÇAZ	9.719.989
LÜLEBURGAZ	357.608.871
MERKEZ	1.332.978.180
MUHELİF İLÇE	4.246.395.029
PEHLİVANKÖY	1.000.000
PINARHİSAR	116.140.667
Toplam	6.259.569.823

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	4.486.166.233
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	716.863.915
Madencilik	441.839.534
Eğitim	245.964.194
Sağlık	131.589.623
Tarım	129.168.095
Enerji	74.878.404
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	30.066.230
Toplam	6.259.569.823

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	4.395.032.091
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	514.593.938
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	305.470.698
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	268.078.111
YEREL YÖNETİMLER	238.409.845
SAĞLIK BAKANLIĞI	131.589.623
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	129.754.590
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	87.143.274
Toplam	6.259.569.823

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu
(BABAESKİ-HAMİTABAT) BRŞ N.-LÜLEBURGAZ ENERJİ İLETİM HATTI	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında
(EDİRNE - HAVSA) AYRIMI - HASKÖY - KIRKLARELİ BÖLÜNMÜŞ YOLU (2...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
(KIRKLARELİ-PINARHİSAR) BRŞ. N.-KIRKLARELİ OSB EİH	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında
(PINARHİSAR - TRAÇİM) BRŞ. N. - PAGDER ASLAN OSB EİH (TTFO)	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında
(PINARHİSAR-VİZE) AYR.-DEMİRKÖY-İÇNEADA DEVLET YOLU YAPIMI (9...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor
ACİL ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti
AHMETBEY ŞEHİRİÇİ TRETUVAR DÜZENLEMESİ	AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Bitti
AHMETBEY ŞEHİRİÇİ YOLLARI STABİLİZE KAPLAMA YAPIMI	AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Bitti
ALPULLU ŞEHİRİÇİ YOLLARI PARKE TAŞ KAPLAMASI	ALPULLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	Bitti
Toplam		

Yatırımcı Kuruluş Dağılımı

Arama Filtreleri

Proje Yeri İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2022

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

H

YİKOB/Özel İdare/D...

Tümü

KIRDES Projesi Mi?

Tümü

KÖYDES Projesi Mi?

Tümü

IRAP Projesi Mi?

Tümü

196

Toplam Proje Sayısı

12.437.662.021

Toplam Proje Tutarı

3.232.658.346

Toplam Yıl Ödeneği

%48,84

Nakdi Gerçekleşme Oranı

%95,91

Yılı Harcama Oranı

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	22	53.070.295	1.279.368.158	68.737.142
İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	20	201.880.561	266.800.671	51.629.191
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	6	9.503.000	9.503.000	0
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	6	1.103.698.715	2.841.299.059	456.500.338
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	7	1.884.618	34.702.646	0
KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	1	1.374.001	2.644.750	480.000
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	4	28.287.222	28.287.222	0
KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	17	79.933.933	200.932.529	20.806.196
KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	2	2.010.167	2.010.167	0
KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	6	11.724.356	13.324.356	93.692
KIRKLARELİ İL MÜHÜR VE İKLİM MÜDÜRLÜĞÜ	12	11.066.030	3.160.675	11.733.534
Toplam	196	3.232.658.346	12.437.662.021	2.974.249.012

Proje Adı

Search

Yatırımcı Kuruluş	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ETÜD, PLAN, PLANLAMA, JEOTEKNİK HİZ.VE YAS	Tarım	Bitti
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İŞLETME VE ONARIM HİZMETLERİ	Tarım	Bitti
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	Tarım	Bitti
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	Tarım	Devam Ediyor
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 2. KISIM	Tarım	Devam Ediyor
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	KAYALIKÖY BARAJI SULAMASI KANALET DEPLASMANI İLAVESİ	Tarım	Devam Ediyor
Toplam			

Arama Filtreleri

Proje Sahibi Beledi...

Tümü

Harcama Yılı

2022

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

İRAP Projesi Mi?

Tümü

65

Toplam Proje Sayısı

273.691.808

Toplam Proje Tutarı

108.538.229

Toplam Yıl Ödeneği

%67,60

Nakdi Gerçekleşme Oranı

%32,31


Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı

%56,92

Yılı Harcama Oranı

Proje Sahibi Kuruluş	Proje Adı	Proje Sektörü	Proje Durumu	Proje Sayısı	Toplam Y
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AHMETBEY ŞEHİRİÇİ TRETUVAR DÜZENLEMESİ	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	AHMETBEY ŞEHİRİÇİ YOLLARI STABİLİZE KAPLAMA YAPIMI	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
ALPULLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	ALPULLU ŞEHİRİÇİ YOLLARI PARKE TAŞ KAPLAMASI	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BABAESKİ HAYVAN BARINAĞI BİNA YAPIMI	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Bitti	1	
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BABAESKİ ŞEHİRİÇİ YOLLARI PARKE TAŞ KAPLAMASI	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	KÜÇÜKKARİŞTIRAN ÇOK AMAÇLI SUNDURMA YAPIM (306 M2)	Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	Bitti	1	
BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BÜYÜKKARİŞTIRAN ŞEHİRİÇİ YOL YAPIMI (DEKORATİF AYDINLATMA Dİ...	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
BÜYÜKKARİŞTIRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	BÜYÜKKARİŞTIRAN ŞEHİRİÇİ YOL YAPIMI (KİLİT TAŞ, PRİZMA TAŞ, BOR...	Ulaştırma - Haberleşme	Bitti	1	
Toplam				65	10

Belediye Bazında Proje Sayısı

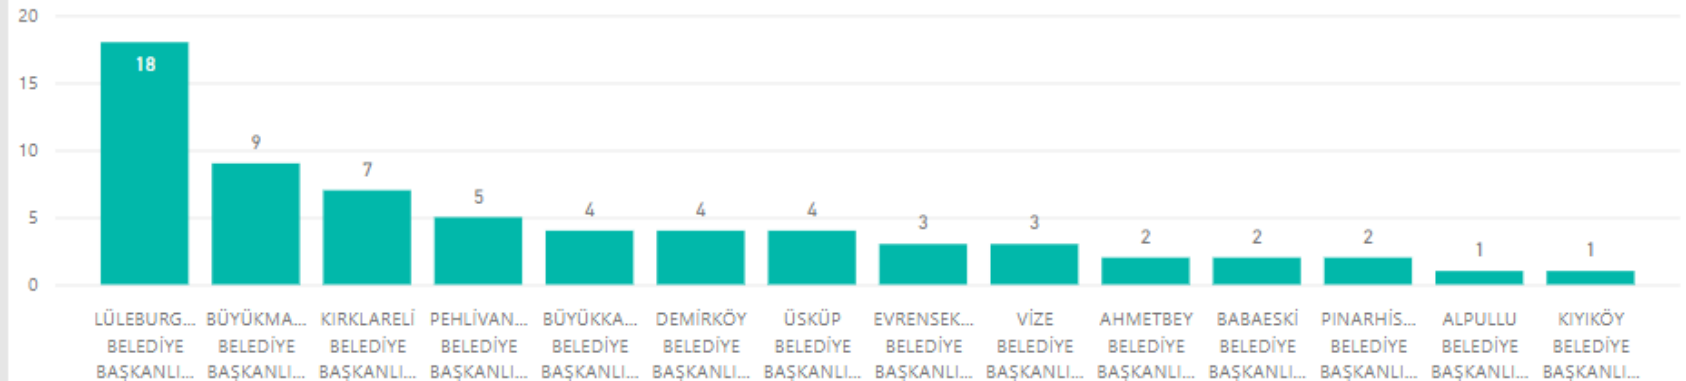

Proje Durum Dağılımı

Arama Filtreleri

İlçe

Tümü

Harcama Yılı

2022

Proje Sahibi Kuruluş

Tümü

Proje Sektörü

Tümü

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

H

Son Güncellenme

05-Oca-23

261

Toplam Proje Sayısı

12.711.353.829

Toplam Proje Tutarı

3.341.196.575

Toplam Yıl Ödeneği

%49,24



Nakdi Gerçekleşme Oranı

%94,64

Yılı Harcama Oranı

Proje Durumu	Proje Sayısı	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı
Bitti	104	597.036.905	675.203.623	69.738.123	567.050.766	636.788.889	%94,31
Devam Ediyor	82	2.594.516.228	8.760.229.401	3.008.092.033	2.514.697.148	5.522.789.181	%63,04
İhale Aşamasında	19	26.813.867	499.152.851	19.486.525	4.968.788	24.455.313	%4,90
Projeye Başlanmadı	56	122.829.575	2.776.767.954	175.820	75.360.620	75.536.440	%2,72
Toplam	261	3.341.196.575	12.711.353.829	3.097.492.501	3.162.077.322	6.259.569.823	%49,24

Proje Durumu

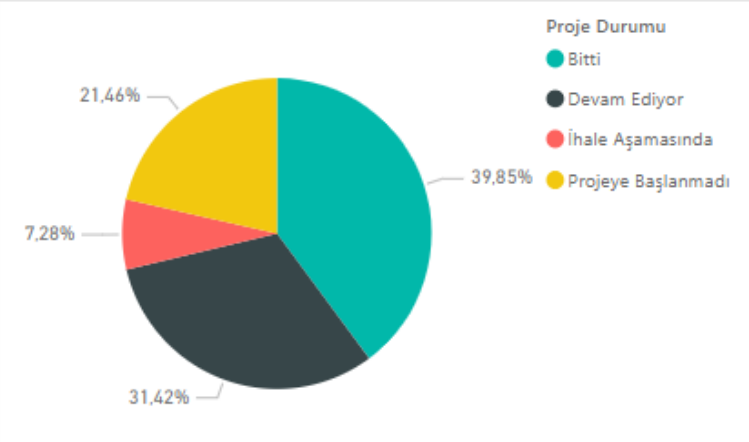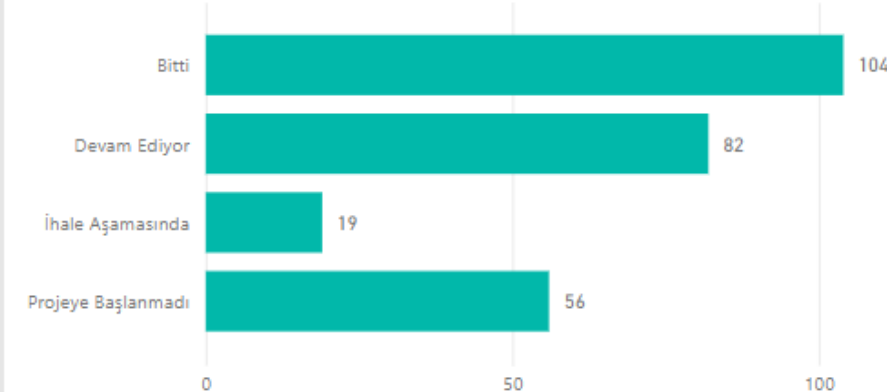

Kuruluşlara Göre Dağılım

Yatırımcı Kuruluş	Proje Sayısı	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Toplam Yıl Ödeneği	Yılı Harcama Tutarı	Toplam Harcama Tutarı	Nakdi Gerçekleşme Oranı	Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı	Yılı Harcama Oranı	Fiziki Gerçekleşme Oranı
Toplam	261	12.711.353.829	3.097.492.501	3.341.196.575	3.162.077.322	6.259.569.823	49,24	24,88	94,64	
Kamu Kuruluşları	196	12.437.662.021	2.974.249.012	3.232.658.346	3.100.293.848	6.074.542.860	48,84	24,93	95,91	
KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	6	2.841.299.059	456.500.338	1.103.698.715	1.103.698.714	1.560.199.052	54,91	38,84	100,00	68,33%
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	22	1.279.368.158	68.737.142	53.070.295	39.924.029	108.661.171	8,49	3,12	75,23	35,00%
İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	20	266.800.671	51.629.191	201.880.561	184.744.719	236.373.910	88,60	69,24	91,51	65,30%
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	1	704.861	0	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	6	9.503.000	0	9.503.000	9.414.211	9.414.211	99,07	99,07	99,07	52,50%
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100,00	100,00	100,00	100,00%
TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	4.213.952.206	2.152.494.733	683.227.510	682.338.306	2.834.833.039	67,27	16,19	99,87	35,00%
MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	2	13.856.200	0	10.903.201	8.202.534	8.202.534	59,20	59,20	75,23	100,00%
TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	3	7.636.314	4.929.292	2.707.021	2.707.021	7.636.313	100,00	35,45	100,00	100,00%
TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	13	235.129.703	19.909.710	71.881.605	54.968.694	74.878.404	31,85	23,38	76,47	16,92%
TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	4	431.513.000	0	431.513.000	431.513.000	431.513.000	100,00	100,00	100,00	100,00%
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	10	81.060.000	18.780.529	53.800.000	53.004.396	71.784.925	88,56	65,39	98,52	76,80%
KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	20	58.901.158	14.262.698	43.226.278	39.120.184	53.382.882	90,63	66,42	90,50	64,05%
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	7	34.702.646	0	1.884.618	297.527	297.527	0,86	0,86	15,79	30,77%
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	4	28.287.222	0	28.287.222	24.067.888	24.067.888	85,08	85,08	85,08	100,00%
KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	17	200.932.529	20.806.196	79.933.933	66.337.078	87.143.274	43,37	33,01	82,99	75,09%
KIRKLARELİ VALİLİĞİ	7	29.132.858	17.874.314	11.258.544	10.832.977	28.707.291	98,54	37,18	96,22	55,26%
KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	2	2.010.167	0	2.010.167	1.619.768	1.619.768	80,58	80,58	80,58	50,00%
KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	6	13.324.356	93.692	11.724.356	11.298.813	11.392.505	85,50	84,80	96,37	60,55%
KIRKLARELİ İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	13	346.967.553	14.732.531	114.966.830	60.963.106	75.695.637	21,82	17,57	53,03	28,08%
KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	18	1.440.109.666	31.214.680	100.445.023	100.374.943	131.589.623	9,14	6,97	99,93	39,33%
KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	6	890.000.000	101.803.966	205.436.522	203.666.732	305.470.698	34,32	22,88	99,14	16,33%
KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	4	8.725.944	0	8.725.944	8.725.208	8.725.208	99,99	99,99	99,99	100,00%
KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	1	2.644.750	480.000	1.374.001	1.374.000	1.854.000	70,10	51,95	100,00	100,00%
Belediyeler	65	273.691.808	123.243.489	108.538.229	61.783.474	185.026.963	67,60	22,57	56,92	
KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	7	12.773.692	2.254.192	10.519.500	9.419.500	11.673.692	91,39	73,74	89,54	89,29%
ÜSKÜP BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	2.818.229	0	2.818.229	1.999.134	1.999.134	70,94	70,94	70,94	100,00%
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	2.309.880	0	2.309.880	2.270.714	2.270.714	98,30	98,30	98,30	100,00%
ALPULLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	3.013.620	0	3.013.620	2.020.160	2.020.160	67,03	67,03	67,03	100,00%
BÜYÜKMANDIRA BELEDİYE BAŞKANLIĞI	9	2.124.350	0	2.124.350	846.350	846.350	39,84	39,84	39,84	33,33%
DEMİRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	2.302.372	0	2.302.372	449.877	449.877	19,54	19,54	19,54	97,50%
LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	18	193.545.652	120.955.413	56.372.556	31.159.070	152.114.483	78,59	16,10	55,27	84,72%
AHMETBEY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	3.246.190	33.884	3.212.306	3.112.706	3.146.590	96,93	95,89	96,90	100,00%
BÜYÜKKARİSTİRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI	4	4.344.960	0	4.344.960	0	0	0,00	0,00	0,00	100,00%
EVRENSEKİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	8.321.941	0	8.321.941	891.704	891.704	10,72	10,72	10,72	66,67%
PEHLİVANKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	5	16.956.000	0	3.098.304	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00%
PINARHİSAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI	2	18.212.337	0	6.622.211	6.622.210	6.622.210	36,36	36,36	100,00	35,00%
VİZE BELEDİYE BAŞKANLIĞI	3	3.350.000	0	3.350.000	2.864.049	2.864.049	85,49	85,49	85,49	100,00%
KIYIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI	1	372.585	0	128.000	128.000	128.000	34,35	34,35	100,00	100,00%

KIRKLARELİ

6
Proje Sayısı2.841.299.059
Toplam Proje Tutarı1.560.199.052
Toplam Harcama Tutarı1.103.698.715
Toplam Yıl Ödeneği1.103.698.714
Yılı Harcama Tutarı

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.103.698.715

1.103.698.714

1.244.960

1.Dönem Harcama Tutarı

137.971.448

2.Dönem Harcama Tutarı

242.421.153

3.Dönem Harcama Tutarı

722.061.153

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,11

%12,50

%21,96

%65,42

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	730.999.059
MUHTELİF İLÇE	829.199.993
Toplam	1.560.199.052

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	1.560.199.052
Toplam	1.560.199.052

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	1.560.199.052
Toplam	1.560.199.052

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Tutarı
(EDİRNE - HAVSA) AYRIMI - HASKÖY - KIRKLARELİ BÖLÜNÜŞ YOLU (2...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	387.185.189	622.746.533	
(PINARHİSAR-VİZE) AYR.-DEMİRKÖY-İĞNEADA DEVLET YOLU YAPIMI (9...	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	215.632.999	1.083.000.000	
ASFALT, BAKIM, ONARIM VE TRAFİK ÇALIŞMALARI	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	83.846.497	83.846.497	
KAMULAŞTIRMALAR	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	24.406.029	24.406.029	
KINALI AYRIMI - ÇERKEZKÖY - SARAY - KIRKLARELİ DEVLET YOLU	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	392.628.000	1.015.000.000	
TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ	KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	12.300.000	
Toplam			1.103.698.715	2.841.299.059	



Kırkklareli

KIRKLARELİ İLİ KARAYOLU YATIRIMLARI

1.

Bölge Müdürlüğü

IV. DÖNEM KORDİNASYON KURULU TOPLANTISI

OCAK 2023


Çidemediğin yer senin değildir.

Halil Rifat Paşa

KIRKLARELİ İLİ GENEL BİLGİLER


KIRKLARELİ İLİNDE DEVAM EDEN PROJELER

KIRKLARELİ İLİNDE YAPILAN RUTİN ÇALIŞMALARIMIZ

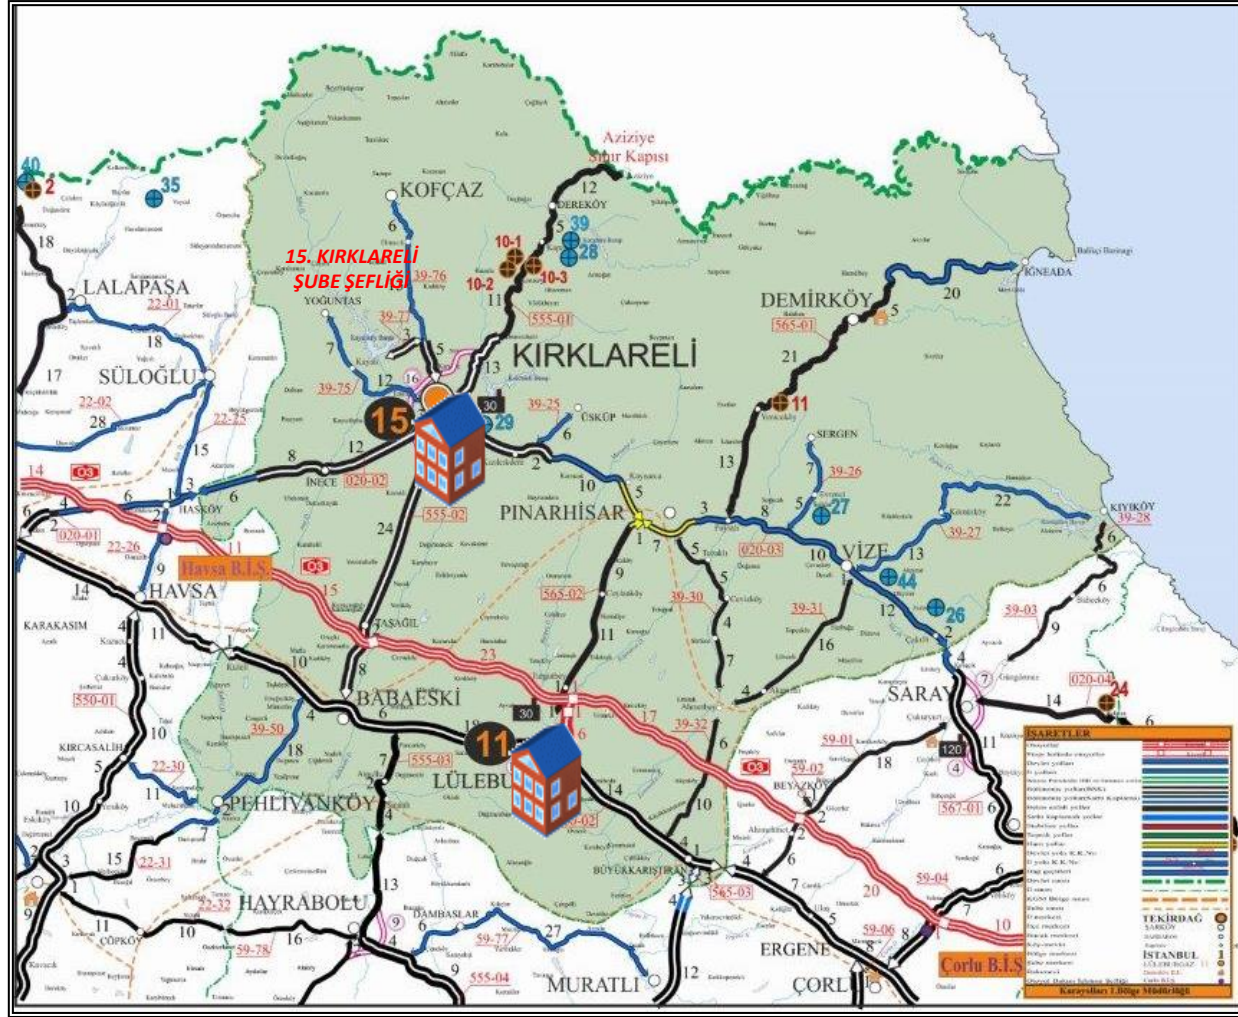


KIRKLARELİ İLİ
601 km

YOL AĞI

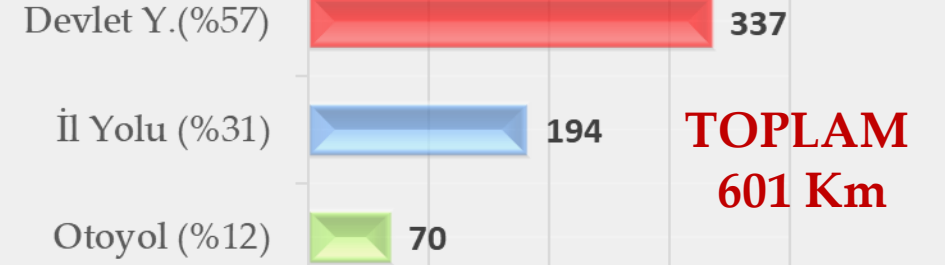

SATIŞ CİNSİ

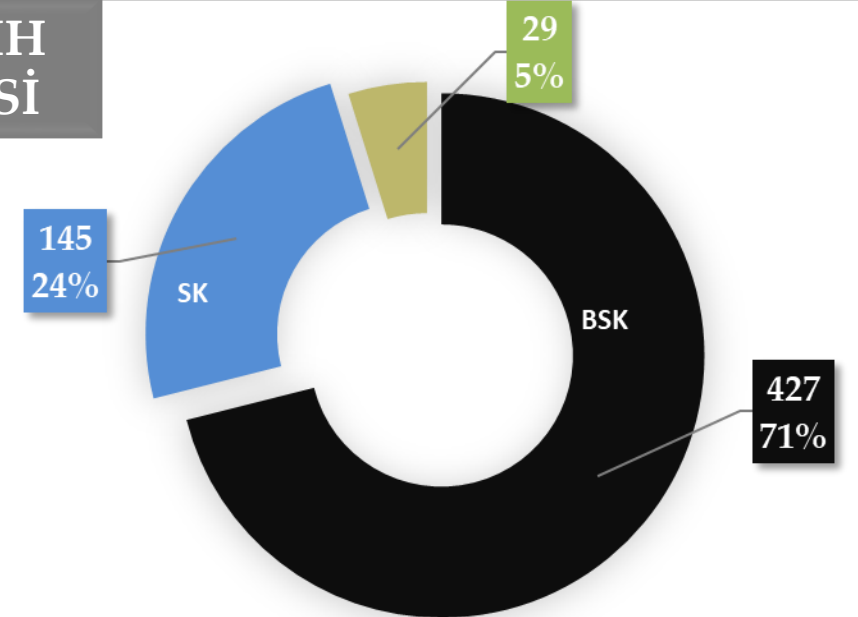


Kırklareli ili sorumluluğumuz altında;
70 km Otoyol,
337 km Devlet Yolu,
194 km İl Yolu
olmak üzere toplam **601** km yol ağı bulunmaktadır.
Bu yollarımızın %39,5 Bölünmüş Yoldur. (**237** km)

Kırklareli İli sınırları içinde, 2022 yılında Yatırım Programında devam eden projelerimizin;

Toplam Proje Bedeli	:	8.330	Milyon TL
Önceki Yılları Harcaması	:	528	Milyon TL
2022 Yılı Yatırım Harcaması	:	1.430	Milyon TL
2022 Yılı Rutin Bakım, Trafik ve YP Dışı İşl.	:	98	Milyon TL
2022 Kamulaştırma Harcaması	:	25	Milyon TL olmak üzere

2022 yılı çalışmaları kapsamında;

2022 YILI TOPLAM HARCAMA : **1.553** Milyon TL dir.
1-Edirne-Kırklareli Yolunda 7,7 km (**2 km Kırklareli**) Bölünmüş Yol,
2- Saray-Kırklareli (Pınarhisar Çevre Yolu Dahil) Yolunda **8 km** Bölünmüş Yol, **5 km** Tek yol yapılmıştır.

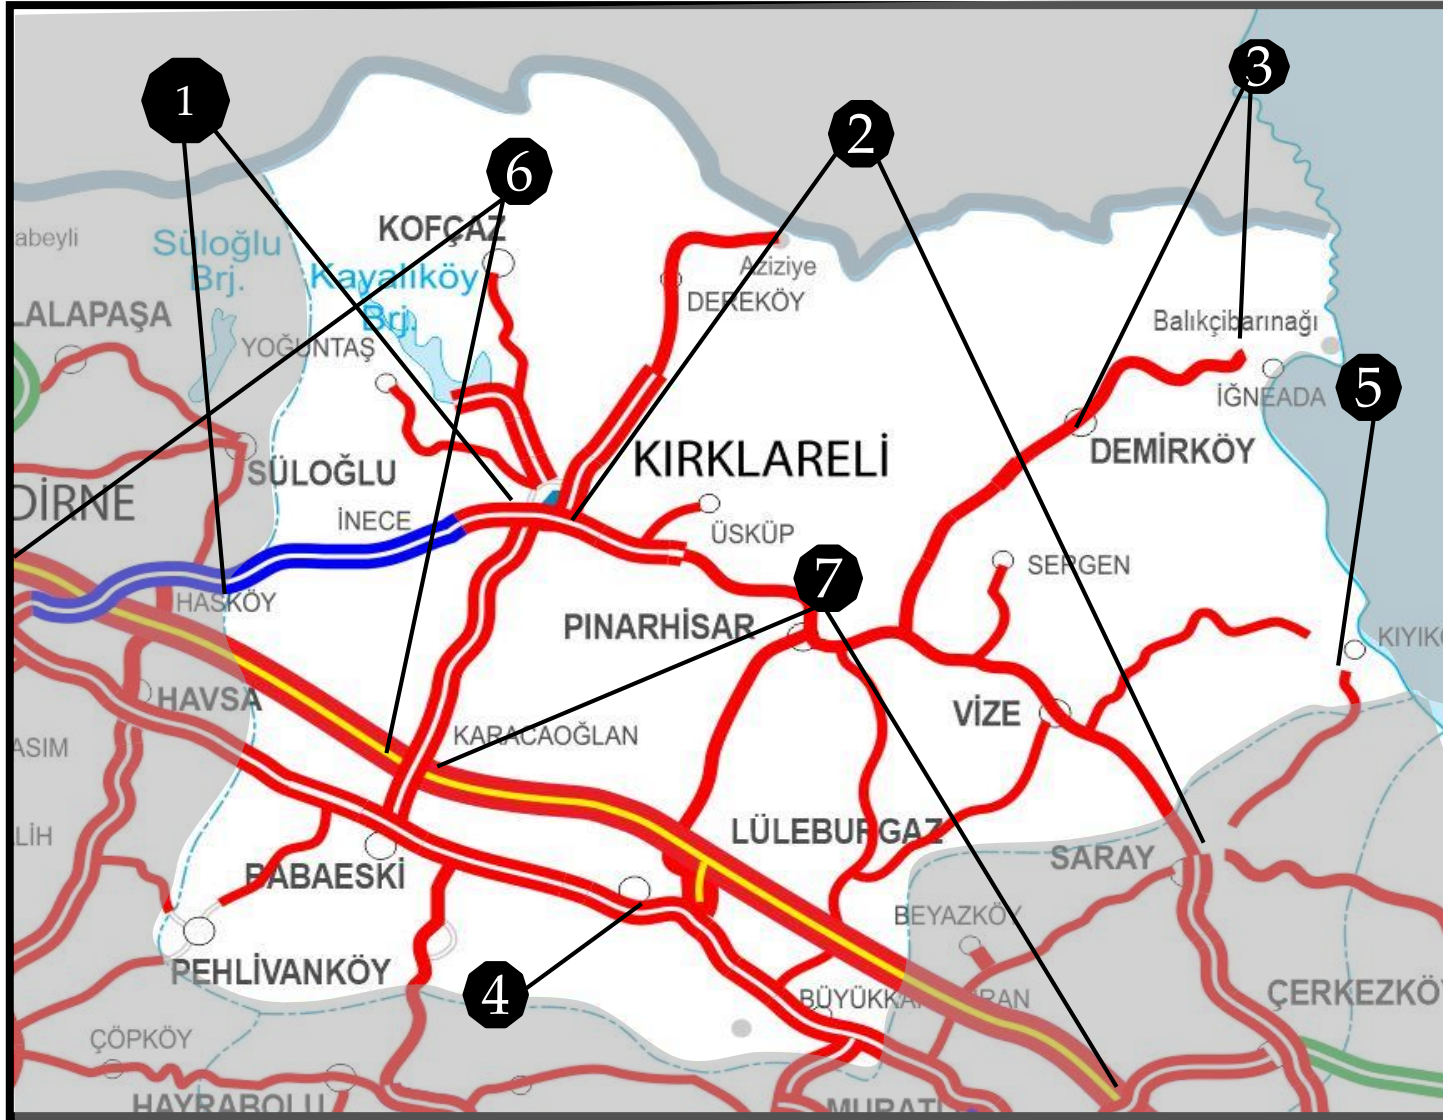

1. EDİRNE – KIRKLARELİ BY YAPIM (2 ve 3 dahil)

2- SARAY– KIRKLARELİ (PINARHİSAR Ç.Y DAHİL) BY YAPIM

3- DEMİRKÖY-İĞNEADA TY ONARIM 1-2

4- (KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ
(SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON
UYGULAMASI İŞİ


5- KIRKLARELİ İLİNDE KIYIKÖY KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ

6- EDİRNE-BATI KAVŞAĞI – BABAESKİ KAVŞAĞI (Km:
9+180 - 71+845) ARASI TEM OTOYOLU VE BAĞLANTI
YOLLARINDA ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ VE BÜYÜK
ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ (Bitüm İdareden)

7- BABAESKİ-SARAY KAVŞAĞI (Km: 71+845 - 125+100)
ARASI TEM OTOYOLU VE BAĞLANTI YOLLARINDA
ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ VE BÜYÜK ONARIM İNŞAATI
YAPIM İŞİ

Hizmete Açık Otoyollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Otoyollar	
Hizmete Açık Bölünmüş Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Bölünmüş Yollar	
İhale Edilecek Bölünmüş Yollar	
Projesi Devam Eden Bölünmüş Yollar	
Hizmete Açık Tek Yollar	
Yapım Çalışmaları Devam Eden Tek Yollar	
İhale Edilecek Tek Yollar	

1) EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU

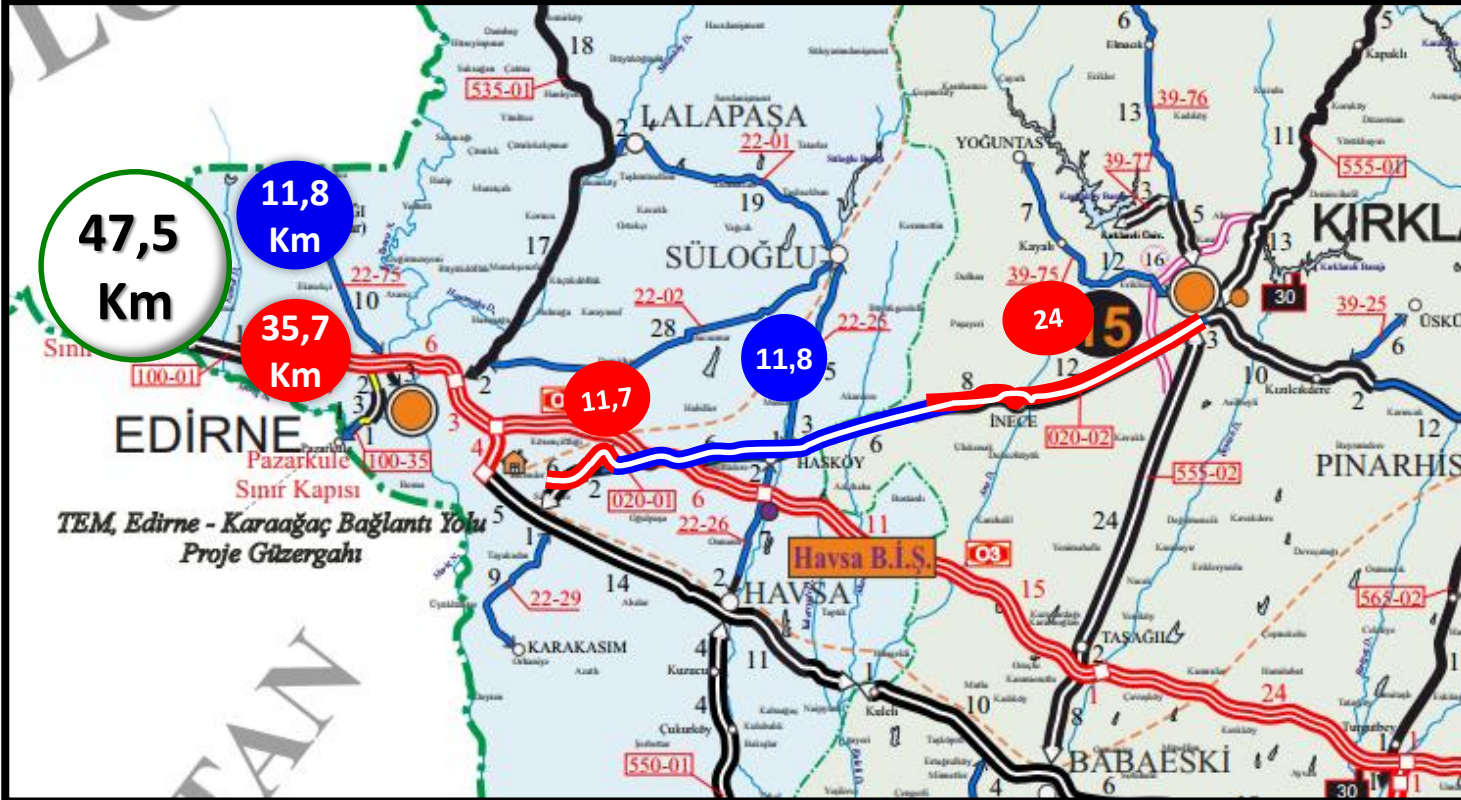

		KAPSAM	BİTEN	2022 HEDEF
BY		47,5 km	35,7 km	3,5 km
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü		7 adet 411 m	6 adet 281 m	
Tek Köprü		3 adet 89 m	1 adet 39 m	
KöprülÜ Kavşak				

MEVCUT 52,5 km/63dk PROJELİ 47,5 km/24dk. YOGT 4.360 AĞIR TAŞIT % 15



Proje Bedeli
(1.000 TL)

4.201.000
1.478.000
Kırklareli



Başlama
Bitiş Tarihi

2017
2022

- ❑ Proje uzunluğu 47,5 km BY-BSK'dır. . Projenin 21 km.si Edirne sınırları içerisinde 26,5 km.si Kırklareli sınırları içerisinde yer almaktadır.
- ❑ 2021 yılı sonuna kadar 28 km.lik kesim BY-BSK seviyesinde, 6 adet köprü (İnce, Dolapdere, Bostanlı, Akardere, Hasköy, Sazlıdere,) tamamlanmıştır.
- ❑ 2022 yılında Km:20+000-24+000 (sol) ve Km:39+500-42+500 (sağ) arası 3,5 Km'lik kesimin bölünmüş yol BSK olarak tamamlanması hedeflenmiş olup 2X30 m uzunluğunda Oğulpaşa köprüsü ile Km: 20+000-24+000 arası sol taşıma, Km: 39+500-42+500 arası sağ taşıma olmak üzere toplamda 4 Km ve Km: 35+800-39+500 arası 3,7 Km'lik kesim binder seviyesinde olmak üzere toplam 7,7 km tamamlanmıştır.

1) EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU



Km 11+377 İnece geçiş



Km 13+000-16+000 İnece Ürünü Arası

1) EDİRNE-KIRKLARELİ YOLU




Km: 45+000



Km: 46+000

2) SARAY - KIRKLARELİ YOLU

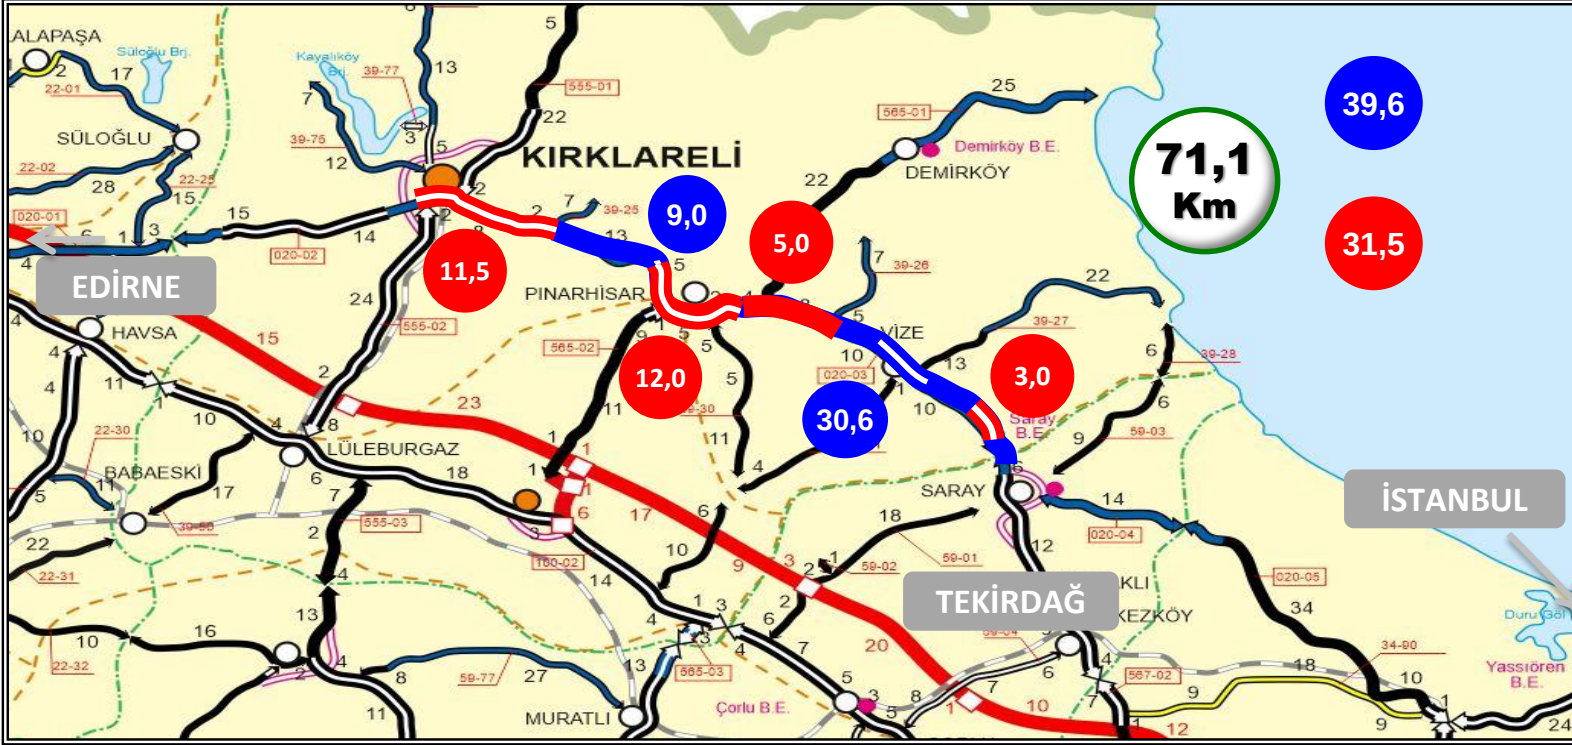

		KAPSAM	BİTEN	2022 HEDEF
BY		32,1 km	26,5 km	8 km
TY		39 km	5 km	5 km
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü		1 adet 96 m	1 adet 96 m	1 adet 96 m
Tek Köprü		3 adet 152 m		
Köprülü Kavşak				



MEVCUT	71,1 km/78dk.	PROJELİ	71,1 km/45 dk.	YOGT	7.550	AĞIR TAŞIT	% 20
--------	---------------	---------	----------------	------	-------	------------	------



Proje Bedeli
(1.000 TL)

1.594.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2019
2023

- ❑ Proje uzunluğu 32,1 km BY BSK, 39 km TY BSK dır.
- ❑ 2021 yılı sonu itibariyle 18,5 Km'lik kesim BY-BSK ' lı olarak tamamlanmıştır.
- ❑ 2022 yılında Km:39+800-44+800 arası 5 Km'lik kesimin TY BSK, Km:11+655-14+610 ile Km:52+300-57+300 arası toplam 8 Km'lik kesimin BY BSK ve uzunluğu 2x96 m olan Poyralı Köprüsü'nün tamamlanması hedeflenmiş olup, 2x96 m uzunluğunda Poyralı Köprüsü ile Km: 11+655-14+610 ve Km: 52+300-57+300 arası toplam 8,0 Km BY, Km: 39+800-44+800 arası 5 Km TY binder seviyesinde tamamlanmıştır.

4) SARAY - KIRKLARELİ YOLU



Çakıllı Çevre Yolu Km:12+000-13+000 Arası




Çakıllı Çevre Yolu Giriş Kavş. Km:11+600

4) SARAY - KIRKLARELİ YOLU




Lüleburgaz TEM Kavşağı Km:52+150

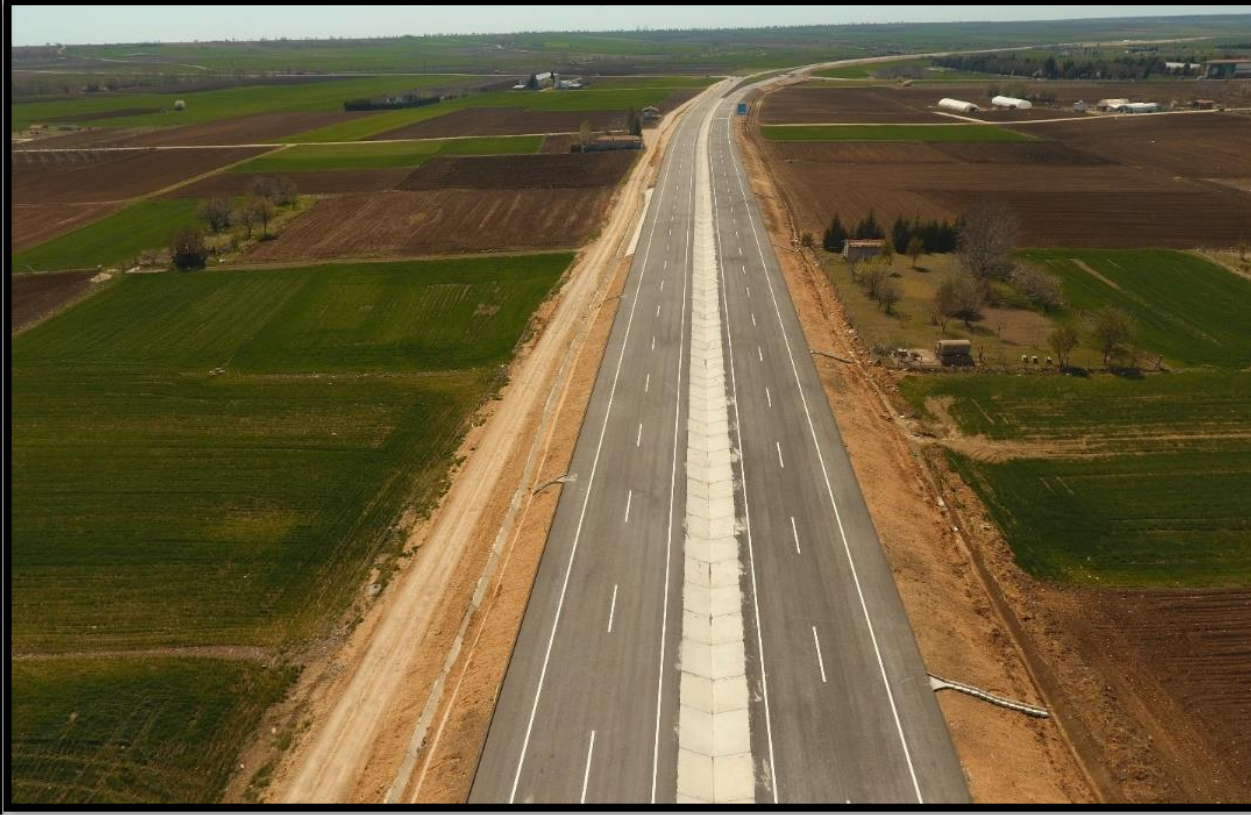

Pınarhisar Çevre Yolu Km:48+000-49+000 Arası

3) DEMİRKÖY – İĞNEADA 1

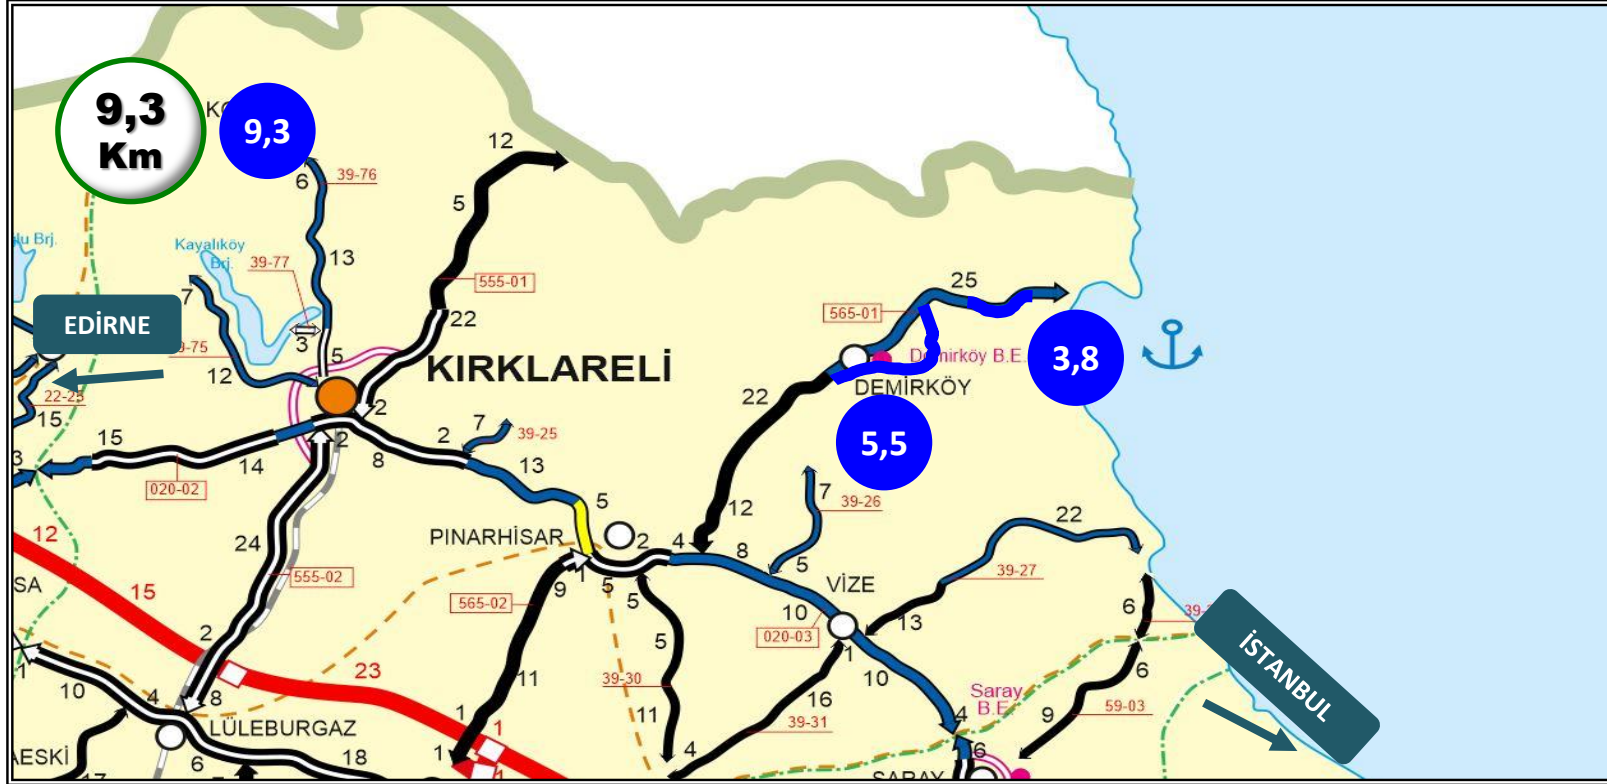

		KAPSA M	BİTEN	2022 HEDEF
BY				
TY		9,3 km		
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü		3 adet 200 m	1 adet 124 m	1 adet 124 m
Köprül ü Kavşak				



MEVCUT

9,3 Km

PROJELİ

9,3 Km

YOGT

1.912

AĞIR TAŞIT

% 6


Proje Bedeli
(1.000 TL)

273.000

Başlama
Bitiş Tarihi2021
2023

- ❑Proje uzunluğu 9,3 km TY BSK dır.
- ❑2021 yılında yol yapım çalışmalarına başlanmıştır.
- ❑2022 yılında yapılan çalışmalar kapsamında 1x124 m uzunluğundaki **Bulanıkdere Köprüsü** tamamlanmıştır.

3) DEMİRKÖY – İĞNEADA 2

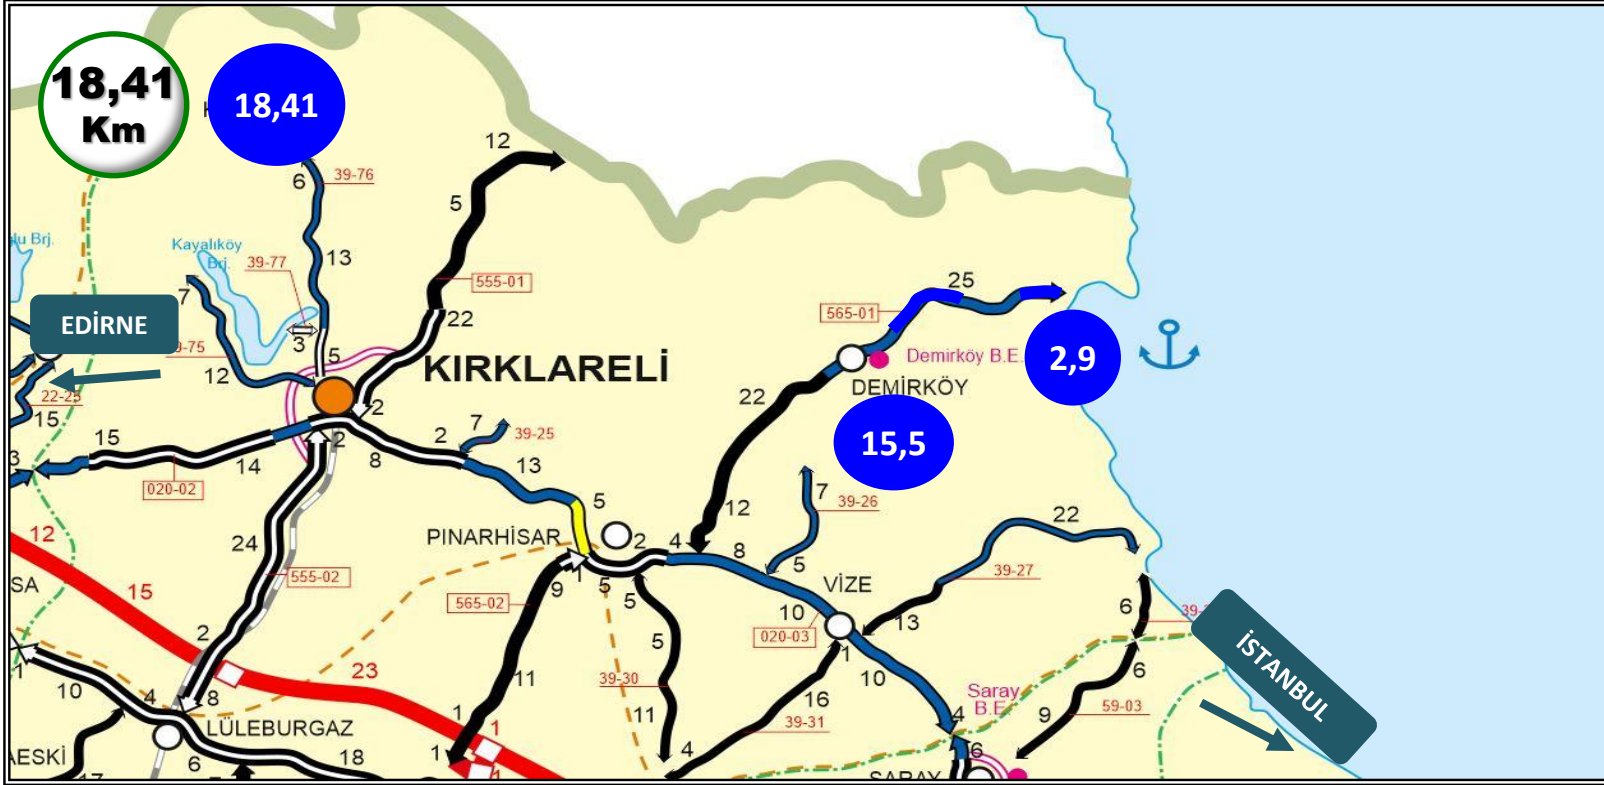

		KAPSAM	BİTEN	2022 HEDEF
BY				
TY		18,41 km		
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü				
KöprülÜ Kavşak				



MEVCUT

18,41 Km

PROJELİ

18,41 Km

YOGT

1.912

AĞIR TAŞIT

% 6



Proje Bedeli
(1.000 TL)

762.000



Başlama
Bitiş Tarihi

2022
2023

- ❑ Proje uzunluğu 18,41 km TY BSK dır.
- ❑ 2022 yılında yol yapım çalışmalarına başlanmıştır.

5) DEMİRKÖY – İĞNEADA TEK YOL




Km:0+000-0+500



Km:2+000-2+500

4) KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ

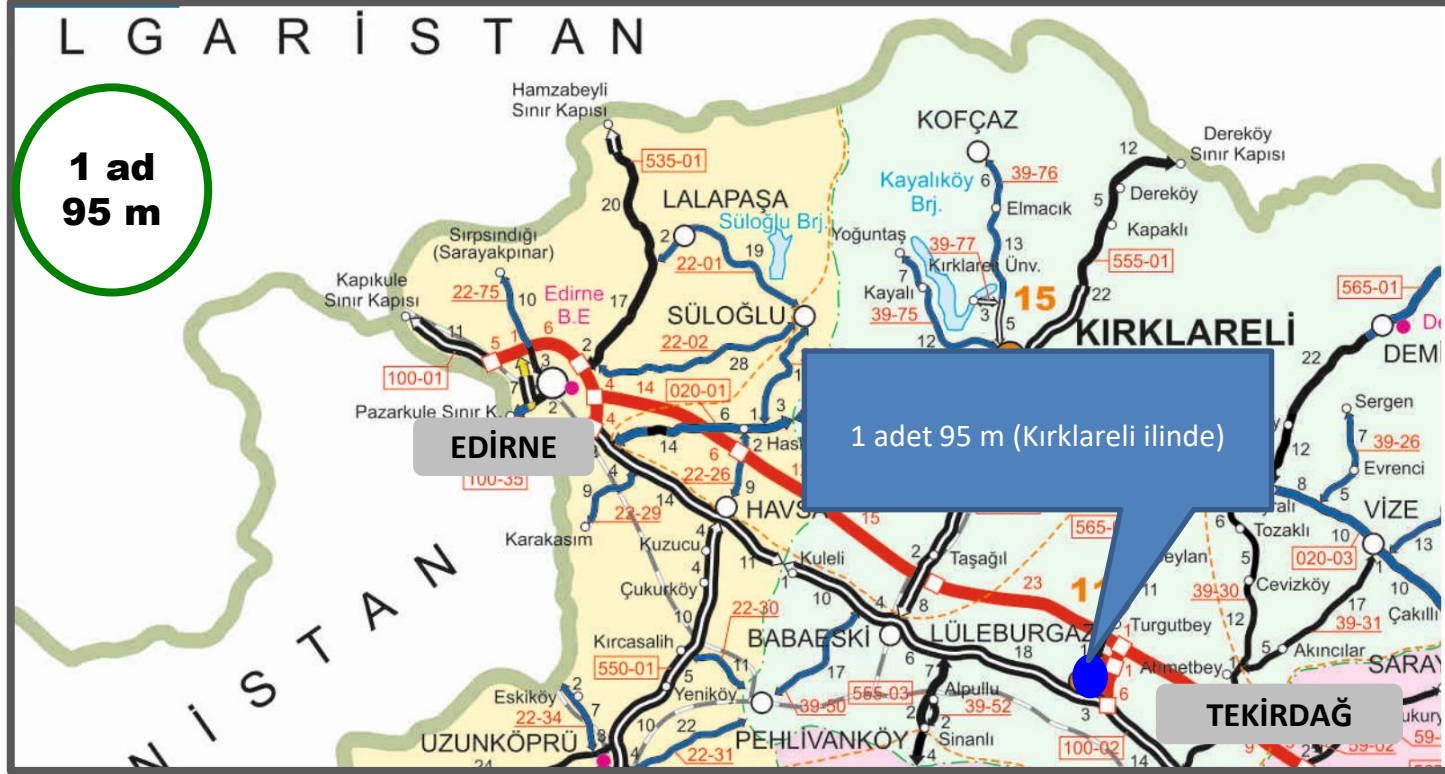

		KAPSAM	BİTEN	2022 HEDEF
BY				
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü		1 adet 95 m		
KöprülÜ Kavşak				

MEVCUT	95 m	PROJELİ	95 m	YOGT		AĞIR TAŞIT	
--------	------	---------	------	------	--	------------	--

Proje Bedeli
(1.000 TL)

37.000

Başlama
Bitiş Tarihi2021
2023

❑Proje 1 adet 95 m uzunluğunda tarihi köprüden oluşmaktadır.

❑2021 yılında yer teslimi yapılmıştır. Araç trafiğine açık olan köprüde çalışma yapılması halinde oluşabilecek trafik yoğunluğunun önüne geçilmesi için Kırklareli Valiliği'nin talebi üzerine DSİ tarafından yapılacak alternatif 2 adet köprü tamamlandıktan sonra çalışmalara başlanabilmektedir.

4) KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ



4) KIRKLARELİ İLİNDE BULUNAN TARİHİ LÜLEBURGAZ (SOKULLU MEHMET PAŞA) KÖPRÜSÜ RESTORASYON UYGULAMASI İŞİ




Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
Genel Görünüm-1



Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü
Genel Görünüm-2

- ❑ Kırklareli İli, Lüleburgaz İlçesi'nde yer alan tarihi Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü, 1565 yılında Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. 95 mt. uzunluğunda, 5,5 mt. genişliğindedir. Kesme taş örgülü 4 sivri kemer, orta ayakta hafifletme gözü ve yanlarda boşaltma gözlerinden teşkil edilmiştir.

5) KIRKLARELİ İLİNDE KIYIKÖY KÖPRÜSÜ YAPIM İŞİ

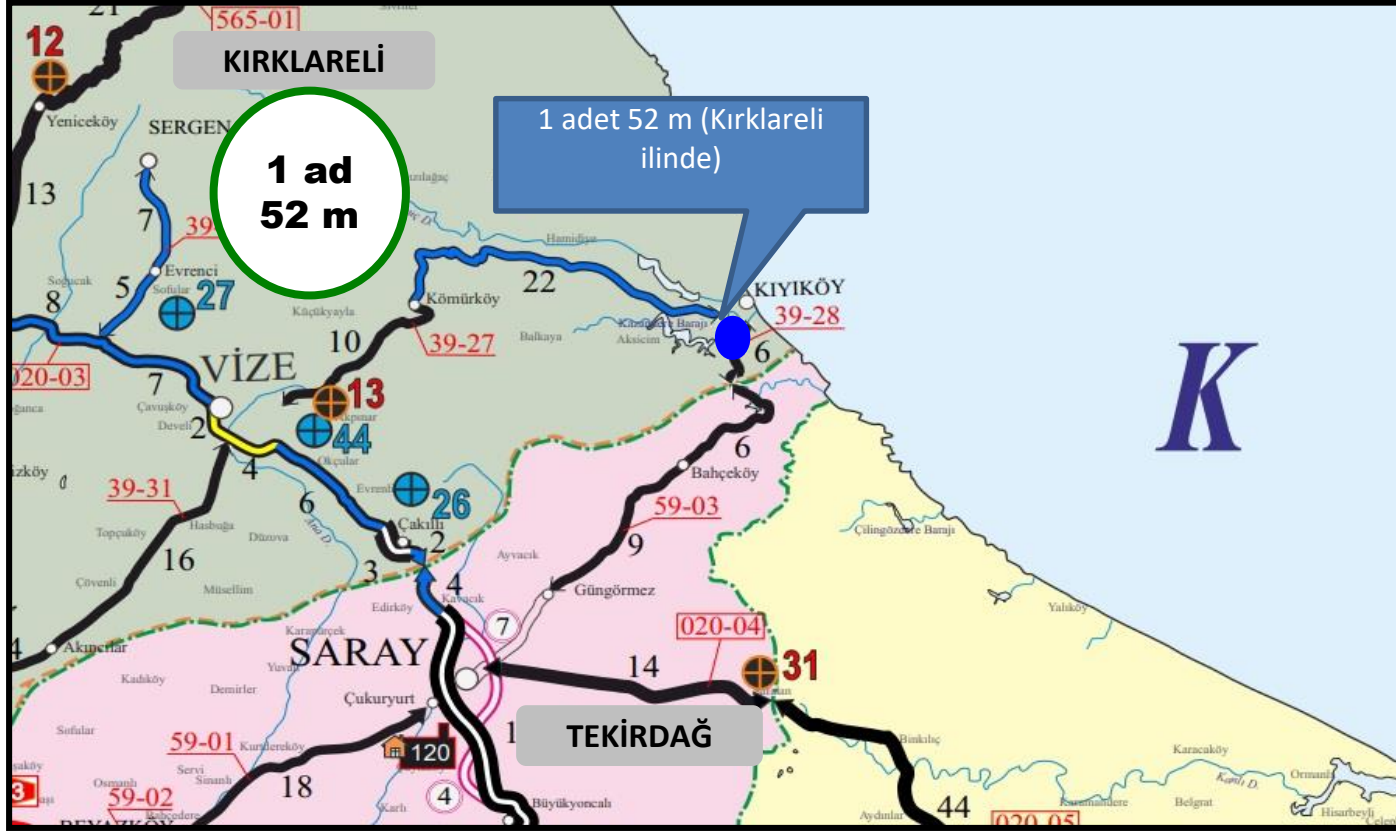

		KAPSAM	BİTEN	2022 HEDEF
BY				
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü		1 adet 52 m		
KöprülÜ Kavşak				

MEVCUT	52 m	PROJELİ	52 m	YOGT	1.913	AĞIR TAŞIT	%10
--------	------	---------	------	------	-------	------------	-----

Proje Bedeli
(1.000 TL)

30.000

Başlama
Bitiş Tarihi2022
2023


- ❑Proje 1 adet 52 m uzunluğunda 2 açıklıklı betonarme köprüden oluşmaktadır.
- ❑19.07.2022 tarihinde ihalesi yapılmış olup, 15.08.2022 tarihinde sözleşmesi yapılarak 19.08.2022 yılında yer teslimi yapılmıştır. Yıkım kararı alınan mevcut köprü yenilenerek can, mal ve trafik güvenliği sağlanacaktır.
- ❑2022 yılında köprüde fore kazık çalışmalarına başlanmıştır.



KIRKLARELİ İLİNDE KIYIKÖY KÖPRÜSÜ YAPIM İŖİ



6)EDİRNE BATI KAVŞAĞI - BABAESKİ KAVŞAĞI (KM: 9+180 - 71+845) ARASI TEM OTOYOLU VE BAĞLANTI YOLLARINDA ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ VE BÜYÜK ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ (BITÜM İDAREDEN)

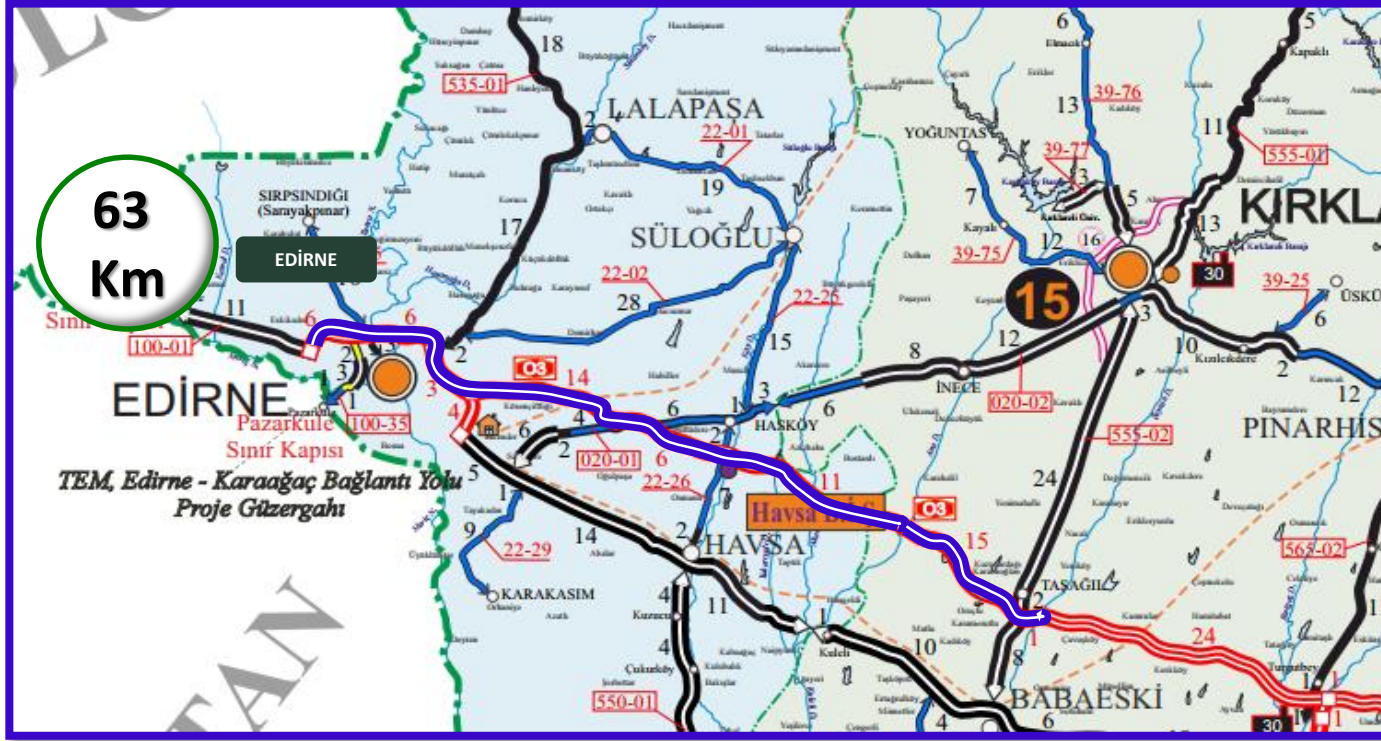

		KAPSAM	BİTEN	2022 HEDEF
BY		63 km		
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü				
KöprülÜ Kavşak				



Proje Bedeli
(1.000 TL)

540.000
216.000
Kırklareli



Başlama
Bitiş Tarihi

2022
2024

MEVCUT

63 Km

PROJELİ

63 Km

YOĞT

11.811


AĞIR TAŞIT

% 33

- ❑ Proje uzunluğu 63 km OY BSK'dır.
- ❑ Çalışmalara 2023 yılı başlanması planlanmaktadır.



6)Edirne Batı KavŖaĐı - Babaeski KavŖaĐı (Km: 9+180 - 71+845) Arası Tem Otoyolu Ve BaĐlantı Yollarında Üstyapı İyileŖtirilmesi Ve Büyük Onarım İnŖaatı Yapım İŖi (Bitüm İdareden)

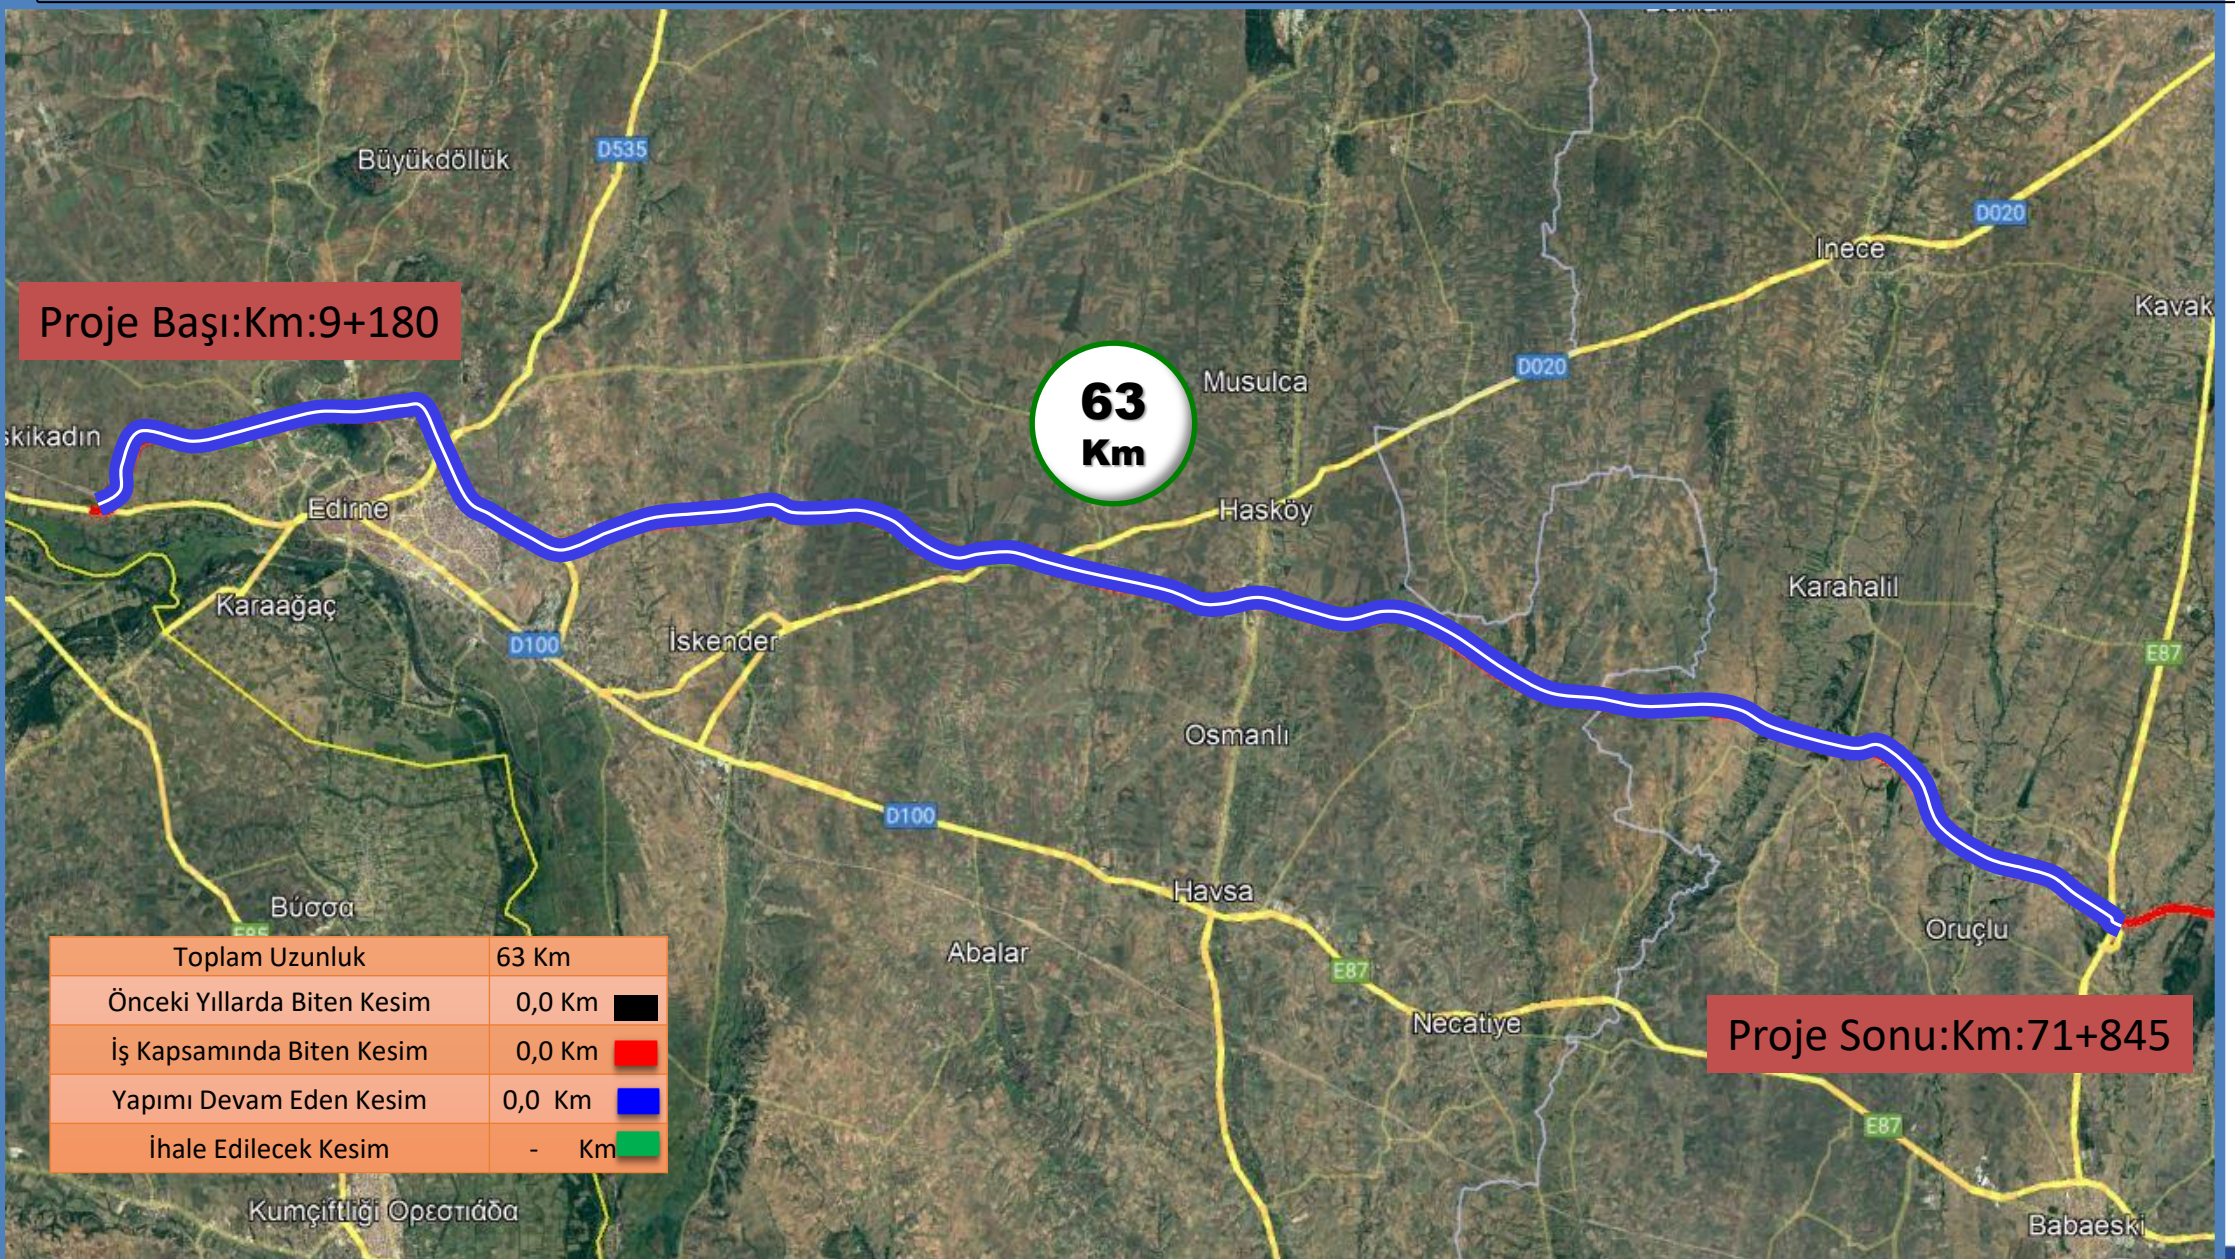

7)BABAESKİ KAVŞAĞI - SARAY KAVŞAĞI (KM: 71+845 - 125+100) ARASI TEM OTOYOLU VE BAĞLANTI YOLLARINDA ÜSTYAPI İYİLEŞTİRİLMESİ VE BÜYÜK ONARIM İNŞAATI YAPIM İŞİ



		KAPSAM	BİTEN	2022 HEDEF
BY		53 km		
TY				
Çift Tüp Tünel				
Tek Tüp Tünel				
Çift Köprü				
Tek Köprü				
KöprülÜ Kavşak				

MEVCUT	53 Km	PROJELİ	53 Km	YOGT	13.892	AĞIR TAŞIT	% 32
--------	-------	---------	-------	------	--------	------------	------



Proje Bedeli
(1.000 TL)

560.000
(448.000
Kırklareli)



Başlama
Bitiş Tarihi


2022
2024

- ❑ Proje uzunluğu 53 km OY BSK'dır.
- ❑ Çalışmalara 2023 yılı başlanması planlanmaktadır.



T.C. ULAŞTIRI
ALTYPABI BAKANLIĞI

7)Babaeski Kavşağı - Saray Kavşağı (Km: 71+845 - 125+100) Arası Tem Otoyolu Ve Bağlantı Yollarında Üstyapı İyileştirilmesi Ve Büyük Onarım İnşaatı Yapım İşı

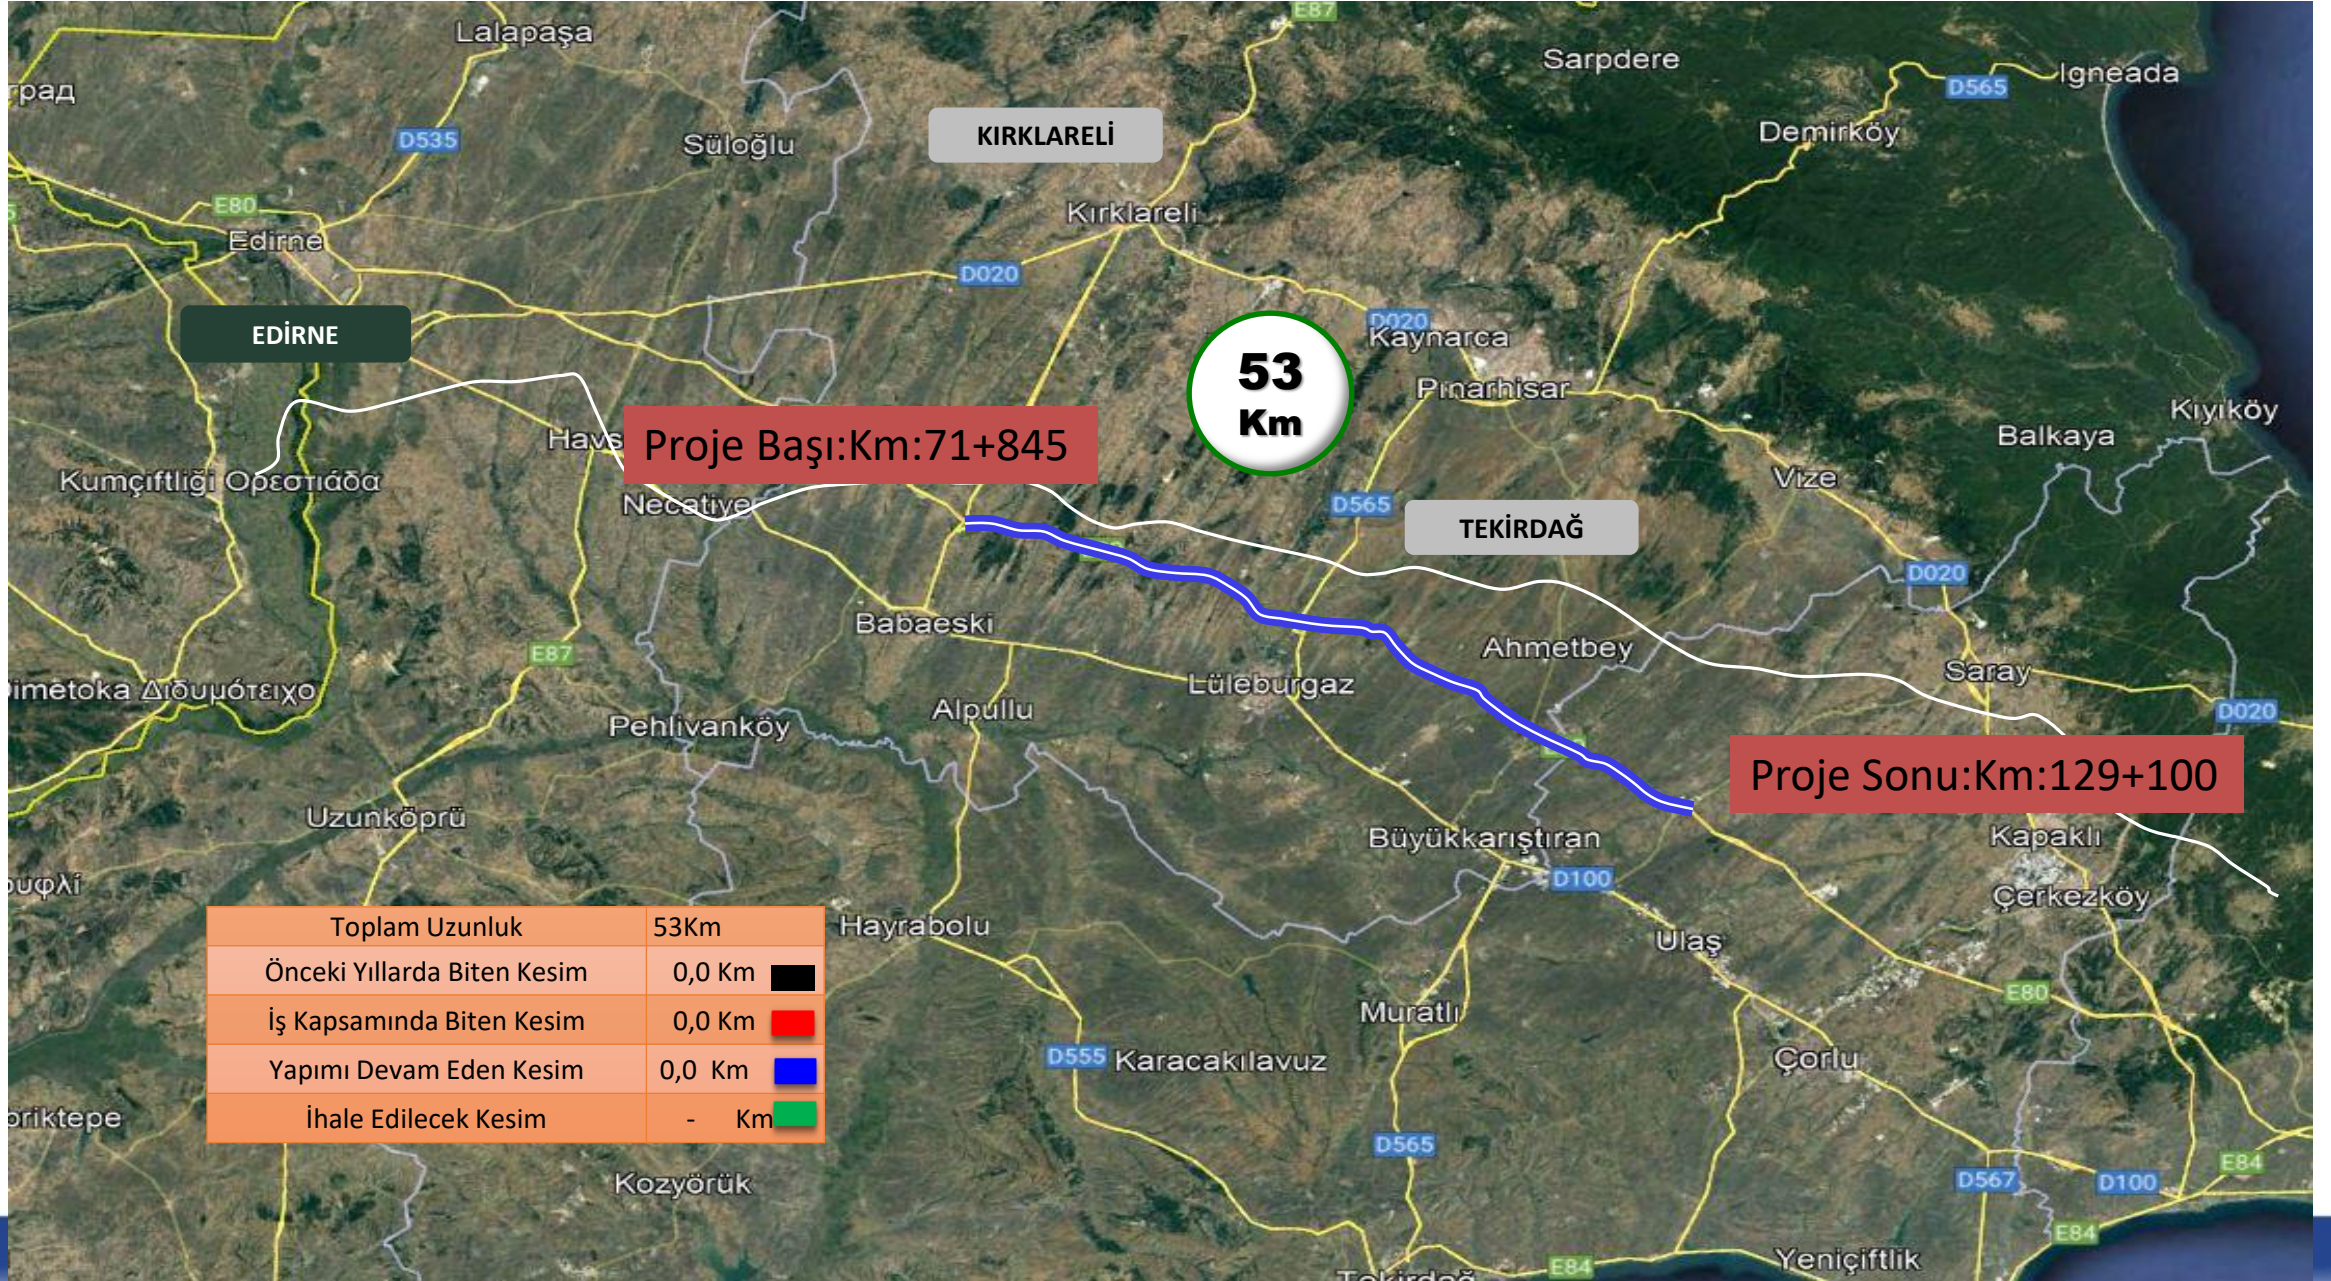

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

2022 YILINDA 75.000.000 TL HARCAMA YAPILMIŞTIR.



EDİRNE – KIRKLARELİ YOLU YAMA ÇALIŞMALARI

RUTİN YAPILAN ÇALIŞMALARIMIZ

TRAFİK GÜVENLİĞİ SİNYALİZASYON ÇALIŞMALARI
24.000.000 TL HARCAMA YAPILMIŞTIR.



KIRKLARELİ



KIRKLARELİ

ARZ EDERİM.

Turgay ÇOLAK
BÖLGE MÜDÜRÜ



KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

53.070.295

39.924.029

22

Proje Sayısı

1.279.368.158

Toplam Proje Tutarı

108.661.171

Toplam Harcama Tutarı

53.070.295

Toplam Yıl Ödeneği

39.924.029

Yılı Harcama Tutarı

2.460

1.Dönem Harcama Tutarı

5.503.409

2.Dönem Harcama Tutarı

2.737.143

3.Dönem Harcama Tutarı

31.681.017

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%10,37

%5,16

%59,70

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	0
DEMİRKÖY	927.701
KOÇAZ	9.632.787
LÜLEBURGAZ	21.064.442
MERKEZ	22.692.997
MUHTELİF İLÇE	41.823.706
PINARHİSAR	12.519.538
Toplam	108.661.171

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	108.661.171
Toplam	108.661.171

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	108.661.171
Toplam	108.661.171

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam H
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	18.338.536	114.897.792	1
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 2. KISIM	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	4.082.663	73.468.495	
ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ 3. KISIM	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	135.000.000	
BABAESKİ PEKMEZDERE TAŞKIN KORUMASI 1. KISIM	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	45.000.000	
BABAESKİ YENİMAHALLE TAŞKIN KORUMASI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	7.500.000	
DEMİRKÖY SİVRİLER GÖLETİ VE SULAMASI (390.000 M3)(1.260 DEKAR)	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	35.000.000	
ETÜD, PLAN, PLANLAMA, JEOTEKNİK HİZ.VE YAS	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.095.735	2.095.735	
İŞLETME VE ONARIM HİZMETLERİ	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	335.017	335.017	
KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.200.000	1.200.000	
Toplam			53.070.295	1.279.368.158	68



T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EDİRNE



11 OCAK 2022
KIRKLARELİ





KIRKLARELİ İLİ TOPRAK POTANSİYELİ VE KULLANIMI (ha)

Tarıma Elverişli Arazi	309.096
Çayır - Mera	19.644
Orman - Fundalık	283.018
Diğer Arazi	25.662
DSİ'ce Etüt Edilen Arazi	152.815
DSİ'ce Sulamaya Elverişli Arazi	128.959
DSİ Etütlerine Göre Ekonomik Olarak Sulanabilir Arazi	57.262
İşletmeye Açılan Saha	40.982
Yatırım Programında Bulunan Saha	4.483
Proje Aşamasındaki Saha	2.166
Etüt Aşamasındaki Saha	9.231



DSİ 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE



TOPLANTI DÖNEMİ	4			
KURULUŞUN ADI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ			
PROJELERİN GENEL DURUMU				
SEKTÖRÜ	PROJE SAYISI	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2022 YILI ÖDENEĞİ (TL)
TARIM	20	1 378 794 009	53 899 514	43 503 045
TRANSFER (KAMULAŞTIRMA GİD.)	1	20 750 000	7 891 103	1 200 000
TOPLAM	21	1399 544 009	61 790 617	44 703 045
PROJELERİN PARASAL GERÇEKLEŞME DURUMU				
SEKTÖRÜ	2022 YILINDA GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL)	2022 YILI HARCAMALARI (TL)	PARASAL GERÇEKLEŞME (%)	2022 YILI ÖDENEK İHTİYACI (TL)
TARIM	43 503 045	42 354 776	98	
TRANSFER (KAMULAŞTIRMA GİD.)	1 200 000	54 085	5	
TOPLAM	44 703 045	42 408 861		



DSİ 11.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-EDİRNE



TOPLANTI DÖNEMİ	4
KURULUŞUN ADI	DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

PROJELERİN FİZİKİ GERÇEKLEŞME DURUMU

SEKTÖRÜ	BAŞLANMAYAN PROJE SAYISI	İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI	BİTMEDEN TASFİYE	DEVAM EDEN PROJE SAYISI	BİTEN PROJE SAYISI	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)
TARIM	9	2		9		7
TRANSFER				1		38

AÇIKLAMALAR

PROJELERE BAŞLANMAMA NEDENLERİ

Proje Çalışmaları Devam Ediyor



BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

**03
OCAK
2023**

BARAJIN ADI	2023 YILI DOLULUK ORANI	2022 YILI DOLULUK ORANI
ARMAĞAN	66	60
ÇAYIRDERE	69	47
KAYALIKÖY	38	54
KIRKLARELİ	51	73
KIRKLARELİ TOPLAMI	49	60



KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

BÜYÜK SU İŞLERİ



2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BŞİ PROJE İCMALİ (3 Adet)



SIRA NO	2022 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm3, hm3/yıl vb)	2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2022 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama- Bitiş	Son Durum
1	KIRKLARELİ PROJESİ						
	Kırklareli Kızılcıkdere Sulaması İkmali Eksik İmalatların Tamamlanması	1 422 ha	1 000	-	(bütününde) 44	2022-2025	2023 yılında ihale edilebilmesi için Yeni İKN Numarası alınmıştır.
2	PINARHİSAR YENİCE BARAJI VE SULAMASI PROJESİ						
	Kırklareli-Pınarhisar Yenice Göleti ve Sulaması	1 407 ha 3,80 hm3	1 000	-	55	2017-2023	Devam ediyor
3	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ						
	Kırklareli Merkez 1.Kısım AT ve TİGH	40 000 ha 15 yerleşim yeri	18 338 536	18 338 534	41	2017-2023	Proje Kırklareli İli Merkez, Pehlivan köy ve Babaeski İlçelerine bağlı 15 yerleşim birimini kapsamamaktadır. İnşaat:177 km stabilize yol,




2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN BSi PROJE İCMALİ (3 Adet)



SIRA NO	2022 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm3, hm3/yıl vb)	2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2022 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama- Bitiş	Son Durum
	ARAZİ TOPLULAŞTIRMA VE TİGH PROJESİ						
	Kırklareli 2. Kısım AT ve TİGH	28 652 ha 12 yerleşim yeri	4 082 663	4 082 335	6	2022-2025	Proje kapsamında; 22.07.2022 tarihinde ihale yapılmış, 14.09.2022 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 23.09.2022 tarihinde iş yeri teslimi yapılarak iş başlatılmıştır.
	Kırklareli 3. Kısım AT ve TİGH	29 848 ha 12 yerleşim yeri	1	-	-	2022-2025	Başlamadı

KIRKLARELİ PROJESİ

KIRKLARELİ KIZILCIKDERE SULAMASI İKMALİ EKSİK İMALATLARIN TAMAMLANMASI

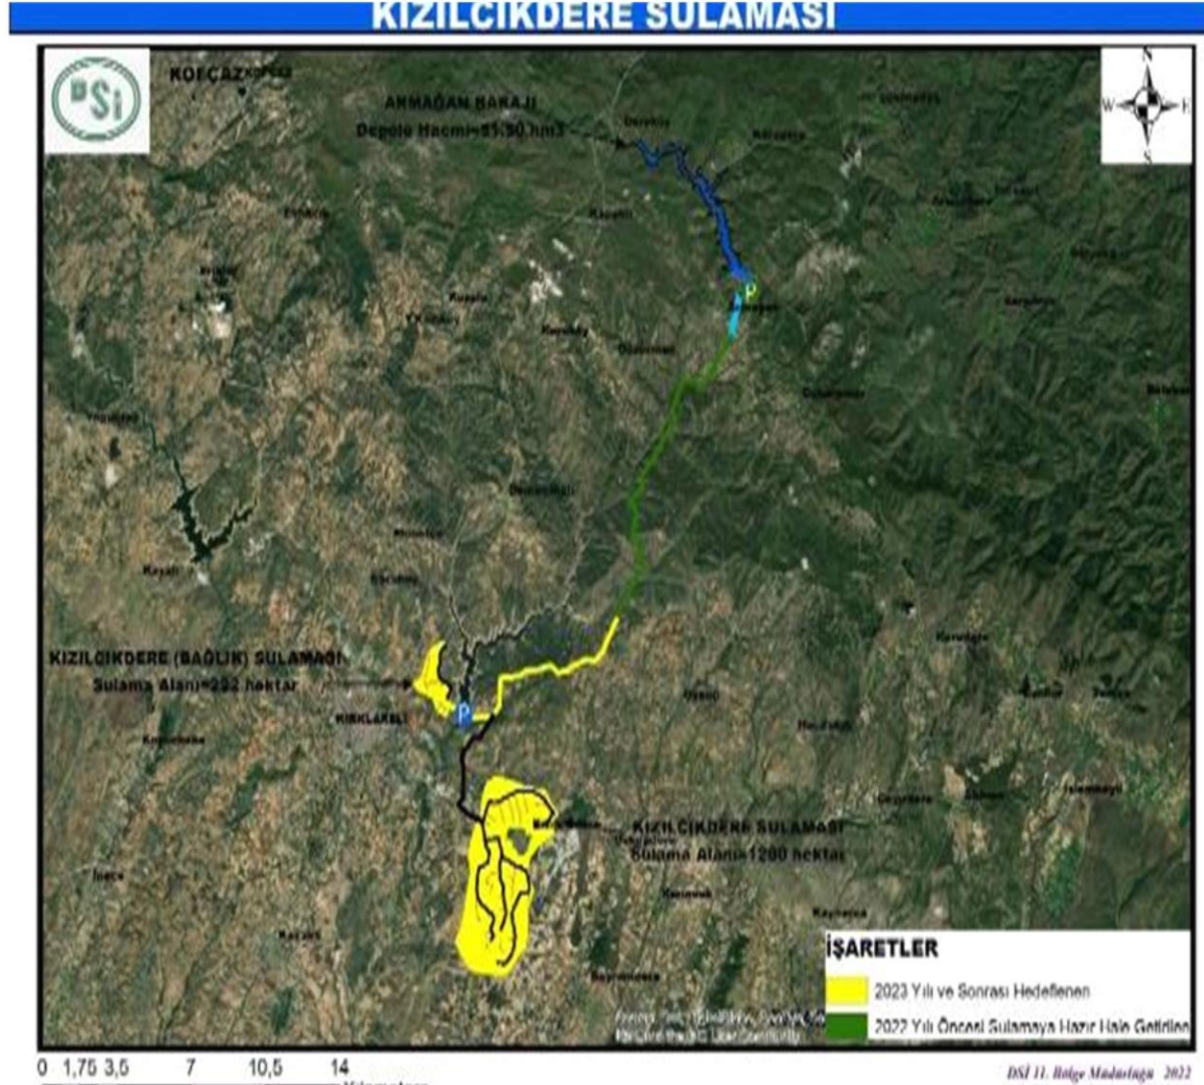

Sulama Alanı	1 422 ha
İhale Tarihi	-
Sözleşme Bedeli (TL)	250 000 000
Sözleşme Tarihi	-
İşe Başlama Tarihi	-
Son İş Bitim Tarihi	-
	250 000 000
Yüklenici	
2022 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti (TL)	250 000 000
2022 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	20 000 000
2022 Yılı Ödeneği (TL)	1 000
2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
2022 Yılı Harcama (TL)	-
Parasal Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	-

Açıklama:

- ✓ 2023 yılında ihale edilebilmesi için Yeni İKN Numarası alınmıştır.

PINARHİSAR YENİCE BARAJI VE SULAMASI PROJESİ

PINARHİSAR YENİCE BARAJI VE SULAMASI



Sulama Alanı	1 407 ha
İhale Tarihi	5.01.2017
Sözleşme Bedeli (TL)	16.03.2017
Sözleşme Tarihi	24.03.2017
İşe Başlama Tarihi	24.08.2022
Son İş Bitim Tarihi	AK SAV İNŞAAT HAFRİYAT PETROL VE MADENCİLİK SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yüklenici	189 313 897
2022 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti (TL)	85 242 138
2022 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	12 000 000
2022 Yılı Ödeneği (TL)	1 000
2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
2022 Yılı Harcama (TL)	55
Parasal Gerçekleşme (%)	55
Fiziki Gerçekleşme (%)	-

Açıklama:

- ✓ Gövde ve seddenin sıyırma kazıları tamamlandı .
- ✓ Batardo dolgusu, gövde ve sedde enjeksiyon çalışmaları ve derivasyon konduvisi betonarme imalatları tamamlandı.
- ✓ Dolusavak betonarme imalatı devam etmektedir.
- ✓ Kapama seddesi dolgu hacmi 77.000 m³ olup, 13.000 m³ lük dolgu imalatı tamamlanmıştır.
- ✓ Sulama hattının toplam uzunluğu 38.500 m olup 32.861 m'si yapıldı.
- ✓ Regülatör iletim hattının toplam uzunluğu 740 m olup 400 m'si yapıldı.



KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

KÜÇÜK SU İŞLERİ



2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KŞİ PROJE İCMALİ (13 Adet)



SIRA NO	2022 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm3, hm3/yıl vb)	2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2022 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama- Bitiş	Son Durum
	GÖLET VE SULAMALARI						
1	Kırklareli Merkez Kadıköy Göleti ve Sulaması İkmali	418 ha 1,93 hm3	1	-	(bütününde) 41	2021-2024	19.12.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır
2	Kırklareli-Demirköy Sivrilere Göleti ve Sulaması İkmali	122 ha 0,39 hm3	1	-	(bütününde) 19	2021-2024	İhale 10.01.2023 tarihinde gerçekleştirilecekt ir
3	Kırklareli-Kofçaz-2 Göleti ve Sulaması	217 ha 0,86 hm3	3 511 881	3 511 880	69	2017-2023	Devam ediyor
4	Kırklareli-Lüleburgaz Ahmetbey Göleti Yükseltilmesi	270 ha 10,34 milyon m3 içmesuyu 12,52 hm3	11 506 449	11 506 448	35	2017-2024	Devam ediyor
	GÖLETLER 2						
1	Kırklareli Merkez Eriklice Göleti	3,61 hm3	1	-	-	2022-2026	Başlamadı
2	Kırklareli Merkez Eriklice Göleti Sulaması	897 ha	1	-	-	2022-2024	Başlamadı



2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KŞİ PROJE İCMALİ (13 Adet)



SIRA NO	2022 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm 3, hm3/yıl vb)	2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2022 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama-Bitiş	Son Durum
	TAŞKIN KORUMA						
1	Kırklareli Babaeski İlçe Merkezi Pekmez Deresi Islahı 1. Kısım	1 ilçe	1	-	-	2022-2024	İhale evrakları EKAP'a yüklendi, İhale tarihi 30.01.2023
2	Kırklareli Babaeski Yenimahalle Köyü Ana Deresi Islahı	1 köy	1	-	-	2022-2023	Ekap no alındı. İhale evraklarının sisteme yüklemesi devam ediyor.
3	Kırklareli Lüleburgaz İlçesi Lüleburgaz Deresi Islahı 1. Kısım	1 ilçe	1	-	-	2022-2024	İhale evrakları EKAP yüklendi, İhale tarihi 08.02.2023
4	Kırklareli Merkez Dokuzhöyük Köyü ve Karahalil Kasabası Tarım Arazilerinin Teke Dere İkmali	3 mahalle, 325 ha	1	-	-	2022-2023	04.08.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanılmıştır. İnşaat çalışmaları devam etmektedir.İş bitim tarihi 16.12.2023
5	Kırklareli Merkez Dolhan Köyiçi Deresi	1 köy	1	-	-	2022-2023	İhale hazırlıkları devam etmektedir.



2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KŞİ PROJE İCMALİ (13 Adet)



SIRA NO	2022 YILI DEVAM EDEN İŞLER	Toplam Faydası(ha,hm 3, hm3/yıl vb)	2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	2022 Yılı Harcaması (TL)	Fiziksel Gerçekleşme (%)	Başlama-Bitiş	Son Durum
	TAŞKIN KORUMA						
6	Kırklareli Merkez İlçesi Bağlıca Deresi Islahı 1. Kısım	1 ilçe	1	-	-	2022-2024	Proje ihalesi devam etmektedir. Tamamlanmasına müteakip yapım işi ilana çıkılacaktır.
7	Kırklareli Pınarhisar İlçesi Çayırdere Islahı	1 ilçe	1	-	-	2022-2023	İhale evrakları EKAP yüklendi. İhale tarihi 15.02.2023



KÜÇÜK SU İŞLERİ

KIRKLARELİ MERKEZ KADIKÖY GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ



Sulama Alanı	418 ha
İhale Tarihi	3.10.2022
Sözleşme Bedeli (TL)	36 421 221
Sözleşme Tarihi	19.12.2022
İşe Başlama Tarihi	-
Son İş Bitim Tarihi	-
Yüklenici	AYZ MÜHENDİSLİK İNŞ.MAK.NAK.ELEK.SAN.TİC.LTD.ŞT İ - CANİP YILDIRIM ÖZALTAŞ İŞ ORT.
2022 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti (TL)	57 698 498
2022 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	57 698 498
2022 Yılı Ödeneği (TL)	1
2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	1
2022 Yılı Harcama (TL)	-
Parasal Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	41

Açıklama:

✓ 19.12.2022 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.



KÜÇÜK SU İŞLERİ

KIRKLARELİ DEMİRKÖY SİVRİLER GÖLETİ VE SULAMASI İKMALİ



Sulama Alanı	122 ha
İhale Tarihi	10.01.2023
Sözleşme Bedeli (TL)	
Sözleşme Tarihi	
İşe Başlama Tarihi	
Son İş Bitim Tarihi	
Yüklenici	
2022 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti (TL)	35 000 000
2022 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	35 000 000
2022 Yılı Ödeneği (TL)	-
2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	-
2022 Yılı Harcama (TL)	-
Parasal Gerçekleşme (%)	-
Fiziki Gerçekleşme (%)	19
Açıklama:	
✓	İhale 10.01.2023 tarihinde gerçekleştirilecektir.

KÜÇÜK SU İŞLERİ

KIRKLARELİ KOÇAZ-2 GÖLETİ VE SULAMASI



Sulama Alanı	217 ha
İhale Tarihi	10.01.2017
Sözleşme Bedeli (TL)	7 025 749
Sözleşme Tarihi	17.03.2017
İşe Başlama Tarihi	24.03.2017
Son İş Bitim Tarihi	3.04.2023
Yüklenici	SUFEN YAPI İNŞAAT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti (TL)	78 542 956
2022 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	28 880 378
2022 Yılı Ödeneği (TL)	3 000 000
2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	3 511 881
2022 Yılı Harcama (TL)	3 511 879
Parasal Gerçekleşme (%)	69
Fiziki Gerçekleşme (%)	69
Açıklama:	
✓ Toplam 100.000 m³ gövde dolgusunun 94.000 m³'ü tamamlandı. Sulama hattının toplam uzunluğu 14.028 m olup 13.908 m'si tamamlandı.	
✓ Sanat yapıları imalatları tamamlandı. Pompa binası ve dolusavak perde duvarı betonarme imalatları devam etmektedir.	



KÜÇÜK SU İŞLERİ

KIRKLARELİ LÜLEBURGAZ AHMETBEY GÖLETİ YÜKSELTİLMESİ



Sulama Alanı	270 ha
İhale Tarihi	5.07.2017
Sözleşme Bedeli (TL)	20 189 030
Sözleşme Tarihi	15.11.2017
İşe Başlama Tarihi	15.11.2017
Son İş Bitim Tarihi	20.05.2023
Yüklenici	AK SAV İNŞAAT HAFRİYAT PETROL VE MADENCİLİK SANAYİ DİŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2022 Yılı Fiyatlarıyla Maliyeti (TL)	216 099 343
2022 Yılı Fiyatlarıyla Kalan Maliyeti (TL)	146 543 522
2022 Yılı Ödeneği (TL)	2 000 000
2022 Yılı Revize Ödeneği (TL)	11 506 449
2022 Yılı Harcama (TL)	11 506 449
Parasal Gerçekleşme (%)	35
Fiziki Gerçekleşme (%)	35
Açıklama:	✓ Toplam 890.000 m ³ gövde dolgusunun 115.000 m ³ yapıldı. Dipsavak betonarme imalatı tamamlandı. Ulaşım yolları tamamlandı.



KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

PLANLAMA VE PROJE ÇALIŞMALARI



2022 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PLANLAMA VE PROJE İŞLERİ (7 Adet)



SIRA NO	2022 YILI DEVAM EDEN İŞLER
	PLANLAMALAR
1	Kırklareli Kofçaz Projesi (Edirne İçmesuyu) Çağlayık Barajı Planlama Raporu (F.G %54)

SIRA NO	2022 YILI DEVAM EDEN İŞLER
	PROJE YAPIMI
1	Kayalıköy Sulaması Yenilemesi Proje Yapımı (F.G %52)
2	Kırklareli Pınarhisar İlçesi ve Üsküp Beldesi Yukarı Havza Islahı ve Mansap Şartı Proje Yapımı (F.G %10)
3	Kırklareli Babaeski İlçesi Şeytandere Taşkın Kontrol Tesisi Yenilemesi Proje Yapımı
4	Kırklareli 2.Grup Gölet ve Sulamaları Planlama Raporu ve Proje Yapımı (F.G %64)
5	Kırklareli Merkez İlçesi Bağlıca Deresi Taşkın Kontrolü Kati Proje Yapımı (F.G %81)
6	Kırklareli Pınarhisar İslambeyli Göleti ve Sulaması Proje Yapımı



ARZ EDERİM

FARUK YÜCEGÖK
BÖLGE MÜDÜRÜ

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

201.880.561

184.744.719

20

Proje Sayısı

266.800.671

Toplam Proje Tutarı

236.373.910

Toplam Harcama Tutarı

201.880.561

Toplam Yıl Ödeneği

184.744.719

Yılı Harcama Tutarı

18.323.733

1.Dönem Harcama Tutarı

59.682.495

2.Dönem Harcama Tutarı

67.196.339

3.Dönem Harcama Tutarı

39.542.152

4.Dönem Harcama Tutarı

%9,08

%29,56

%33,29

%19,59

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	47.145.222
DEMİRKÖY	23.946.511
LÜLEBURGAZ	66.661.213
MERKEZ	6.863.279
PEHLİVANKÖY	1.000.000
PINARHİSAR	86.599.266
VİZE	4.158.419
Toplam	236.373.910

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	228.400.664
Ulaştırma - Haberleşme	7.973.246
Toplam	236.373.910

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	236.373.910
Toplam	236.373.910

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıl
B.ESKİ BÜYÜKMANDIRA ŞEHİRİÇİ YOLLARI PARKE TAŞ KAPLAMA VE BO...	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	349.980	349.980	
BABAESKİ ALPULLU İÇMESUYU VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.856.312	10.604.252	
BABAESKİ ALPULLU KANALİZASYON İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	31.504.713	36.131.074	
BABAESKİ İMAR PLANI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	70.741	141.482	
DEMİRKÖY İÇNEADA İÇMESUYU VE İÇMESUYU ARITMA TESİSİ İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	9.095.482	24.180.998	
KELİ KAVAKLI ŞEHİRİÇİ YOLLARI PARKETAŞ KAPLAMA, KALDIRIM VE YA...	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.623.773	3.247.546	
KIRKLARELİ KAVAKLI İÇMESUYU İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.035.024	3.597.727	
KIRKLARELİ YEREL YÖNETİMLERİ KATI ATIK ÖN İŞLEM TESİSİ KESİN PRO...	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	236.000	236.000	
L.BURGAZ AHMETBEY İÇMESUYU İNŞAATI	İLLER BANKASI İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	24.500.000	30.500.000	
Toplam			201.880.561	266.800.671	

İller Bankası A.Ş.
İstanbul Bölge Müdürlüğü
Kırklareli İli Yatırımları
Aralık 2022

KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIM BİLGİLERİ

PROJE SAYISI	18
TOPLAM PROJE TUTARI	263.819.841 TL
ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI	48.357.851 TL
2022 YILI HARCAMA TUTARI	184.744.720TL

KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIMLARI

Pınarhisar İtfaiye Binası ve Müştemilatları Yapım İşi

- **Başlama-Bitiş Tarihi** : 2021-2022
- **Proje Tutarı** : 6.012.100 TL
- **Yapılan Toplam Harcama** : 500.000 TL
- **Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi**: %100
- **Projenin Durumu** : İş tamamlandı.



Pınarhisar Güneş Enerji Santrali Yapım İşi

- **Başlama-Bitiş Tarihi** : 2022-2022
- **Proje Tutarı** : 9.263.591 TL
- **Yapılan Toplam Harcama** : 3.219.975 TL
- **Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi**: %36
- **Projenin Durumu** : İş devam ediyor.



KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIMLARI

İğneada İçmesuyu Ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2019-2022
- Proje Tutarı : 24.180.999 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 23.946.512 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: % 99
- Projenin Durumu : İş devam ediyor.



Alpullu İçmesuyu Ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2020-2022
- Proje Tutarı : 10.604.253 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 10.593.075 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: %100
- Projenin Durumu : İş tamamlandı



KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIMLARI

Evrensekiz İçmesuyu İnşaatı

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2021-2022
- Proje Tutarı : 2.561.015 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 2.515.854 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: %100
- Projenin Durumu : İş tamamlandı.



Ahmetbey İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2021-2023
- Proje Tutarı : 61.945.950 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 60.684.774 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: %100
- Projenin Durumu : İş tamamlandı.



KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIMLARI

Pınarhisar Kanalizasyon, Yağmursuyu ve İçmesuyu İnşaatı

- **Başlama-Bitiş Tarihi** : 2021-2023
- **Proje Tutarı** : 87.343.490 TL
- **Yapılan Toplam Harcama** : 82.879.291 TL
- **Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi**: % 89
- **Projenin Durumu** : İş devam ediyor



Kavaklı İçmesuyu Ayaklı Depo İkmal İnşaatı


- **Başlama-Bitiş Tarihi** : 2022-2022
- **Proje Tutarı** : 2.035.024 TL
- **Yapılan Toplam Harcama** : 2.034.558 TL
- **Projenin Durumu** : İş tamamlandı



KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIMLARI

Alpullu Kanalizasyon İnşaatı

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2021-2022
- Proje Tutarı : 36.131.073 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 36.130.958 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: %99
- Projenin Durumu : İş devam ediyor

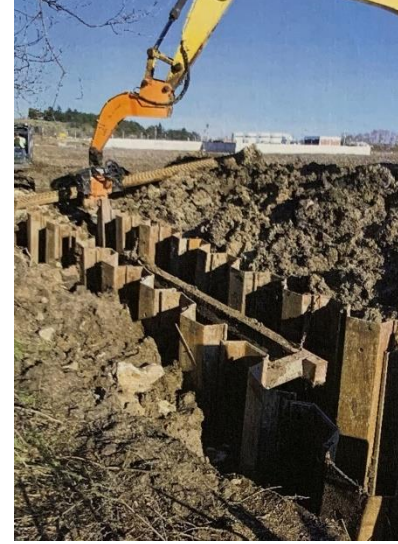

Çakıllı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2021-2022
- Proje Tutarı : 4.408.102 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 4.158.420 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: % 95
- Projenin Durumu : İş devam ediyor.



KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIMLARI

Pehlivanköy Yol ve Kaldırım İnşaatı

- **Başlama-Bitiş Tarihi** : 2021-2022
- **Proje Tutarı** : 1.176.094 TL
- **Yapılan Toplam Harcama** : 1.000.000 TL
- **Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi**: %100
- **Projenin Durumu** : İş tamamlandı



Evrensekiz Kilitli Parke Taşı Yol Yapımı ve Kaldırım Düzenleme Yapım İş

- **Başlama-Bitiş Tarihi** : 2022-2023
- **Proje Tutarı** : 7.344.966 TL
- **Yapılan Toplam Harcama** : 3.375.720 TL
- **Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi**: %50
- **Projenin Durumu** : İş devam ediyor.



KIRKLARELİ 2022 YILI YATIRIMLARI

Kavaklı Avcılar Ve Site Sokakların Kilitli Parke Taş Yol, Kaldırım Ve Yağmur Oluğu Yapım İşi

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2022-2022
- Proje Tutarı : 2.035.500 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 1.623.773 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: %100
- Projenin Durumu : İş tamamlandı.



Büyükmandıra Çevre Düzenlemesi Kapsamında Hürriyet Mah. Mera Sk. Kilitli Parke Taşı Ve Bordürle Düzenlenmesi İşi

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2022-2022
- Proje Tutarı : 295.110 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 295.110 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: %100
- Projenin Durumu : İş tamamlandı.

Büyükmandıra Hürriyet Mah. Mezarlığın Önünün Ve Çevresinin Kilitli Parke Taşı Ve Beton Bordürle Düzenlenmesi İşi

- Başlama-Bitiş Tarihi : 2022-2022
- Proje Tutarı : 54.870 TL
- Yapılan Toplam Harcama : 54.870 TL
- Fiziki Gerçekleşme Yüzdesi: %100
- Projenin Durumu : İş tamamlandı.

Arz Ederim.

M. Ferit YÜKSEL
Bölge Müdürü

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI I. ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

100.000

0

1

Proje Sayısı

704.861

Toplam Proje Tutarı

0

Toplam Harcama Tutarı

100.000

Toplam Yıl Ödeneği

0

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

0

3.Dönem Harcama Tutarı

0

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%0,00

%0,00

Proje Yeri İlçe

Toplam Harcama Tutarı

DEMİRKÖY

0

Toplam

0

Proje Sektörü

Toplam Harcama Tutarı

Tarım

0

Toplam

0

Bakanlık Adı

Toplam Harcama Tutarı

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI

0

Toplam

0

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
D.KÖY İĞNEADA BALIKÇI BARINAĞI ETÜD PROJE İŞLERİ	ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	100.000	704.861
Toplam			100.000	704.861



T.C. ULAŖTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĐI

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ FAALİYETLERİ



ARALIK 2022


SERDAR YÜCEL
Bölge Müdürü



I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET SINIRLARI



İĞNEADA BALIKÇI BARINAĞI ETÜT PROJE İŞLERİ

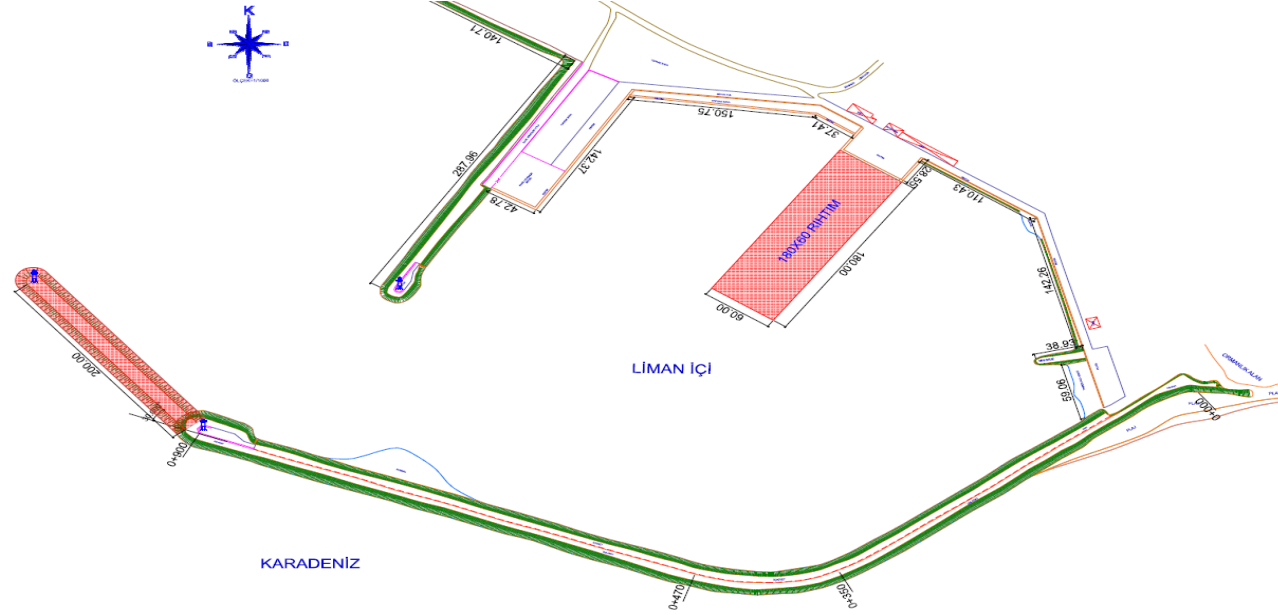

Proje kapsamında mevcut balıkçı barınağında onarım yapılarak kapasitesinin artırılması planlanmaktadır. 23.02.2022 tarihinde ihale edilmiş olup ihale kapsamında yüklenici ile sözleşme yapılmıştır. 25.03.2022 tarihinde yer teslimi yapılarak batimetrik ölçümlere başlanılmıştır. Taslak Genel Vaziyet planı Genel Müdürlüğümüze onaylanmıştır. Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığınca Onaylanan Rapor Bölge Müdürlüğümüze teslim edilmiştir. Sayısal Modelleme Raporundaki eksiklik ve düzeltmeler yapılarak, Genel Müdürlük onayına tekrar gönderilmiştir. Onaya müteakip sondaj çalışmalarına başlanacaktır.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

9.503.000

9.418.211

6

Proje Sayısı

9.503.000

Toplam Proje Tutarı

9.418.211

Toplam Harcama Tutarı

9.503.000

Toplam Yıl Ödeneği

9.418.211

Yılı Harcama Tutarı

110.000

1.Dönem Harcama Tutarı

867.000

2.Dönem Harcama Tutarı

1.429.529

3.Dönem Harcama Tutarı

7.011.682

4.Dönem Harcama Tutarı

%1,16

%9,12

%15,04

%73,78

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MERKEZ	898.211
MUHTELİF İLÇE	8.520.000
Toplam	9.418.211

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	9.418.211
Toplam	9.418.211

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	9.418.211
Toplam	9.418.211

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplamı
ENDÜSTRİYEL PLANTASYON	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	70.000	70.000	
FİDAN ÜRETİMİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.487.000	2.487.000	
ORMAN AMENAJMANI VE ORMAN KÖYLERİ ETÜDÜ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	829.000	829.000	
ORMAN KORUMA VE YANGINLA MÜCADELE	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	25.000	25.000	
ORMANCILIK ALTYAPISI VE ÜRETİM MAKİNASI ALIM	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	4.680.000	4.680.000	
ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE GENİŞLETİLMESİ	İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.412.000	1.412.000	
Toplam			9.503.000	9.503.000	



T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKLARELİ İLİ
İL KOORDİNASYON TOPLANTISI



11/01/ 2023



Sunuş Planı



❖ GENEL TANITIM

❖ Ormanlık Alan

❖ YATIRIM PROJELERİ

❖ Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi

❖ Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi

❖ Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi

❖ Endüstriyel Plantasyon Projesi

❖ Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü Projesi

❖ Fidan Üretim Projesi






Genel Tanıtım



3 Orman İşletme
Müdürlüğü
1 Orman Fidanlık
Müdürlüğü
35 Orman İşletme Şefliği
1 KDM Şefliği
1 ATM Şefliği
2 Fidanlık Şefliği



Ormanlık Alan

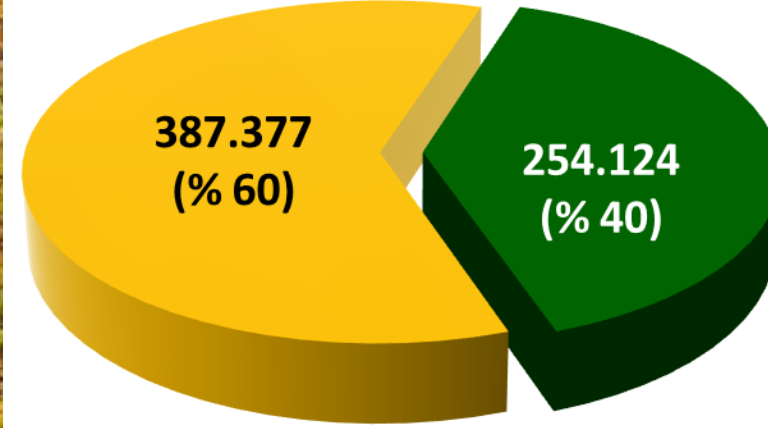

Ormanlık Alan : 254.124 Hektar

Ormansız Alan : 387.377 Hektar

Genel Toplam : 641.501 Hektar



Yatırım Projeleri



Proje Adı ve Karakteristiği	Bütçe Türü	Projenin Yeri (İlçe)	Proje Tutarı (TL)	2022 Yılı Harcamaları (TL)	Nakdi Gerçekleşme (%)	Fiziki Gerçekleşme (%)	Proje Durumu
Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi Projesi	Ö.B.	Lüleburgaz	1.202.000	1.202.000	100	100	BT
Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi	D.S.	Merkez Demirköy Vize	4.680.000	4.596.000	98	100	BT
Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	Ö.B.	Demirköy	25.000	25.000	100	100	BT
Endüstriyel Plantasyon Projesi	Ö.B.	Demirköy	70.000	70.000	100	100	BT
Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü Projesi	D.S.	Vize	829.000	829.000	100	100	BT
Fidan Üretim Projesi	Ö.B. D.S.	Lüleburgaz	2.697.000	2.697.000	100	100	BT
TOPLAM			9.503.000	9.418.211	99	100	



Ormanların Geliştirilmesi ve Geniřletilmesi Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŐME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Ağaçlandırma Tesis	70 Ha.	476.000	Lüleburgaz	70 Ha.	476.000
Ağaçlandırma Bakımı	500 Ha.	647.000	Lüleburgaz	500 Ha.	647.000
Rehabilitasyon Bakım	150 Ha.	75.000	Lüleburgaz	150 Ha.	75.000
Etüd Proje	200 Ha.	4.000	Lüleburgaz	200 Ha.	4.000
PROJE TOPLAMI	920 Ha.	1.202.000		920 Ha.	1.202.000



Ormanların Geliştirilmesi ve Geniřletilmesi Projesi





Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Orman Yolu Yapımı	70 Km.	4.680.000	Merkez Demirköy Vize	70 Km.	4.596.000



Yeni Yol



Üst Yapı



Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Fotokapan Alımı	3 Adet	25.000	Demirköy	3 Adet	25.000





Endüstriyel Plantasyon Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Endüstriyel Ağaçlandırma Bakımı	50 Ha.	70.000	Demirköy	50 Ha.	70.000






Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Orman Amenajman Planı Yenileme	72.142 Ha.	829.000	Vize	72.142 Ha.	828.211





Fidan Üretim Projesi



FAALİYET TÜRÜ	PROGRAM MİKTAR	ÖDENEK (TL)	İLÇESİ	GERÇEKLEŞME MİKTAR	HARCAMA (TL)
Fidan Üretimi	1.550.000 Ad.	1.250.000	Lüleburgaz	1.550.000 Ad.	1.250.000
Fidan Bakımı	850.000 Ad.	360.000	Lüleburgaz	850.000 Ad.	360.000
Tohum Üretimi	2 Ton	130.000	Lüleburgaz	2 Ton	130.000
Ağaç ve Tohum Islahı (Ağaç ve Tohum Islahı Bakımı)	5 Ha.	12.000	Lüleburgaz	5 Ha.	12.000
Sulama-Enerji Tesis ve Sistemleri	1 Ad.	850.000	Lüleburgaz	1 Ad.	850.000
Muhtelif Fidanlık Teçhizat-Ekipmanları	2 Ad.	95.000	Lüleburgaz	2 Ad.	95.000
PROJE TOPLAMI		2.697.000			2.697.000



Fidan Üretim Projesi





Orman Köylüsüne Aktarılan Kaynak Miktarı



İşin Nevi	Aktarılan Miktar (TL.)
Orköy Destek Kredisi	3.364.184
Üretim İstihkakı	96.057.462
Silvikültür Faaliyetleri	8.858.819
Ağaçlandırma Faaliyetleri	871.724
%25 Kanuni Hak Ödemesi	3.519.520
TOPLAM	112.671.709



İSTANBUL ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Arz ederim

Celal PİR

İstanbul Orman Bölge Müdürü

2023

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

KIRKLARELİ

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖL...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.100.000

1.100.000

2

Proje Sayısı

1.100.000

Toplam Proje Tutarı

1.100.000

Toplam Harcama Tutarı

1.100.000

Toplam Yıl Ödeneği

1.100.000

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

761.293

3.Dönem Harcama Tutarı

338.707

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%69,21

%30,79

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
DEMİRKÖY	1.100.000
Toplam	1.100.000

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Turizm	1.100.000
Toplam	1.100.000

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	1.100.000
Toplam	1.100.000

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önc
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI MESCİT YAPIMI	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	354.350	354.350	
İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI YÜRÜŞ YOLLARI VE GİRİŞ ...	TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	745.650	745.650	
Toplam			1.100.000	1.100.000	



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ – KIRKLARELİ İL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İL KOORDİNASYON KURULU 2023 YILI 1. DÖNEM TOPLANTISI

11.01.2023



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI



İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI

2022 Yılında Genel Bütçe harcama kaleminden alan düzenlemesi için 1.100.000 TL bütçe ayrılmış olup,

11.03.2022 tarihinde çıkılan ihale ile;

- ✓ Mert Gölü mevkiinde yer alan kamp alanında yer alan mescit yapımı işi tamamlanmıştır.





İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI



Kalan ödenek ile;

- Kırklareli Şube Müdürlüğümüzce kullanılmak üzere Aladağ Orman İşletme Müdürlüğü, Sarıalan deposundan 45 m 3 3. sınıf uzunboy sarıçam tomruğu alım işi,
- Tomruğun emprenye yapılması işi,
- İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı yürüyüş platformu yapım işi,
- İğneada Longoz Ormanları Milli Parkına çöp konteyneri alım işi tamamlanmıştır.



T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı
yürüyüş platformu



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkına
çöp konteyneri





T.C. TARIM VE
ORMAN BAKANLIĞI

İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI MİLLİ PARKI



Projenin amacı;

İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı'nın alt ve üst yapı yatırımlarını gerçekleştirerek Milli Parkın ziyaretçi sayısı ve memnuniyetini artırmak.

Projenin faydası;

Ziyaretçi memnuniyeti ve sayısındaki artış ile birlikte korunan alanın tanıtımı gerçekleştirmek ve İğneada Beldesinin turizm gelirlerinde artış sağlamak.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

683.227.510

682.338.306

2

Proje Sayısı

4.213.952.206

Toplam Proje Tutarı

2.834.833.039

Toplam Harcama Tutarı

683.227.510

Toplam Yıl Ödeneği

682.338.306

Yılı Harcama Tutarı

98.877.912

1.Dönem Harcama Tutarı

213.190.413

2.Dönem Harcama Tutarı

88.215.937

3.Dönem Harcama Tutarı

282.054.044

4.Dönem Harcama Tutarı

%14,47

%31,20

%12,91

%41,28

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	2.834.833.039
Toplam	2.834.833.039

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	2.834.833.039
Toplam	2.834.833.039

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI	2.834.833.039
Toplam	2.834.833.039

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcam
DEMİRYOLU YAPIM, BAKIM VE ONARIMLARI	TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	7.645.850	10.787.786	94.7
HALKALI-KAPIKULE YÜKSEK STANDARTLI DEMİRYOLU İNŞAATI (60/230 ...	TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	675.581.660	4.203.164.420	2.152.400.0
Toplam			683.227.510	4.213.952.206	2.152.494.7



KIRKLARELİ İLİ 2023 YILI OCAK DÖNEMİ YATIRIM SUNUMU

Toplam Proje Sayısı	Toplam Proje Tutarı (TL)	Önceki Yıllar Toplam Harcaması (TL)	2022 Yılı Toplam Ödenek Tutarı (TL)	2022 Yılı Toplam Harcama Tutarı (TL)	2022 Yılı Fiziki İlerleme (%)	2022 Yılı Nakdi İlerleme (%)
10	4.213.938.897,124	2.359.231.355,41	602.545.849,74	682.338.304,93	74	52

2022 YILI İÇERİSİNDE

Ödeneği Çıkan Ancak İhale Dosyası Hazırlanmaya Başlanmayan İş Sayısı	İhale Dosyası Hazırlama Sürecinde Olan İş Sayısı	İhale Aşamasında Olan İş Sayısı	Devam Eden İş Sayısı	Geçici Kabul Aşamasında Olan İş Sayısı	İptal Olan İş Sayısı	Biten İş Sayısı
0	0	0	6	0	0	4

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2022 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2022 YILI HARCAMALARI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	PROJE DURUMU	AÇIKLAMALAR	YÜKLENİCİ FİRMA
1	Ulaştırma	Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin Altyapı, Üstyapı, Elektrik, Sinyalizasyon ve Telekomünikasyon İşlerinin Yapılması (Km:75+900-228+807)	Kırklareli %40	11.06.2019	31.12.2023	4.203.164.420,40 ₺	2.359.136.646,66 ₺	594.900.000,00 ₺	675.581.659,67 ₺	72%	70%	Devam ediyor	Devam ediyor	SALİNİ-KOLİN ADİ ORTAKLIĞI
2	Ulaştırma	Çerkezköy-Kapıkule Arasındaki 100 Adet Blok ve KBS Sinyallerinin Ledli Sinyalle Değişiminin Yapılması	Kırklareli %32	25.11.2021	25.05.2022	301.920,00 ₺	0,00 ₺	301.920,00 ₺	301.920,00 ₺	100%	100%	Bitti	15.11.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup malzeme teminleri tamamlanmıştır. Montaj çalışmaları ve kumanda merkezi yazılım güncellemeleri tamamlanmış olup sistem komple devreye alınmıştır.30 günlük deneme süreci tamamlanmış olup hakedişi ödenmiştir.	ORTANA ELEKTRONİK
3	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Trakya Hat Kesiminde Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemlerine Ait Bilgilerin F/O Kablo İle Çerkezköy Kumanda Merkezine Taşınması İş	Kırklareli %32	25.11.2021	25.05.2022	301.920	0	301.920	52.540	17%	100%	Devam ediyor	15.11.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olup malzeme teminleri tamamlanmıştır. Montaj çalışmaları ve kumanda merkezi yazılım güncellemeleri tamamlanmış olup sistem komple devreye alınmıştır.30 günlük deneme süreci başlamıştır. Deneme sürecinde bir problem çıkmazsa hakedişi ödenecektir.	ABAKÜS MÜHENDİSLİK TURİZM İNŞAAT

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2022 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2022 YILI HARCAMALARI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	PROJE DURUMU	AÇIKLAMALAR	YÜKLENİCİ FİRMA
4	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Alpullu Erişilebilirlik Projeleri Yapıtırılması 1.Etap İşi	Kırklareli %4,88	2018	2022	13.900,00 ₺	0,00 ₺	13.900,00 ₺	0,00 ₺	0%	60%	Devam ediyor.	Projeler onaydadır	Mir Mimarlık İnşaat
5	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Lüleburgaz Erişilebilirlik Projeleri Yapıtırılması 1.Etap İşi	Kırklareli %4,88	2018	2022	7.900,00 ₺	0,00 ₺	7.900,00 ₺	0,00 ₺	0%	60%	Devam ediyor.	Projeler onaydadır	Ramazan Demir Mimarlık Müh. İnş. San. Ve Tic. Ltd. Şti.
6	Ulaştırma	1. Bölge Müdürlüğü Pehlivan köy Erişilebilirlik Projeleri Yapıtırılması 1.Etap İşi	Kırklareli %4,88	2018	2022	14.327,74 ₺	0,00 ₺	14.327,74 ₺	14.327,74 ₺	100%	80%	Devam ediyor.	Projeler onaydadır	Kıymet İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2022 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2022 YILI HARCAMALARI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	PROJE DURUMU	AÇIKLAMALAR	YÜKLENİCİ FİRMA
7	Ulaştırma	Alpullu Çatalca Çorlu Kurfalı Lüleburgaz Muratlı Pehlivanköy Velimeşe Peron Peronbej Uzatma	Kırklareli %37,5	2022	2023	5.126.342,89 ₺	0,00 ₺	2.904.552,00 ₺	2.064.451,60 ₺	40%	40%	Devam ediyor.	09.06.2022 tarihinde ihalesi yapılmıştır. (İKN:2022/47549 6). 26.07.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır.	Çağın İnş. Tur. Nak. Paz. İth. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti.
8	Ulaştırma	1 Bölge Sınırları Dahilinde İstasyonların Saha Aydınlatmalarının Yapılması İşİ	Kırklareli %20	2022	2023	1.673.436,04 ₺	0,00 ₺	1.000.000,00 ₺	973.814,91 ₺	58%	80%	Devam ediyor.	Söz konusu işin 15.08.2022 tarihinde yer teslimi yapılmış olup sahada çalışmalara başlanmamıştır. Aydınlatma hesapları yapılmaktadır.	Enver Tunçel

TCDD 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İLİ YATIRIMLARI

SIRA NO	SEKTÖRÜ	PROJE ADI VE KARAKTERİSTİĞİ	PROJENİN YERİ	BAŞLAMA TARİHİ	BİTİŞ TARİHİ	PROJE TUTARI (TL)	ÖNCEKİ YILLAR HARCAMALARI (TL)	2022 YILI ÖDENEĞİ (TL)	2022 YILI HARCAMALARI (TL)	NAKDİ GERÇEKLEŞME (%)	FİZİKİ GERÇEKLEŞME (%)	PROJE DURUMU	AÇIKLAMALAR	YÜKLENİCİ FİRMA
9	Ulaştırma	1. Bölge Sınırları Dahilinde İstasyonların Kompanzasyon Sistemlerinin Yapılması	Kırklareli %15	11.03.2021	11.09.2021	91.150,05 ₺	94.708,76 ₺	9.750,00 ₺	8.631,02 ₺	113%	100%	Bitti	Geçici kabulü yapıldı.	Başar Elekt. İnşaat Müh. Tur. Gıda Nak. Paz. Tic. San. Ltd. Şti.
10	Ulaştırma	Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri İçin 9 Adet Kesintisiz Güç Kaynağı Temini	Kırklareli %33	30.09.2021	30.04.2022	3.283.500,00 ₺	0,00 ₺	3.283.500,00 ₺	3.283.500,00 ₺	100%	100%	Bitti	03.08.2021 tarihinde ihalesi yapılmış olup 17.09.2021 tarihinde sözleşmesi imzalanmıştır.30.09.2021 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Montaj çalışmaları tamamlanmıştır.	NETTA ELEKTRONİK TİCARET

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

Projenin Planlanan Bitiş Tarihi	: 31.12.2023
Toplam Güzergah Uzunluğu	: 229 km
Proje Bedeli	: 529,9 Milyon Avro

Ülkemiz, Asya-Avrupa arasında taşımacılık yönünden bir köprü konumundadır. Halkalı-Kapıkule demiryolu projesi, Asya-Avrupa koridorunun ilk parçasını oluşturmaktadır. Bu projenin tamamlanması ile birlikte İpek Demiryolu güzergâhının Ülkemizden geçen bölümünü Avrupa bağlantısını oluşturan en önemli halkalarından birini teşkil etmektedir.

229 km güzergâhta 200 km/s hıza uygun, çift hatlı, elektrikli ve sinyalli olarak hem yük hem de yolcu taşımacılığı yapılabilecek yeni hızlı tren hattı inşa edilecektir.

229 km uzunluğundaki projenin yaklaşık 55 km’si Edirne, yaklaşık 62 km’si Kırklareli, 36 km Tekirdağ il sınırları içerisinde kalmaktadır. Tekirdağ’da Çerkezköy Yolcu ve Çerkezköy Yük İstasyonu olmak üzere 2 istasyon olacaktır. Kırklareli’nde Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran olmak üzere 3 istasyon, Edirne ilimizde ise Edirne ve Kapıkule’de 2 istasyon olacaktır.

Hızlı tren projesi ile eş zamanlı olarak Kırklareli-Babaeski arasındaki 35 km’lik mevcut demiryolu hattının da yenilenmesi yapılarak Kırklareli il merkezinin hızlı tren ile bağlantısı planlanmaktadır.

Projenin tamamlanmasıyla;

- Halkalı-Kapıkule (Edirne) arası yolcu seyahat süresi 4 saatten 1 saat 20 dakikaya; yük taşıma süresi ise 6 saat 30 dakikadan 2 saat 20 dakikaya düşmesi,
- Mevcut durumda yıllık 1,53 milyon ton yük taşınmakta olup yıllık 9,6 milyon yük taşınması,
- Mevcut durumda yıllık ortalama 600 bin yolcudan yıllık 3,4 milyona çıkması,
- Mevcut hat kapasitesinin 42 trenden 200 tren üzerine çıkması hedeflenmektedir.

Proje iki kesimden oluşmaktadır.

Çerkezköy-Kapıkule(153 km);

İşin sözleşmesi 30.04.2019 tarihinde Salini Impregilo & Kolin Adi Ortaklığı tarafından imzalanmış ve 09.07.2019 tarihinde yer teslimi yapılarak işe başlanmıştır. İşin %59.88 tamamlanmıştır. İhale bedeli 529.899.70,00 Euro olan işin süresi 1460 gün olup iş bitiş tarihi 31.12.2023 ‘tür.

Halkalı-Ispartakule(8 km)/Ispartakule-Çerkezköy(68 km);

Proje Ulaştırma Altyapı Bakanlığı, Altyapı Genel Müdürlüğüne yürütülmekte olup dış finansman temini yapılmış, yapım ihale aşamasındadır.


Projenin 2026 tarihinde bitmesi öngörülmektedir.

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

TOPLAM PROJE BEDELİ = 529,9 Milyon Avro

AB Hibesi = 275 Milyon Avro TR Katkısı = 255 Milyon Avro

KIRKLARELİ	1. Babaeski	1. Ağayeri 2. Çavuşköy	3. Çengerli 4. Çiğdemli	5. Düğüncülü 6. Eriklyurdu	
	2. Lüleburgaz	1. Akçaköy 2. Alacaoğlu 3. Ayvalı	5. Çengelli 6. Çeşmekolu 7. Ceylanköy	9. Yıldırım Beyazıt 10. Gazi M. Kemal Paşa 11. Celaliye	

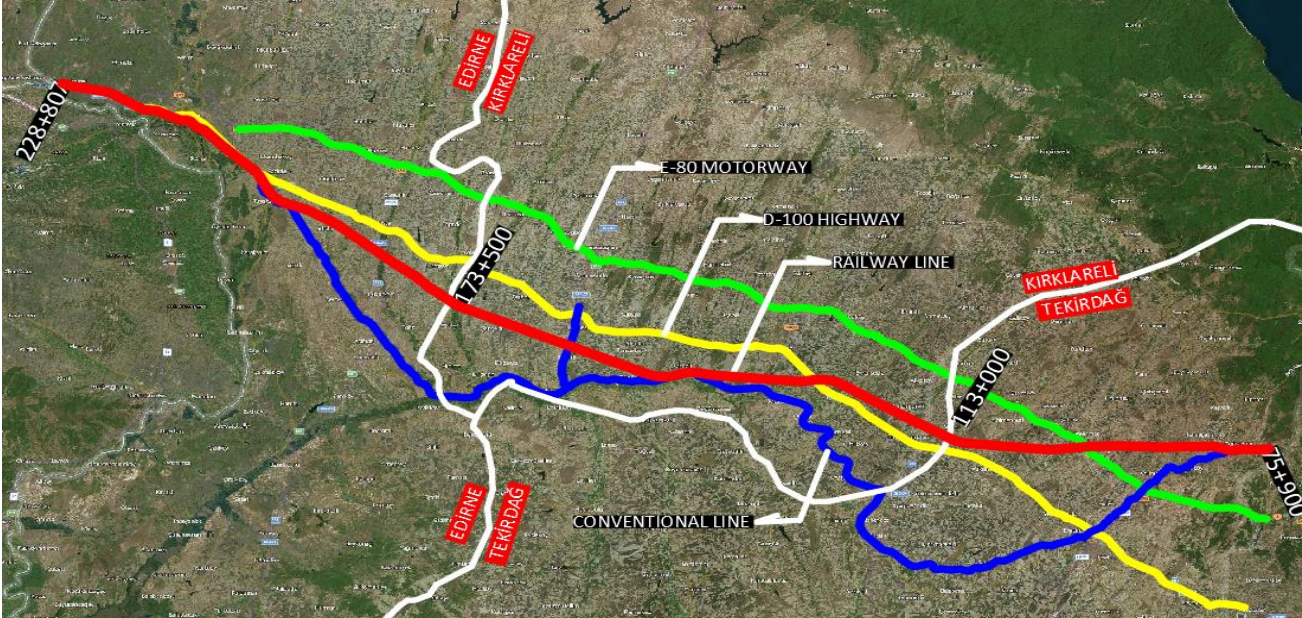

Toplam Hat Uzunluğu: 54,2 km

Tüm Hattın %40'ü

Ana Arter Geçişleri:

- 1 adet D565 Karayolu
- 1 adet D100 Karayolu
- 1 adet E80 Otoyolu

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ

	KIRKLARELİ (Adet)	KIRKLARELİ BİTEN (Adet)	PROJE TOPLAM (Adet)
MENFEZ	67	60	180
AÇ-KAPA TÜNEL	2	1	7
KARAYOLU ALTGEÇİT	29	28	52
KARAYOLU ÜSTGEÇİT	20	-	62
DEMİRYOLU KÖPRÜ	12	2	32
VİYADÜK	-	-	2

Yapılarının %79'ı BİTTİ

Toplam Sanat Yapılarının
%36'sı

NAKDİ İLERLEME : %72

FİZİKİ İLERLEME : %70

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



114+935 GÜZERGAH PLASTİK KAZIK İMALATI

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



117+535 GÜZERGAH PLASTİK KAZIK İMALATI

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



138+036-138+328 DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



158+281-158+539 DEMİRYOLU KÖPRÜSÜ

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



176+055 ÜST GEÇİDİ

HALKALI – KAPIKULE DEMİRYOLU HATTI ÇERKEZKÖY – KAPIKULE KESİMİNİN İNŞASI PROJESİ



172+460-173+210 AÇ-KAPA TÜNEL



ARZ EDERİM
NECMETTİN ACAR
BÖLGE MÜDÜRÜ

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

MADEN TETKİK VE ARAMA MARMAR...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

10.903.201

8.202.534

2

Proje Sayısı

13.856.200

Toplam Proje Tutarı

8.202.534

Toplam Harcama Tutarı

10.903.201

Toplam Yıl Ödeneği

8.202.534

Yılı Harcama Tutarı

2.531.598

1.Dönem Harcama Tutarı

981.117

2.Dönem Harcama Tutarı

1.586.485

3.Dönem Harcama Tutarı

3.103.334

4.Dönem Harcama Tutarı

%23,22

%9,00

%14,55

%28,46

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	8.202.534
Toplam	8.202.534

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Madencilik	8.202.534
Toplam	8.202.534

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	8.202.534
Toplam	8.202.534

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
TRAKYA BÖLGESİ OLİGOSEN HAVZASI KÖMÜR ARAMALARI	MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	10.903.200	10.903.200
TRAKYA YÖRESİ İNTRÜZİFLERLE İLİŞKİLİ POLİMETAL MADEN ARAMALARI	MADEN TETKİK VE ARAMA MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	2.953.000
Toplam			10.903.201	13.856.200





KIRKLARELİ İLİ YATIRIM BİLGİLERİ



1- Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Projenin Yeri	Başlama Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2022 yılı ödeneği (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Nakdi ger. (%)	Fiziki ger. (%)	Açıklamalar
	Toplam			10.903.200	10.903.200	10.903.200	8.202.534	75	98	
1	Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları Projesi	Kırklareli ve diğer iller	2022	10.903.200	10.903.200	10.903.200	8.202.534	75	98	Kırklareli ilinde 5.706,50 m. sondaj gerçekleştirilmiştir.



ARAZİ ÇALIŞMALARI



1- Trakya B lgesi Oligosen Havzası K m r Aramaları Projesi

Projenin Amacı:

Trakya Oligosen Havzasında bulunan k m r varlı ının geometrisinin ve rezervinin nitelik ve nicelik y n nden belirlenmesi ve k m r yata ının i letilebilirli ine esas olu turacak ve proje hazırlamaya temel olabilecek parametrelerin ortaya  ıkartılması projenin amacını olu turmaktadır.

Ger ekle me : Kırklareli ilinde 5.706,50 m. sondaj ger ekle tirilmi tir.  alı malar di er illerde devam etmektedir.



KIRKLARELİ İLİ YATIRIM BİLGİLERİ



2- Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi

Sıra no	Proje adı ve karakteristiği	Projenin Yeri	Başlama Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2022 yılı ödeneği (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Nakdi ger. (%)	Fiziki ger. (%)	Açıklamalar
	Toplam			2.953.000	2.953.000	2.953.000	-	-	100	
1	Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi	Kırklareli ve diğer iller	2022	2.953.000	2.953.000	2.953.000	-	-	100	Kamp merkezi Tekirdağ ilinde olup harcamalar o ilde gösterilmektedir. Kırklareli ilinde çalışmalar kapsamında 50 km ² lik alanda jeolojik etüt ve 50 km ² prospeksiyon çalışması gerçekleştirilmiştir.



ARAZİ ÇALIŞMALARI



2- Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları Projesi

Projenin Amacı:

Istranca Masifi içerisinde proje üretilmemiş veya prospeksiyon aşamasında bırakılmış polimetal cevherleşmelerine yönelik sahalardan ruhsat problemleri nedeniyle uzun zamandır çalışılmayan sahalardan ruhsatı alınanlarda, günümüz bilim ve teknoloji imkanlarıyla değerlendirmeler yaparak, eksik kalan çalışmaları tamamlamak, yeni rezervler ortaya koymak, gömülü yatakları aramaya yönelik modeller geliştirmek ve ruhsatı kurumumuzda bulunan veya gelecekte alınacak olan sahaların, polimetal cevherleşmeleri bakımından potansiyellerini ortaya koymak projenin temel amacını oluşturmaktadır.

Gerçekleşme : Kırklareli ilinde 50 km² jeolojik etüt ,50 km² prospeksiyon, 30 km² jeokimyasal etüt gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar termin plana uygun olarak gerçekleştirilmiş ve 15.10.2022 tarihinde sona ermiştir.



ARAZİ ÇALIŞMALARI





ARAZİ ÇALIŞMALARI






ARAZİ ÇALIŞMALARI





ARAZİ ÇALIŞMALARI

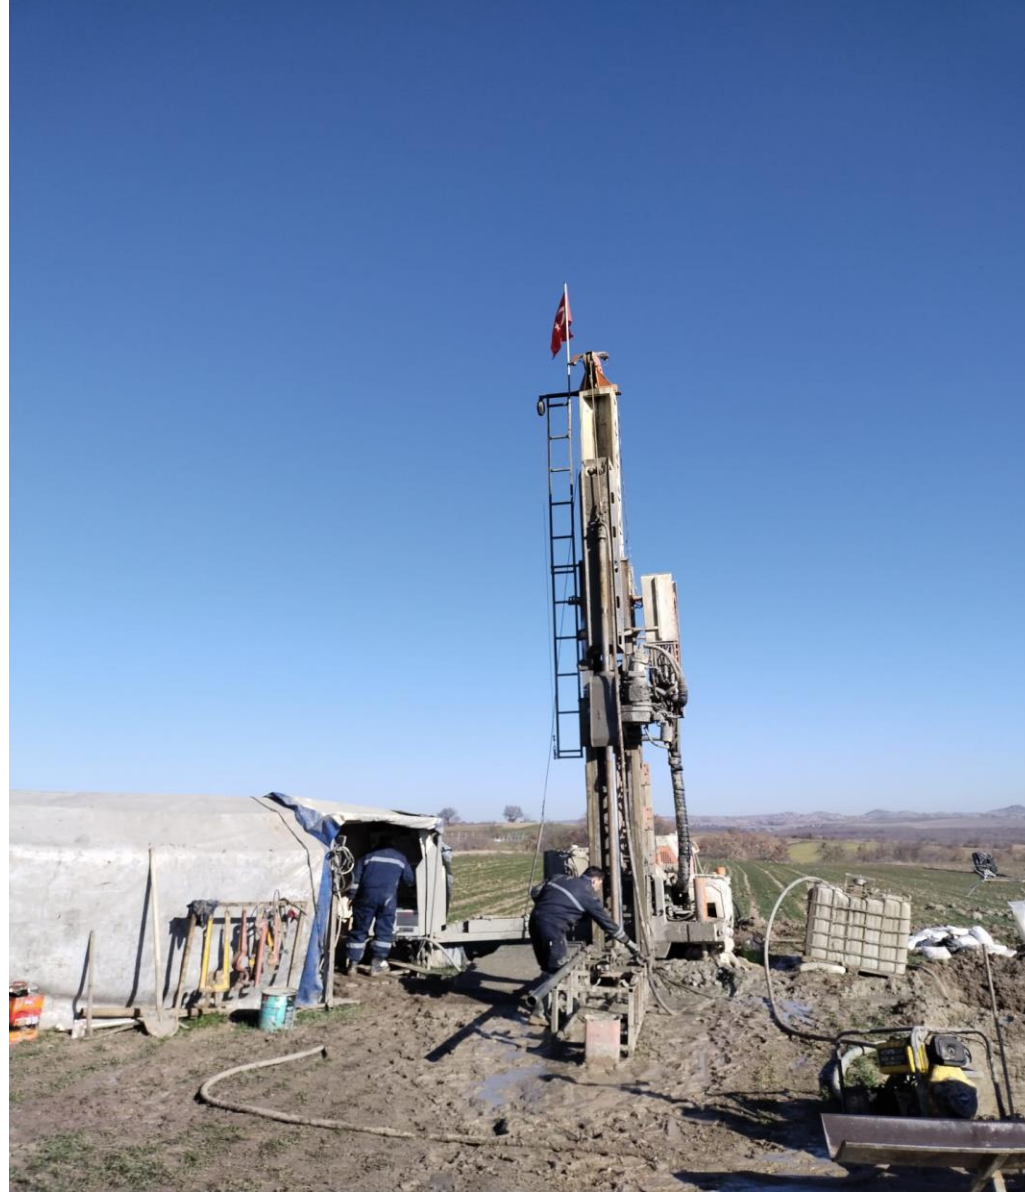



T.C.
MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MARMARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ARZ EDERİM.

Afşın EKMEKYAPAR
Bölge Müdürü

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

KIRKLARELİ

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

2.707.021

2.707.021

3

Proje Sayısı

7.636.314

Toplam Proje Tutarı

7.636.313

Toplam Harcama Tutarı

2.707.021

Toplam Yıl Ödeneği

2.707.021

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

1.299.922

2.Dönem Harcama Tutarı

415.932

3.Dönem Harcama Tutarı

991.167

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%48,02

%15,36

%36,61

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
LÜLEBURGAZ	2.283.504
MUHELİF İLÇE	5.352.809
Toplam	7.636.313

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	7.636.313
Toplam	7.636.313

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	7.636.313
Toplam	7.636.313

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Ör
KIRKLARELİ 2. GRUP KADASTRO GÜNCELLEMESİ	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	369.480	3.355.012	
LÜLEBURGAZ KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.283.504	2.283.504	
VİZE KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI	TAPU VE KADASTRO XIV. (EDİRNE) BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	54.037	1.997.798	
Toplam			2.707.021	7.636.314	

KIRKLARELİ

13
Proje Sayısı235.129.703
Toplam Proje Tutarı74.878.404
Toplam Harcama Tutarı71.881.605
Toplam Yıl Ödeneği54.968.694
Yılı Harcama Tutarı

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

71.881.605

54.968.694

4.467.463

1.Dönem Harcama Tutarı

32.839.344

2.Dönem Harcama Tutarı

10.146.013

3.Dönem Harcama Tutarı

7.515.874

4.Dönem Harcama Tutarı

%6,22

%45,69

%14,11

%10,46

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	14.556.803
LÜLEBURGAZ	2.821.193
MERKEZ	0
MUHTELİF İLÇE	1.007.249
VİZE	56.493.159
Toplam	74.878.404

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Enerji	74.878.404
Toplam	74.878.404

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	74.878.404
Toplam	74.878.404

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam H
(BABAESKİ-HAMİTABAT) BRŞ N.-LÜLEBURGAZ ENERJİ İLETİM HATTI	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	7.249	5.400.000	
(KIRKLARELİ-PINARHİSAR) BRŞ. N.-KIRKLARELİ OSB EİH	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	300.000	3.000.000	
(PINARHİSAR - TRAÇİM) BRŞ. N. - PAGDER ASLAN OSB EİH (TTFO)	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	5.500.000	6.500.000	
BABAESKİ TRAFO MERKEZİ YENİLEME	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1	16.000.000	1.
BALKAYA RES YEKA - VİZE 380 HAVZA EİH (TTFO)(154 KV, 1272 MCM, 1...	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	21.000.000	
BALKAYA RES-KIYIKÖY RES EİH (TTFO) (154 KV, 1272 MCM, 32 KM)	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	100.000	14.000.000	
HAMİTABAT TRAFO MERKEZİ YENİLEME	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	5.000.000	45.000.000	
KIRKLARELİ OSB TM 154/33 KV, 1. VE 2. TRAFO FİDERİ	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1.100.000	16.000.000	
LÜLEBURGAZ TRAFO MERKEZİ YENİLEME	TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	5.921.000	5.921.000	
Toplam			71.881.605	235.129.703	19



TEİAŞ 20. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

2023 YILI KIRKLARELİ 1.DÖNEM
RAPORU



2023 YILI KIRKLARELİ 1. DÖNEM RAPORU

- BİTEN PROJE SAYISI : **1**
- DEVAM EDEN PROJE SAYISI : **1**
- İHALE AŞAMASINDAKİ PROJE SAYISI : **10**
- TOPLAM PROJE TUTARI : **193.321.000 TL**
- 2022 YILI ÖDENEĞİ (TOPLAM) : **41.431.000 TL**
- 2022 YILI YAPILAN TOPLAM HARCAMA : **54.968.693,16 TL**
- NAKDİ GERÇEKLEŞME ORANI : **% 29**
- FİZİKİ GERÇEKLEŞME ORANI : **% 10**

Kırklareli İlinde Bulunan Trafo Merkezleri





KIRKLARELİ İLİ ENERJİ VERİLERİ VE KURULU GÜCÜ

	TÜKETİM (MWh)	ÜRETİM (MWh)	KURULU GÜÇ (MW)
EYLÜL	228.973.016	397.104.268	2106
EKİM	233.767.025	601.162.294	2106
KASIM	240.121.856	564.669.936	2106



2023 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN KIRKLARELİ İLİNE AİT PROJELER

- Vize 380 Havza TM Tevsiyat (154 kV, 3 fider (Balkaya RES-1, Balkaya RES-2, Sergen RES))
- Hamitabat TM Tevsiyat (380 kV, 2 Fider (Alibeyköy, Reaktör) + 380/154 kV, Ototrafo Fideri + 250 MVA Ototrafo + 420 kV)
- (Babaeski - Hamitabat) Brş. N. - Lüleburgaz EİH (154 kV 2x1272 MCM, 4 km)
- Balkaya RES YEKA - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 14+14 km(İki Ayrı Hat))
- Balkaya RES - Kırıkköy RES EİH (TTFO) (154 kV, 1272 MCM, 32 km)
- Sergen RES - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 22 km)
- Sergen RES - Evrencik RES EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 9 km)
- Pagder Aslan OSB TM(154/33 kV, 100 MVA + 2. Trafo Fideri)
- LÜLEBURGAZ TM TEVSIAT (154 kV, 2 Fider ,Babaeski Hamitabat)
- Kırklareli OSB TM 154/33 kV, 1. ve 2. Trafo Fideri
- (Kırklareli – Pınarhisar) Brş. N. – Kırklareli OSB EİH
- (Pınarhisar - Traçim) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH



Biten Projeler

- **Pagder Aslan OSB TM** (154/33 kV, 100 MVA + 2. Trafo Fideri) 30.05.2021 Tarihinde Yer Teslimi yapılmıştır. 16.11.2022 Tarihinde Geçici Kabul Protoklü imzalandı.

Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Projenin yeri (ilçe)	Başlam a tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2022 yılı ödeneği (TL)	2022 yılı har.
2020D00-149430-149508	Pagder Aslan OSB TM	<u>KİT</u>	Vize	2020	2022	30.500.000	23.500.000	47.411.930



Devam Eden Projeler

- **Lüleburgaz TM Tevsiat**(154 kV, 2 Fider ,Babaeski Hamitabat) 07.06.2022 Tarihinde Yer Teslimi yapılmıştır.

Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Projenin yeri (ilçe)	Başlam a tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	2022 yılı ödeneği (TL)	2022 yılı har.
18D002500	Lüleburgaz TM Tevsiat	<u>KİT</u>	Lüleburgaz	2022	2023	5.921.000	5.921.000	1.008.213



ARZ EDERİM.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

431.513.000

431.513.000

4

Proje Sayısı

431.513.000

Toplam Proje Tutarı

431.513.000

Toplam Harcama Tutarı

431.513.000

Toplam Yıl Ödeneği

431.513.000

Yılı Harcama Tutarı

57.025.952

1.Dönem Harcama Tutarı

77.413.787

2.Dönem Harcama Tutarı

98.667.261

3.Dönem Harcama Tutarı

198.406.000

4.Dönem Harcama Tutarı

%13,22

%17,94

%22,87

%45,98

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	431.513.000
Toplam	431.513.000

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Madencilik	431.513.000
Toplam	431.513.000

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI	431.513.000
Toplam	431.513.000

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harc
İDAME YENİLEME VE MAKİNE TEÇHİZAT ALIMI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.070.000	1.070.000	
KUYU TAMAMLAMA YATIRIMLARI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	110.902.000	110.902.000	
PETROL VE DOĞAL GAZ SAHALARI GELİŞTİRME YATIRIMLARI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	63.511.000	63.511.000	
SONDAJ YATIRIMLARI	TP TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	256.030.000	256.030.000	
Toplam			431.513.000	431.513.000	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

H

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

53.800.000

53.004.396

10

Proje Sayısı

81.060.000

Toplam Proje Tutarı

71.784.925

Toplam Harcama Tutarı

53.800.000

Toplam Yıl Ödeneği

53.004.396

Yılı Harcama Tutarı

221.251

1.Dönem Harcama Tutarı

2.949.190

2.Dönem Harcama Tutarı

11.706.115

3.Dönem Harcama Tutarı

38.127.840

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,41

%5,48

%21,76

%70,87

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MERKEZ	71.034.058
MUHTELİF İLÇE	750.867
Toplam	71.784.925

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	59.819.306
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	11.965.619
Toplam	71.784.925

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÜNİVERSİTELER	71.784.925
Toplam	71.784.925

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar
ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜD PROJESİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	100.000	100.000	
DİĞER KAMPÜS ALTYAPI ÇALIŞMALARI	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Bitti	760.000	760.000	
GIDA ODAK ALAN İHTİSASLAŞMA PROJESİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	12.000.000	15.000.000	
KAYALI YERLEŞKESİ KAMPÜS GİRİŞİNDEN CAMİYE KADAR OLAN HATTI...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Bitti	240.000	1.000.000	
KAYALI YERLEŞKESİ TIP FAKÜLTESİ İNŞAATI (... DERSLİK, 15.000 M2)	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Devam Ediyor	25.000.000	48.500.000	
KESİN KABUL ÖDEMELERİ	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Bitti	400.000	400.000	
MAKİNE TEÇHİZAT, OKUL VE BÜRO MEFRUŞATI, DEMİRBAŞ, BİLGİSAYAR...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Bitti	12.000.000	12.000.000	
MUHTELİF BAKIM VE ONARIMLAR	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Bitti	1.250.000	1.250.000	
REKTÖRLÜK VE BAĞLI BİRİMLERİ MEKANİK VE ELEKTRİK BAKIM VE ONA...	KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ	Bitti	750.000	750.000	
Toplam			53.800.000	81.060.000	

Kırklareli Tıp Fakóltesi



Başlama bitiş tarihi : 2020 - 2023

Proje tutarı : 48.500.000

Önceki yıllar harcaması : 18.021.433

2022 ödeneđi : 25.000.000

2022 gönderilen ödenek : 25.000.000

2022 harcaması : 24.866.954

Nakdi gerçekleşme : % 99

Fiziki gerçekleşme : % 68

2.9.2020 tarihinde yer teslim yapılmıştır. Sözleşmeye göre işin bitiş tarihi 18.6.2023'dür.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

43.226.278

39.120.184

20

Proje Sayısı

58.901.158

Toplam Proje Tutarı

53.382.882

Toplam Harcama Tutarı

43.226.278

Toplam Yıl Ödeneği

39.120.184

Yılı Harcama Tutarı

490.467

1.Dönem Harcama Tutarı

9.080.959

2.Dönem Harcama Tutarı

7.101.462

3.Dönem Harcama Tutarı

22.447.296

4.Dönem Harcama Tutarı

%1,13

%21,01

%16,43

%51,93

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	0
LÜLEBURGAZ	22.302
MERKEZ	15.204.062
MUHTELİF İLÇE	34.694.705
PINARHİSAR	2.344.896
VİZE	1.116.917
Toplam	53.382.882

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	23.083.230
Eğitim	16.329.593
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	10.446.415
Madencilik	2.124.000
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	789.746
Tarım	609.898
Toplam	53.382.882

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
YEREL YÖNETİMLER	53.382.882
Toplam	53.382.882

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam H
ACIL ARAMA VE KURTARMA HİZMETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	630.521	630.521	
BABAESKİ SİNANLI OSMANLI ÇEŞMESİ BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Projeye Başlanmadı	93.500	93.500	
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	274.850	274.850	
HAYVAN İÇMESUYU GÖLETLERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	135.001	160.000	
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	310.000	310.000	
KIRKLARELİ İLİM YAYMA CEMİYETİ BİNASI RESTORASYONU	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	796.987	876.136	
KIRKLARELİ KOCAHIDIR İLKÖĞRETİM OKULU RÖLEVE RESTİTÜSYON VE ...	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	1	1.071.000	
KIRKLARELİ YAPRAKLI MAHALLESİNDEKİ TAŞINMAZIN RESTİTÜSYON VE ...	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Devam Ediyor	2.571.283	8.389.728	5
KÖY İÇMESULARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ	Bitti	3.404.928	3.557.927	
Toplam			43.226.278	58.901.158	14.

İl Özel İdaresi

	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 Yılı Programı (TL)	2022 Yılında Gönderilen Ödenek (TL)	2022 Yılı Harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	Proje aşamasındaki proje sayısı	İhale aşamasındaki proje sayısı	İhalesi yapılan proje sayısı	Yer teslimi yapılan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam	362	86.788.380	14.262.698	71.113.500	63.403.142	62.788.485	11	1	11	0	0	0	51	288	88
İl Özel İdaresi	252	58.901.158	14.262.698	43.226.278	39.734.841	39.120.184	9	1	3	0	0	0	24	215	91
Tarım / Sulama	1	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Tarım / Bitkisel üretim	6	274.850	0	274.850	244.783	244.783	1	0	0	0	0	0	0	5	89
Tarım / Hayvancılık	5	470.000	0	445.001	365.115	365.115	0	0	1	0	0	0	1	3	82
Madencilik	1	2.200.000	2124000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Ulaştırma	125	23.697.870	30.513	23.667.357	23.194.866	23.052.717	3	0	0	0	0	0	8	114	97
Eğitim / Kültür	9	18.760.436	11.027.691	6.574.560	5.301.902	5.301.902	1	1	0	0	0	0	7	0	81
DKH İktisadi / Güvenlik hizmetleri	1	890.000	789.746	100.254	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
DKH Sosyal / İçmesuyu	41	3.557.927	0	3.404.928	2.669.247	2.669.247	4	0	2	0	0	0	1	34	78
DKH Sosyal / Kanalizasyon	11	1.370.000	0	1.370.000	1.280.000	1.280.000	0	0	0	0	0	0	1	10	93
DKH Sosyal / Kırsal alan planlaması	51	6.999.554	290.748	6.708.806	6.444.344	5.971.836	0	0	0	0	0	0	4	47	89
DKH Sosyal / Afetler	1	630.521	0	630.521	234.584	234.584	0	0	0	0	0	0	0	1	37
KÖYDES	110	27.887.222	0	27.887.222	23.668.301	23.668.301	2	0	8	0	0	0	27	73	85
Ulaştırma	38	12.976.511	0	12.976.511	12.183.997	12.183.997	0	0	5	0	0	0	8	25	94
DKH Sosyal / İçmesuyu	52	11.750.395	0	11.750.395	8.725.363	8.725.363	1	0	3	0	0	0	14	34	74
DKH Sosyal / Kanalizasyon	20	3.160.316	0	3.160.316	2.758.941	2.758.941	1	0	0	0	0	0	5	14	87

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETL...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.884.618

297.527

7

Proje Sayısı

34.702.646

Toplam Proje Tutarı

297.527

Toplam Harcama Tutarı

1.884.618

Toplam Yıl Ödeneği

297.527

Yılı Harcama Tutarı

52.622

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

160.830

3.Dönem Harcama Tutarı

84.075

4.Dönem Harcama Tutarı

%2,79

%0,00

%8,53

%4,46

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAEŞKİ	197.216
MERKEZ	100.311
Toplam	297.527

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	297.527
Toplam	297.527

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI	297.527
Toplam	297.527

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı
BABAEŞKİ SOSYAL HİZMET MERKEZİ TEFRİŞATI	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	241.906	241.90
KIRKLARELİ AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE S...	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	498.26
KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜRO MEFRU...	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	100.311	100.31
KIRKLARELİ HUZUREVİ EK BİNA ÇATI ONARIMI	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	216.213	216.21
KIRKLARELİ HUZUREVİ İHATA DUVARİ YAPIMI	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	429.619	429.61
KIRKLARELİ HUZUREVİ RÖLEVE PROJESİ HAZIRLANMASI	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	216.334	216.33
KIRKLARELİ HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ İNŞ...	KIRKLARELİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	680.234	33.000.00
Toplam			1.884.618	34.702.64

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

28.287.222

24.067.888

4

Proje Sayısı

28.287.222

Toplam Proje Tutarı

24.067.888

Toplam Harcama Tutarı

28.287.222

Toplam Yıl Ödeneği

24.067.888

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

21.123.311

3.Dönem Harcama Tutarı

2.944.577

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%0,00

%74,67

%10,41

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MERKEZ	399.587
MUHTELİF İLÇE	23.668.301
Toplam	24.067.888

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Ulaştırma - Haberleşme	12.183.997
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	11.484.304
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	399.587
Toplam	24.067.888

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI	24.067.888
Toplam	24.067.888

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ BAKIM VE O...	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	400.000	
KÖY İÇMESULARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI (KÖYDES)	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	11.750.395	11
KÖY KANALİZASYONLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI (KÖYDES)	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	3.160.316	3
KÖY YOLLARI YAPIM, BAKIM VE ONARIMI (KÖYDES)	KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	12.976.511	12
Toplam			28.287.222	28.



TÜRKİYE CUMHURİYETİ
KIRKLARELİ ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ

YEŞİL KALKINMA
YOLUNDA
Türkiye


2022



İŞİN ADI	Kırklareli Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binası Genel Onarım İşİ
İHALE VE AKİT MAKAMI	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
YÜKLENİCİ FİRMA	Serkan KILIÇ
DANIŞMAN	-
SÖZLEŞME TARİHİ	27.06.2022
İHALE USULÜ	4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu / Açık İhale Usulü
SÖZLEŞME BEDELİ	396.000,00 TL + 3.586,74 TL(Ek Sözleşme Bedeli)=399.586,74 TL + KDV
YER TESLİM TARİHİ	29.06.2022
İŞ BİTİM TARİHİ	09.08.2022
İŞİN SÜRESİ	90 GÜN
KESİN TEMİNAT TUTARI	24.000,00 TL
SÜRE UZATIMI	-
NAKDİ GERÇEKLEŞME	%100
FİZİKİ GERÇEKLEŞME (İnşaat)	%100
GEÇİCİ KABUL TARİHİ	09.08.2022
KESİN KABUL TARİHİ	YAPILMADI
RAPOR DÖNEMİ	15.09.2022



ÇATI ONARIM SONRASI:

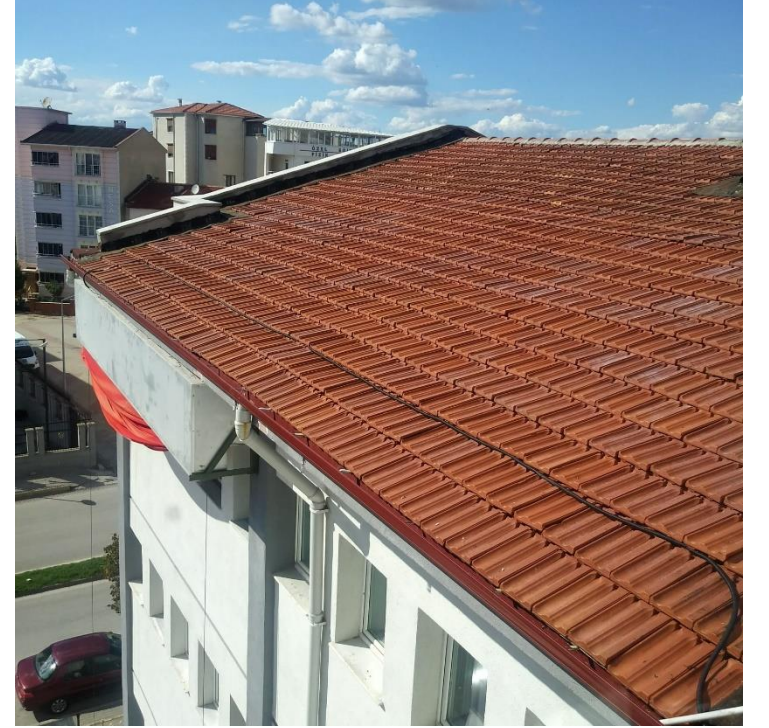



MİLLİ EMLAK ARŞİV YAPIMI SONRASI:



KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜD...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

79.933.933

66.337.078

17

Proje Sayısı

200.932.529

Toplam Proje Tutarı

87.143.274

Toplam Harcama Tutarı

79.933.933

Toplam Yıl Ödeneği

66.337.078

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

5.899.872

2.Dönem Harcama Tutarı

233.939

3.Dönem Harcama Tutarı

60.203.267

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%7,38

%0,29

%75,32

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	3.023.658
LÜLEBURGAZ	50.320.328
MERKEZ	25.987.302
PINARHİSAR	6.304.757
VİZE	1.507.229
Toplam	87.143.274

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	83.048.508
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	3.707.726
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	387.040
Toplam	87.143.274

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI	87.143.274
Toplam	87.143.274

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Öncelik
BABAESKİ ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	3.023.658	3.023.658	
KIRKLARELİ ARMAĞAN SPOR ALANI ÜZERİNİN KAPATILMASI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	82.600	82.600	
KIRKLARELİ HAYDAR SÜKAN KIŞLASI AÇIK SPOR TESİSLERİ YAPIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	782.635	782.635	
KIRKLARELİ HOKEY SAHASI TRİBÜN, SOYUNMA ODALARI VE AYDINLAT...	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	3.919.685	3.919.685	
KIRKLARELİ MUSTAFA YAMAN SPOR TESİSİ TENİS KORTLARI BAKIM VE ...	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	645.794	1.336.279	
KIRKLARELİ SPOR SALONU YAPIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1	38.775.240	
KIRKLARELİ TENİS KORTU VE ERKEK ÖĞRENCİ YURDU ÇATILARI BAKIM ...	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	622.500	622.500	
LÜLEBURGAZ 8 KASIM STADI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	8.260.000	8.260.000	
LÜLEBURGAZ ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.937.846	2.937.846	
Toplam			79.933.933	200.932.529	

**T.C.
KIRKLARELİ VALİLİĞİ**



GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



2022

İÇİNDEKİLER

➤ BİTEN PROJELERİMİZ

- Merkez Kapalı Tenis Kortları Bakım Onarım ve Yapım İşi
- Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor Tesisi Yapım İşi
- Pınarhisar Gençlik Merkezi Binasında Kenet Sistem Çatı Örtüsü Onarım İşi
- Kırklareli Merkez Tenis Kortu ve Erkek Öğrenci Yurt Çatıları Bakım Onarım ve Yapım İşi
- Vize İlçe Tesisleri Çevre İhata Duvarı ve Panel Çit Yapım İşi

➤ DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

- Kırklareli Merkez Kapalı Spor Salonu Genel Bakım Onarım Projesi
- Merkez Sentetik Çim Yüzeyli Hokey Sahası Soyunma Odaları, Tribün ve Aydınlatma Yapım İşi
- Lüleburgaz 2000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapım İşi
- Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşi
- Pınarhisar Soyunma Odaları, Çelik Tribün ve Saha Aydınlatma Yapım İşi
- Vize İlçe Müdürlüğü Tesisleri Doğalgaz Dönüşüm İşi

➤ YAPIM AŞAMASINDA BULUNAN PROJELERİMİZ

- Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım Onarım ve Yapım İşi
- Vize İlçe Gençlik Merkezi Yapım İşi
- Üsküp Beldesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi
- Demirköy İlçesi Spor Salonu Yapım İşi
- Armağan Köyü Spor Alanının Üzerinin Kapatılma Yapım İşi



BİTEN PROJELERİMİZ

- *Merkez Kapalı Tenis Kortları Bakım Onarım ve Yapım İşi*
- *Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor Tesisi Yapım İşi*
- *Pınarhisar Gençlik Merkezi Binasında Kenet Sistem Çatı Örtüsü Onarım İşi*
- *Kırklareli Merkez Tenis Kortu ve Erkek Öğrenci Yurt Çatıları Bakım Onarım ve Yapım İşi*
- *Vize İlçe Tesisleri Çevre İhata Duvarı Ve Panel Çit Yapım İşi*
- *Vize İlçe Müdürlüğü Tesisleri Doğalgaz Dönüşüm İşi*
- *Pınarhisar Soyunma Odaları, Çelik Tribün ve Saha Aydınlatma Yapım İşi*
- *Lüleburgaz Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım Onarım İşi*
- *Babaeski Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım Onarım ve Yapım İşi*
- *Merkez Sentetik Çim Hokey Sahası Soyunma Odaları ve Tribün, Çevre Panel Çit Yapım İşi*



MERKEZ KAPALI TENİS KORTLARI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan kapalı tenis kortlarının eskiyen zeminin yenilenmesi ve çevre düzenlenmesinin yapılarak tenis branşında yetenekli sporcuların yetişmesine yönelik yürüttüğümüz bir projedir.

İşin Adı : Merkez Kapalı Tenis Kortları Bakım
Onarım ve Yapım İşİ


Sözleşme Tarihi : 10.11.2021

Geçici Kabul Tarihi : 13.05.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 619.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100

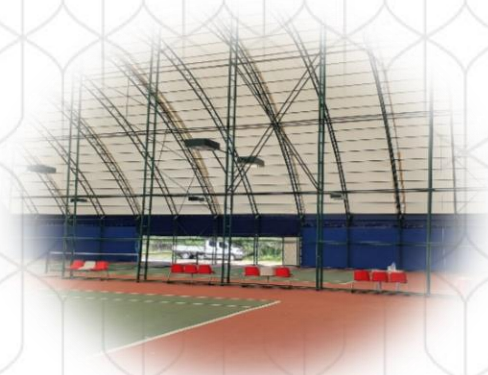

ORG. HAYDAR SÜKAN KIŞLASI AÇIK SPOR TESİSİ YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan askeri kışlamıza spor tesisi yaparak yaşamın her alanında modern spor tesislerini vatandaşımıza sunma çerçevesinde yürüttüğümüz bir projedir.

İşin Adı : Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor
Tesis Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 04.01.2021

Geçici Kabul Tarihi : 12.05.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 511.301,79 TL + KDV

Sözleşme Bedeli : 663.250,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

SPORTOTO



PINARHİSAR GENÇLİK MERKEZİ BİNASI KENET SİSTEM ÇATI ÖRTÜSÜ ONARIM İŞİ

Projenin Amacı : İlçemizdeki gençlik merkezi çatısının şiddetli fırtınadan zarar görmesi sonucunda daha sağlıklı ve daha güvenli, modern bir çatı sistemi ile yenilediğimizi bir projedir.

İşin Adı : Pınarhisar Gençlik Merkezi
Binasında Kenet Sistem Çatı Örtüsü Onarım İşİ


Sözleşme Tarihi : 25.02.2021

Geçici Kabul Tarihi : 12.05.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 540.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100

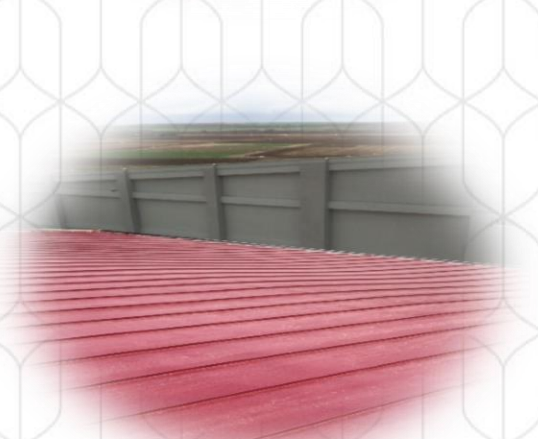

KIRKLARELİ MERKEZ TENİS KORTU VE ERKEK ÖĞRENCİ YURT ÇATILARI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizdeki açık tenis sahası brandalarının ve merkez ilçemizdeki yurt çatılarının şiddetli fırtınadan zarar görmesi sonucunda yenileme çalışması yaptığımız, tesisimizi daha modern bir görünüme kavuşturmak için gerçekleştirdiğimiz bir projedir.

İşin Adı : Kırklareli Merkez Tenis Kortu
ve Erkek Öğrenci Yurt Çatıları Bakım Onarım ve Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 18.03.2022

Geçici Kabul Tarihi : 12.05.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 299.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %100



VİZE İLÇE TESİSLERİ ÇEVRE İHATA DUVARI VE PANEL ÇİT YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Vize ilçemizde bulunan spor tesisimizin daha güvenli ve modern bir yapıya dönüşmesi için Spor Toto sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bir başka projemizdir.

İşin Adı : Vize İlçe Tesisleri Çevre İhata Duvarı ve Panel Çit Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 06.04.2022

Geçici Kabul Tarihi : 30.05.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 917.300,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

NOT: Bu projemizde yüklenici üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmediği için sözleşmesi 12.01.2022 tarihinde idaremizce fesh edilmiş ve tekrardan idaremizce ihaleye çıkılmış olup yeni sözleşme bilgileri yukarıda belirtilmiştir.



PINARHİSAR SOYUNMA ODASI, ÇELİK TRIBÜN VE SAHA AYDINLATMA YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Pınarhisar ilçesine yapılması planlanan projemizde herkesi spor yapmaya teşvik etmek ve geleceğe yönelik milli sporcular yetiştirerek ülke sporuna katkı sağlamak amacıyla Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda yürütülen bir projedir.

İşin Adı : Pınarhisar Soyunma Odası, Çelik Tribün ve Saha Aydınlatma Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 18.03.2022

Geçici Kabul Tarihi : 05.10.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 3.975.100,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

NOT: Bu projemizin 20.12.2021 tarihinde ihalesi yapılmış, ihaleye katılım olmadığı için ihale iptal edilmiştir. Yaklaşık Maliyeti güncellenerek tekrardan ihaleye çıkılmış olup yüklenici ile imzalanan sözleşme bilgileri yukarıda belirtilmiştir.



MERKEZ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ HOKEY SAHASI SOYUNMA ODALARI, TRİBÜN VE AYDINLATMA YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik tamamladığımız bir projedir.

İşin Adı : Merkez Sentetik Çim Yüzeylı Hokey Sahası
Soyunma Odaları, Tribün ve Aydınlatma Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 22.03.2022

Geçici Kabul Tarihi : 19.07.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 3.164.939,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100

NOT: Bu projemizin 28.12.2021 tarihinde ihalesi yapılmış, ihaleye yeterli katılım olmadığı için ihale iptal edilmiştir. Yaklaşık Maliyeti güncellenerek tekrardan ihaleye çıkılmış olup yüklenici ile imzalanan sözleşme bilgileri yukarıda belirtilmiştir.



VİZE İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLERİ DOĞALGAZ DÖNÜŞÜM İŞİ

Projenin Amacı : Vize ilçemizde bulunan spor tesisimizin ısıtma sistemini modernleştirerek daha ekonomik bir hale getirmek için İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projemizdir.

İşin Adı : Vize İlçe Müdürlüğü Tesisleri
Doğalgaz Dönüşüm İşİ

Sözleşme Tarihi : 18.04.2022

Geçici Kabul Tarihi : 16.06.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 328.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100



LÜLEBURGAZ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI BAKIM ONARIM İŞİ

Projenin Amacı : Lüleburgaz ilçemizde bulunan spor tesisimizin zemin yenilemesi kapsamında İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projemizdir.

İşin Adı : Lüleburgaz Sentetik Çim
Yüzeyli Futbol Sahası Bakım Onarım İşİ

Sözleşme Tarihi : 28.10.2022

Geçici Kabul Tarihi : 07.12.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 2.489.700,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100



BABAESKİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Babaeski ilçemizde bulunan spor tesisimizin zemin yenilemesi kapsamında İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirdiğimiz dönüşüm projemizdir.

İşin Adı : Babaeski Sentetik Çim Yüzeyli
Futbol Sahası Bakım Onarım İşİ

Sözleşme Tarihi : 09.08.2022

Geçici Kabul Tarihi : 14.10.2022

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 2.247.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 100



DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

- *Lüleburgaz 2000 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu Yapım İşı*
- *Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İşı*
- *Kırklareli Merkez Yeni Spor Salonu Yapım İşı*



KIRKLARELİ YENİ SPOR SALONU YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Son yıllarda başarılı sporcular yetiştiren ülkemizin güzide şehirlerinden olan Kırklareli’nde gençlerimize modern spor tesisleri sunarak onları spora teşvik etmek ve gençlerimizden uluslararası kulvarlarda ülkemizi başarı ile temsil edecek sporcular yetişmesini sağlamak amacıyla yeni spor salonu projemize başlanmıştır.

İşin Adı : Kırklareli Yeni Spor Salonu Yapım İşi

Sözleşme Tarihi : 07.10.2020

Geçici Kabul Tarihi : 18.02.2022 (Yüklenici konkordato ilan etti.)

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 30.318.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 70

NOT: Bu projemiz için Bakanlığımız ile yapılan görüşmelerde yüklenici firmanın sözleşmesinin fesih işlemlerine başlandığına dair bilgilendirme şifahi olarak İl Müdürlüğümüze söylenmiştir.



LÜLEBURGAZ 2000 SEYİRCİ KAPASİTELİ SPOR SALONU YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Trakya bölgesinde kavşak niteliği taşıyan Lüleburgaz ilçemizde büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak, bölgemizi spor alanında cazibe merkezi olmasını sağlamak en önemli hedeflerimiz arasında yer almaktadır. Şuanda fizibilite çalışmalarını yaptığımız projemizi Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğu ile gerçekleştirilecektir.



İşin Adı : Lüleburgaz 2000 Seyirci Kapasiteli

Spor Salonu Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : 26.05.2022

Geçici Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 97.840.000,00 TL + KDV

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 25.000.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : % 30



LÜLEBURGAZ YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Trakya bölgesinde kavşak niteliği taşıyan Lüleburgaz ilçemizde büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmak için başlattığımız projelerimizden bir tanesi olan yarı olimpik yüzme havuzu projemizle hem ülke genelinde yüzme yarışlarını organize etmek hem de ilçemizde ilk büyük çaplı yüzme havuzu inşa ederek gençlerimizi yüzmeye teşvik ederek uluslararası platformda ülkemizi temsil edecek sporcuların yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla başlattığımız ve şu anda fizibilite çalışmalarını yaptığımız Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bir projedir.

SPOR TOTO

İşin Adı : Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapım İş

Sözleşme Tarihi : 13.06.2022

Geçici Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Kesin Kabul Tarihi : Yapılmadı.

Sözleşme Bedeli : 13.900.000,00 TL + KDV

Spor Toto Sözleşme Bedeli : 4.300.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %35



YAPIM AŞAMASINDA BULUNAN PROJELERİMİZ

- *Lüleburgaz 8 Bakım Onarım ve Yapım İşi*
- *Vize İlçe Gençlik Merkezi Yapım İşi*
- *Üsküp Beldesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol Sahası Yapım İşi*
- *Demirköy İlçesi Spor Salonu Yapım İşi*
- *Armağan Köyü Spor Alanının Üzerinin Kapatılma Yapım İşi*
- *Kırklareli Gençlik Merkezi Bakım Onarım ve Perde Duvar İşi*
- *Lüleburgaz Gençlik Merkezi Bakım Onarım İşi*



LÜLEBURGAZ 8 KASIM STADI BAKIM ONARIM VE YAPIM İŞİ

İl Müdürlüğümüze bağlı Lüleburgaz İlçesinde bulunan İlçe Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezimiz bölge halkını sporla iç içe yaşamasının yönünde düzenlediği spor etkinlikleriyle gerek yerel gerek ulusal basında ön plana çıkan teşkilatımızın önemli bir parçasıdır.

İşin Adı : Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım
Onarım ve Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 7.000.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



VİZE İLÇESİ GENÇLİK MERKEZİ YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı : Vize İlçe Gençlik Merkezi Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 1.832.785,54 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



ÜSKÜP BELDESİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı : Üsküp Beldesi Sentetik Çim Yüzeyli Futbol
Sahası Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 2.623.564,45 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



DEMİRKÖY İLÇESİ SPOR SALONU YAPIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez ilçemizde bulunan hokey sahamızın eksikliklerini gidererek daha fazla verim almaya yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı	: Demirköy İlçesi Spor Salonu Yapım İşİ
Sözleşme Tarihi	: Proje Aşamasında
İş Bitim Tarihi	: -
Sözleşme Bedeli	: 6.000.000,00 TL + KDV
Fiziki Gerçekleşme Oranı	: %0



ARMAĞAN KÖYÜ SPOR ALANININ ÜZERİNİN KAPATILMA YAPIM PROJESİ

Projenin Amacı : Merkez Armağan köyü belde halkının yılın her mevsiminde spor yapma imkanı sunmak amacıyla bölgede mevcut bulunan spor alanının üzerinin kapatılmasına yönelik başlattığımız ve şuanda fizibilite aşamasında olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bir projedir.



İşin Adı : Armağan Köyü Spor Alanının Üzerinin Kapatılma Yapım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 70.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0

NOT: Bu projemiz için yapılan yaklaşık maliyet çalışması belirlenen sözleşme bedelinin üzerinde olması sebebiyle Projeye başlanılmamış olup sözleşme fiyatının güncellenmesi beklenilmektedir.



KIRKLARELİ GENÇLİK MERKEZİ BAKIM ONARIM VE PERDE DUVAR İŞİ

Projenin Amacı : Merkez’de bulunan Gençlik Merkezimizin daha güvenli hale getirilmesi ve modernizasyonun sağlanmasına yönelik yapacağımız bir projedir.

İşin Adı : Kırklareli Gençlik Merkezi Bakım Onarım ve Perde Duvar İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 1.199.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



LÜLEBURGAZ GENÇLİK MERKEZİ BAKIM ONARIM İŞİ

Projenin Amacı : Merkez Armağan köyü belde halkının yılın her mevsiminde spor yapma imkanı sunmak amacıyla bölgede mevcut bulunan spor alanının üzerinin kapatılmasına yönelik başlattığımız ve şuanda fizibilite aşamasında olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı sponsorluğunda gerçekleştireceğimiz bir projedir.



İşin Adı : Lüleburgaz Gençlik Merkezi Bakım Onarım İşİ

Sözleşme Tarihi : Proje Aşamasında

İş Bitim Tarihi : -

Sözleşme Bedeli : 774.000,00 TL + KDV

Fiziki Gerçekleşme Oranı : %0



KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ VALİLİĞİ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

11.258.544

10.832.977

7

Proje Sayısı

29.132.858

Toplam Proje Tutarı

28.707.291

Toplam Harcama Tutarı

11.258.544

Toplam Yıl Ödeneği

10.832.977

Yılı Harcama Tutarı

303.100

1.Dönem Harcama Tutarı

442.966

2.Dönem Harcama Tutarı

8.212.959

3.Dönem Harcama Tutarı

1.873.952

4.Dönem Harcama Tutarı

%2,69

%3,93

%72,95

%16,64

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
KOÇCAZ	87.202
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	23.554.555
MUHTELİF İLÇE	3.315.534
PINARHİSAR	1.750.000
VİZE	0
Toplam	28.707.291

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	26.870.089
Konut	1.837.202
Toplam	28.707.291

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	28.707.291
Toplam	28.707.291

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam Harcaması	Yılı H
BULGARİSTAN SINIR BÖLGESİNE ENERJİ HATTI ÇEKİLMESİ	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	279.016	3.594.550	3.315.534	
DOĞAL AFET GİDERLERİ	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	9.771.809	22.715.174	12.943.365	
KIRKLARELİ HÜKÜMET BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	723.966	839.381	115.415	
KOÇCAZ HÜKÜMET KONAĞI BAKIM ONARIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Bitti	96.823	96.823	0	
LÜLEBURGAZ HÜKÜMET KONAĞI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	116.601	116.601	0	
RHİSAR KAYMAKAMEVİ İNŞAATI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	250.000	1.750.000	1.500.000	
VİZE HÜKÜMET KONAĞI BAKIM VE ONARIMI	KIRKLARELİ VALİLİĞİ	Devam Ediyor	20.329	20.329	0	
Toplam			11.258.544	29.132.858	17.874.314	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

2.010.167

1.619.768

2

Proje Sayısı

2.010.167

Toplam Proje Tutarı

1.619.768

Toplam Harcama Tutarı

2.010.167

Toplam Yıl Ödeneği

1.619.768

Yılı Harcama Tutarı

45.548

1.Dönem Harcama Tutarı

833.002

2.Dönem Harcama Tutarı

27.307

3.Dönem Harcama Tutarı

713.911

4.Dönem Harcama Tutarı

%2,27

%41,44

%1,36

%35,52

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	1.619.768
Toplam	1.619.768

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-İktisadi	1.619.768
Toplam	1.619.768

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI	1.619.768
Toplam	1.619.768

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplam
HİZMET BİNASI VE LOJMAN ONARIMLARI	KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	668.024	668.024	
MALZEME ALIMI İLE DİĞER BAKIM VE ONARIMLAR	KIRKLARELİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	1.342.143	1.342.143	
Toplam			2.010.167	2.010.167	

KIRKLARELİ

6

Proje Sayısı

13.324.356

Toplam Proje Tutarı

11.392.505

Toplam Harcama Tutarı

11.724.356

Toplam Yıl Ödeneği

11.298.813

Yılı Harcama Tutarı

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

11.724.356

11.298.813

1.034.109

1.Dönem Harcama Tutarı

1.672.435

2.Dönem Harcama Tutarı

2.469.315

3.Dönem Harcama Tutarı

6.122.954

4.Dönem Harcama Tutarı

%8,82

%14,26

%21,06

%52,22

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
LÜLEBURGAZ	10.093.150
MERKEZ	321.355
MUHTELİF İLÇE	70.000
PINARHİSAR	0
VİZE	908.000
Toplam	11.392.505

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	11.071.150
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	321.355
İmalat	0
Toplam	11.392.505

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI	11.392.505
Toplam	11.392.505

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önc
ESKİ ESER RESTORASYONLARINA YARDIM	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1	
KIRKLARELİ İL HALK KÜTÜPHANESİ TEFRİŞİ	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	321.355	321.355	
LÜLEBURGAZ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ İNŞAATI (2.555 M2)	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	10.000.000	11.600.000	
PINARHİSAR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLATI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	260.000	260.000	
VİZE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLAT VE TEFRİŞATI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1.073.000	1.073.000	
YEREL KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE YARDIM ÇALIŞMALARI	KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	70.000	70.000	
Toplam			11.724.356	13.324.356	



TURİZMDE MARKA ŞEHİR KIRKLARELİ

2022 YILI YATIRIMLARI

(ARALIK 2022)



KIRKLARELİ İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

2022 YATIRIMLARI

BAŞLIKLAR

- Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi Proje Yapımı
- Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım Çalışmaları
- Eski Eser Restorasyonlarına Yardım
- Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadilat ve Tefriş Uygulaması Projesi
- Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Tadilat Projesi



LÜLEBURGAZ İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ YAPIMI

Başlama Tarihi	2020
Bitiş Tarihi	2023
Proje Tutarı	11.600.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	-
2022 yılı ödeneği	5.000.000 TL
2022 yılında gönderilen ödenek	5.000.000 TL
2022 yılı harcamaları	3.750.000 TL
Nakdi Gerçekleşme	%32
Fiziki Gerçekleşme	%10



YEREL KÜLTÜREL ETKİNLİKLERE YARDIM ÇALIŞMALARI

Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	70.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	-
2022 yılı ödeneği	70.000 TL
2022 yılında gönderilen ödenek	70.000 TL
2022 yılı harcamaları	70.000 TL
Nakdi Gerçekleşme	%100
Fiziki Gerçekleşme	%100



ESKİ ESER RESTORASYONLARINA YARDIM

Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	250.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	0 TL
2022 yılı ödeneği	250.000 TL
2022 yılında gönderilen ödenek	-
2022 yılı harcamaları	0
Nakdi Gerçekleşme	-
Fiziki Gerçekleşme	



VIZE İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLAT VE TEFRİŞ UYGULAMASI PROJESİ

Başlama Tarihi	2021
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	1.073.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	-
2022 yılı ödeneği	1.073.000 TL
2022 yılında gönderilen ödenek	1.073.000 TL
2022 yılı harcamaları	908.000 TL
Nakdi Gerçekleşme	%85
Fiziki Gerçekleşme	%100



PINARHİSAR İLÇE HALK KÜTÜPHANESİ TADİLAT PROJESİ

Başlama Tarihi	2022
Bitiş Tarihi	2022
Proje Tutarı	260.000 TL
Önceki Yıllar Harcamaları	-
2022 yılı ödeneği	260.000 TL
2022 yılında gönderilen ödenek	260.000 TL
2022 yılı harcamaları	0
Nakdi Gerçekleşme	%0
Fiziki Gerçekleşme	%0

PROJELERİN GENEL DURUMU

	Eğitim / Kültür	Turizm	Toplam
Proje Sayısı	4	0	4
Proje Tutarı (TL)	13.253.000	-	13.253.000
Önceki Yıllar Harcamaları	-	-	-
2022 yılı ödeneği (TL)	6.653.000	-	6.653.000

PROJELERİN PARASAL GERÇEKLEŞME DURUMU

	Kültür	Turizm	Toplam
2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	6.403.000	-	6.403.000
2022 yılı harcamaları (TL)	4.728.000	-	4.728.000
Parasal gerçekleşme (yüzde)	36	-	36
2022 yılı ödenek ihtiyacı (TL)			0

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı



13

Proje Sayısı

346.967.553

Toplam Proje Tutarı

75.695.637

Toplam Harcama Tutarı

114.966.830

Toplam Yıl Ödeneği

60.963.106

Yılı Harcama Tutarı

4.177.278

1.Dönem Harcama Tutarı

0

2.Dönem Harcama Tutarı

27.757.222

3.Dönem Harcama Tutarı

29.028.606

4.Dönem Harcama Tutarı

%3,63

%0,00

%24,14

%25,25

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	120.549
LÜLEBURGAZ	82.128
MERKEZ	32.363.091
MUHTELİF İLÇE	11.248.316
VİZE	31.881.553
Toplam	75.695.637

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Eğitim	75.695.637
Toplam	75.695.637

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI	75.695.637
Toplam	75.695.637

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıl
BABAESKİ ORTAOKULU İNŞAATI (24 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	3.000.000	27.704.000	
BABAESKİ TOBB ANAOKULU İNŞAATI (6 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	6.500.000	7.832.000	
İLKÖĞRETİM VE GENEL ORTAÖĞRETİM KURUMLARI BAKIM VE ONARI...	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	29.035.000	29.035.000	
KIRKLARELİ BADEM LİK (CAMİKEBİR) MAH. İLKOKULU YAPIMI (16 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	11.230.492	25.300.000	
KIRKLARELİ BİLİM SANAT MERKEZİ İNŞAATI (8 DERSLİK)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.870.000	13.200.000	
KIRKLARELİ İSTİKLAL ORTAOKULU İNŞAATI (24 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	4.070.000	40.700.000	
KIRKLARELİ OSB MESLEKİ VE TEKNİK LİSESİ (16 DRS + 3 ATÖLYE + SPO...	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	5.520.000	55.200.000	
LÜLEBURGAZ ANAOKULU İNŞAATI (6 DRS)	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	5.000.000	7.832.000	
LÜLEBURGAZ DERE MAHALLESİ ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU İNŞAATI (12 ...	KIRKLARELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	2.400.000	22.328.000	
Toplam			114.966.830	346.967.553	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

100.445.023

100.374.943

18

Proje Sayısı

1.440.109.666

Toplam Proje Tutarı

131.589.623

Toplam Harcama Tutarı

100.445.023

Toplam Yıl Ödeneği

100.374.943

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

15.268.626

2.Dönem Harcama Tutarı

14.123.419

3.Dönem Harcama Tutarı

70.982.898

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%15,20

%14,06

%70,67

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
BABAESKİ	65.000
DEMİRKÖY	0
LÜLEBURGAZ	48.107.834
MERKEZ	83.416.789
PINARHİSAR	0
Toplam	131.589.623

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Sağlık	131.589.623
Toplam	131.589.623

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
SAĞLIK BAKANLIĞI	131.589.623
Toplam	131.589.623

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıllar Toplamı
BABAESKİ ALPULLU 3 HEKİMLİ ASM + 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	7.736.300	
BABAESKİ GAZİOSMANPAŞA 4 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ VE 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	7.736.300	
BABAESKİ İLÇE SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ + AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (SHM+...)	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	65.000	63.557.000	
DEMİRKÖY 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1.300.000	
DEMİRKÖY İĞNEADA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (2AHB) + 112 ASHİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	İhale Aşamasında	1	5.850.000	
KELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ (TOPLUM S...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1	1	
KIRKLARELİ DOLHAN SAĞLIK EVİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	61.750	1.300.000	
KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	1	129.037	
KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ EK BİNA İNŞAATI (250 Y...	KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	1.125.000.000	
Toplam			100.445.023	1.440.109.666	



2022 YILI KIRKLARELİ İLİ SAĞLIK YATIRIMLARI

KIRKLARELİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

	TAMAMLANAN YATIRIMLAR (3 Adet)
1	Pınarhisar 112 ASHİ
2	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği
3	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi
	İNŞAAT AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR (4 Adet)
4	Kırklareli Sağlık Kompleksi (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi +Halk Sağlığı Laboratuvarı + Merkez ASM 6 Hekim+112 KKM+112 ASHİ)
5	Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü +Sağlıklı Hayat Merkezi (A Tipi) +112 ASHİ+ Lüleburgaz 2 No'lu ASM (8 AHB)
6	Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi (Bağış)
7	Kırklareli Merkez 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)
	İHALE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR (2)
8	Kırklareli Demirköy 112 ASHİ
9	Lüleburgaz 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)
	PROJE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR (7 Adet)
10	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina (250 Yatak)
11	Babaeski Alpullu 3 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi+112 ASHİ
12	Babaeski Atatürk Mahallesi 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) +112 ASHİ
13	Dolhan Sağlık Evi
14	Lüleburgaz 1 No'lu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)+SHM (B Tipi)+112 ASHİ (2 Adet)
15	Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü+ Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +SHM+112 ASHİ
16	Kırklareli Demirköy İğneada Aile Sağlığı Merkezi (2AHB)+112 ASHİ
	ARSA AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR (1 Adet)
17	Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi (5AHB)+ 112 Acil Sağlık İstasyonu
	TOPLAM PROJE SAYISI :17 TOPLAM PROJE TUTARI:1.413.869.182,00 TL



TAMAMLANAN YATIRIMLAR



PINARHİSAR 112 ACİL YARDIM İSTASYON BİNASI



Kapalı Alan : 90 m2

İhale Tarihi : 02.10.2020

Sözleşme Tarihi : 21.12.2020

Yüklenici Firma : Kamil Yalçın Topkaya, Adalya Mimarlık Enerji İnşaat Turizm Gıda İletişim İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

Sözleşme Bedeli : 598.520 TL +KDV

İş Günü : 60 gün

Açıklama : 01.04.2022 tarihi itibarıyla Pınarhisar 112 AŞİ yeni binasında hizmet vermeye başlamıştır. 11.04.2022 tarihinde resmi açılış töreni yapılmıştır.

PINARHİSAR 112 ACİL YARDIM İSTASYON BİNASI





KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SEMT POLİKLİNİĞİ



Açıklama : İlimiz mevcut Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi üniversite ile afiliasyon olduktan sonra daha iyi hizmet sunumu yapılabilmesi adına poliklinik ihtiyacı doğmuş olup ek poliklinikler planlanmıştır. Toplum Sağlığı Merkezi Eski Hizmet Binasının 2. ve 3. katı Müdürlüğümüz teknik personellerinin desteği ile boya badanası ve tadilat işlemleri yapılarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı semt polikliniği olarak hizmet vermeye başlamıştır. Semt Polikliniği Çocuk Psikiyatri merkezimizde ; çocuk psikiyatri uzmanı, psikolog, dil terapisti, oyun terapisti, sosyal çalışmacı, çocuk ergen terapisti hizmet vermektedir.



KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK İZLEM MERKEZİ



Kapalı Alan : 200 m²

İhale Tarihi : 04.05.2021

Sözleşme Tarihi : 24.05.2021

Sözleşme Bedeli : 109.353,00 +KDV


Açıklama :İlimiz Merkez İlçe Atiye Mehmet Genç 4 No'lu Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binasının 2. katı tadilat işlemleri yapılarak Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Çocuk İzlem Merkezi olarak 01.08.2022 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır.



İNŞAATI DEVAM EDEN YATIRIMLAR



KIRKLARELİ SAĞLIK KOMPLEKSİ
**(İDARİ HİZMET BİNALARI + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ + HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI+
MERKEZ 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU
BİNASI+TRSM+KREŞ)**

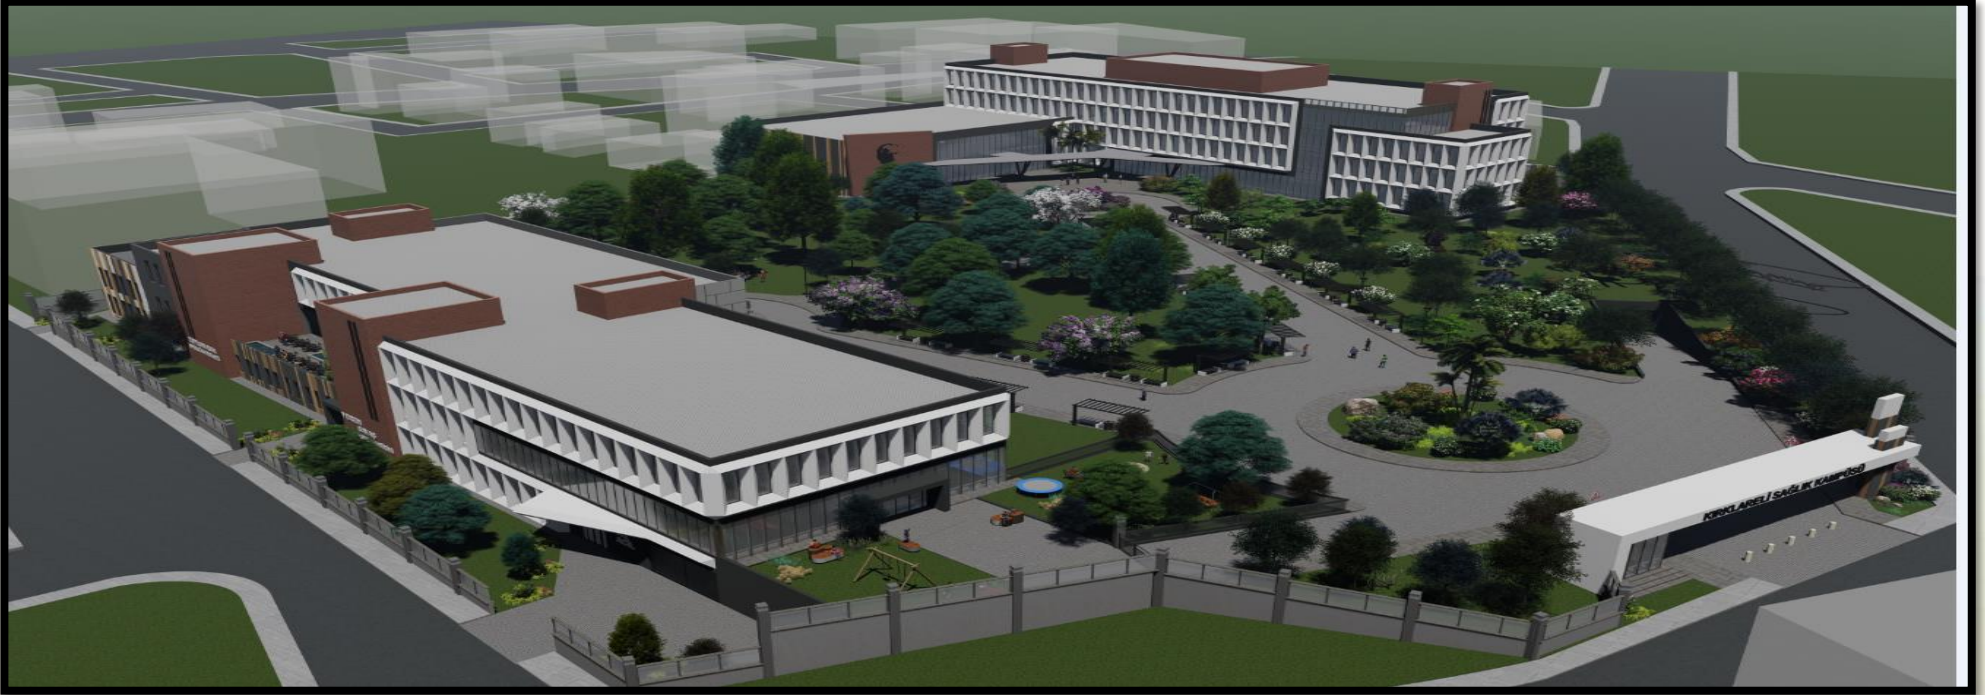

Kapalı Alan	: A Blok :11.851,13 m ² B Blok: 6.625,41 m ² Toplam:18.477 m ²
İhale Tarihi	: 26.01.2021
Yer Teslim Tarihi	: 17.02.2021
Yüklenici Firma	: Şentürk İnş. Taah. Müh. Mim Gıda ve Tem Hizmet Nak Tic Ltd Şt- Hakan ŞENTÜRK İş Ortaklığı
Proje Tutarı	: 84.739.000,00 +KDV
Sözleşmeye Göre Bitiş Tarihi:	05.08.2023 Süre Uzatımı: 01.04.2024
Açıklama	: İdari Hizmet Binası + Aile Sağlığı Merkezi + Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu + Toplum Ruh Sağlığı Merkezi hizmetlerinin verileceği Sağlık Kompleksi İnşaatı Fiziki Gerçekleşmesi % 58 seviyesinde devam etmektedir.

KIRKLARELİ SAĞLIK KOMPLEKSİ (İDARİ HİZMET BİNALARI + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ + HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI+ MERKEZ 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUBİNASI+TRSM+KREŞ) A BLOK



KIRKLARELİ SAĞLIK KOMPLEKSİ (İDARİ HİZMET BİNALARI + TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ +HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI+ MERKEZ 6 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONUBİNASI+TRSM+KREŞ) B BLOK





LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 2 NO'LU ASM (8 AHB)+SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ (A TİPİ) +112 ASHİ



Kapalı Alan : 5.183,25 m²

İhale Tarihi : 01.02.2021

Yer Teslim Tarihi: 17.02.2021

Yüklenici Firma : Kılıçlar İnş Ltd Şti

Sözleşme Bedeli : 18.989.553,00 +KDV

Tahmini Bitiş Tarihi: 16/03/2023

Açıklamalar : İlçe Sağlık Müdürlüğü +2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi+ Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 ASHİ Hizmet Binası kaba inşaat imalatları tamamlanmıştır. İnşaat fiziki gerçekleşmesi %93 seviyesinde devam etmektedir.

**LÜLEBURGAZ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ+ 2 NO'LU ASM (8 AHB)+SAĞLIKLI HAYAT
MERKEZİ (A TİPİ) +112 AŞİ**





LÜLEBURGAZ 4 HEKİMLİ ÖZDEN GÖKÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (BAĞIŞ)



Kapalı Alan : 421,48 m²

Protokol Tarihi : 24.08.2021

İnşaat Ruhsatı Tarihi : 22.09.2021

İnşaat Başlama Tarihi : 04.10.2021

Açıklamalar : Hayırsever Miktat Gökçe tarafından yaptırılan “Özden GÖKÇE 4 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi”ne ait yapım iş birliği protokolü 24 Ağustos 2021 tarihinde imzalanmıştır. 11/10/2021 tarihinde temel atma töreni yapılmıştır.

*İnşaat fiziki gerçekleşmesi % 95 seviyesinde devam etmektedir.



LÜLEBURGAZ 4 HEKİMLİ ÖZDEN GÖKÇE AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (BAĞIŞ)





MERKEZ 6 NOLU PINAR MAHALLESİ (4 AHB) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ



Kapalı Alan	: 446 m ²
İhale Tarihi	: 13.09.2022
Yer Teslim Tarihi	: 27.10.2022
Yüklenici Firma	: Mirel Müh İnş Elekt Taah San ve Tic Ltd Şti
Sözleşme Bedeli	: 4.984.000,00 TL+KDV
İş Süresi/Bitiş Tarihi	: 300 gün / 25.08.2023
Açıklamalar	: Yapım inşaat ihalesi 13.09.2022 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından yapılmış olup 27.10.2022 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. İnşaat çalışmaları %29 seviyesinde devam etmektedir.



MERKEZ 6 NOLU PINAR MAHALLESİ (4 AHB) AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ





İHALE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR



DEMİRKÖY 112 ASHİ



Ada/Parsel : 332/1

Arsa Yüzölçümü : 889,16 m²

Kapalı Alan : 100 m²

Kat : 1 NK

Açıklamalar : Yapım inşaat ihalesi 08/12/2022 tarihinde yapılmış olup ihale süreci tamamlanma aşamasındadır. 27.12.2022 tarihinde sözleşmeye davet yapılması planlanmaktadır.



LÜLEBURGAZ 6 NOLU 8 AHB AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASI



Ada/Parsel :167/2

Kapalı Alan : 682,5 m²

Kat Sayısı : Z+1 NK

Açıklamalar :Bakanlığımız tarafından uygulama projeleri onaylanmış olup yapım ihale izni verilmiştir.
Yapım ihale süreçlerine başlanmıştır.



PROJE AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR

KIRKLARELİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 250 YATAKLI EK BİNA



Ada/Parsel : 373 /35

Arsa Yüzölçümü : 63.489,19 m²

Kapalı Alan m2 :62.500 m2

Proje İhale Tarihi :16.12.2022

Sözleşmeye Davet:19.12.2022 tarihinde yapılmıştır. 10 günlük yasal süreç beklenmektedir.

Açıklamalar :Mevcut hastane arsasına yapılması ile ilgili proje süreci Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir.

Ek binada çocuk, kadın doğum, genel cerrahi, dahiliye ve tüm ana branşların yan dalları ve Onkoloji Tanı Tedavi Merkezi (PET-CT, Nükleer Tıp, Radyasyon Onkolojisi, Gama Kamera, Lineer Hızlandırıcı) , ÜYTE, Diabet Merkezi, İleri Patoloji Merkezi, ÇİM, Çocuk Psikiyatri Merkezi planlanmıştır.



LÜLEBURGAZ 1 NO'LU 8 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+ B TİPİ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ+112 AŞİ (2 ADET) PROJE GÖRSELİ



Açıklama : Lüleburgaz İlçesi Kocasinan Mahallesinde bulunan mevcut eski ASM binasının yıkılarak bulunduğu arsa üzerine 4.220,8 m² kapalı alanlı yeni hizmet binası yapılması planlanmaktadır. Mimari projeleri Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır.



BABAESKİ İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ +8 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 AŞİ+ SAĞLIKLI HAYAT MERKEZİ (B TİPİ) (PROJE GÖRSELİ)



Açıklamalar: Eski Babaeski Devlet Hastanesinin bulunduğu arsa üzerine 4.889 m² kapalı alanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü + 8 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi+112 AŞİ ve Sağlıklı Hayat Merkezinin Hizmet vereceği yeni hizmet binası yapılması planlanmaktadır. Mimari projeleri Bakanlığımız tarafından onaylanmıştır.



BABAESKİ ATATÜRK MAHALLESİ 4 NO'LU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ(4AHB) +112 AŞİ



Ada/Parsel :998/2

Kapalı Alan : 595,10 m²

Kat Sayısı : 1 NK

Açıklamalar :Cumhurbaşkanlığı Ka Ya sistemi revizyon onay süreci devam etmektedir. Projeleri Bakanlığımıza onaya gönderilmiştir.



BABAESKİ ALPULLU 3 HEKİMLİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ+112 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU



Ada/Parsel : 126/6

Arsa Alanı : 2.027,94

Kapalı Alan : 595,10 m²

Açıklamalar : Alpüllü 3 Hekimli ASM+112 AŞİ Yapımı 2022 Yılı Yatırım Programına alınmıştır. Cumhurbaşkanlığı maliyet revizyon süreci devam etmektedir. Avan Proje çalışmaları devam etmektedir.



MERKEZ DOLHAN SAĞLIKEVİ+LOJMAN BİNASI



Ada/Parsel :153/6


Arsa Yüzölçümü : 723,93 m²

Kapalı Alan : 100 m²

Kat Açıklamalar : Uygulama projeleri yaklaşık maliyet çalışmaları tamamlanmış olup Özel İdare değerlendirme aşamasındadır.



KIRKLARELİ DEMİRKÖY İĞNEADA AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ (2AHB)+112 ASHİ

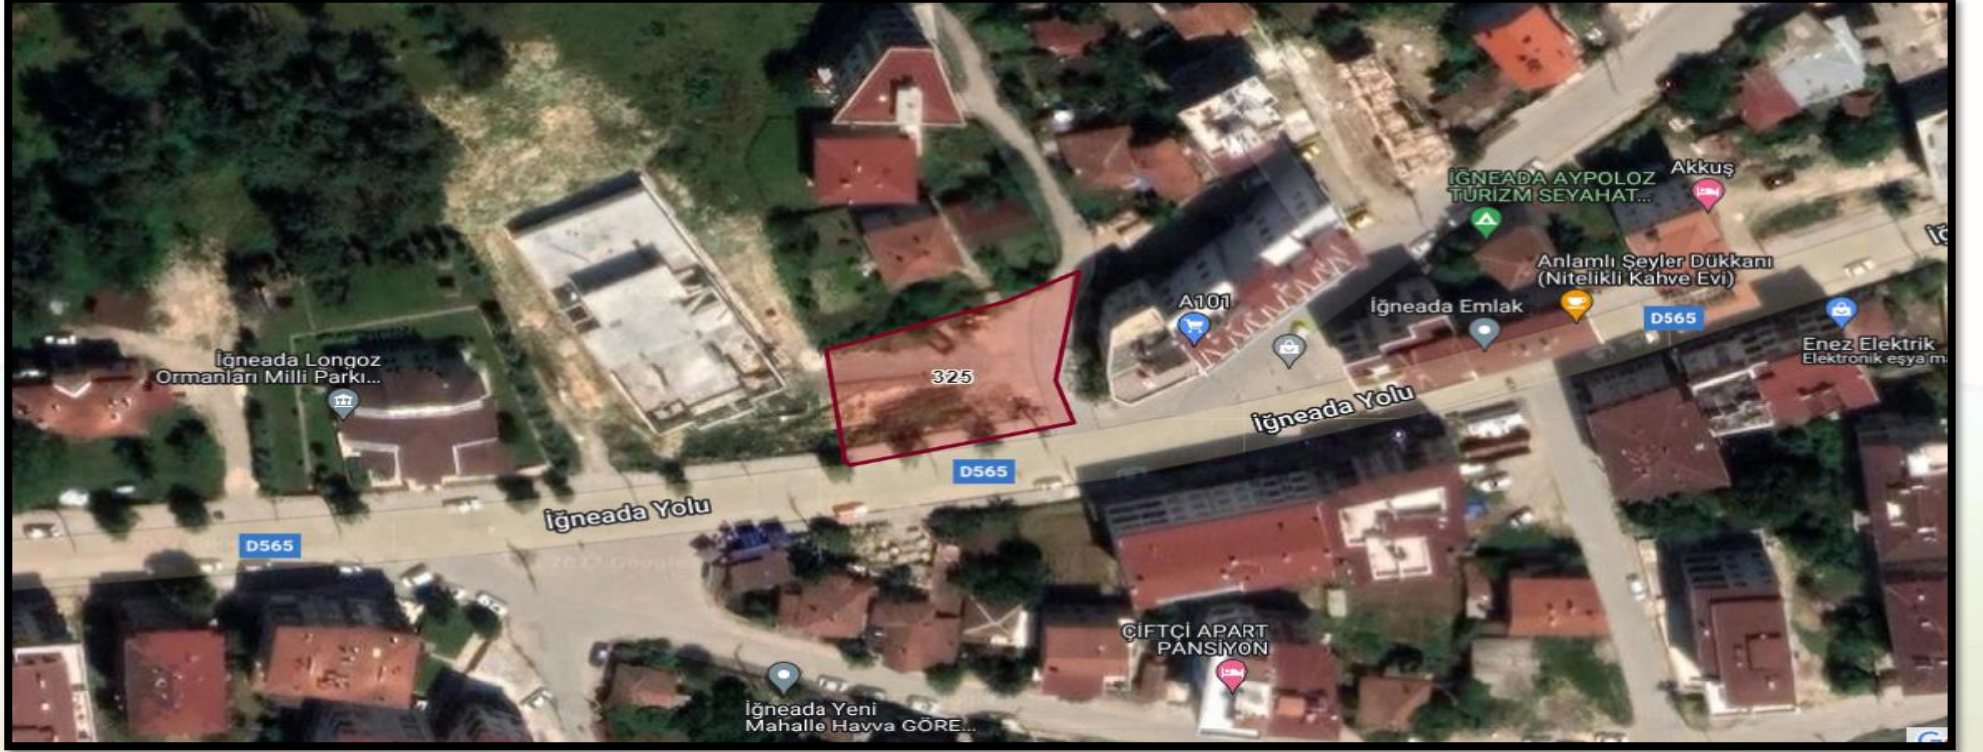

Ada/Parsel : /325

Arsa Yüzölçümü : 700 m²


Açıklamalar : 2022 yılı yatırım programına alınan Demirköy İğneada ASM (2 AHB) +112 ASHİ Binası Bakanlığımıza tahsisli 325 Parsel No'lu taşınmaza yapılması planlanmaktadır. Bakanlığımızdan Avan + Uygulama Proje ihale izni beklenmektedir.



ARSA AŞAMASINDAKİ YATIRIMLAR



PINARHİSAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ +112 AŞİ (5 AHB)

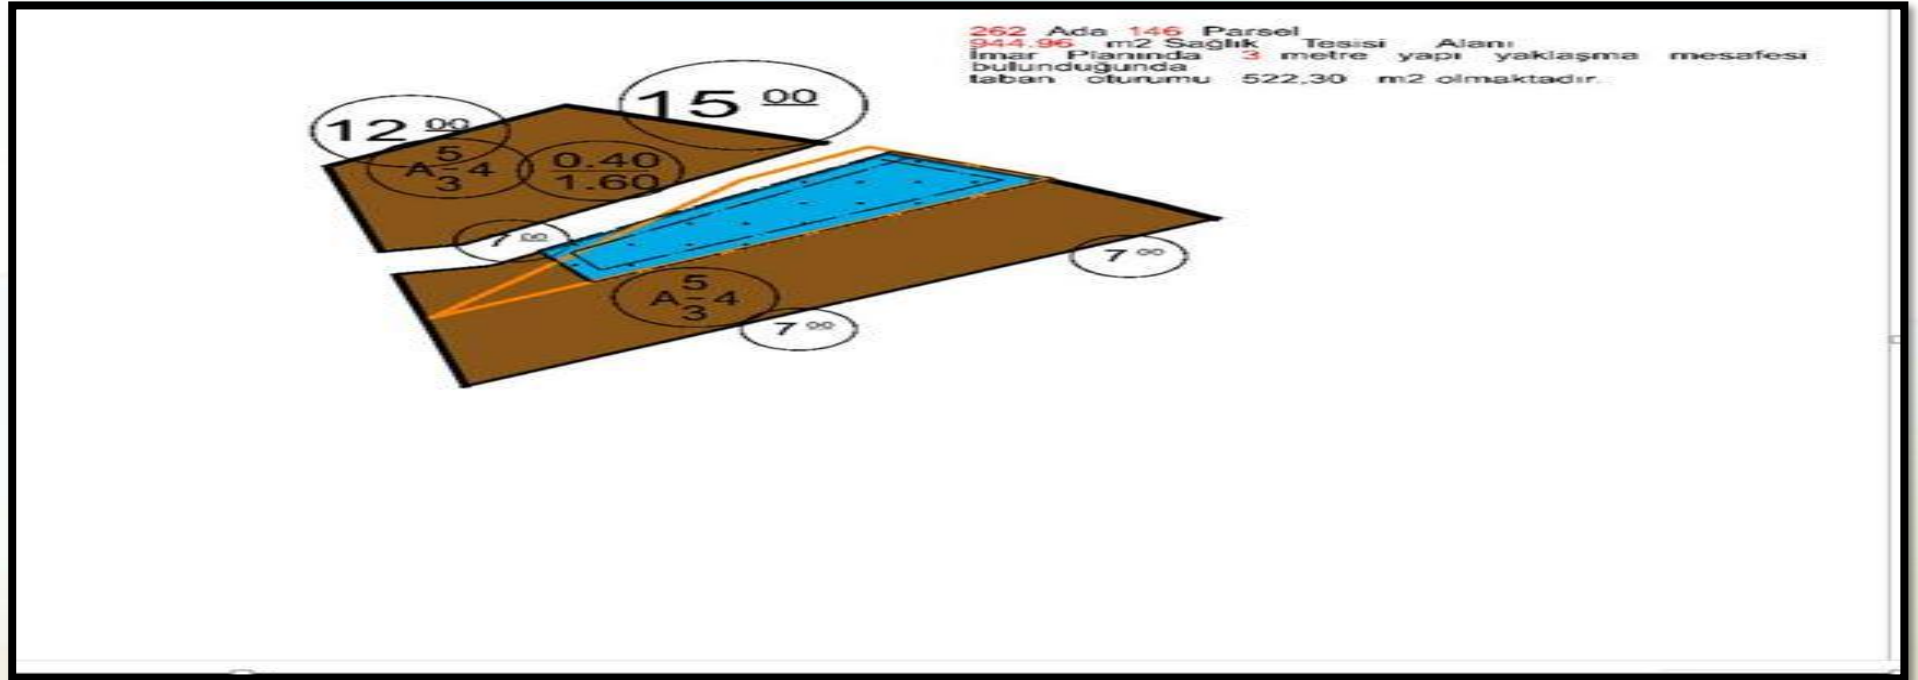

Açıklamalar: Bakanlığımız yatırım programında bulunan Pınarhisar ASM (5 AHB)+112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun üzerine yapılması planlanan 262 ada, 146 parsel sayılı taşınmazın imar plan tadilat süreci tamamlanmıştır. Belediye Başkanlığının Meclis Kararı Maliye Hazinesine devredilerek Bakanlığımıza tahsis kararı alınmıştır. Tahsis ile ilgili süreçler devam etmektedir.



ARZ EDERİM.

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

205.436.522

203.666.732

6

Proje Sayısı

890.000.000

Toplam Proje Tutarı

305.470.698

Toplam Harcama Tutarı

205.436.522

Toplam Yıl Ödeneği

203.666.732

Yılı Harcama Tutarı

66.000

1.Dönem Harcama Tutarı

21.444.336

2.Dönem Harcama Tutarı

76.967.634

3.Dönem Harcama Tutarı

105.188.762

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,03

%10,44

%37,47

%51,20

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
LÜLEBURGAZ	0
MERKEZ	305.470.698
Toplam	305.470.698

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Diğer Kamu Hizmetleri-Sosyal	305.470.698
Toplam	305.470.698

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI	305.470.698
Toplam	305.470.698

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Ö
KIRKLARELİ KAVAKLI TARIMA DAYALI İHTİSAS SÜT ORGANİZE SANAYİ B...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1.905.000	50.000.000	
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 2. KISIM ALTYAPI İNŞAATI	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	40.000.000	150.000.000	
KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 3. KISIM ALTYAPI İNŞAATI	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	163.431.520	210.000.000	
LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI ...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	100.000	175.000.000	
LÜLEBURGAZ BÜYÜKKARIŞTIRAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	200.000.000	
LÜLEBURGAZ EVRENSEKİZ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ALTYAPI (KANA...	KIRKLARELİ SANAYİ VE TEKNOLOJİ İL MÜDÜRLÜĞÜ	Projeye Başlanmadı	1	105.000.000	
Toplam			205.436.522	890.000.000	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜ...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

8.725.944

8.725.208

4

Proje Sayısı

8.725.944

Toplam Proje Tutarı

8.725.208

Toplam Harcama Tutarı

8.725.944

Toplam Yıl Ödeneği

8.725.208

Yılı Harcama Tutarı

0

1.Dönem Harcama Tutarı

530.500

2.Dönem Harcama Tutarı

1.072.383

3.Dönem Harcama Tutarı

7.122.325

4.Dönem Harcama Tutarı

%0,00

%6,08

%12,29

%81,62

Proje Yeri İlçe	Toplam Harcama Tutarı
MUHTELİF İLÇE	8.725.208
Toplam	8.725.208

Proje Sektörü	Toplam Harcama Tutarı
Tarım	8.628.815
İmalat	96.393
Toplam	8.725.208

Bakanlık Adı	Toplam Harcama Tutarı
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI	8.725.208
Toplam	8.725.208

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam Yıl Ödeneği	Toplam Proje Tutarı	Önceki Yıla
BİTKİSEL ÜRETİMİ GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	6.488.085	6.488.085	
GIDA HİZMETLERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	96.393	96.393	
HAYVANCILIĞI GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	2.098.376	2.098.376	
SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİNİ GELİŞTİRME PROJELERİ	KIRKLARELİ İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ	Bitti	43.090	43.090	
Toplam			8.725.944	8.725.944	

KIRKLARELİ

Arama Filtreleri

İl Adı

Tümü

İlçe

Tümü

Proje Sahibi Kuruluş

KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE T...

Harcama Yılı

2022

Proje Durumu

Tümü

Proje Alt Durumu

Tümü

Proje İzlemede Mi ?

E

● Toplam Yıl Ödeneği ● Yılı Harcama Tutarı

1.374.001

1.374.000

1

Proje Sayısı

2.644.750

Toplam Proje Tutarı

1.854.000

Toplam Harcama Tutarı

1.374.001

Toplam Yıl Ödeneği

1.374.000

Yılı Harcama Tutarı

343.501

1.Dönem Harcama Tutarı

343.499

2.Dönem Harcama Tutarı

343.501

3.Dönem Harcama Tutarı

343.499

4.Dönem Harcama Tutarı

%25,00

%25,00

%25,00

%25,00

Proje Yeri İlçe

Toplam Harcama Tutarı

MUHTELİF İLÇE

1.854.000

Toplam

1.854.000

Proje Sektörü

Toplam Harcama Tutarı

Tarım

1.854.000

Toplam

1.854.000

Bakanlık Adı

Toplam Harcama Tutarı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

1.854.000

Toplam

1.854.000

Proje Adı	Yatırımcı Kuruluş	Proje Durumu	Toplam
ARAŞTIRMA PROJELERİ	KIRKLARELİ ATATÜRK TOPRAK SU VE TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ	Devam Ediyor	
Toplam			



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

ATATÜRK TOPRAK SU ve TARIMSAL METEOROLOJİ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres: İstanbul Yolu Üzeri 4. Km.

Tel: 0 288 214 2026

E-Posta : kirklarelitopraksu@tarimorman.gov.tr

KEP : tarimveormanbakanligi@hs01.kep.tr



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Kırklareli Evsel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanakları ve Sera Gazı Salınımlarına Etkisinin Araştırılması

Proje Bütçesi: 357000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı:Nüfus artışı bir taraftan tatlı su kaynaklarının azalmasına ve kirlenmesine neden olurken bir taraftan da kullanılmış ve arıtılmış atık suların artmasına neden olmaktadır. Arıtılmış atık suların (AAS), kullanım şartlarını sağlayacak şekilde yeterli arıtma sağlandığında birçok alanda (tarımsal sulama, peyzaj ve rekreasyon, endüstriyel kullanım, yeraltı suyu besleme gibi) tekrar kullanımı söz konusudur. Bu proje ile arıtılmış atık suların tarımda kullanım olanakları araştırılacak ve toprak bitki üzerindeki etkisi araştırılacaktır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı:Kırklareli İlinde Buğday ve Ayçiçeği Bitkileri İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi

Proje Bütçesi: 254000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı:Proje ile Trakya bölgesinde en çok tarımı yapılan buğday ve Ayçiçek bitkilerinin , İHA teknolojisi kullanılarak verim tahmini, su tüketimlerinin belirlenmesi, bitki gelişimleri izlenmesi ve tarımda uzaktan algılama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Kırklareli İlinde Yonca (*Medicago sativa*) Bitkisi İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi

Proje Bütçesi: 254000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı:Proje ile Trakya bölgesinde yonca bitkisinin , İHA teknolojisi kullanılarak verim tahmini, su tüketimlerinin belirlenmesi, bitki gelişimleri izlenmesi ve tarımda uzaktan algılama tekniklerinin kullanımının yaygınlaştırılması planlanmaktadır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Kırklareli Koşullarında Yapay Meralarda Su Kısıtının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri

Proje Bütçesi: 132500

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2024

Projenin Amacı: Proje ile Trakya bölgesinde oluşturulacak yapay merada su kısıtı uygulamaları sonucu verim kalite parametreleri üzerine etkisi araştırılacaktır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Trakya Yöresinde Yapay Sinir Ağları ile Kuraklık Tahmini ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Haritalanması

Proje Bütçesi: 20000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2020-2021

Projenin Amacı: Bu çalışmada, Kuraklık ise Standart Yağış İndisi (SYİ) ile değerlendirilecektir. SYİ yağmur verilerinden elde edilmesi ve hesaplaması kolay olduğu için bu çalışmada Trakya yöresi için kuraklık değerlendirmesinde kullanılacaktır. Kuraklığın yol açtığı zararı minimuma indirmek için yapay sinir ağları kullanılarak etkili bir kuraklık tahmini planlaması gerekmektedir. Proje bitmiştir. Sonuç raporu yazılmaktadır.

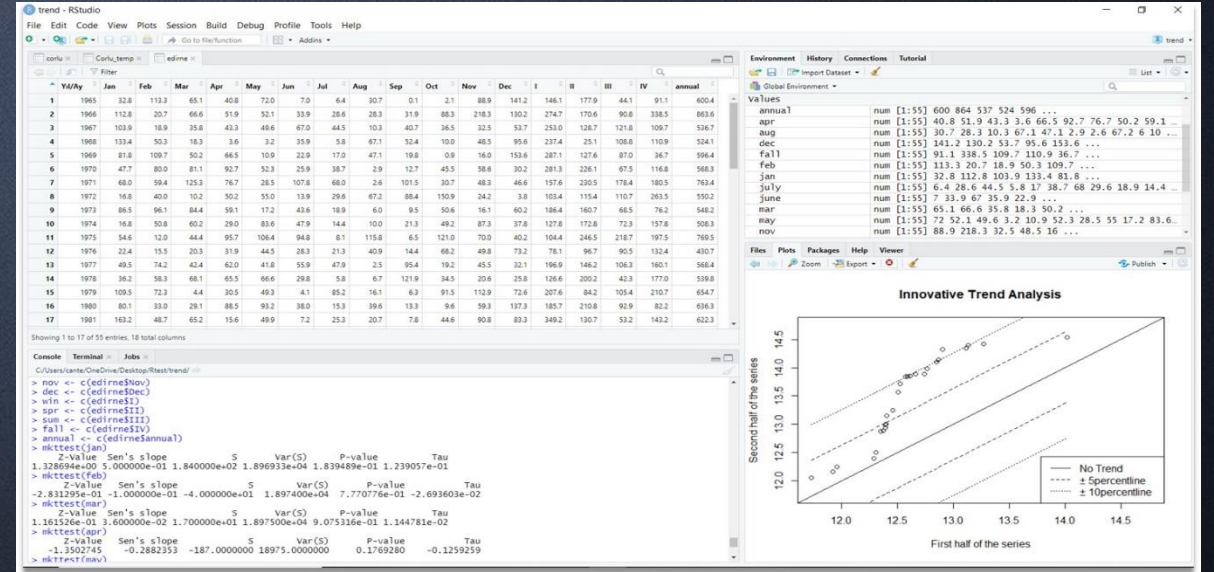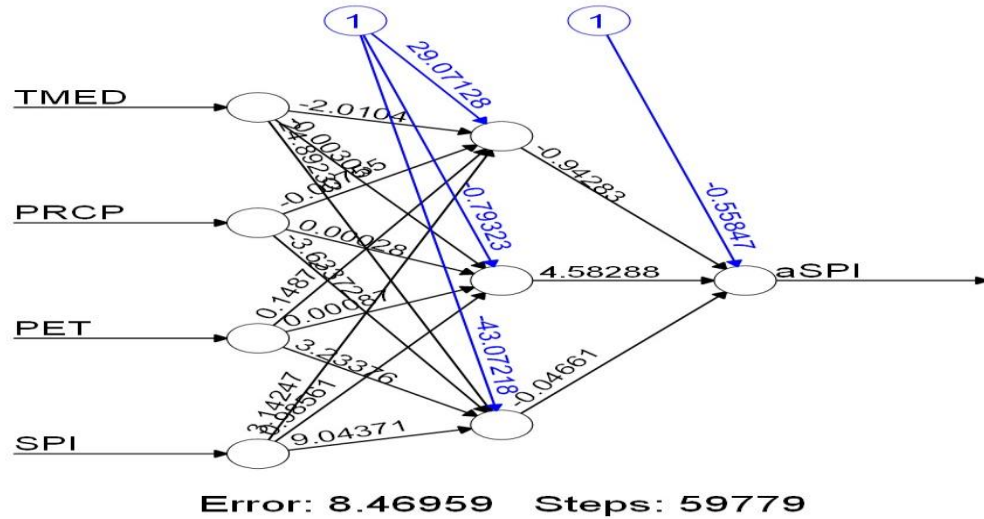



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Trakya Bölgesinde Palmer Kuraklık Şiddet İndisinin Buğday Bitkisi İçin Yeniden Modellenmesi

Proje Bütçesi: 80000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2024

Projenin Amacı: Bu proje ile kuraklığın buğday üzerindeki fizyolojik etkileri gözlemlenerek, toprak nem içeriği takip edilerek ve hesaplamada kullanılabilecek en uygun bitki su tüketimi yöntemi dikkate alınarak düzenlenecektir. Bu sayede Trakya tarımının önemli bir ürünü olan buğday için geliştirilmiştir bir kuraklık indisi elde edilecektir.





T.C.


TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Çeltik Tarımından Kaynaklı Sera Gazlarının Hesaplanması ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi

Proje Bütçesi: 280000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2023

Projenin Amacı: Çeltik tarımından kaynaklı sera gazlarının azaltımı çalışmalarının yapılması uygun arazi yönetimi sisteminden geçmekte ama öncelikle durum tespiti yapılabilmesi için envanter çıkarılması gerekmektedir. Bu envanter hesaplamalarında kullanılan çeşitli yöntemler mevcuttur. Arazi de pratikliği ve ekonomik şartlar göz önüne alındığında uygulamada en çok kullanılan yöntemlerden biri olan Kapalı Manuel Chamber(odacık) metodu ile örnek alınması ve gaz kromografi cihazı ile örnekler analiz edilerek çeltik tarımından kaynaklı sera gazlarının hesaplanması bu projenin amacıdır.

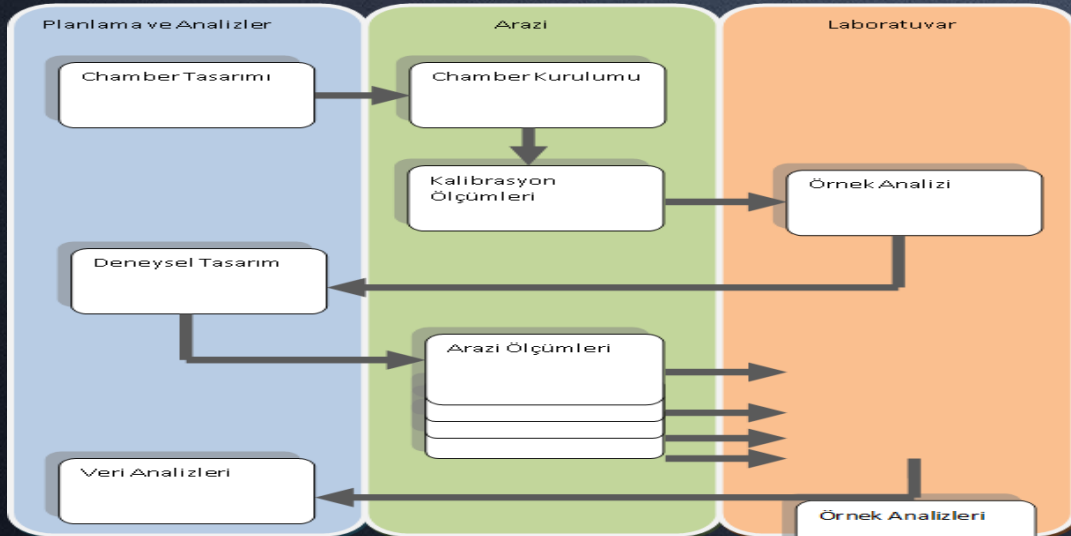



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Trakya Yöresinde FAO-SHARP Aracı ile İklim Değişikliği Dayanıklılığının Değerlendirilmesi

Proje Bütçesi: 100000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2022

Projenin Amacı: Mevcut iklim değişkenliği göz önüne alındığında, küçük üreticileri bilgilendirmek ve güçlendirmek için iklim dayanıklılığının ölçülmesi ve izlenmesi gereklidir. Dayanıklılığı ölçmenin başka yolları bulunsa da, bunlar küçük çiftlik sistemlerinde ölçülememektedir. FAO tarafından geliştirilen yeni SHARP aracı, üreticilerin çıkarlarını göz önünde bulundurarak iklim direncini iyileştirici faaliyetlerin bir şekilde tanımlanmasına, ölçülmesine ve önceliklendirilmesine izin vermektedir. Bu uygulamada, iklim değişikliğinden dolayı oluşabilecek tehditleri ve fırsatları anlamak ve tartışmak için çiftçilere ve göçerlere yardım etmeyi ve ortalama dayanıklılığı geliştirmek için bireysel ve kolektif eylemleri önceliklendirmeyi hedeflemektedir.



SHARP anketi (gözden geçirilmiş sürüm)

Mevcut 40 temalı anket, 2014 yılında geliştirilen ve son 2 yılda pilotluk yapılan 54 soru SHARP standart formunun gözden geçirilmesinin bir sonucudur.

Tema adından önceki yıldız işaretleri (*), Cabelli ve Oelefse (2012) tarafından geliştirilen 13 tarımsal ekosistem gösterge çerçevesini izleyerek esneklik değerlendirme için kapsaması gereken modülleri göstermektedir.

Anketin tamamı beş bölüme ayrılmıştır:

- agronomik uygulamalar (gri),
- çevresel yönler (yeşil),
- sosyal etkileşimler (mavi),
- ekonomik bileşenler (kırmızı); ve,
- yönetim (sarı).result of the review of the 54 question SHARP standard form initially developed in 2014 and piloted in the last 2 years.

* 1. Genel Bilgiler	
* Katılımcının adı	Sarıyer SAK
* Katılımcının cinsiyeti	Erkek
* Katılımcının yaşı	15-19; 20-24; 25-29; 30-34; 35-39; 40-44; 45-49; 50-54; 55-60; 61+
* Hanehalkı lideri kimdir?	Gen
* Evde başka bir karar verici var mı?	Hayır
* Coğrafi konum	Kırklareli / Kocaeli
* İl/Bölge	Kırklareli
* İlçe	Kocaeli
* Köy/topluluk	Kocaeli
* GPS	Enlem
* Ankete bağlama tarihi	22.11.2021



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Yavaş Salınlımlı Azotlu Gübreler ve Azaltılmış Dozlarının Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri

Proje Bütçesi: 95000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2021-2023

Projenin Amacı: Azot, mısır bitkisinin sağlıklı büyümesi için mutlak gerekli bir besin elementidir. Gübreleme ile toprağa verilen azot elementinden; yıkanma, denitrifikasyon gibi durumlara bağlı olarak kayıplar yaşanmaktadır. Bu kayıpların azaltılması amacıyla, gübreleme derinliği ile yavaş salınlımlı azotlu gübrelerin mısır bitkisinde etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Biyogaz Çıktısı Sıvı Fermente Ürünün Toprak Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi

Proje Bütçesi: 98000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022- 2024

Projenin Amacı: Azot, mısır bitkisinin sağlıklı büyümesi için mutlak gerekli bir besin elementidir. Gübreleme ile toprağa verilen azot elementinden; yıkanma, denitrifikasyon gibi durumlara bağlı olarak kayıplar yaşanmaktadır. Bu kayıpların azaltılması amacıyla, gübreleme derinliği ile yavaş salınımlı azotlu gübrelerin mısır bitkisinde etkinliğinin araştırılması amaçlanmaktadır.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Trakya Koşullarında Yetiştirilen Lavanta Bitkisinin Azot ve Fosfor İhtiyacının Belirlenmesi

Proje Bütçesi: 147250

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022- 2026

Projenin Amacı: alternatif bir ürün olarak Kırklareli de yetiştiriciliğine başlanmış olan lavanta bitkisinin azot ve fosfor ihtiyacı belirlenmesi ve gübreleme programının oluşturulması amaçlanmaktadır.





T.C.



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Proje Adı: Kırklareli İli Alternatif Bitkisel Üretim Deseninin Belirlenmesi

Proje Bütçesi: 297000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022- 2025

Projenin Amacı: Tarım alanları artan dünya nüfusu, sanayileşme ve yanlış tarımsal uygulamalar gibi çeşitli faktörler tarafından baskı altındadır. Bu alanların uzun vadede kullanılabilmesi ve gelecek nesillere aktarılabilmesi için sürdürülebilirliği sağlanmalıdır. Doğru tarımsal uygulamalar öncelikle arazi kullanım planlaması yapılması ile sağlanabilir. Kırklareli ilinin yüzölçümünün yaklaşık % 36'sını tarım alanları oluşturmaktadır. Önemli üretim potansiyeline sahip ilde en fazla yetiştiriciliği yapılan ürünler buğday, ayçiçeği, mısır ve çeltiktir. Buğday ve ayçiçeğine ait uzun yıllar verim değerleri incelendiğinde Kofçaz ilçesindeki buğday ve ayçiçeği verim değerleri il ortalamasının çok altında kalmaktadır. Bu çalışma ile ilçenin asit karakterli toprak yapısına uygun tarımsal arazi kullanım planlaması ve alternatif bitki desenine ait haritaların hazırlanması planlanmaktadır. Ayrıca buğday, ayçiçeği, mısır, çeltik vb. tarımının yoğun gerçekleştirildiği mutlak tarım arazileri dışında kalan Merkez ilçe ve diğer ilçelerde bulunan marjinal tarım alanlarında gerçekleştirilecek arazi çalışmaları ile mevcut durum analizi yapılarak, toprak kalitesi belirlenecek ve alternatif ürün deseni oluşturulacaktır.

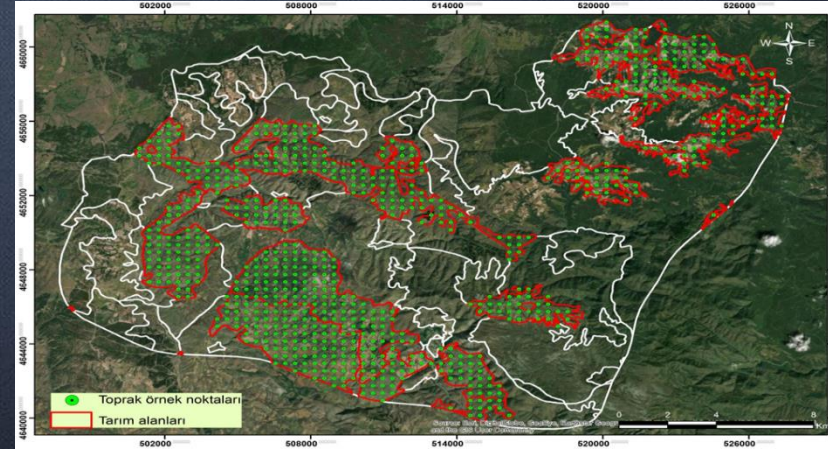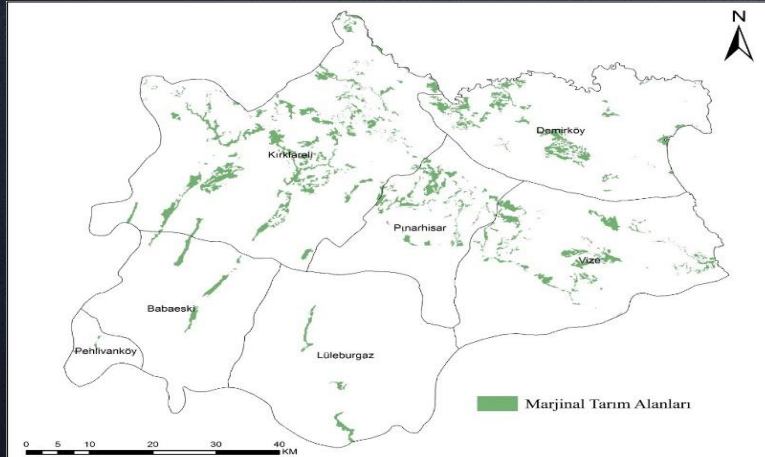

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON



T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: Kırklareli ilinde Tarımsal Mekanizasyon Planlaması, Yeni Teknolojilerin Kullanımı ve Politikalarının Araçlarının Geliştirilmesi

Proje Bütçesi: 110000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri:2020-2022

Projenin Amacı: Bu projede, Kırklareli ilinde tarımsal işletmelerin mekanizasyon planlamasının yapılması amaçlanmıştır. Tarım işletmeleri için farklı makine setleri oluşturulacak ve her makine seti için işletme arazisi büyüklüğü değişken olarak alınacak ve karı maksimize eden ürün deseni belirlenecektir.





T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

TAGEM
AR-GE & İNOVASYON

Proje Adı: TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Altyapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu Projesi

Proje Bütçesi: 420000

Proje başlama ve Bitiş Tarihleri: 2022-2023

Projenin Amacı: TAGEM tarafından yürütülmekte olan bu uygulamanın amacı, enstitü ve istasyon bünyesindeki tarımsal üretim alanlarının sulama altyapılarının iyileştirilmesi ve modernize edilmesidir.



