

kırklareli

2022 kamu yatırımları



Tarım	7
Madencilik	13
İmalat	16
Enerji	17
Ulaştırma – Haberleşme	19
Turizm	31
Konut	32
Eğitim	33
Sağlık	40
DKH İktisadi	43
DKH Sosyal	45

Giriş


Kamu Yatırımlarıyla İlgili Göstergeler

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nüfus (1)	346.973	351.684	356.050	360.860	361.836	361.737	366.363	
GSYH (TL) (1)	11.083.451.614	12.427.991.841	14.232.767.046	17.670.867.404	20.654.402.220	24.443.902.264	35.220.127.163	
GSYH (Zincirleme Hacim) (TL) (1)	7.289.054.743	7.638.055.182	7.908.220.014	8.330.971.313	8.547.852.146	8.877.799.938	9.808.529.328	
GSYH Zincirleme hacimdeki değişim (Büyüme) (yüzde) (1)	6,79	4,79	3,54	5,35	2,60	3,86	10,48	
Kişi başına GSYH (dolar)	11.837	11.774	11.026	10.456	10.066	9.597	10.772	
Kamu yatırımları (TL)	337.192.257	302.895.315	395.160.059	357.673.589	569.857.849	697.717.357	1.141.609.992	3.100.293.848
Kamu yatırımlarının GSYH oranı (yüzde)	3,04	2,44	2,78	2,02	2,76	2,85	3,24	
Kişi başına kamu yatırımları (TL)	972	861	1.110	991	1.575	1.929	3.116	
Bütçe kamu giderleri (TL) (2)	862.612.000	956.452.000	1.051.216.000	1.302.243.000	1.727.618.000	2.187.175.000	2.590.494.000	
Bütçe kamu giderlerinin GSYH oranı (yüzde)	7,78	7,70	7,39	7,37	8,36	8,95	7,36	
Kişi başına bütçe kamu giderleri (TL)	2.486	2.720	2.952	3.609	4.775	6.046	7.071	
Bütçe sermaye giderleri (TL) (2)	84.882.000	58.413.000	72.550.000	71.375.000	50.248.000	82.933.000	118.384.000	
Sermaye giderlerinin kamu giderlerine oranı (yüzde)	9,84	6,11	6,90	5,48	2,91	3,79	4,57	
Kişi başına bütçe sermaye giderleri (TL) (2)	245	166	204	198	139	229	323	

Kaynak: 1. TÜİK

2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

GSYH, Kamu Yatırımları, Bütçe Sermaye Giderleri ve Büyüme İlişkisi

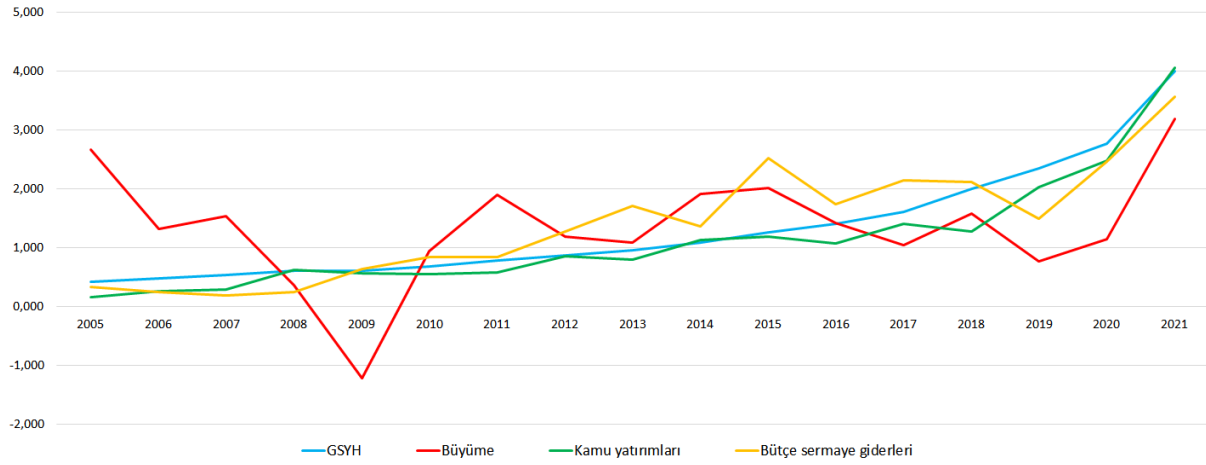

Grafik, gerçek değerlerin standart sapmaları hesaplanarak oluşturulmuştur.

Proje sayısı: 588, Proje tutarı: 12.437.662.021, Önceki yıllar harcaması: 2.974.284.412, 2022 yılı harcaması: **3.100.293.848**

Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı

Sıra no	Sektör	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	588	12.437.662.021	2.974.284.412	3.232.658.345	3.149.746.568	3.100.293.848	96
1	Tarım	88	1.301.645.170	69.217.142	73.446.698	73.182.730	59.950.953	82
2	Madencilik	7	447.569.200	2.124.000	442.416.202	439.715.534	439.715.534	99
3	İmalat	2	96.393	0	96.393	96.393	96.393	100
4	Enerji	13	235.129.703	19.909.710	71.881.605	71.881.481	54.968.694	76
5	Ulaştırma	183	7.104.044.232	2.610.932.253	1.830.385.949	1.828.349.864	1.827.340.311	100
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	2	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100
8	Konut	1	1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100
9	Eğitim	53	644.447.486	65.476.039	253.402.291	199.088.868	184.255.608	73
10	Sağlık	18	1.440.109.666	31.214.680	100.445.023	100.445.012	100.374.943	100
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	221	1.261.770.171	173.910.588	459.234.184	435.636.686	432.241.412	94
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	10	30.683.025	17.164.060	13.518.965	12.993.144	12.602.332	93
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	211	1.231.087.146	156.746.528	445.715.219	422.643.542	419.639.080	94

Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı

Sıra no	İlçe	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	588	12.437.662.021	2.974.284.412	3.232.658.345	3.149.746.568	3.100.293.848	96
1	Merkez	108	3.157.444.040	434.542.738	757.296.662	741.393.644	735.406.256	97
2	Babaeski	89	241.303.469	28.001.845	54.357.832	48.046.165	44.116.714	81
3	Demirköy	37	1.158.903.812	18.917.867	233.696.437	232.286.380	232.232.380	99
4	Koçgaz	25	29.841.663	6.120.907	8.037.140	7.717.973	7.717.972	96
5	Lüleburgaz	104	1.176.141.961	34.657.422	223.533.076	190.125.140	174.754.451	78
6	Pehlivanköy	15	2.718.993	282.896	2.260.003	2.027.577	2.027.577	90
7	Pınarhisar	43	199.837.662	18.671.966	116.645.970	105.894.099	93.894.099	80
8	Vize	56	145.995.593	19.512.705	90.498.853	82.679.551	82.233.762	91
9	Çoklu İlçeler	111	6.325.474.828	2.413.576.066	1.746.332.372	1.739.576.039	1.727.910.637	99

Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı

Sıra no	İlçe	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçekteleşme (%)
	Toplam	588	12.437.662.021	2.974.284.412	3.232.658.345	3.149.746.568	3.100.293.848	96
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	6	2.841.299.059	456.500.338	1.103.698.714	1.103.698.714	1.103.698.714	100
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	22	1.279.368.158	68.737.142	53.070.295	53.070.281	39.924.029	75
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	20	266.800.671	51.629.191	201.880.561	184.744.719	184.744.719	92
4	Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü	1	704.861	0	100.000	0	0	0
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	17	9.503.000	0	9.503.000	9.499.000	9.414.211	99
5	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	4	1.802.000	0	1.802.000	1.798.000	1.798.000	100
6	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	3	3.645.000	0	3.645.000	3.645.000	3.591.000	99
7	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	2	1.359.000	0	1.359.000	1.359.000	1.328.211	98
8	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	8	2.697.000	0	2.697.000	2.697.000	2.697.000	100
9	Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü	2	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100
10	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	10	4.213.952.206	2.152.494.733	683.227.510	683.205.710	682.338.306	100
11	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	2	13.856.200	0	10.903.201	8.202.534	8.202.534	75
12	Kırklareli Kadastro Müdürlüğü	3	7.636.314	4.929.292	2.707.021	2.707.021	2.707.021	100
13	TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü	13	235.129.703	19.909.710	71.881.605	71.881.481	54.968.694	76
14	TP Trakya Bölge Müdürlüğü	4	431.513.000	0	431.513.000	431.513.000	431.513.000	100
15	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	11	81.060.000	18.780.529	53.800.000	53.004.397	53.004.396	99
16	İl Özel İdaresi	252	58.901.158	14.262.698	43.226.278	39.734.841	39.120.184	91
17	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	7	34.702.646	0	1.884.618	1.159.693	297.527	16
18	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	1	400.000	0	400.000	400.000	399.587	100
19	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	17	200.932.529	20.806.196	79.933.933	66.337.078	66.337.078	83
20	Valilik	7	29.132.858	17.874.314	11.258.544	10.832.977	10.832.977	96
21	İl Emniyet Müdürlüğü	2	2.010.167	0	2.010.167	2.010.167	1.619.768	81
22	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	6	13.324.356	93.692	11.724.356	11.463.813	11.298.813	96
23	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	13	346.967.553	14.767.931	114.966.830	75.631.365	60.963.106	53
24	İl Sağlık Müdürlüğü	18	1.440.109.666	31.214.680	100.445.023	100.445.012	100.374.943	100
25	Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	6	890.000.000	101.803.966	205.436.522	205.336.520	203.666.732	99
26	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	24	8.725.944	0	8.725.944	8.725.944	8.725.208	100
27	Atatürk TSTMA Enstitüsü Müdürlüğü	14	2.644.750	480.000	1.374.001	1.374.000	1.374.000	100
	KÖYDES	110	27.887.222	0	27.887.222	23.668.301	23.668.301	85

Proje Tutarı En Yüksek Beş Proje

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
1	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	4.203.164.420	2.152.400.024	675.581.660	675.581.660	675.581.660	100	70	DE
2	2018I00-145138	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)	GB	2018	2025	1.125.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
3	1986E04-128-170005	(Pınarhisar-Vize)Ayr.-Demirköy-İğneada Devlet Yolu Yapımı (9,3 km)	ÖB	2021	2024	1.083.000.000	2.904.650	215.632.999	215.632.999	215.632.999	100	49	DE
4	2013E04-1777	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2025	1.015.000.000	218.034.344	392.628.000	392.628.000	392.628.000	100	66	DE
5	2016E04-2634	(Edirne - Havsa) Aynımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2024	622.746.533	235.561.344	387.185.189	387.185.189	387.185.189	100	95	DE

En Çok Harcama Yapılan Beş Proje

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
1	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	4.203.164.420	2.152.400.024	675.581.660	675.581.660	675.581.660	100	70	DE
2	2016E04-2634	(Edirne - Havsa) Aynımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2024	622.746.533	235.561.344	387.185.189	387.185.189	387.185.189	100	95	DE
3	2013E04-1777	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2025	1.015.000.000	218.034.344	392.628.000	392.628.000	392.628.000	100	66	DE
4	2021B00-160841	Sondaj Yatırımları	KT	2022	2022	256.030.000	0	256.030.000	256.030.000	256.030.000	100	100	BT
5	1986E04-128-170005	(Pınarhisar-Vize)Ayr.-Demirköy-İğneada Devlet Yolu Yapımı (9,3 km)	ÖB	2021	2024	1.083.000.000	2.904.650	215.632.999	215.632.999	215.632.999	100	49	DE

Proje sayısı: 88, Proje tutarı: 1.301.645.170, Önceki yıllar harcaması: 69.217.142, 2022 yılı harcaması: **59.950.953**

tarım

Sulama

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

- **Su Depolama Tesisleri:** Eriklice Göleti, Kadıköy Göleti, Sivrilere Göleti, Kofaz 2 Göleti, Ahmetbey Göleti Yükseltmesi, Yenice Barajı
- **Sulama Tesisleri:** Eriklice, Kızılcıkdere, Kadıköy, Sivrilere, Kofaz 2, Ahmetbey, Yenice
- Taşkın Koruma Tesisleri

Bitkisel Üretim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Bitkisel üretimi geliştirme projeleri

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

- Araştırma projeleri (14 adet)

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

- Arazi Toplulaştırma TİGH Projeleri

İl Özel İdaresi

- **Bitkisel üretimi geliştirme projeleri:** Seracılık, Lavanta, Aronia, Salep

Hayvancılık**İl Tarım ve Orman Müdürlüğü**

- Hayvancılığı geliştirme projeleri

İl Özel İdaresi

- **HİS göletleri:** Çayırılı, Çeşmeköy, Kocayazı, Çeşmekolu
- **Hayvancılığı geliştirme projeleri:** Arıcılık

Ormancılık**İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü**

- Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi
- Endüstriyel Plantasyon
- Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı
- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele
- Orman Amenejman ve Orman Köyleri Etüdü
- Fidan Üretimi

Su Ürünleri**Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü**

- İğneada Balıkçı Barınağı Etüd Proje İşleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Su ürünlerini geliştirme projeleri

Kofçaz 2 Göleti ve Sulaması

İlçesi: Kofçaz, Karakteristiği: Depolama (860.000 m3), Sulama (2.170 dekar), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2022, Proje tutarı: 25.316.404, Harcama: 9.632.787

Lüleburgaz Ahmetbey Göleti Yükseltmesi ve Sulaması

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: Depolama (12.500.000 m3), Sulama (12.200.000 dekar), İçmesuyu (10.340.000 m3), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2023, Proje tutarı: 103.217.344, Harcama: 21.064.442

Pınarhisar Yenice Barajı ve Sulaması

İlçesi: Pınarhisar, Karakteristiği: Depolama (3.800.000 m3), Sulama (14.070 dekar), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2023, Proje tutarı: 63.027.223, Harcama: 12.519.538
Sulama hattının toplam uzunluğu 38 500 metredir.



Pınarhisar Yenice Barajı



Kofçaz 2 Göleti



Ahmetbey Göleti

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
		Tarım				1.301.645.170	69.217.142	73.446.698	73.182.730	59.950.953		82	
		Tarım / Sulama				956.051.871	56.884.650	30.699.095	30.649.082	17.503.160		57	
		DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				956.001.871	56.884.650	30.649.095	30.649.082	17.503.160		57	
		Kırklareli Projesi				251.129.845	16.102.244	2	0	0	0	0	
1	1984A01-94	K.eli Kızılıkdere Sulaması İkmal (14.220 dekar)	GB	2016	2025	250.000.000	15.595.029	1	0	0	0	44	İA
2	1984A01-94	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı İlavesi	GB	2013	2022	1.129.845	507.215	1	0	0	0		DE
		Baraj ve Göletler				493.301.274	33.232.061	27.018.334	27.018.330	15.018.328		56	
3	0000000-000	K.eli Eriklice Göleti	GB	2022	2026	90.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
4	0000000-000	K.eli Eriklice Göleti Sulaması	GB	2022	2024	134.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
5	1977A010320	K.eli Kadıköy Göleti ve Sulaması (1.930.000 m3, 4.180 dekar)	GB	2016	2024	42.740.303	4.105.921	1	0	0	0	41	DE
6	1977A010320	D.köy Sivrilir Göleti ve Sulaması (390.000 m3, 1.260 dekar)	GB	2016	2024	35.000.000	927.701	1	0	0	0	19	İA
7	1977A010320	Koçaz 2 Göleti ve Sulaması (860.000 m3, 2.170 dekar)	GB	2016	2023	25.316.404	6.120.907	3.511.881	3.511.881	3.511.880	100	69	DE
8	1977A010320	L.burgaz Ahmetbey Göleti Yükseltmesi ve Sulaması (12.520.000 m3, 12.200 dekar)	GB	2016	2024	103.217.344	9.557.994	11.506.449	11.506.449	11.506.448	100	35	DE
9	2016A01-149838	P.hisar Yenice Barajı ve Sulaması (3.800.000 m3, 14.070 dekar)	GB	2016	2023	63.027.223	12.519.538	12.000.000	12.000.000	0	0	55	DE
		Taşkın Koruma				207.940.000	7.550.345	7	0	0	0	0	
10	0000000-000	K.eli Bağlıca Deresi Taşkın Koruması 1. Kısım	GB	2022	2024	20.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
11	1977A010320	K.eli Dolhan Taşkın Koruması	GB	2021	2023	8.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
12	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2023	33.940.000	7.550.345	1	0	0	0	80	DE
13	0000000-000	B.eski Pekmezdere Taşkın Koruması 1. Kısım	GB	2022	2024	45.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
14	1977A010320	B.eski Yenimahalle Taşkın Koruması	GB	2021	2023	7.500.000	0	1	0	0	0	0	İA
15	1977A010320	Lüleburgaz 1. Kısım Taşkın Koruması	GB	2016	2024	85.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
16	0000000-000	P.hisar Çayırdere Taşkın Koruması	GB	2022	2023	8.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				3.630.752	0	3.630.752	3.630.752	2.484.832		68	
17	0000000-000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	2021	2022	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	54.085	5	100	BT
18	1985A010020	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2021	2022	2.095.735	0	2.095.735	2.095.735	2.095.732	100	100	BT
19	1987A010510	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2021	2022	335.017	0	335.017	335.017	335.015	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				50.000	0	50.000	0	0	0	0	
		Sulama Göleti Bakım ve Onarımları				50.000	0	50.000	0	0	0	0	
20	0000000-000	L.burgaz Çeşmekolu Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	100	BT
		Tarım / Bitkisel Üretim				332.773.972	12.332.492	30.558.136	30.528.067	30.527.001		100	
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				6.488.085	0	6.488.085	6.488.085	6.487.349		100	
21	0000000-000	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	GB	2022	2022	86.680		86.680	86.680	86.680	100	100	BT
22	0000000-000	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	GB	2022	2022	4.000		4.000	4.000	4.000	100	100	BT
23	0000000-000	Kırsal Kalkınma Desteklerinin İzlenmesi	GB	2022	2022	4.085		4.085	4.085	4.085	100	100	BT
24	0000000-000	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2022	2022	230.536		230.536	230.536	230.536	100	100	BT
25	0000000-000	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	GB	2022	2022	78.045		78.045	78.045	78.045	100	100	BT
26	0000000-000	Çayır, Mera Islahı ve Amenejman Projesi	GB	2022	2022	545.422		545.422	545.422	545.422	100	100	BT
27	0000000-000	Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi	GB	2022	2022	120.028		120.028	120.028	120.028	100	100	BT
28	0000000-000	Arazi Kullanım Planlaması Projesi	GB	2022	2022	508.156		508.156	508.156	508.156	100	100	BT
29	0000000-000	Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanılması	GB	2022	2022	45.000		45.000	45.000	45.000	100	100	BT
30	0000000-000	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü	GB	2022	2022	5.182		5.182	5.182	5.182	100	100	BT
31	0000000-000	Şeker Hammaddelerinin Sürdürülebilir Yönetimi	GB	2022	2022	20.000		20.000	20.000	20.000	100	100	BT
32	0000000-000	Alternatif Üretim Yöntemlerinin Geliştirilmesi	GB	2022	2022	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	100	BT
33	0000000-000	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi				2.914		2.914	2.914	2.914	100	100	BT
34	0000000-000	Arazi Dağıtım Projesi	GB	2022	2022	16.494		16.494	16.494	16.494	100	100	BT
35	0000000-000	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2022	2022	3.272.921		3.272.921	3.272.921	3.272.185	100	100	BT
36	0000000-000	Muhtelif İşler	GB	2022	2022	548.622		548.622	548.622	548.622	100	100	BT
		Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü				2.644.750	480.000	1.374.001	1.374.000	1.374.000		100	
		Araştırma Projeleri (1 / 14 adet)				2.644.750	480.000	1.374.001	1.374.000	1.374.000		100	
		Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri				480.000	340.000	80.001	80.000	80.000		100	
37	2012A02-1505	Trakya Yör. Yapay Sin. Ağ. İle Kur. Tah. ve Coğ. Bil. Sis. İle Haritalanması	GB	2020	2022	20.000	20.000	1	0	0	0	99	DE
38	2012A02-1505	Trakya Böl. Palmer Kuraklık Şiddet İndisinin Buğday Bitkisi İçin Yeniden Modellenmesi	GB	2021	2024	80.000	50.000	10.000	10.000	10.000	100	50	DE
39	2012A02-1505	Çeltik Tar. Kaynaklı Sera Gazlarının Hesaplanması ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi	GB	2021	2023	280.000	200.000	40.000	40.000	40.000	100	67	DE
40	2012A02-1505	Trakya Yöresinde FAO-SHARP Aracı İle İklim Değişikliği Dayanıklılığının Değerlendirilmesi	GB	2021	2022	100.000	70.000	30.000	30.000	30.000	100	99	DE

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri				637.250	40.000	223.750	223.750	223.750	100		
41	2012A02-1505	Yavaş Salımlı Azotlu Gübreler ve Azaltılmış Dozlarının Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri	GB	2021	2023	95.000	40.000	28.000	28.000	28.000	100	67	DE
42	2012A02-1505	Trakya Koşullarında Yetiştirilen Lavanta Bitkisinin Azot ve Fosfor İhtiyacının Belirlenmesi	GB	2022	2026	147.250	0	31.750	31.750	31.750	100	20	DE
43	2012A02-1505	Kırklareli İli Alternatif Bitkisel Üretim Desenin Belirlenmesi	GB	2022	2025	297.000	0	113.000	113.000	113.000	100	25	DE
44	2012A02-1505	Biyogaz Çıktısı Sıvı Fermente Ürünün Toprak Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi	GB	2022	2024	98.000	0	51.000	51.000	51.000	100	33	DE
		Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırma Projeleri				997.500	0	640.250	640.250	640.250	100		
45	2012A02-1505	Kırklareli Eysel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanakları ve Sera Gazı Salımlarına Etkisinin Araştırılması	GB	2022	2024	357.000	0	202.000	202.000	202.000	100	33	DE
46	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Buğday ve Ayçiçeği Bitkileri İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme	GB	2022	2024	254.000	0	173.000	173.000	173.000	100	33	DE
47	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Yonca (Medicago sativa) Bitkisi İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi	GB	2022	2024	254.000	0	173.000	173.000	173.000	100	33	DE
48	2012A02-1505	Kırklareli Koşullarında Yapay Meralarda Su Kısıtının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri	GB	2022	2024	132.500	0	92.250	92.250	92.250	100	33	DE
		Tarımsal Mekanizasyon ve Bilgi Teknolojileri Araştırmaları				530.000	100.000	430.000	430.000	430.000	100		
49	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Tar. Mek. Pl. Yeni Tek. Kul. Ve Pol. Ar. Geliştirilmesi	GB	2020	2022	110.000	100.000	10.000	10.000	10.000	100	99	DE
50	2012A02-1505	TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Altyapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu	GB	2022	2022	420.000	0	420.000	420.000	420.000	100	100	BT
		DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				323.366.287	11.852.492	22.421.200	22.421.199	22.420.869	100		
51	2010A02-1188	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi (40.000 hektar, 15 yerleşim yeri)	GB	2018	2023	114.897.792	11.852.492	18.338.536	18.338.536	18.338.534	100	41	DE
52	2010A02-1188	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi 2. Kısım	GB	2022	2025	73.468.495	0	4.082.663	4.082.663	4.082.335	100	6	DE
53	2010A02-1188	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi 3. Kısım	GB	2022	2025	135.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		İl Özel İdaresi				274.850	0	274.850	244.783	244.783	89		
54	0000000-000	Seraçılık	Öİ	2022	2022	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	BT
55	0000000-000	Lavanta Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	0	0	0	0	HB
56	0000000-000	Salep Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
57	0000000-000	Aronia Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	59.999	59.999	100	100	BT
58	0000000-000	Ayçiçeği ve Silajlık Tohum Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	49.850	0	49.850	49.850	49.850	100	100	BT
59	0000000-000	Kırmızı Karınca Yuvalarının Korunması	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	29.934	29.934	100	100	BT
		Tarım / Hayvancılık				2.568.376	0	2.543.377	2.463.491	2.463.491	97		
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				2.098.376	0	2.098.376	2.098.376	2.098.376	100		
60	0000000-000	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2022	2022	539.593		539.593	539.593	539.593	100	100	BT
61	0000000-000	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	GB	2022	2022	228.200		228.200	228.200	228.200	100	100	BT
62	0000000-000	Hayvansal Üretimin Artırılması	GB	2022	2022	1.330.583		1.330.583	1.330.583	1.330.583	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				470.000	0	445.001	365.115	365.115	82		
		Hayvan İcmesuyu Göletleri (0 / 4 adet)				160.000	0	135.001	85.000	85.000	63		
63	0000000-000	K.eli Çeşmeköy HİS Göleti Yapımı	Öİ	2020	2022	25.000	0	1	0	0	0		DE
64	0000000-000	K.eli Çayır HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
65	0000000-000	Koğaz Kocayazı HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
66	0000000-000	L.burgaz Çeşmekolu HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	İA
		Hayvancılık Projeleri				310.000	0	310.000	280.115	280.115	90		
67	0000000-000	Arıcılık	Öİ	2022	2022	310.000	0	310.000	280.115	280.115	90	100	BT

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
		Tarım / Ormancılık				9.503.000	0	9.503.000	9.499.000	9.414.211	99		
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				1.802.000	0	1.802.000	1.798.000	1.798.000	100		
		Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi				1.202.000	0	1.202.000	1.198.000	1.198.000	100		
68	2022A05-181731	Ağaçlandırma	ÖB	2022	2022	1.123.000	0	1.123.000	1.123.000	1.123.000	100	100	BT
69	2022A05-181731	Rehabilitasyon	ÖB	2022	2022	75.000	0	75.000	75.000	75.000	100	100	BT
70	2022A05-181731	Etüd Proje	ÖB	2022	2022	4.000	0	4.000	0	0	0	100	BT
		Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				600.000	0	600.000	600.000	600.000	100		
71	2022A05-166557	B.Onarım	DS	2022	2022	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100	100	BT
		Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü				3.645.000	0	3.645.000	3.645.000	3.591.000	99		
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele				25.000	0	25.000	25.000	25.000	100		
72	2022A05-181575	Fotokapan (Otlatma - Gözetleme)	ÖB	2022	2022	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
		Endüstriyel Plantasyon				70.000	0	70.000	70.000	70.000	100		
73	2020A05-151908	Endüstriyel Ağaçlandırma Bakımı	ÖB	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
		Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				3.550.000	0	3.550.000	3.550.000	3.496.000	98		
74	2022A05-166557	B.Onarım	DS	2022	2022	3.550.000	0	3.550.000	3.550.000	3.496.000	98	100	BT
		Vize Orman İşletme Müdürlüğü				1.359.000	0	1.359.000	1.359.000	1.328.211	98		
		Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				530.000	0	530.000	530.000	500.000	94		
75	2022A05-166557	B.Onarım	DS	2022	2022	530.000	0	530.000	530.000	500.000	94	100	BT
		Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü				829.000	0	829.000	829.000	828.211	100		
76	2022A05-181925	Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü	DS	2022	2022	829.000	0	829.000	829.000	828.211	100	100	BT
		Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü				2.697.000	0	2.697.000	2.697.000	2.697.000	100		
		Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi				210.000	0	210.000	210.000	210.000	100		
77	2022A05-181915	Fidan Üretimi	ÖB	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
78	2022A05-181917	Fidan Üretimi	ÖB	2022	2022	110.000	0	110.000	110.000	110.000	100	100	BT
		Fidan Üretimi				2.487.000	0	2.487.000	2.487.000	2.487.000	100		
79	2022A05-181915	Fidan Üretimi	DS	2022	2022	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100	100	BT
80	2022A05-181915	Fidan Bakımı	DS	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
81	2022A05-181915	Tohum Üretimi	DS	2022	2022	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
82	2022A05-181915	Ağaç ve Tohum Islahı	DS	2022	2022	12.000	0	12.000	12.000	12.000	100	100	BT
83	2022A05-181915	Tesisler	DS	2022	2022	850.000	0	850.000	850.000	850.000	100	100	BT
84	2022A05-181915	Makine Teçhizat Alımı	DS	2022	2022	95.000	0	95.000	95.000	95.000	100	100	BT
		Tarım / Su Ürünleri				747.951	0	143.090	43.090	43.090	30		
		Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü				704.861	0	100.000	0	0	0		
85	2020A04-150875	D.köy İğneada Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri	GB	2022	2023	704.861	0	100.000	0	0	0	0	DE
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				43.090	0	43.090	43.090	43.090	100		
86	0000000-000	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2022	2022	11.553	0	11.553	11.553	11.553	100	100	BT
87	0000000-000	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2022	2022	2.401	0	2.401	2.401	2.401	100	100	BT
88	0000000-000	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	GB	2022	2022	29.136	0	29.136	29.136	29.136	100	100	BT

Proje sayısı: 7, Proje tutarı: 447.569.200, Önceki yıllar harcaması: 2.124.000,
2022 yılı harcaması: **439.715.534**

madencilik

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü


- Maden Arama Çalışmaları

TP Trakya Bölge Müdürlüğü

- Petrol ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları

İl Özel İdaresi

- Jeotermal Sondajı

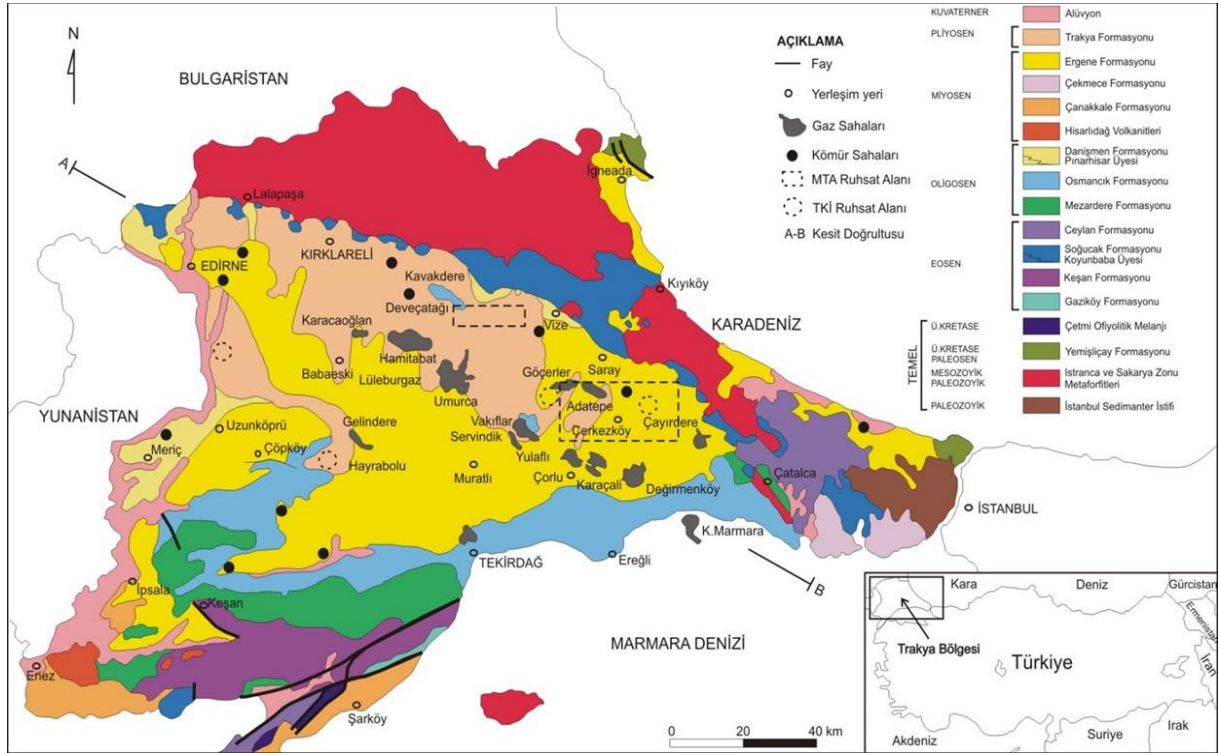

Trakya Jeoloji Haritası

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Madencilik				447.569.200	2.124.000	442.416.202	439.715.534	439.715.534	99		
		MTA Marmara Bölge Müdürlüğü				13.856.200	0	10.903.201	8.202.534	8.202.534	75		
89	0000000-000	Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları	ÖB	2022	2022	10.903.200	0	10.903.200	8.202.534	8.202.534	75	100	BT
90	0000000-000	Trakya Yöresi İntrüziflerle İlişkili Polimetal Maden Aramaları	ÖB	2022	2022	2.953.000	0	1	0	0	0	100	BT
		TP Trakya Bölge Müdürlüğü				431.513.000	0	431.513.000	431.513.000	431.513.000	100		
91	2021B00-160841	Sondaj Yatırımları	KT	2022	2022	256.030.000	0	256.030.000	256.030.000	256.030.000	100	100	BT
92	2021B00-157088	Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları	KT	2022	2022	63.511.000	0	63.511.000	63.511.000	63.511.000	100	100	BT
93	2021B00-160856	Kuyu Tamamlama Yatırımları	KT	2022	2022	110.902.000	0	110.902.000	110.902.000	110.902.000	100	100	BT
94	2021B00-158534	İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı	KT	2022	2022	1.070.000	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				2.200.000	2.124.000	1	0	0	0		
95	0000000-000	P.hisar Osmançık Jeotermal Sondajı (1500 m)	Öİ	2021	2022	2.200.000	2.124.000	1	0	0	0		DE



TP Misinli-2 Kuyusu

Proje sayısı: 2, Proje tutarı: 96.393, Önceki yıllar harcaması: 0, 2022 yılı harcaması: **96.393**

İmalat

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Gıda hizmeti projeleri

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	Açıklamalar
		İmalat				96.393	0	96.393	96.393	96.393	100	
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				96.393	0	96.393	96.393	96.393	100	
96	00000000-000	Gıda Hizmetleri	GB	2022	2022	65.841		65.841	65.841	65.841	100	BT
97	00000000-000	Gıda ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2022	2022	30.552		30.552	30.552	30.552	100	BT

Proje sayısı: 13, Proje tutarı: 235.129.703, Önceki yıllar harcaması: 19.909.710,
2022 yılı harcaması: **54.968.694**

enerji

TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü

- Trafo merkezi yapımı: Kırklareli OSB, Vize Pagder Aslan OSB **Toplam 2 TM**
- Trafo merkezi yenileme: Babaeski, Lüleburgaz, Hamitabat, Vize **Toplam 4 TM**
- Enerji nakil hattı: (Kırklareli – Pınarhisar Brş.) – Kırklareli OSB, **Balkaya – Vize**, Sergen – Vize, **Sergen – Evrencik**, Vize – Vize OSB, **(Babaeski – Hamitabat) – Lüleburgaz**, Demirköy – Kıyıköy **Toplam 7 hat**

Babaeski Trafo Merkezi Yenileme

İlçesi: Babaeski, Karakteristiği: 154/33 kV, 50 MVA Trafo + 154 kV 4 Fider + OG Metal Clad İlavesi, Başlama ve bitiş tarihi: 2012 – 2022, Harcama: 14.556.803

Vize Pagder Aslan OSB Trafo Merkezi Yapımı

İlçesi: Vize, Karakteristiği: 154/33 kV, 100 MVA + 2. Trafo Fideri, Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2022, Harcama: 56.308703



Babaeski Trafo Merkezi



Pagder Aslan OSB Trafo Merkezi

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Enerji						235.129.703	19.909.710	71.881.605	71.881.481	54.968.694	76		
TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü						235.129.703	19.909.710	71.881.605	71.881.481	54.968.694	76		
Trafo Merkezleri						164.229.703	18.758.895	65.940.593	65.940.591	54.927.804	83		
98	2012D030340	Babaeski TM Yenileme (154/33 kV, 50 MVA Trafo + 154 kV 4 Fider + OG Metal Clad İlavesi)	KT	2012	2022	16.000.000	14.556.803	1	0	0	0	100	BT
99	2003D00-648-64521	L.burgaz Hamitabat TM Tevsiat 400 kV,1 Fider (Reaktör) + 400/154 kV, Ototrafo Fideri + 250 MVA Ototrafo + 420 kV, 160-250 MVar Ayarlanabilir Reaktör	KT	2017	2023	45.000.000	1.812.980	5.000.000	5.000.000	0	0	0	İA
100	2020D00-149430-149455	Vize 380 Havza TM Tevsiat 400 kV 3 Fider (Babaeski, Yedek, Reaktör) + 154 kV, 4 fider (Balkaya RES, Sergen RES, Modern Karton, ASB)))	KT	2020	2024	25.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
101	2020D00-149430-149508	Vize Pagder Aslan OSB TM (154/33 kV, 100 MVA + 2. Trafo Fideri)	KT	2020	2022	56.308.703	2.389.112	53.919.591	53.919.591	53.919.591	100	100	BT
102	18D002500	Lüleburgaz TM Tevsiat	KT	2021	2022	5.921.000	0	5.921.000	5.921.000	1.008.213	17	20	DE
103	2022D00-175939-176964	Kırklareli OSB TM 154/33 kV, 1. ve 2. Trafo Fideri	KT	2022	2024	16.000.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0	İA
Enerji İletim Hatları						70.900.000	1.150.815	5.941.012	5.940.890	40.890	1		
104	2001D00-634-64767	(Babaeski - Hamitabat) Brş. N. - Lüleburgaz EİH (154 kV 2x1272 MCM, 4 km)	KT	2018	2024	5.400.000	0	7.249	7.249	7.249	100	0	İA
105	2001D00-634-64788	Balkaya RES - Kiyıköy RES EİH 154 kV, 1272 MCM, 18 km	KT	2018	2024	14.000.000	150.815	100.000	100.000	0	0	0	İA
106	2020D00-149430-149454	Balkaya RES YEKA - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 14+14 km(İki Ayrı Hat)	KT	2020	2023	21.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
107	2020D00-149430-149458	Sergen RES - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 22 km)	KT	2020	2024	15.000.000	0	31.762	31.762	31.762	100	0	İA
108	2020D00-149430-149459	Sergen RES - Evrencik RES EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 9 km)	KT	2020	2024	6.000.000	0	2.000	1.879	1.879	94	0	İA
109	2020D00-149430-149518	(Pınarhisar - Traçım) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH (TTFO)(154 kV, 1272 MCM, (6 + 6) km (İki Ayrı Hat)	KT	2020	2022	6.500.000	1.000.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0	İA
110	2022D00-175939-176972	(Kırklareli - Pınarhisar) Brş. N. - Kırklareli OSB EİH (154 kV, 1272 MCM, 2+2 km (İki Ayrı Hat)	KT	2022	2024	3.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0	İA

Proje sayısı: 183, Proje tutarı: 7.104.044.232, Önceki yıllar harcaması: 2.610.932.253, 2022 yılı harcaması: **1.827.340.311**

ulaştırma

Demiryolu

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

- Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı
- Demiryolları Bakım ve Onarımları

Karayolu

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

- Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (71,1 km)
- (Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 km)
- (Pınarhisar - Vize) Ayrım - Demirköy - İğneada Yolu (30,9 km)
- Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü

İl Özel İdaresi

- Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı

Kentiçi Ulaşım

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Şehiriçi Yolları ve Kaldırım Yapımı: Kavaklı, Büyükmandıra, Evrensekiz, Pehlivan köy

Halkalı – Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı

Halkalı - Çerkezköy (76 km) Çerkezköy - Kapıkule (153 km)

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşaatı, İlçesi: Babaeski, Lüleburgaz, Başlama ve bitiş tarihi: 2007 – 2023 (31.12.2023), Proje tutarı: 4.203.164.420, Harcama: 2.827.981.684, Nakdi gerçekleşme: % 67, Fiziki gerçekleşme: % 70

Hat bilgileri: Toplam hat: 152,906 km (İkili hat: 142,546 km + Üçlü hat: 10,360)

Toprak işleri: Güzergah ve temel kazısı: 63.792.000 m³, Dolgu:10.334.02 m³

Sanat yapıları: Menfez:180, Aç-Kapa Tünel: 7, Altgeçit: 52, Üstgeçit: 62, Demiryolu köprüsü: 32, Viyadük: 2

63.792.000 m³ kazının, 57.828.543 m³'ü (%92) tamamlandı.

10.334.029 m³ dolgunun, 4.761.401 m³'ü (%46) tamamlandı.

7 adet aç kapa tünel ve karayolu geçişi (6 adet tamamlandı – 1 adet devam ediyor)

2 adet viyadük (devam ediyor)

62 adet üst geçit (16 adet tamamlandı – 46 adet devam ediyor)

52 adet altgeçit (43 adet tamamlandı – 9 adet devam ediyor)

32 adet demiryolu köprüsü (9 adet tamamlandı – 24 adet devam ediyor)

180 adet menfez (124 adet tamamlandı – 56 adet devam ediyor)

353 Km'lik hattın yaklaşık 52 km'lik kısmının serimi yapılmıştır.

Projede yaklaşık 900.000 m³ balasta ihtiyaç vardır, yaklaşık 203.000 m³ balast üretimi gerçekleştirilmiş olup, 131,197 m³ balast serimi yapılmıştır.


305 deplase imalatı (203 adet tamamlandı – 102 adet devam ediyor.)

Toplam 229 km uzunluğa sahip hat tamamlandığında Halkalı - Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek, mevcut hat kapasitesi de 4 kat daha artacaktır. Ayrıca bölgedeki yoğun kara trafiğini azaltacak ulaşımın gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Halkalı-Çerkezköy demiryolu kesimlerinden oluşuyor. Çift hatlı, 200 km hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilen hatta yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje ile birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacaktır.


Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattıyla, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacaktır. Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacaktır. Bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artacak, imalat sanayine gerekli olan hammaddelerin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetleri azalacaktır.



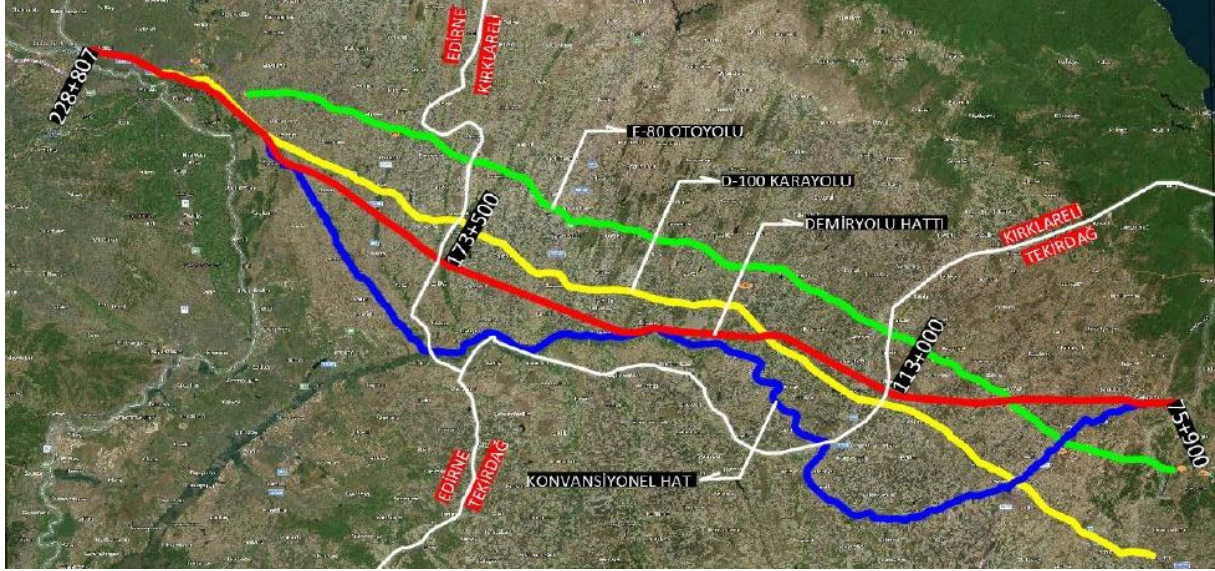

Çerkezköy 75,900 km (**Tekirdağ: 37,100 km**), Kırklareli il sınırı 113,000 km (**Kırklareli: 60,500 km**)
Kırklareli il sınırı 173,500 km, Kapıkule 228,807 km (**Edirne: 55,307 km**)

İstasyon Noktaları

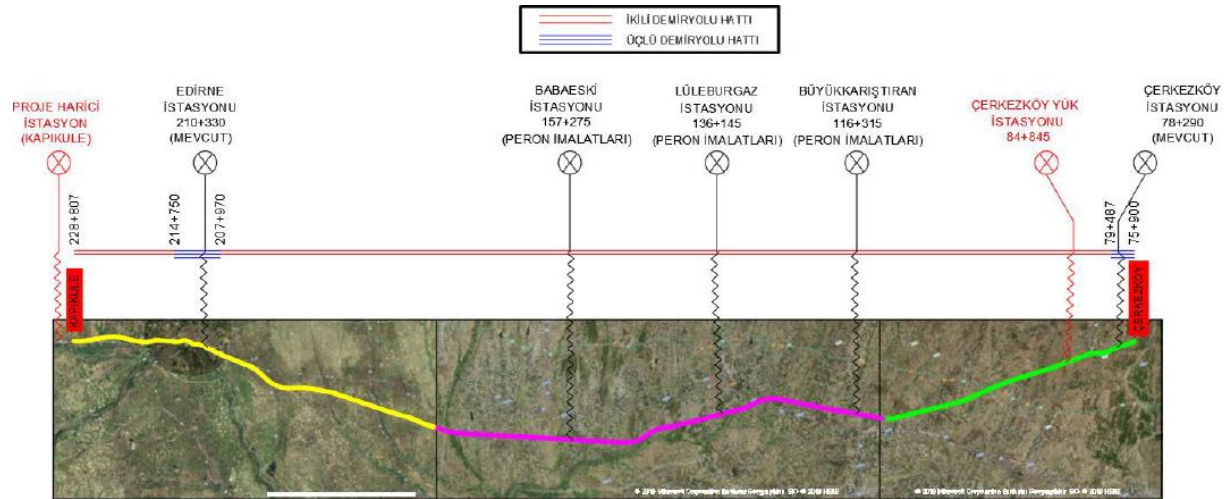

Kapıkule, Edirne (210,330), Babaeski (157,275), Lüleburgaz (136,145), Büyükkarıştıran (116,315), Çerkezköy Yük İstasyonu (84,845), Çerkezköy (78,290)



Halkalı – Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı

Kırklareli – Edirne Bölünmüş Yolu

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 26,5 / 47,5 km, Başlama ve bitiş tarihi: 2013 – 2024, Proje tutarı: 622.746.533, Harcama: 622.746.533. Kırklareli il sınırları içinde 21,5 km yol tamamlanarak hizmete açılmıştır. 391 m uzunluğunda 6 köprü (İnece, Dolapdere, Bostanlı, Akardere, Hasköy, Sazlıdere) yapılmıştır.

Saray – Kırklareli Yolu

İlçesi: Merkez, Pınarhisar, Vize, Karakteristiği: 71,1 km (32,1 BY, 39 TY), 4 köprü (186 m), Başlama ve bitiş tarihi: 2019 – 2025, Proje tutarı: 1.015.000.000, Harcama: 610.662.344

Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın video konferans ile teşrifleri ile 30 Nisan 2022 Cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kırklareli'yi Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan Saray-Kırklareli yolu projesi kapsamında 7,4 kilometrelik Pınarhisar çevre yolu ile 3 kilometrelik Çakıllı çevre yolumuzun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kılacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Yıllık toplam 128,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7.275 ton azaltılacak.



Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni (30.04.2022)



Kırklareli – Edirne Bölünmüş Yolu



Pınarhisar Çevre Yolu



Çakılı Çevre Yolu

(Pınarhisar – Vize Ayrımı) – Demirköy – İğneada Yolu Rehabilitasyonu

İlçesi: Demirköy, Karakteristiği: 30, 9 km (İlk kısım: 9,3 km (1A, 12 m) (5,5 km Demirköy Çevre yolu), İkinci kısım: 21,6 km (1A, 12 m), Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2024, Proje tutarı: 1.083.000.000, Harcama: 218.537.649

Km: 0+000-5+450 ve 21+000-24+820 Arası: 9,3 km tek yol ile 200 metre uzunluğunda 3 köprü yapılacaktır. Yüzde 88 tamamlanmıştır.

Km: 5+450+21+000 ve 24+820-27+684 Arası: 18,4 km tek yol yapılacaktır. Yüzde 9 tamamlanmıştır.



İl Özel İdaresi**Köy Yolları Yapım Bakım ve Onarımı**

İlçesi: Muhtelif, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 23.697.870, Harcama: 23.052.717

Köy yolları yapım, bakım ve onarımı

Sıcak asfalt kaplama **9,000 km (başlamadı)**

İkinci kat asfalt kaplama **3,450 km (tamamı yapıldı)**

Birinci kat asfalt kaplama **25,800 km (tamamı yapıldı)**

Parke taş kaplaması **92.831 m2 (85.286 m2 yapıldı)**

Köprü, menfez ve sanat yapıları **9 adet (3 adet yapıldı)**

KÖYDES**Köy Yolları Yapım Bakım ve Onarımı (KÖYDES)**

İlçesi: Muhtelif, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 12.976.511, Harcama: 12.183.997

Köy yolları yapım, bakım ve onarımı

İkinci kat asfalt kaplama **3,000 km (tamamı yapıldı)**

Birinci kat asfalt kaplama **15,800 km (tamamı yapıldı)**

Parke taş kaplaması **7.516 m2 (5.748 m2 yapıldı)**

Köprü, menfez ve sanat yapıları **5 adet (1 adet yapıldı)**



Deveçatağı, 20.06.2022



Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Ulaştırma				7.104.044.232	2.610.932.253	1.830.385.949	1.827.491.596	1.826.482.043	100		
		Demiryolu				4.213.952.206	2.152.494.733	683.227.510	683.205.710	682.338.306	100		
		TCDD 1. Bölge Müdürlüğü				4.213.952.206	2.152.494.733	683.227.510	683.205.710	682.338.306	100		
111	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	4.203.164.420	2.152.400.024	675.581.660	675.581.660	675.581.660	100	70	DE
112	2016.E010060.27.01.0005	İstasyonların Kompanzasyon Sistemlerinin Yapılması	KT	2021	2022	104.459	94.709	9.750	9.750	8.631	89	100	BT
113	2019.E010140.01.01.0023	Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri İçin Kesintisiz Güç Kaynağı Temini (9 Adet)	KT	2020	2022	3.283.500	0	3.283.500	3.283.500	3.283.500	100	100	BT
114	2020.E010140.01.01.0024	Çerkezköy - Kapıkule Arasındaki 100 Adet Blok ve KBS Sinyallerinin Ledli Sinyalle Değişiminin Yapılması	KT	2021	2022	262.000	0	110.000	110.000	110.000	100	100	BT
115	2021.E010140.01.01.0030	Trakya Hat Kesminde Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemlerine ait Bilgilerin F/O Kablo ile Çerkezköy Kumanda Merkezine Taşınması	KT	2021	2022	301.920	0	301.920	301.920	301.920	100	100	BT
116	2017.E010110.01.03	Alpullu Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2022	13.900	0	13.900	0	0	0	60	DE
117	2017.E010110.01.03	Lüleburgaz Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2022	7.900	0	7.900	0	0	0	60	DE
118	2017.E010110.01.03	Pehlivanköy Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2022	14.328	0	14.328	14.328	14.328	100	80	DE
119	2020.E010190.01.14	Alpullu Çatalca Çorlu Kurfalı Lüleburgaz Muratlı Pehlivanköy Velimeşe Peron Peronbeji Uzatma	KT	2022	2023	5.126.343	0	2.904.552	2.904.552	2.064.452	71	40	DE
120	2020.E010190.01.21	İstasyonların Saha Aydınlatmalarının Yapılması	KT	2022	2023	1.673.436	0	1.000.000	1.000.000	973.815	97	80	DE
		Karayolu				2.877.973.440	456.530.851	1.140.342.582	1.138.219.309	1.138.077.160	100		
		Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü				2.841.299.059	456.500.338	1.103.698.714	1.103.698.714	1.103.698.714	100		
		Yol Yapımları				2.720.746.533	456.500.338	995.446.188	995.446.188	995.446.188	100		
121	2013E04-1777	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2025	1.015.000.000	218.034.344	392.628.000	392.628.000	392.628.000	100	66	DE
122	2016E04-2634	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2024	622.746.533	235.561.344	387.185.189	387.185.189	387.185.189	100	95	DE
123	1986E04-128-170005	(Pınarhisar-Vize)Ayr.-Demirköy-İğneada Devlet Yolu Yapımı (9,3 km)	ÖB	2021	2024	1.083.000.000	2.904.650	215.632.999	215.632.999	215.632.999	100	49	DE
		Köprü Yapımları				12.300.000	0	0	0	0	0	0	
124	2000E04-619-63099	Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (90 m)	ÖB	2015	2023	12.300.000	0	0	0	0	0	0	YT
		Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Çalışmaları				83.846.497	0	83.846.497	83.846.497	83.846.497	100		
125	1991E040090	Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Çalışmaları	ÖB	2022	2022	83.846.497	0	83.846.497	83.846.497	83.846.497	100	100	BT
		Kamulaştırmalar				24.406.029	0	24.406.029	24.406.029	24.406.029	100		
126	00000000-000	Kamulaştırmalar	ÖB	2022	2022	24.406.029	0	24.406.029	24.406.029	24.406.029	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				23.697.870	30.513	23.667.357	23.194.866	23.052.717	97		
127	00000000-000	Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı				23.697.870	30.513	23.667.357	23.194.866	23.052.717	97	100	BT
		KÖYDES				12.976.511	0	12.976.511	12.183.997	12.183.997	94		
252	00000000-000	Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı				12.976.511	0	12.976.511	12.183.997	12.183.997	94	100	BT
		Kentçi Ulaşım				12.118.586	1.906.669	6.815.857	6.066.577	6.066.577	89		
		İller Bankası 1. Bölge Müdürlüğü				12.118.586	1.906.669	6.815.857	6.066.577	6.066.577	89		
286	00000000-000	K.eli Kavaklı Şehirci Yolları Parke Taşı Kaplama, Kaldırım ve Yağmur Oluğu Yapımı	İB	2022	2022	3.247.546	1.623.773	1.623.773	1.623.773	1.623.773	100	100	BT
287	00000000-000	B.eski Büyükmandıra Şehirci Yolları Parke Taşı Kaplama Yapımı ve Bordür Düzenlemesi	İB	2022	2022	349.980	0	349.980	349.980	349.980	100	100	BT
288	00000000-000	L.burgaz Evrensekiz Şehirci Yolları Parke Taşı Kaplama ve Kaldırım Yapımı	İB	2022	2022	7.344.966	0	4.125.000	3.375.720	3.375.720	82	50	DE
289	00000000-000	Pehlivanköy Şehirci Yolları ve Kaldırım Yapımı	İB	2021	2022	1.176.094	282.896	717.104	717.104	717.104	100	100	BT

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. gerçek (%)	Fiziki işleme gerçek (%)	Açıklamalar
		İl Özel İdaresi				23.697.870	30.513	23.667.357	23.194.866	23.052.717	97		
		Köy Yolları Yapımı				23.697.870	30.513	23.667.357	23.194.866	23.052.717	97		
		1. Kat Asfalt Kaplama (25,800 / 25,800 km)				750.002	0	750.002	750.000	750.000	100		
127	0000000-000	Kumrular - Müsellim Köyü 1. Kat Asfalt Kaplama (12 km)	GB	2022	2022	1	0	1	0	0	0	100	BT
128	0000000-000	Yeşilce - Ky.İlt. (Hamdibey) Köyü 1. Kat Asfalt Kaplama (11 km)	GB	2022	2022	1	0	1	0	0	0	100	BT
129	0000000-000	Soğucak - Sergen Köyü 1. Kat Asfalt Kaplama (2,800 km)	GB	2022	2022	750.000	0	750.000	750.000	750.000	100	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (3,450 / 3,450 km)				750.000	0	750.000	750.000	750.000	100		
130	0000000-000	K.eli Dereköy Köyü Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (0,750 km)	GB	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
131	0000000-000	K.eli Deveçatağı Köyü Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (0,750 km)	GB	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
132	0000000-000	K.eli Koyunbaba Köyü Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (0,750 km)	GB	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
133	0000000-000	Pınarhisar - Evciler Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (1,200 km)	GB	2022	2022	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100	100	BT
		Beton Kaplama (9 / 9 km)				1	0	1	0	0	0		
134	0000000-000	Lüleburgaz - Umurca - Sakızköy - Emirali Ky. BSK Kaplaması (9 km)	GB	2022	2022	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Parke Taşı Kaplaması (83.203 / 92.831 m2)				10.465.000	0	10.465.000	10.465.000	10.465.000	100		
135	0000000-000	K.eli Arızbaba Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
136	0000000-000	K.eli Asilbeyli Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
137	0000000-000	K.eli Bayramdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
138	0000000-000	K.eli Değirmencik Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.205 m²)	Öİ	2022	2022	115.000	0	115.000	115.000	115.000	100	100	BT
139	0000000-000	K.eli Dolhan Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
140	0000000-000	K.eli Düzorman Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
141	0000000-000	K.eli Erikler Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
142	0000000-000	K.eli Karadere Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
143	0000000-000	K.eli Karahamza Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
144	0000000-000	K.eli Kavakdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
145	0000000-000	K.eli Kayalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.257 m²)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
146	0000000-000	K.eli Kocahıdır Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
147	0000000-000	K.eli Koruköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
148	0000000-000	K.eli Paşayeri Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
149	0000000-000	K.eli Şükrüpaşa Köyü Parke Taşı Kaplaması (629 m²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
150	0000000-000	K.eli Ürünli Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
151	0000000-000	K.eli Yoğuntaş Köyü Parke Taşı Kaplaması (733 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
152	0000000-000	B.eski Çavuşköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
153	0000000-000	B.eski Çengerli Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
154	0000000-000	B.eski Çiğdemli Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
155	0000000-000	B.eski Dügüncülü Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
156	0000000-000	B.eski Erikleryurdu Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
157	0000000-000	B.eski Haznedar Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
158	0000000-000	B.eski Kadiköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
159	0000000-000	B.eski Karabayeri Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.311 m²)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
160	0000000-000	B.eski Karacaoğlan Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
161	0000000-000	B.eski Karamesutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.119 m²)	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
162	0000000-000	B.eski Katranca Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
163	0000000-000	B.eski Kuleli Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
164	0000000-000	B.eski Kumrular Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
165	0000000-000	B.eski Kuzuçardağı Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
166	0000000-000	B.eski Mutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
167	0000000-000	B.eski Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
168	0000000-000	B.eski Nacak Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
169	0000000-000	B.eski Nadrılı Köyü Parke Taşı Kaplaması (656 m²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
170	0000000-000	B.eski Oruçlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
171	0000000-000	B.eski Osmaniye Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
172	0000000-000	B.eski Pancarköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (546 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
173	0000000-000	B.eski Sinanlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.240 m²)	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
174	0000000-000	B.eski Sofuhalil Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.084 m²)	Öİ	2022	2022	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	BT
175	0000000-000	B.eski Taşgöl Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.311 m²)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
176	0000000-000	B.eski Taşköprü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.084 m²)	Öİ	2022	2022	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	BT
177	0000000-000	B.eski Terzili Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.084 m²)	Öİ	2022	2022	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	BT
178	0000000-000	B.eski Yeniköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. gerçek (%)	Fiziki gerçek (%)	Açıklamalar
179	0000000-000	B.eski Yenimahalle Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
180	0000000-000	D.köy Armutveren Köyü Parke Taşı Kaplaması (677 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
181	0000000-000	D.köy Beğendik Köyü Parke Taşı Kaplaması (871 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
182	0000000-000	D.köy Hamdibey Köyü Parke Taşı Kaplaması (774 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
183	0000000-000	D.köy İmanköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (774 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
184	0000000-000	D.köy Sivrilir Köyü Parke Taşı Kaplaması (871 m²)	Öİ	2022	2022	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
185	0000000-000	Koçgaz Aşağıkanara Köyü Parke Taşı Kaplaması (581 m²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
186	0000000-000	Koçgaz Beyci Köyü Parke Taşı Kaplaması (484 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
187	0000000-000	Koçgaz Malkoçlar Köyü Parke Taşı Kaplaması (871 m²)	Öİ	2022	2022	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
188	0000000-000	Koçgaz Tastepe Köyü Parke Taşı Kaplaması (387 m²)	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
189	0000000-000	Koçgaz Terzidere Köyü Parke Taşı Kaplaması (581 m²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
190	0000000-000	L.burgaz Akçağ Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
191	0000000-000	L.burgaz Alacaoğlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
192	0000000-000	L.burgaz Ayvalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
193	0000000-000	L.burgaz Celaliye Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
194	0000000-000	L.burgaz Ceylanköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (350 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
195	0000000-000	L.burgaz Çeşmekolu Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
196	0000000-000	L.burgaz Davutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
197	0000000-000	L.burgaz Düşüncübaşı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
198	0000000-000	L.burgaz Emirali Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
199	0000000-000	L.burgaz Ertuğrul Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
200	0000000-000	L.burgaz Hamzabey Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
201	0000000-000	L.burgaz Karaağaç Köyü Parke Taşı Kaplaması (908 m²)	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
202	0000000-000	L.burgaz Karamusul Köyü Parke Taşı Kaplaması (908 m²)	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
203	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli Köyü Parke Taşı Kaplaması (350 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
204	0000000-000	L.burgaz Kırıkköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (2.583 m²)	Öİ	2022	2022	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100	100	BT
205	0000000-000	L.burgaz Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
206	0000000-000	L.burgaz Oklağlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
207	0000000-000	L.burgaz Ovacak Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
208	0000000-000	L.burgaz Sakızköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
209	0000000-000	L.burgaz Sarıcaali Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
210	0000000-000	L.burgaz Seyitler Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.372 m²)	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
211	0000000-000	L.burgaz Tatar köy Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.467 m²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
212	0000000-000	L.burgaz Turgutbey Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
213	0000000-000	L.burgaz Umrurca Köyü Parke Taşı Kaplaması (350 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
214	0000000-000	L.burgaz Yenitaşı Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
215	0000000-000	P.köy Doğanca Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.619 m²)	Öİ	2022	2022	205.000	0	205.000	205.000	205.000	100	100	BT
216	0000000-000	P.köy İmampazarı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.514 m²)	Öİ	2022	2022	195.000	0	195.000	195.000	195.000	100	100	BT
217	0000000-000	P.köy Kuştepe Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.048 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
218	0000000-000	P.köy Yeşilova Köyü Parke Taşı Kaplaması (972 m²)	Öİ	2022	2022	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100	100	BT
219	0000000-000	P.köy Yeşilpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (903 m²)	Öİ	2022	2022	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	BT
220	0000000-000	P.hisar Akören Köyü Parke Taşı Kaplaması (492 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
221	0000000-000	P.hisar Sütlüce Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.048 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
222	0000000-000	Vize Akıncılar Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
223	0000000-000	Vize Akpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.006 m²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
224	0000000-000	Vize Aksicim Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
225	0000000-000	Vize Balkaya Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
226	0000000-000	Vize Develi Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
227	0000000-000	Vize Doğanca Köyü Parke Taşı Kaplaması (615 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
228	0000000-000	Vize Düzova Köyü Parke Taşı Kaplaması (604 m²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
229	0000000-000	Vize Evrenli Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
230	0000000-000	Vize Kışlacık Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
231	0000000-000	Vize Küçükyayla Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
232	0000000-000	Vize Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (503 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
233	0000000-000	Vize Pazarlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
234	0000000-000	Vize Topçuköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
Köprü, Menfez ve Sanat Yapıları						823.000	0	823.000	400.000	400.000	49		
235	0000000-000	K.eli Yoğuntaş Köyü Menfez Yapımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
236	0000000-000	B.eski Çengerli Menfez ve Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	0	0	0	0	DE

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
237	0000000-000	B.eski Kuzuçardğı Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	75.000	0	75.000	0	0	0	0	DE
238	0000000-000	B.eski Sofuhalil Köyü Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
239	0000000-000	B.eski Taşagül Menfez Yapımı	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	0	DE
240	0000000-000	B.eski Yenimahalle Köyü Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
241	0000000-000	Koçgaz Beyci Köyü Kapalı İzgara ve Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	28.000	0	28.000	0	0	0	0	DE
242	0000000-000	Koçgaz Devletiağaç Köyü Trapez Kanal ve İzgaralı Geçiş Yapımı	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
243	0000000-000	Koçgaz Kocayazı Köyü Bariyer Yapımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
244	0000000-000	Koçgaz Kocayazı Köyü Ahmetler Aynırı Bariyer Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
245	0000000-000	Koçgaz Tatlıpınar Köyü Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	0	0	0	0	DE
246	0000000-000	Koçgaz Yukarıkanara Yaya Geçidi Köprüsü Yapımı	Öİ	2021	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
Diğerleri						10.909.867	30.513	10.879.354	10.829.866	10.687.717	98		
247	0000000-000	Köy yolları Yapım, Bakım ve Onarımları	Öİ	2020	2022	10.151.130	0	10.151.130	10.151.130	10.151.130	100		DE
248	0000000-000	Araç Takip Sistemi Alımı	Öİ	2020	2022	80.000	30.513	49.487	0	0	0	0	DE
249	0000000-000	Yedek Parça Alımı	Öİ	2020	2022	1	0	1	0	0	0	0	HB
250	0000000-000	Hareketli İş Makinesi Alımı	Öİ	2022	2022	578.586	0	578.586	578.586	436.437	75		DE
251	0000000-000	Koçgaz Köy Yolları Çizgilerinin Çizilmesi ve Mezarlık Yollarının Düzenlenmesi	Öİ	2022	2022	100.150	0	100.150	100.150	100.150	100	100	BT
KÖYDES						12.976.511	0	12.976.511	12.183.997	12.183.997	94		
1. Kat Asfalt Kaplama (15,800 / 15,800 km)						6.241.485	0	6.241.485	5.480.088	5.480.088	88		
252	0000000-000	Dy.İlt. Paşayeri-Dolhan Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	957.253	0	957.253	540.230	540.230	56	100	BT
253	0000000-000	Kocahıdır - Arızbaba Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2022	2022	2.259.441	0	2.259.441	2.161.596	2.161.596	96	100	BT
254	0000000-000	Ky.İlt-Boztaş-Yığıtbaşı Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2022	2022	774.038	0	774.038	774.038	774.038	100	100	BT
255	0000000-000	Koçgaz Devletiağaç Köy içi 1. kat Asfalt Kaplama (0,800 km)	KP	2022	2022	300.000	0	300.000	270.000	270.000	90	100	BT
256	0000000-000	Dy.İlt.-Ayvalı Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	1.016.310	0	1.016.310	1.016.310	1.016.310	100	100	BT
257	0000000-000	Vize-Develi-Çavuşköy-Doğanca (Ky.İlt.) Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	934.444	0	934.444	717.914	717.914	77	100	BT
2. Kat Asfalt Kaplama (3 / 3 km)						1.115.020	0	1.115.020	1.002.520	1.002.520	90		
258	0000000-000	Dy. İlt. - Kocatarla Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	1.115.020	0	1.115.020	1.002.520	1.002.520	90	100	BT
Parke Taşı Kaplaması (5,748 / 7.516 m²)						1.912.705	0	1.912.705	475.454	475.454	25		
259	0000000-000	B.eski Çavuşköy Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (209 m2)	KP	2022	2022	40.000	0	40.000	38.981	38.981	97	100	BT
260	0000000-000	B.eski Haznedar Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (525 m2)	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0		DE
261	0000000-000	B.eski Karabayır Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (350 m2)	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0		DE
262	0000000-000	B.eski Katranca Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (525 m2)	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0		DE
263	0000000-000	B.eski Kuleli Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (280 m2)	KP	2022	2022	80.000	0	80.000	0	0	0		DE
264	0000000-000	B.eski Nadrılı Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (175 m2)	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0		DE
265	0000000-000	B.eski Nadrılı Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (209 m2)	KP	2022	2022	40.000	0	40.000	38.981	38.981	97	100	BT
266	0000000-000	B.eski Oruncu Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (175 m2)	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0		DE
267	0000000-000	B.eski Taşagül Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (306 m2)	KP	2022	2022	87.481	0	87.481	0	0	0		DE
268	0000000-000	B.eski Yeniköy Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (218 m2)	KP	2022	2022	41.535	0	41.535	40.392	40.392	97	100	BT
269	0000000-000	L.burgaz Çiftlikköy Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (328 m2)	KP	2022	2022	93.777	0	93.777	0	0	0		DE
270	0000000-000	L.burgaz Davutlu Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (443 m2)	KP	2022	2022	80.000	0	80.000	0	0	0		DE
271	0000000-000	L.burgaz Karaağaç Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (443 m2)	KP	2022	2022	126.670	0	126.670	113.709	113.709	90	100	BT
272	0000000-000	L.burgaz Müsellim Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (700 m2)	KP	2022	2022	90.000	0	90.000	0	0	0	0	İA
273	0000000-000	L.burgaz Oklağlı Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (355 m2)	KP	2022	2022	80.000	0	80.000	0	0	0		DE
274	0000000-000	L.burgaz Sarcaali Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (507 m2)	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0		DE
275	0000000-000	L.burgaz Tuğutbey Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (280 m2)	KP	2022	2022	126.670	0	126.670	113.709	113.709	90	100	BT
276	0000000-000	L.burgaz Tuğutbey Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (315 m2)	KP	2022	2022	129.902	0	129.902	129.682	129.682	100	100	BT
277	0000000-000	L.burgaz Yenitaşı Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (380 m2)	KP	2022	2022	126.670	0	126.670	0	0	0		DE
278	0000000-000	Vize Soğucak Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (350 m2)	KP	2022	2022	70.000	0	70.000	0	0	0		DE
279	0000000-000	Vize Topçuköy Köyü Köy İçi Parke Taş Yapımı (443 m2)	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0		DE
Menfez Yapımı (1 / 9 adet)						622.879	0	622.879	106.931	106.931	17		
280	0000000-000	B.eski Çengerli Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	0	0	0	0	0	###	0	İA
281	0000000-000	B.eski Ertuğral Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	0	0	0	0	0	###	0	İA
282	0000000-000	B.eski Oruncu Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	0	0	0	0	0	###	0	İA
283	0000000-000	B.eski Yenimahalle Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	0	0	0	0	0	###	0	İA
284	0000000-000	P.köy Akarca Trapez Kanal Yapımı ve Büz Döşenmesi	KP	2022	2022	77.583	0	77.583	56.991	56.991	73	100	BT
285	0000000-000	P.köy Hıdırcı Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	49.940	49.940	100	100	BT
286	0000000-000	P.hisar Hacıfaklı Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	36.245	0	36.245	0	0	0	0	İA
287	0000000-000	Vize Akıncılar Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	160.000	0	160.000	0	0	0		DE
288	0000000-000	Vize Serger Menfez Yapımı	KP	2022	2022	299.051	0	299.051	0	0	0		DE
Ortam Alım						3.084.422	0	3.084.422	4.260.736	4.260.736	138		
289	0000000-000	Yönetim Giderleri ve Ortak Alımlar	KP	2022	2022	3.084.422	0	3.084.422	4.260.736	4.260.736	138		DE

Proje sayısı: 2, Proje tutarı: 1.100.000, Önceki yıllar harcaması: 0, 2022 yılı harcaması: **1.100.000**

turizm

Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü

- İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Alan Düzenlemesi

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para salı (TL)	Fiziki işleme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Turizm				1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	
		Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü				1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	100	100	100	
294	00000000-000	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Mescit Yapımı	GB	2022	2022	354.350	0	354.350	354.350	354.350	100	100	100	BT
295	00000000-000	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Düzenleme Çalışmaları (Piknik masası ve çöp konteynırı alımı, yürüyüş platformu yapımı)	GB	2022	2022	745.650	0	745.650	745.650	745.650	100	100	100	BT



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

Proje sayısı: 1, Proje tutarı: 1.750.000, Önceki yıllar harcaması: 1.500.000, 2022 yılı harcaması: **250.000**

konut

Valilik

- Pınarhisar Kaymakam Evi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para salı (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Konut				1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100		
		Valilik				1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100		
296	0000000-000	P.hisar Kaymakamevi İnşaatı	GB	2021	2022	1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100		DE

Proje sayısı: 53, Proje tutarı: 644.447.486, Önceki yıllar harcaması: 65.476.039, 2022 yılı harcaması: **184.255.608**

eğitim

İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- **Anaokulu:** Babaeski, Lüleburgaz, Lüleburgaz Özel Eğitim
- **İlkokul:** Kırklareli
- **Ortaokul:** Kırklareli, Babaeski
- **Bilim Sanat Merkezi:** Kırklareli
- Bakım ve onarımlar

Mesleki ve Teknik Eğitim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- **Lise:** Kırklareli, Lüleburgaz, Vize
- **Spor Salonu:** Vize
- Bakım ve onarımlar

Yüksek Öğretim

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
- Muhtelif İşler
- Kampüs Altyapısı
- Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi İnşaatı
- Yayın Alımları

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

- Öğrenci Yurdu Bakım ve Onarımı

Kültür**İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü**

- Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı
- Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı
- Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadil ve Tefrişatı
- Eski Eser Restorasyonlarına Yardım
- Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım

İl Özel İdaresi

- Kırklareli Tarihi Gar Binası Röleve ve Restorasyonu
- Kırklareli Kocahıdır İlköğretim Okulu Röleve Restitüsyon ve Restorasyonu
- Kırklareli Yapraklı Mahallesindeki Taşınmazın Restitüsyon ve Restorasyonu
- Kırklareli İlim Yayma Cemiyeti Restorasyonu
- Babaeski Sinanlı Osmanlı Çeşmesi Onarımı
- Lüleburgaz Oklağlı Camii Bakım ve Onarımı
- Pınarhisar Kalesi ve Surları Koruma Planı Yapımı
- Pınarhisar Poyralı Cami Bakım ve Onarımı
- Vize Hükümet Konağı Röleve ve Restitüsyon Projesi

Beden Eğitimi ve Spor**Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**

- Kırklareli Spor Salonu Yapımı
- Kırklareli MY Spor Tesisleri Tenis Kortları Bakım ve Onarımı
- Kırklareli Hokey Sahası Tribün, Soyunma Odaları ve Aydınlatma Yapımı
- Kırklareli HS Kışlası Açık Spor Tesisleri Yapımı
- Kırklareli Armağan Spor Alanı Üzerinin Kapatılması
- Babaeski Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım ve Onarımı
- Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı (2000 seyircili)
- Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı
- Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım ve Onarımı
- Lüleburgaz Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım ve Onarımı
- Pınarhisar Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım ve Onarımı (Portatif Tribün + Soyunma Odası + Aydınlatma)
- Vize Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı (İhata Duvarı + Doğal Gaz Dönüşümü)

Babaeski TOBB Anaokulu

İlçesi: Babaeski, Karakteristiği: 6 derslik, Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2023, Proje tutarı: 7.832.000, Harcama: 120.549

Kırklareli Bademlik Mahallesi İlkokulu

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 16 derslik, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Proje tutarı: 25.300.000, Harcama: 7.508.715

Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İlçesi: Vize, Karakteristiği: 16 derslik ve atölye, Başlama ve bitiş tarihi: 2015 – 2022, Harcama: 31.881.553

Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 25 derslik, 20 laboratuvar ve 1 konferans salonu, 15.700 m2, Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2023, Proje tutarı: 48.500.000, Harcama: 42.888.387



Babaeski Anaokulu



Kırklareli Bademlik (Camikebir) Mahallesi İlkokulu



Vize Meslek ve Teknik Lisesi



Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi

Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: 2.555 m2, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2023, Proje tutarı: 11.600.000, Harcama: 10.093.150

Kırklareli Spor Salonu Yapımı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 2.000 kişilik, Başlama ve bitiş tarihi: 2015 – 2022 (Sözleşme tarihi: 29.09.2020, Bitiş tarihi: 11.02.2022), Proje tutarı: 38.775.240 (Sözleşme bedeli: 30.318.000 + KDV), Harcama: 20.115.711

Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: 2.000 kişilik, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Proje tutarı: 115.451.200, Harcama: 47.339.050

Lüleburgaz Yüzme Havuzu Yapımı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: Yarı olimpik, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Proje tutarı: 16.402.000, Harcama: 2.981.278



Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi




Kırklareli Spor Salonu



Lüleburgaz Spor Salonu



Lüleburgaz Yüzme Havuzu

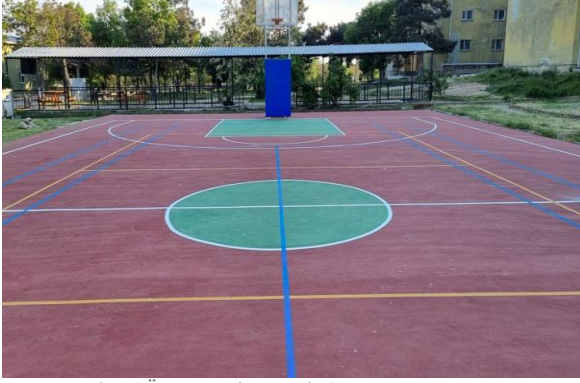

Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor Tesisi Yapım



Vali Mustafa Yaman Spor Tesisi Tenis Kortları Bakım ve Onarımı



Hokey Sahası



Pınarhisar Futbol Sahası

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	gerçekleşme (%)	gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Eğitim				644.447.486	65.476.039	253.402.291	199.088.868	184.255.608		73		
		İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				173.931.000	0	63.105.492	40.577.343	32.483.640		51		
		İl Millî Eğitim Müdürlüğü				173.931.000	0	63.105.492	40.577.343	32.483.640		51		
		Anaokulu İnşaatları (6 drs)				37.992.000	0	13.900.000	4.000.000	120.549		1		
297	0000000-000	B.eski TOBB Anaokulu İnşaatı (6 drs)	Öİ	2020	2023	7.832.000	0	6.500.000	4.000.000	120.549	2	10	DE	
298	0000000-000	L.burgaz Anaokulu İnşaatı (6 drs)	Öİ	2022	2023	7.832.000	0	5.000.000	0	0	0	0	PA	
299	0000000-000	L.burgaz Dere Mah. Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı (12 drs)	Öİ	2022	2023	22.328.000	0	2.400.000	0	0	0	0	PA	
		İlkokul İnşaatları (16 drs)				25.300.000	0	11.230.492	11.230.492	9.950.100		89		
300	0000000-000	K.eli Bademlik (Camikebir) Mah. İlkokulu Yapımı (16 drs)	Öİ	2021	2023	25.300.000	0	11.230.492	11.230.492	9.950.100	89	55	DE	
		Ortaokul İnşaatları (48 drs)				68.404.000	0	7.070.000	0	0		0		
301	0000000-000	K.eli İstiklal Ortaokulu İnşaatı (24 drs)	Öİ	2022	2023	40.700.000	0	4.070.000	0	0	0	0	İA	
302	0000000-000	B.eski Ortaokulu İnşaatı (24 drs)	Öİ	2022	2023	27.704.000	0	3.000.000	0	0	0	0	PA	
		Diğer Okul İnşaatları (8 derslik)				13.200.000	0	1.870.000	550.000	0		0		
303	2014H01-1567-67869	Kırklareli Bilim Sanat Merkezi İnşaatı (8 derslik)	GB	2017	2024	13.200.000	0	1.870.000	550.000	0	0	0	PA	
		Diğerleri				29.035.000	0	29.035.000	24.796.851	22.412.991		77		
304	0000000-000	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim Kurumları Bakım ve Onarımları	GB	2022	2022	29.035.000	0	29.035.000	24.796.851	22.412.991	77	100	BT	
		Mesleki ve Teknik Eğitim				173.036.553	14.767.931	51.861.338	35.054.022	28.479.466		55		
		İl Millî Eğitim Müdürlüğü				173.036.553	14.767.931	51.861.338	35.054.022	28.479.466		55		
		Lise İnşaatları (56 derslik)				160.881.553	14.732.531	39.706.338	22.899.022	17.231.150		43		
305	2010H02-373	K.eli OSB Mesleki ve Teknik Lise (16 derslik + 3 Atölye + Spor Salonu)	GB	2021	2024	55.200.000	0	5.520.000	0	0	0	0	PA	
306	2010H02-373-67440	Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı (24 derslik, 3 atölye, spor salonu)	GB	2015	2024	64.800.000	82.128	15.805.188	5.417.872	0	0	0	İA	
307	2010H02-373-67439	Vize Mesleki ve Teknik Lise İnşaatı (16 drs + Atölye)	GB	2015	2022	31.881.553	14.650.403	17.231.150	17.231.150	17.231.150	100	100	BT	
308	2014H05-822-66397	Vize Mesleki ve Teknik Lise Spor Salonu İnşaatı	GB	2018	2024	9.000.000	0	1.150.000	250.000	0	0	0	PA	
		Diğerleri				12.155.000	35.400	12.155.000	12.155.000	11.248.316		93		
309	0000000-000	Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Bakım ve Onarımları	GB	2022	2022	12.155.000	35.400	12.155.000	12.155.000	11.248.316	93	100	BT	
		Yüksek Öğretim				66.682.500	18.780.529	42.422.500	41.403.941	41.403.940		98		
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				66.060.000	18.780.529	41.800.000	41.038.778	41.038.777		98		
		Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				100.000	0	100.000	0	0		0		
310	2021H03-167527	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2021	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB	
		Muhtelif İşler				14.100.000	0	14.100.000	13.868.842	13.868.842		98		
311	2022H03-187588	Muhtelif Bakım ve Onarımlar	ÖB	2020	2022	1.250.000	0	1.250.000	1.212.441	1.212.441	97	100	BT	
312	2022H03-187588	Makine Teçhizat, Okul ve Büro Mefruşatı, Demirbaş, Bilgisayar, Yazılım ve Taşıt Alımı	ÖB	2022	2022	12.000.000	0	12.000.000	11.850.517	11.850.517	99	100	BT	
313	2022H03-187588	Rektörlük ve Bağlı Birimleri Mekanik ve Elektrik Bakım ve Onarımı	ÖB	2020	2022	750.000	0	750.000	733.987	733.987	98	100	BT	
314	0000000-000	Kesin Kabul Ödemeleri	ÖB	2022	2022	100.000	0	100.000	71.897	71.897	72	100	BT	
		Kampüs Altyapısı				1.760.000	759.096	1.000.000	965.846	965.845				
315	2020H03-151237	Kayalı Yerleşkesi Kampüs Girişinden Camiye Kadar Olan Hattın Peyzaj ve Aydınlatması	ÖB	2021	2022	1.000.000	759.096	240.000	214.979	214.978	90	100	BT	
316	2020H03-151237	Diğer Kampüs Altyapı Çalışmaları	ÖB	2020	2022	760.000	0	760.000	750.867	750.867	99	100	BT	
		Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı				48.800.000	18.021.433	25.300.000	25.144.618	25.144.618				
317	2009H03-1060	Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi İnşaatı (... derslik, 15.700 m2)	ÖB	2020	2023	48.500.000	18.021.433	25.000.000	24.866.954	24.866.954	99	68	DE	
318	0000000-000	Kesin Kabul Ödemeleri	ÖB	2022	2022	300.000	0	300.000	277.664	277.664	93	100	BT	
		Yayın Alımları				1.300.000	0	1.300.000	1.059.472	1.059.472		81		
319	2021H03-167531	Yayın Alımları	ÖB	2020	2022	1.300.000	0	1.300.000	1.059.472	1.059.472	81	100	BT	
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				622.500	0	622.500	365.163	365.163		59		
320	0000000-000	Kırklareli Tenis Kortu ve Erkek Öğrenci Yurdu Çatıları Bakım Onarımı	GB	2022	2022	622.500	0	622.500	365.163	365.163	59	100	BT	

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
		Kültür				32.084.792	11.121.383	18.298.916	16.765.715	16.600.715	91		
		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				13.324.356	93.692	11.724.356	11.463.813	11.298.813	96		
321	0000000-000	K.eli İl Halk Kütüphanesi Tefrişi	Öİ	2022	2022	321.355	0	321.355	321.355	321.355	100	100	BT
322	1976H04-53	L.burgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı (2.555 m2)	GB	2017	2023	11.600.000	93.692	10.000.000	9.999.458	9.999.458	100		DE
323	1976H04-53	Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı	GB	2022	2022	260.000	0	260.000	0	0	0	0	İA
324	1976H04-53	Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadilat ve Tefrişatı	GB	2021	2022	1.073.000	0	1.073.000	1.073.000	908.000	85	100	BT
325	0000000-000	Eski Eser Restorasyonlarına Yardım	GB	2021	2022	1	0	1	0	0	0	0	HB
326	0000000-000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım	GB	2021	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				18.760.436	11.027.691	6.574.560	5.301.902	5.301.902	81		
327	0000000-000	K.eli Tarihi Gar Binasının Röleve ve Restorasyon Projelerinin Uygulanması	DG	2020	2022	6.500.601	4.886.899	1.613.702	1.613.702	1.613.702	100		DE
328	0000000-000	K.eli Kocahıdır İlköğretim Okulu Röleve Restitüsyon ve Restorasyonu	Öİ	2020	2022	1.071.000	0	1	0	0	0		DE
329	0000000-000	K.eli Yapraklı Mahallesi'ndeki Taşınmazın Restitüsyon ve Restorasyonu	Öİ	2019	2022	8.389.728	5.818.445	2.571.283	2.571.283	2.571.283	100		DE
330	0000000-000	K.eli İlim Yayma Cemiyeti Restorasyonu	Öİ	2015	2022	876.136	79.149	796.987	0	0	0		DE
331	0000000-000	B.eski Sınanlı Osmanlı Çeşmesi Onarımı	Öİ	2018	2022	93.500	0	93.500	0	0	0	0	PA
332	0000000-000	L.burgaz Oklağı Camii Bakım ve Onarımı	DG	2018	2022	302.302	22.302	280.000	0	0	0	0	DE
333	0000000-000	Pınarhisar Kalesi ve Surları Koruma Planı Yapımı	DG	2020	2022	225.000	220.896	1	0	0	0		DE
334	0000000-000	Pınarhisar Poyralı Cami Bakım ve Onarımı	DG	2021	2022	102.169	0	102.169	0	0	0	0	HB
335	0000000-000	Vize Hükümet Konağı Röleve ve Restitüsyon Projesi	DG	2021	2022	1.200.000	0	1.116.917	1.116.917	1.116.917	100		DE
		Beden Eğitimi ve Spor				198.712.641	20.806.196	77.714.045	65.287.847	65.287.847	84		
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				198.712.641	20.806.196	77.714.045	65.287.847	65.287.847	84		
336	0000000-000	K.eli Spor Salonu Yapımı	GB	2015	2022	38.775.240	20.115.711	1	0	0	0	50	YK
337	0000000-000	K.eli MY Spor Tesisi Tenis Kortları Bakım ve Onarımı	GB	2021	2022	1.336.279	690.485	645.794	219.015	219.015	34	100	BT
338	0000000-000	K.eli Hokey Sahası Tribün, Soyunma Odaları ve Aydınlatma Yapımı	GB	2021	2022	3.919.685	0	3.919.685	3.919.685	3.919.685	100	100	BT
339	0000000-000	K.eli HS Kışlası Açık Spor Tesisleri Yapımı	GB	2021	2022	782.635	0	782.635	677.243	677.243	87	100	BT
340	0000000-000	K.eli Armağan Spor Alanı Üzerinin Kapatılması	DG	2021	2022	82.600	0	82.600	0	0	0	0	PA
341	0000000-000	B.eski Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım ve Onarımı	DG	2022	2022	3.023.658	0	3.023.658	3.023.658	3.023.658	100	100	BT
342	0000000-000	Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı (2000 seyircili)	DG	2021	2023	115.451.200	0	47.339.050	47.339.050	47.339.050	100	40	DE
343	0000000-000	Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı	DG	2021	2023	16.402.000	0	2.981.278	2.981.278	2.981.278	100	35	DE
344	0000000-000	Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım ve Onarımı	DG	2021	2022	8.260.000	0	8.260.000	0	0	0	0	PA
345	0000000-000	Lüleburgaz Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım ve Onarımı	DG	2022	2022	2.937.846	0	2.937.846	0	0	0	100	BT
346	0000000-000	P.hisar Çim Yüzeyli Futbol Sahası Bakım ve Onarımı (Çelik Tribün + Soyunma Odası + Aydınlatma)	DG	2021	2022	5.620.689	0	5.620.689	5.620.689	5.620.689	100	100	BT
347	0000000-000	P.hisar İlçe Müdürlüğü Tesisleri Doğal Gaz Dönüşümü	DG	2022	2022	600.620	0	600.620	0	0	0		DE
348	0000000-000	Vize Tesisleri Çevre İhata Duvarı ve Panel Çit Yapımı	DG	2021	2022	1.120.189	0	1.120.189	1.120.189	1.120.189	100	100	BT
349	0000000-000	Vize İlçe Müdürlüğü Tesisleri Doğal Gaz Dönüşümü	DG	2022	2022	400.000	0	400.000	387.040	387.040	97	100	BT

Proje sayısı: 18, Proje tutarı: 1.440.109.666, Önceki yıllar harcaması: 31.214.680, 2022 yılı harcaması: **100.374.943**

sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü

- Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)
- Kırklareli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) İnşaatı
- Babaeski Gaziosmanpaşa 112 ASHİ + 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)
- Babaeski Alpullu Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) + 112 ASHİ
- Demirköy İğneada Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) + 112 ASHİ
- Lüleburgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (SHB (B) + 8 AHB + 112 ASHİ (2 ad))
- Lüleburgaz 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)
- Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)
- Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) + 112 ASHİ
- Pınarhisar 112 ASHİ
- Kırklareli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ)
- Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü+ Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +SHM+112 ASHİ
- Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATipi) Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ
- Kırklareli Dolhan Sağlık Evi
- Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği
- Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi

Kırklareli Sağlık Kompleksi İnşaatı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ, Başlama ve bitiş tarihi: 2014 – 2023, Proje tutarı: 99.992.000, Harcama: 81.301.007

Lüleburgaz Sağlık Kompleksi İnşaatı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATipi) + Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ, Başlama ve bitiş tarihi: 2014 – 2022, Proje tutarı: 48.042.834, Harcama: 48.042.834



Kırklareli Sağlık Kompleksi



Lüleburgaz Sağlık Kompleksi



Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi



Pınarhisar 112 ASHİ



Kırklareli 6 Nolu Pınar Mah. Aile Sağlığı Merkezi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü				1.440.109.666	31.214.680	100.445.023	100.445.012	100.374.943	100		
		Hastane İnşaatları				1.125.000.000	0	1	0	0	0	0	
350	2018100-145138	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)	GB	2018	2025	1.125.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ İnşaatları				101.483.474	0	1.583.789	1.583.781	1.583.781	100		
351	2006100-823-133235	K.eli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) İnşaatı	GB	2014	2025	5.881.120	0	1.518.781	1.518.781	1.518.781	100	29	DE
352	2006100-823-133280	B.eski Gaziosmanpaşa 112 ASHİ + 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	GB	2016	2024	7.736.300	0	1	0	0	0	0	PA
353	2006100-823-133280	Babaeski Alpullu 3 Hekimli ASM + 112 ASHİ	GB	2021	2024	7.736.300	0	1	0	0	0	0	PA
354	20161001500	D.köy İğneada Aile Sağlığı Merkezi (2AHB) + 112 ASHİ	GB	2022	2025	5.850.000	0	1	0	0	0	0	İA
355	20161001500	Demirköy 112 ASHİ	GB	2022	2024	1.300.000	0	1	0	0	0	0	İA
356	2006100-166421-166448	L.burgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (SHB (B) + 8 AHB + 112 ASHİ (2 ad))	GB	2014	2024	53.651.000	0	65.000	65.000	65.000	100	0	PA
357	2006100-823-133235	L.burgaz 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)	GB	2018	2024	8.872.500	0	1	0	0	0	0	İA
358	0000000-000	L.burgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	DG	2021	2022	1	0	1	0	0	0	95	DE
359	20161001500	Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu	GB	2021	2025	9.750.000	0	1	0	0	0	0	HB
360	20161001500	P.hisar 112 ASHİ	GB	2016	2022	706.253	0	1	0	0	0	100	BT
		Diğer İnşaatlar				212.891.835	31.214.680	98.255.912	98.255.911	98.255.911	100		
361	2006100-166421-166445	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ)	GB	2014	2023	99.992.000	22.974.893	58.326.114	58.326.114	58.326.114	100	58	DE
362	0000000-000	K.eli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği (Toplum Sağlığı Merkezi Binasının Semt Polikliniğine Dönüştürülmesi)	GB	2021	2022	1	0	1	0	0	0	100	BT
363	2006100-166421-166451	Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü + Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + SHM + 112 ASHİ	GB	2016	2024	63.557.000	0	65.000	65.000	65.000	100	0	PA
364	20161001500	Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATİP) + Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ	GB	2014	2022	48.042.834	8.239.787	39.803.047	39.803.047	39.803.047	100	93	DE
365	2006100-823-133246	Kırklareli Dolhan Sağlık Evi	GB	2014	2024	1.300.000	0	61.750	61.750	61.750	100	0	PA
		Diğer				734.357	0	605.321	605.320	535.251	88		
366	0000000-000	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi	GB	2021	2022	129.037	0	1	0	0	0	100	BT
367	0000000-000	Sağlık Birimleri Büyük Onarımları	GB	2022	2022	605.320	0	605.320	605.320	535.251	88	100	BT

Proje sayısı: 10, Proje tutarı: 30.683.025, Önceki yıllar harcaması: 17.164.060, 2022 yılı harcaması: **12.602.332**

dkh iktisadi

Genel İdare

Valilik

- Demirköy Hükümet Konağı İnşaatı
- Hükümet Konakları Bakım Onarımı
- Doğal Afet Giderleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

- Hizmet Binası Bakım Onarımı

Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü

- Kırklareli Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaatı

Güvenlik Hizmetleri

Valilik

- Bulgaristan Sınır Bölgesine Enerji Hattı Çekilmesi

İl Emniyet Müdürlüğü

- Hizmet Binası ve Lojman Onarımları
- Malzeme Alımı ile Diğer Bakım ve Onarımlar

İl Özel İdaresi

- Okullara Kent Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması

Kırklareli Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaatı

İlçesi: Merkez, TOKİ tarafından yapılmaktadır.

Demirköy Hükümet Konağı İnşaatı

İlçesi: Demirköy, TOKİ tarafından yapılmaktadır.



Demirköy Hükümet konağı

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki inşaat (%)	Açıklamalar
		DKH İktisadi				30.683.025	17.164.060	13.518.965	12.993.144	12.602.332	93		
		Genel İdare				24.188.308	13.058.780	11.129.528	10.982.977	10.982.564	99		
		Valilik				23.788.308	13.058.780	10.729.528	10.582.977	10.582.977	99		
368	0000000-000	K.eli Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2019	2022	839.381	115.415	723.966	723.966	723.966	100	100	BT
369	0000000-000	Koçaz Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2022	2022	96.823	0	96.823	87.202	87.202	90	100	BT
370	0000000-000	L.burgaz Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2021	2022	116.601	0	116.601	0	0	0	0	DE
371	0000000-000	Vize Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2021	2022	20.329	0	20.329	0	0	0	0	DE
372	0000000-000	Doğal Afet Giderleri	GB	2018	2022	22.715.174	12.943.365	9.771.809	9.771.809	9.771.809	100	100	BT
		Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bakım ve Onarımı				400.000	0	400.000	400.000	399.587	100		
373	0000000-000	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bakım ve Onarımı	GB	2022	2022	400.000	0	400.000	400.000	399.587	100	100	BT
		Güvenlik Hizmetleri				6.494.717	4.105.280	2.389.437	2.010.167	1.619.768	68		
		Valilik				3.594.550	3.315.534	279.016	0	0	0		
374	0000000-000	Bulgaristan Sınır Bölgesine Enerji Hattı Çekilmesi	GB	2017	2022	3.594.550	3.315.534	279.016	0	0	0	0	DE
		İl Emniyet Müdürlüğü				2.010.167	0	2.010.167	2.010.167	1.619.768	81		
375	0000000-000	Hizmet Binası ve Lojman Onarımları	GB	2022	2022	668.024	0	668.024	668.024	659.030	99	100	BT
376	0000000-000	Malzeme Alımı ile Diğer Bakım ve Onarımlar	GB	2022	2022	1.342.143	0	1.342.143	1.342.143	960.738	72	100	BT
		İl Özel İdaresi				890.000	789.746	100.254	0	0	0		
377	0000000-000	Okullara Kent Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	Öİ	2018	2022	890.000	789.746	100.254	0	0	0	0	DE

Proje sayısı: 211, Proje tutarı: 1.231.087.146, Önceki yıllar harcaması: 156.746.528, 2022 yılı harcaması: **419.639.080**

dkh sosyal

İçmesuyu

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- İçmesuyu tesisleri: Kavaklı, Alpullu, İğneada, Ahmetbey, Evrensekiz, Pınarhisar
- İçmesuyu arıtma tesisleri: Alpullu, İğneada

İl Özel İdaresi

- Köy içmesuyu yapım bakım ve onarımları 90 köy

Kanalizasyon

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Kanalizasyon tesisleri: Alpullu, Ahmetbey, Pınarhisar
- Atıksu arıtma tesisleri: Çakıllı, Kıyıköy
- Yağmursuyu tesisleri: Ahmetbey, Pınarhisar

İl Özel İdaresi

- Köy kanalizasyonu yapım bakım ve onarımları 31 köy

Kırsal Alan Planlaması

İl Özel İdaresi

- Köy işleri

Belediye Hizmetleri

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Pınarhisar İtfaiye Binası ve Müştemilatı
- Pınarhisar Güneş Enerji Santrali

Şehirleşme

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- İmar planları: Babaeski, Ahmetbey

TOKİ Başkanlığı

- Kırklareli Millet Bahçesi
- Pınarhisar Millet Bahçesi

Kadastro Müdürlüğü

- Kadastro Güncelleme Çalışmaları
- Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

- Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Altyapı İnşaatı
- Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı
- Kırklareli Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi
- Lüleburgaz Büyükkarıştırır Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatı
- Lüleburgaz Büyükkarıştırır Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
- Lüleburgaz Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Altyapı (Kanalizasyon ve Yağmursuyu) İnşaatı

Teknolojik Araştırma

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

- Gıda Odak Alan İhtisaslaşma Projesi

Afetler

İl Özel İdaresi

- Acil Arama ve Kurtarma Hizmetleri

Sosyal İçerme

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

- Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası (Etüd - proje)
- Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m²)
- Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Büro Mefruşatı Alımı
- Kırklareli Huzurevi İhata Duvarı Yapımı ve Ek Bina Çatı Onarımı
- Kırklareli Huzurevi Röleve Projesi Hazırlanması
- Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Tefrişatı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

- Lüleburgaz Gençlik Merkezi Bakım ve Onarımı
- Pınarhisar Gençlik Merkezi Bakım ve Onarımı

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü**İçmesuyu İnşaatları**

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: İçmesuyu ve içmesuyu arıtma tesisi yapımı, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2023, Proje tutarı: 114.943.992, Harcama: 112.052.700

Kavaklı İçmesuyu İnşaatı **Bitti**
 Alpullu İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı **Bitti**
 İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
 Ahmetbey İçmesuyu İnşaatı **Bitti**
 Evrensekiz İçmesuyu İnşaatı **Bitti**
 Pınarhisar İçmesuyu İnşaatı

Kanalizasyon İnşaatları

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: Kanalizasyon ve kanalizasyon arıtma tesisi yapımı ve yağmursuyu inşaatı, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Proje tutarı: 123.978.838, Harcama: 112.453.442

Alpullu Kanalizasyon İnşaatı
 Ahmetbey Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı **Bitti**
 Pınarhisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı
 Çakıllı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
 Kıyıköy Kanalizasyonu Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

İl Özel İdaresi**Köy İçmesuları**

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: 81 köy, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 15.308.322, Harcama: 11.394.610
 İl Özel İdaresi: 39 köy, 2.669.247 / 3.557.927
 KÖYDES: 51 köy, 8.725.363 / 11.750.395

Köy Kanalizasyonları

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: 28 köy, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 4.530.316, Harcama: 4.038.941
 İl Özel İdaresi: 11 köy, 1.280.000 / 1.370.000
 KÖYDES: 20 köy, 2.758.941 / 3.160.316



Kavaklı su deposu



Çakıllı atıksu arıtma tesisi

Kırklareli Millet Bahçesi

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanları yapımı, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023

TOKİ tarafından yapılmaktadır. Yeşillikler içerisinde, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacaktır. Mevcut yeşil alan 3 kat arttıracaktır.

Pınarhisar Millet Bahçesi

İlçesi: Pınarhisar, TOKİ tarafından yapılmaktadır.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Altyapı İnşaatı

İlçesi: Merkez, Başlama ve bitiş tarihi: 2005 – 2022, Harcama: 141.803.966

Yolların altyapısı tamamlanarak betonla kaplanmış, dere ıslahı yapılmış, atık su arıtma tesisinin ek yapıları ile doğal gaz ve içme suyu tesisleri bitirilmiştir.

Son 3 yılda; Beton Yollar, Kuşaklama Kanalı, 2800m³/gün Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi, 8. Bulvar Peyzaj Düzenlemesi, Giriş Kapı Düzenlemesi, OSB Yönlendirme Projesi işleri yapılmış ve bitirilmiştir.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı

İlçesi: Merkez, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2023, Harcama: 163.431.520

OSB İlave Alan Yer Seçim ve İmar Planı yapılmış ve bitirilmiştir. Ayrıca, idari ve sosyal tesisler alanı tasarım projesi hazırlanmıştır.

Güvenlik Duvarı ve Çit Yapımı, İdari Bina Yapımı, Kreş Yapımı, Cami Yapımı, Rekreasyon Alanı Yapımı, Restoran ve Büfe Yapımı, İtfaiye, 112 Acil ve Jandarma Merkezi Yapımı, Elektrik ve Doğalgaz İşletme Binaları Yapımı, İlave Alan Altyapı Yapımı, GES, RES Fizibilite Çalışmaları devam etmektedir.



Kırklareli Millet Bahçesi





Pınarhisar Millet Bahçesi



Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi



Pınarhisar İtfaiye Binası



Pınarhisar güneş enerji santrali

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		DKH Sosyal İçmesuyu				1.231.087.146	156.746.528	445.715.219	422.643.542	419.639.080	94		
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				130.252.314	34.812.013	95.187.302	88.635.297	88.635.297	93		
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				114.943.992	34.812.013	80.031.979	77.240.687	77.240.687	97		
378	0000000-000	K.eli Kavaklı İçmesuyu İnşaatı	İB	2017	2022	3.597.727	1.562.703	2.035.024	2.034.558	2.034.558	100	100	BT
379	0000000-000	B.eski Alpullu İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2020	2022	10.604.252	8.747.940	1.856.312	1.845.134	1.845.134	99	100	BT
380	0000000-000	D.köy İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2019	2022	24.180.998	15.085.516	9.095.482	8.860.995	8.860.995	97	99	DE
381	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2023	30.500.000	6.000.000	24.500.000	24.000.000	24.000.000	98	100	BT
382	0000000-000	L.burgaz Evrensekiz İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2022	2.561.015	2.515.854	45.161	0	0	0	100	BT
383	0000000-000	Pınarhisar İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2023	43.500.000	900.000	42.500.000	40.500.000	40.500.000	95	89	DE
		İl Özel İdaresi				3.557.927	0	3.404.928	2.669.247	2.669.247	78		
		İçmesuyu (34 / 39 adet)				3.557.927	0	3.404.928	2.669.247	2.669.247	78		
384	0000000-000	K.eli Asilbeyli İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	Öİ	2022	2022	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	BT
385	0000000-000	K.eli Bayramdere İçmesuyu Su Pompası Güneş Paneli Kurulumu	Öİ	2022	2022	430.000	0	430.000	430.000	430.000	100	100	BT
386	0000000-000	K.eli Çayırılı İçmesuyu Kaptaj Yapımı (2 adet)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
387	0000000-000	K.eli Çukurpınar İçmesuyu Şebeke Hattı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
388	0000000-000	K.eli Dereköy İçmesuyu Kaptaj Yapımı ve Depo Bağlantısı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0		DE
389	0000000-000	K.eli Erikler İçmesuyu Vana Değişimi	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
390	0000000-000	K.eli Kadıköy İçmesuyu Boru Değişimi	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
391	0000000-000	K.eli Kapaklı İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
392	0000000-000	K.eli Karahamza İçmesuyu Çeşmeköy Sondaj ve Ana Depo Bağlantısı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
393	0000000-000	K.eli Karakoç İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
394	0000000-000	K.eli Karakoç İçmesuyu Güneş Enerji Sistemi Kurulumu	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
395	0000000-000	K.eli Yündolan İçmesuyu Kuyu Sondajı Elektrik Panosu Yapımı	Öİ	2022	2022	36.247	0	36.247	36.247	36.247	100	100	BT
396	0000000-000	B.eski Karacaoğlan İçmesuyu Su Tahliye Vanası Tamiri	Öİ	2022	2022	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
397	0000000-000	B.eski Katranca İçmesuyu Su Tahliye Vanası Tamiri	Öİ	2022	2022	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
398	0000000-000	B.eski Sinanlı İçmesuyu Su Tahliye Vanası Tamiri	Öİ	2022	2022	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
399	0000000-000	D.köy Avcılar - Boztaş İçmesuyu Su Deposu Yapımı	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
400	0000000-000	D.köy Beğendik İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2022	2022	295.000	0	295.000	295.000	295.000	100	100	BT
401	0000000-000	D.köy Hamdibey İçmesuyu Su Pompası Alımı	Öİ	2022	2022	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
402	0000000-000	D.köy Köy İçmesuları Bakım ve Onarımları	Öİ	2022	2022	90.680	0	90.680	0	0	0	0	HB
403	0000000-000	Kofçaz Karabalar İçmesuyu Arıtma Tesisi Yapımı	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
404	0000000-000	L.burgaz Ertuğrul İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
405	0000000-000	L.burgaz Karaağaç İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
406	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli İçmesuyu Sondaj Pompası Değişimi	Öİ	2022	2022	12.000	0	12.000	12.000	12.000	100	100	BT
407	0000000-000	L.burgaz Oklağlı İçmesuyu Sondaj Pompası Değişimi	Öİ	2022	2022	7.000	0	7.000	7.000	7.000	100	100	BT
408	0000000-000	L.burgaz Sakızköy İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
409	0000000-000	L.burgaz Köyleri İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
410	0000000-000	P.hisar Akören İçmesuyu Kaptaj yapımı	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
411	0000000-000	P.hisar Ataköy İçmesuyu İlave Su Deposu Yapımı	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
412	0000000-000	P.hisar Cevizköy İçmesuyu Güneş Enerji Sistemi Yapımı	Öİ	2022	2022	100.000	0	1	0	0	0	100	BT
413	0000000-000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2022	2022	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100	100	BT
414	0000000-000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
415	0000000-000	P.hisar Kurudere İçmesuyu Vana Alımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
416	0000000-000	P.hisar Kurudere İçmesuyu Su Tankeri Alımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
417	0000000-000	P.hisar Osmanlık İçmesuyu Su Deposu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
418	0000000-000	P.hisar Poyralı İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2022	2022	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100	100	BT
419	0000000-000	P.hisar Poyralı İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
420	0000000-000	P.hisar Sütüce İçmesuyu Kuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
421	0000000-000	Vize Hasbuğa İçmesuyu Motopompunun Değişimi	Öİ	2022	2022	17.000	0	17.000	17.000	17.000	100	100	BT
422	0000000-000	Vize Kışlacık İçmesuyu Kuyu Sondajı ve Bağlantısı	Öİ	2022	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	0	İA
423	0000000-000	Vize Sergen İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	0	0	0	0	İA
424	0000000-000	Vize Sergen İçmesuyu Su Borusu Alımı	Öİ	2022	2022	70.000	0	17.000	17.000	17.000	100	100	BT
KÖYDES (34 / 51)						11.750.395	0	11.750.395	8.725.363	8.725.363	74		
425	0000000-000	K.eli Çeşmeköy-Karahamza İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	750.000	0	750.000	0	0	0	0	İA
426	0000000-000	K.eli Demirchallı İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	160.000	0	160.000	210.002	210.002	131	100	BT
427	0000000-000	K.eli Kocayazı Grup III (Elmacık-Kadıköy) İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	810.000	0	810.000	810.000	810.000	100	100	BT
428	0000000-000	K.eli Koyunbaba İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	350.000	0	350.000	194.700	194.700	56	100	BT
429	0000000-000	K.eli Yündolan İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	144.432	144.432	96	100	BT
430	0000000-000	B.eski Çiğdemli İçmesuyu 100 m³.lük Betonarme Gömme İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	148.090	148.090	99	100	BT
431	0000000-000	B.eski Ertuğrul Grubu (Taşköprü-Ertuğrul) İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	156.138	156.138	78	100	BT
432	0000000-000	B.eski Kadıköy İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	171.690	171.690	86	100	BT
433	0000000-000	B.eski Kuleli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	312.700	312.700	78	100	BT
434	0000000-000	B.eski Müsellim İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Değişimi	KP	2022	2022	260.000	0	260.000	254.762	254.762	98	100	BT
435	0000000-000	B.eski Osmaniye İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	183.962	183.962	92	100	BT
436	0000000-000	B.eski Pancarköy İçmesuyu 150 m³.lük Betonarme Ayaklı İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	147.500	147.500	98	100	BT
437	0000000-000	B.eski Taşalı İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	312.700	312.700	78	100	BT
438	0000000-000	B.eski Yenimahalle İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	284.616	284.616	142	100	BT
439	0000000-000	D.köy Balaban İçmesuyu 50 m³.lük Biriktirme İçme Suyu Depo Yapımı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0		DE
440	0000000-000	D.köy Boztaş İçmesuyu 60 m³.lük İlave Betonarme İçme Suyu Depo Yapımı	KP	2022	2022	190.000	0	190.000	0	0	0		DE
441	0000000-000	D.köy Hamdibey İçmesuyu Enerji Nakil Hattı Yenilenmesi	KP	2022	2022	640.000	0	640.000	0	0	0	0	İA
442	0000000-000	D.köy Limanköy İçmesuyu Şebeke Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	140.234	0	140.234	124.295	124.295	89		DE
443	0000000-000	D.köy Sislioba İçmesuyu 50 m³.lük Betonarme Gömme İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	85.649	85.649	86	100	BT
444	0000000-000	D.köy Sislioba İçmesuyu Kaptaj ve İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	97.908	97.908	98	100	BT
445	0000000-000	Koçgaz Beyci İçmesuyu 2 Adet Maslak ve İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	286.666	0	286.666	281.312	281.312	98	100	BT
446	0000000-000	Koçgaz Kacayazı İçmesuyu Ortak Kaynak Terfi-İsale Hattı ve Biriktirme Depo Yapımı	KP	2022	2022	500.000	0	500.000	496.308	496.308	99	100	BT
447	0000000-000	Koçgaz Kocayazı Grup III (Elmacık-Kadıköy) İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	810.000	0	810.000	810.000	810.000	100	100	BT
448	0000000-000	L.burgaz Ayvalı İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	210.000	210.000	100	100	BT

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
449	0000000-000	L.burgaz Ayvalı İçmesuyu İlave Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	101.874	101.874	102	100	BT
450	0000000-000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Şebeke Boru Değişimi	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	72.458	72.458	145	100	BT
451	0000000-000	L.burgaz Çengelli İçmesuyu Sondaj Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	192.340	192.340	92		DE
452	0000000-000	L.burgaz Çengelli İçmesuyu Sondaj Terfi Hattı Yapımı	KP	2022	2022	160.000	0	160.000	153.400	153.400	96	100	BT
453	0000000-000	L.burgaz Çeşmekolu İçmesuyu Sondaj Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022		0				0	0	HB
454	0000000-000	L.burgaz Düğüncübaşı İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	60.000	0	60.000	59.000	59.000	98		DE
455	0000000-000	L.burgaz Karaağaç İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	99.710	99.710	100		DE
456	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	210.000	210.000	100	100	BT
457	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli İçmesuyu İlave Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	78.510	78.510	79	100	BT
458	0000000-000	L.burgaz Kırıkköy İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	210.000	210.000	100	100	BT
459	0000000-000	L.burgaz Kırıkköy İçmesuyu İlave Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	78.510	78.510	79	100	BT
460	0000000-000	L.burgaz Sarıcaalı İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	141.600	141.600	94	100	BT
461	0000000-000	L.burgaz Turgutbay İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	207.000	207.000	104	100	BT
462	0000000-000	P.köy Doğanca İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	37.567	37.567	75		DE
463	0000000-000	P.köy Yeşilova İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	40.920	40.920	82		DE
464	0000000-000	P.hisar Ataköy İçmesuyu 100 m³.lük İlave Betonarme İçme Suyu Depo Yapımı	KP	2022	2022	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
465	0000000-000	P.hisar Hacıfaklı - Çayirdere 50 m3 İçme Suyu Deposu ve Terfi Hattı Yapımı	KP	2022	2022	604.096	0	604.096	0	0	0	0	İA
466	0000000-000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Sondaj Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	277.699	0	277.699	416.540	416.540	150		DE
467	0000000-000	P.hisar Poyralı İçmesuyu Sondaj Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	277.699	0	277.699	234.348	234.348	84	100	BT
468	0000000-000	Vize Aksicim İçmesuyu Su Deposu Sinyalizasyon Sistemi Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0		DE
469	0000000-000	Vize Çavuşköy İçmesuyu 50 m³.lük Biriktirme Betonarme İçme Suyu Depo Yapım ve Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	310.000	0	310.000	301.991	301.991	97		DE
470	0000000-000	Vize Çövenli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	224.790	224.790	150	100	BT
471	0000000-000	Vize Çövenli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	320.000	0	320.000	0	0	0	100	BT
472	0000000-000	Vize Kışlacık İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	40.000	0	40.000	39.004	39.004	98		DE
473	0000000-000	Vize Kızılağaç İçmesuyu 100 m³.lük Gömme İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	60.000	0	60.000	59.060	59.060	98	100	BT
474	0000000-000	Vize Kömürköy İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	100	BT
475	0000000-000	Vize Kömürköy İçmesuyu Elektrik Trafosu Yenilemesi	KP	2022	2022	70.000	0	70.000	95.977	95.977	137		DE
476	0000000-000	Vize Köyleri İçmesuyu Boru Alımı	KP	2022	2022	144.000	0	144.000	144.000	144.000	100		DE

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklama
Kanalizasyon						128.509.154	14.254.903	111.256.298	102.237.480	102.237.480	92		
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						123.978.838	14.254.903	106.725.982	98.198.539	98.198.539	92		
477	0000000-000	B.eski Alpullu Kanalizasyon İnşaatı	İB	2021	2022	36.131.074	4.626.361	31.504.713	31.504.597	31.504.597	100	99	DE
478	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	İB	2021	2023	31.445.950	6.247.820	25.198.130	24.436.954	24.436.954	97	100	BT
479	0000000-000	P.hisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	İB	2021	2023	43.943.490	907.532	43.035.958	40.571.759	40.571.759	94	89	DE
480	0000000-000	Vize Çakıllı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2021	2022	4.408.101	2.473.190	1.934.911	1.685.229	1.685.229	87	95	DE
481	0000000-000	Vize Kiyıköy Kanalizasyonu Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2021	2023	8.050.223	0	5.052.270		0	0	0	YK
İl Özel İdaresi						1.370.000	0	1.370.000	1.280.000	1.280.000	93		
Kanalizasyon (10 / 11 adet)						1.370.000	0	1.370.000	1.280.000	1.280.000	93		
482	0000000-000	B.eski Nacak Kanalizasyonu Rögar Tamiri	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
483	0000000-000	D.köy Limanköy Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
484	0000000-000	D.köy Sarpdere Kanalizasyonu Doğal Arıtması	Öİ	2022	2022	140.000	0	140.000	140.000	140.000	100	100	BT
485	0000000-000	D.köy Köy Kanalizasyonları Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	90.000	0	90.000	0	0	0	0	DE
486	0000000-000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
487	0000000-000	L.burgaz Hamzabey Yağmursuyu Tahliye Hattı Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
488	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
489	0000000-000	L.burgaz Sakızköy Kanalizasyonu İlave	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
490	0000000-000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
491	0000000-000	P.hisar Kurudere Kanalizasyonu Arıtma Tesisi Yapımı	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
492	0000000-000	Vize Çövenli Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
KÖYDES (14 / 20)						3.160.316	0	3.160.316	2.758.941	2.758.941	87		
493	0000000-000	K.eli Geçitağzı Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	230.000	0	230.000	227.740	227.740	99	100	BT
494	0000000-000	K.eli Geçitağzı Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	99.120	99.120	99	100	BT
495	0000000-000	B.eski Çavuşköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	48.775	48.775	98	100	BT
496	0000000-000	B.eski Katranca Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	399.430	399.430	100	100	BT
497	0000000-000	B.eski Müsellim Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	51.049	51.049	102	100	BT
498	0000000-000	B.eski Nadirli Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	48.617	48.617	97	100	BT
499	0000000-000	B.eski Pancarköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	50.340	50.340	101	100	BT
500	0000000-000	D.köy Limanköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	48.521	48.521	97	100	BT
501	0000000-000	D.köy Sarpdere Kanalizasyonu Fosseptik ve İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	240.000	0	240.000	358.975	358.975	150	100	BT
502	0000000-000	L.burgaz Akçaköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	99.999	99.999	100	100	BT
503	0000000-000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	389.400	389.400	97		DE
504	0000000-000	L.burgaz Eskitaşlı Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	47.200	47.200	47	100	BT
505	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	300.000	0	300.000	299.720	299.720	100		DE
506	0000000-000	L.burgaz Tatarköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	95.000	95.000	95	100	BT
507	0000000-000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	300.000	0	300.000	295.000	295.000	98		DE
508	0000000-000	L.burgaz Yenibedir Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
509	0000000-000	P.köy Akarca Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	99.459	99.459	99	100	BT
510	0000000-000	P.köy Hidirca Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	290.316	0	290.316	100.596	100.596	35	100	BT
511	0000000-000	Vize Develi Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0		DE
512	0000000-000	Vize Kızılağaç Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0		DE

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Kırsal Alan Planlaması						6.999.554	290.748	6.708.806	6.444.344	5.971.836	89		
İl Özel İdaresi						6.999.554	290.748	6.708.806	6.444.344	5.971.836	89		
513	0000000-000	K.eli Karıncak Mezarlığı Duvarı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
514	0000000-000	K.eli Kavakdere Şehitlik Çamlığı Tel Çit Yapımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
515	0000000-000	K.eli Kocahıdır Güvenlik Kamerası Kurulumu	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
516	0000000-000	K.eli Köyleri WC Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
517	0000000-000	K.eli Yörükbayır Yağmur Suyu Tahliyesi	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
518	0000000-000	K.eli Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
519	0000000-000	K.eli Köyleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	85.000	0	85.000	85.000	85.000	100	100	BT
520	0000000-000	K.eli Köyleri Çöp Konteynır Alımı	Öİ	2022	2022	340.000	0	340.000	340.000	340.000	100	100	BT
521	0000000-000	Hali Hazır Harita Yapımı	Öİ	2019	2022	900.000	290.748	609.252	609.252	226.773	37		DE
522	0000000-000	B.eski Ağayeri Şehit Onbaşı Parkı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	0	0		DE
523	0000000-000	B.eski Oruçlu WC Yapımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
524	0000000-000	B.eski Köyleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı (7 köy)	Öİ	2022	2022	310.000	0	310.000	310.000	310.000	100	100	BT
525	0000000-000	B.eski Köyleri Mezarlık Çevresinin Duvar ve Çitle Çevrilmesi (3 köy)	Öİ	2022	2022	110.000	0	110.000	110.000	110.000	100	100	BT
526	0000000-000	B.eski Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı (5 köy)	Öİ	2022	2022	165.000	0	165.000	165.000	165.000	100	100	BT
527	0000000-000	B.eski Köyleri Cami Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	BT
528	0000000-000	B.eski Köyleri Oyun Parkı Yapımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
529	0000000-000	B.eski Köyleri Yangın Söndürme Tankeri Giderleri	Öİ	2022	2022	213.000	0	213.000	213.000	213.000	100	100	BT
530	0000000-000	D.köy Balaban İstinat Duvarı Yapımı	Öİ	2022	2022	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100	100	BT
531	0000000-000	D.köy Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı (6 köy)	Öİ	2022	2022	191.000	0	191.000	191.000	191.000	100	100	BT
532	0000000-000	D.köy Köyleri WC Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100	100	BT
533	0000000-000	D.köy Köyleri Çöp Konteynır Alımı	Öİ	2022	2022	232.000	0	232.000	232.000	232.000	100	100	BT
534	0000000-000	Koçgaz Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı (4 köy)	Öİ	2022	2022	82.000	0	82.000	82.000	82.000	100	100	BT
535	0000000-000	Koçgaz Köyleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı (8 köy)	Öİ	2022	2022	323.000	0	323.000	323.000	323.000	100	100	BT
536	0000000-000	Koçgaz Köyleri Damlama Sulama Boru Alımı	Öİ	2022	2022	48.600	0	48.600	48.600	48.600	100	100	BT
537	0000000-000	Koçgaz Köyleri Hayvan Sulumu Çeşmesi Yapımı (3 köy)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
538	0000000-000	L.burgaz Alacaoğlu Güneş Enerji Paneli Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
539	0000000-000	L.burgaz Çengerli Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
540	0000000-000	L.burgaz Hamzabey Yağmur Suyu Tesisi Tahliye Hatı Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
541	0000000-000	L.burgaz Köyleri WC Yapımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
542	0000000-000	L.burgaz Köylerine Çöp Konteynır Alımı	Öİ	2022	2022	282.000	0	282.000	282.000	282.000	100	100	BT
543	0000000-000	L.burgaz Köylerine Haşere İlaçlama Makinesi Alımı (25 adet)	Öİ	2022	2022	400.000	0	400.000	400.000	359.971	90	100	BT
544	0000000-000	P.köy Kumköy WC Bakım ve Onarımları	Öİ	2022	2022	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	BT
545	0000000-000	P.köy Köyleri Bakım ve Onarımları	Öİ	2022	2022	25.000	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
546	0000000-000	P.köy Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2022	2022	95.000	0	95.000	95.000	95.000	100	100	BT
547	0000000-000	P.hisar Ataköy Cami Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
548	0000000-000	P.hisar Osmançık Dükkanları Yapımının Tamamlanması	Öİ	2022	2022	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100	100	BT
549	0000000-000	P.hisar Tozaklı Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
550	0000000-000	P.hisar Tozaklı Yangın Tankeri Alımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
551	0000000-000	P.hisar Yenice Mesire Alanı Düzenlemesi	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
552	0000000-000	P.hisar Köyleri Sosyal Tesisleri Bakım ve Onarımı (7 köy)	Öİ	2022	2022	491.720	0	491.720	491.720	491.720	100	100	BT
553	0000000-000	P.hisar Köyleri Çocuk Parkı Yapımı (3 köy)	Öİ	2022	2022	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
554	0000000-000	P.hisar Köyleri WC Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2022	2022	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100	100	BT
555	0000000-000	Vize Aksicim İmam Lojmanı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
556	0000000-000	Vize Evrencik Kantar Yapımı	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
557	0000000-000	Vize Çavuşköy Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	17.500	0	17.500	17.500	17.500	100	100	BT
558	0000000-000	Vize Pazarlı ULV Cihazı Alımı	Öİ	2022	2022	17.500	0	17.500	17.500	17.500	100	100	BT
559	0000000-000	Vize Köylerine Su Tankeri Alımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
560	0000000-000	Vize Köylerine Çöp Konteynır Alımı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
561	0000000-000	Vize Köylerine Su Tankeri Alımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
562	0000000-000	Köylere Çöp Konteynır Alımı	Öİ	2022	2022	141.234	0	141.234	140.538	140.538	100		DE
563	0000000-000	Köylere Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Grubu Kurulumu	Öİ	2022	2022	275.000	0	275.000	11.234	11.234	4		DE

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Belediye Hizmetleri				15.511.691	500.000	8.236.001	3.238.447	3.238.447	39		
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				15.511.691	500.000	8.236.001	3.238.447	3.238.447	39		
564	0000000-000	Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Ön İşlem Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması	İB	2021	2022	236.000	0	236.000	18.472	18.472	8	10	DE
565	0000000-000	Pınarhisar İtfaiye Binası ve Müstemilatı Yapımı	İB	2021	2022	6.012.100	500.000	1	0	0	0	100	BT
566	0000000-000	Pınarhisar Güneş Enerji Santrali Yapımı	İB	2021	2022	9.263.591	0	8.000.000	3.219.975	3.219.975	40	36	DE
		Şehirci				897.883.878	106.888.864	208.214.285	208.044.010	206.374.222	99		
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				247.564	155.606	70.742	469	469	1		
567	0000000-000	B.eski İmar Planı	İB	2018	2023	141.482	70.741	70.741	469	469	1	50	YK
568	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey İmar Planı	İB	2017	2022	106.082	84.865	1	0	0	0	80	YK
		Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü				7.636.314	4.929.292	2.707.021	2.707.021	2.707.021	100		
569	2017K09-3825	Kırklareli 2. Grup Kadastro Güncellemesi (.... birim)	DS	2020	2022	3.355.012	2.985.531	369.480	369.480	369.480	100	100	BT
570	2008K09-958	Vize Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması	DS	2020	2022	1.997.798	1.943.761	54.037	54.037	54.037	100	100	BT
571	2008K09-958	Lüleburgaz Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması	DS	2021	2023	2.283.504	0	2.283.504	2.283.504	2.283.504	100	100	BT
		Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü				890.000.000	101.803.966	205.436.522	205.336.520	203.666.732	99		
572	0000000-000	Kırklareli Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi	DG	2021	2023	50.000.000	0	1.905.000	1.905.000	235.212	12	0	PA
573	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnş.	DG	2022	2023	210.000.000	0	163.431.520	163.431.520	163.431.520	100		DE
574	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2022	150.000.000	101.803.966	40.000.000	40.000.000	40.000.000	100	98	DE
575	2013C33-1916	L.burgaz Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatı	DG	2020	2023	175.000.000	0	100.000	0	0	0	0	YT
576	2013C33-1916	L.burgaz Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	DG	2020	2023	200.000.000	0	1	0	0	0	0	YT
577	2013C33-1916	L.burgaz Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Altyapı (Kanalizasyon ve Yağmursuyu) İnşaatı	DG	2020	2023	105.000.000	0	1	0	0	0	0	PA
		Teknolojik Araştırma				15.000.000	0	12.000.000	11.965.619	11.965.619	100		
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				15.000.000	0	12.000.000	11.965.619	11.965.619	100		
578	2021K12-169139	Gıda Odak Alan. İhtisaslaşma Projesi	ÖB	2021	2025	15.000.000	0	12.000.000	11.965.619	11.965.619	100		DE
		Afetler				630.521	0	630.521	234.584	234.584	37		
		İl Özel İdaresi				630.521	0	630.521	234.584	234.584	37		
579	0000000-000	Acil Arama ve Kurtarma Hizmetleri	Öİ	2022	2022	630.521	0	630.521	234.584	234.584	37	100	BT
		Sosyal İçerme				36.300.034	0	3.482.006	1.843.761	981.595	28		
		Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü				34.702.646	0	1.884.618	1.159.693	297.527	16		
580	2018K170390	K.eli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası (Etüd - proje)	GB	2018	2023	498.263	0	1	0	0	0	0	HB
581	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m²)	GB	2014	2023	33.000.000	0	680.234	0	0	0	0	HB
582	0000000-000	Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Büro Mefruşatı Alımı	GB	2022	2022	100.311	0	100.311	100.311	100.311	100	100	BT
583	0000000-000	Kırklareli Huzurevi İhata Duvarı Yapımı	GB	2022	2022	429.619	0	429.619	429.619	0	0	0	İA
584	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Ek Bina Çatı Onarımı	GB	2022	2022	216.213	0	216.213	216.213	0	0	100	BT
585	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Röleve Projesi Hazırlanması	GB	2022	2022	216.334	0	216.334	216.334	0	0	0	YT
586	0000000-000	Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Tefrişatı	GB	2022	2022	241.906	0	241.906	197.216	197.216	82		DE
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				1.597.388	0	1.597.388	684.068	684.068	43		
587	0000000-000	L.burgaz Gençlik Merkezi Bakım ve Onarımı	DG	2022	2022	913.320	0	913.320	0	0	0	90	DE
588	0000000-000	P.hisar Gençlik Merkezi Kenet Sistem Çatı Örtüsü Bakım ve Onarımı	DG	2022	2022	684.068	0	684.068	684.068	684.068	100	100	BT

Proje sayısı: 65, Proje tutarı: 273.691.808, Önceki yıllar harcaması: 123.243.489, 2022 yılı harcaması: **61.783.474**

belediyeler

Sıra no	Sektör	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
Toplam		65	273.691.808	123.243.489	108.538.230	61.783.474	61.783.474	57
1	Kırklareli	7	12.773.692	2.254.192	10.519.501	9.419.500	9.419.500	90
2	İnece	0	0	0	0	0	0	0
3	Kavaklı	0	0	0	0	0	0	0
4	Üsküp	4	2.818.229	0	2.818.229	1.999.134	1.999.134	71
5	Babaeski	2	2.309.880	0	2.309.880	2.270.714	2.270.714	98
6	Alpullu	1	3.013.620	0	3.013.620	2.020.160	2.020.160	67
7	Büyükmandıra	9	2.124.350	0	2.124.350	846.350	846.350	40
8	Karahalil	0	0	0	0	0	0	0
9	Demirköy	4	2.302.372	0	2.302.372	449.877	449.877	20
10	İğneada	0	0	0	0	0	0	0
11	Koçgaz	0	0	0	0	0	0	0
12	Lüleburgaz	18	193.545.652	120.955.413	56.372.556	31.159.070	31.159.070	55
13	Ahmetbey	2	3.246.190	33.884	3.212.306	3.112.706	3.112.706	97
14	Büyükkarıştıran	4	4.344.960	0	4.344.960	0	0	0
15	Evrensekiz	3	8.321.941	0	8.321.941	891.704	891.704	11
16	Pehlivan köy	5	16.956.000	0	3.098.304	0	0	0
17	Pınarhisar	2	18.212.337	0	6.622.211	6.622.210	6.622.210	100
18	Kaynarca	0	0	0	0	0	0	0
19	Vize	3	3.350.000	0	3.350.000	2.864.049	2.864.049	85
20	Çakıllı	0	0	0	0	0	0	0
21	Kıyıköy	1	372.585	0	128.000	128.000	128.000	100



Kırklareli



Kırklareli Sungurbey Caddesi



Üsküp yeşil alan düzenlemesi



Demirköy



Lüleburgaz



Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi



Lüleburgaz solar çamur kurutma tesisi



Büyükkarıştıran aydınlatma



Evrensekiz içmesuyu kuyusu açılması



Pehlivan köy yol yapımı



Pınarhisar Spor Kompleksi



Pınarhisar Seracılık ve Kuluçka Merkezi

						Önceki yıllar		2022 yılı		2022 yılında		Para		Fiziki	
Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	harcamaları (TL)	programı (TL)	ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	2022 yılı gerçekleşme (%)	2022 yılı gerçekleşme (%)	Açıklamalar		
Kırklareli						12.773.692	2.254.192	10.519.501	9.419.500	9.419.500	90				
		Ulaştırma				12.773.692	2.254.192	10.519.501	9.419.500	9.419.500	90				
1	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolları Asfalt Tamiri ve Hız Kesici Yapımı	BL	2021	2022	2.254.192		1	0	0	0	100	BT		
2	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolları Parke Taş Kaplaması	BL	2021	2022	761.679	0	761.679	761.679	761.679	100	100	BT		
3	0000000-000	K.eli Sungurbey Caddesi Dekortif Baskı Beton Kaldırım Yapılması	BL	2021	2022	336.000	0	336.000	336.000	336.000	100	100	BT		
4	0000000-000	K.eli Sungurbey Caddesi Aydınlatması	BL	2022	2022	403.000	0	403.000	403.000	403.000	100	100	BT		
5	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolları Asfalt Tamiri ve Hız Kesici Yapımı	BL	2022	2023	5.937.321	0	5.937.321	5.937.321	5.937.321	100	100	BT		
6	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolları Parke Taş Kaplaması ve Bordür Düzenlemesi	BL	2022	2023	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	25	DE		
7	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolları Aydınlatması (Aydınlatma direği ve ışıklı tabela alımı)	BL	2022	2022	1.981.500	0	1.981.500	1.981.500	1.981.500	100	100	BT		
Üsküp						2.818.229	0	2.818.229	1.999.134	1.999.134	71				
		Ulaştırma				1.212.922	0	1.212.922	1.095.664	1.095.664	90				
8	0000000-000	Üsküp Yol Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	1.212.922		1.212.922	1.095.664	1.095.664	90	100	BT		
		İçmesuyu				266.153	0	266.153	215.683	215.683	81				
9	0000000-000	Üsküp İçmesuyu Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	266.153		266.153	215.683	215.683	81	100	BT		
		Kanalizasyon				54.751	0	54.751	20.000	20.000	37				
10	0000000-000	Üsküp Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	54.751		54.751	20.000	20.000	37	100	BT		
		Diğerleri				1.284.403	0	1.284.403	667.787	667.787	52				
11	0000000-000	Üsküp Yapım ve Onarım İşleri	BL	2022	2022	1.284.403		1.284.403	667.787	667.787	52	100	BT		
Babaeski						2.309.880	0	2.309.880	2.270.714	2.270.714	98				
		Ulaştırma				1.663.600	0	1.663.600	1.624.434	1.624.434	98				
12	0000000-000	B.eski Şehiriçi Yolları Parke Taş Kaplaması	BL	2022	2022	1.663.600	0	1.663.600	1.624.434	1.624.434	98	100	BT		
		Diğerleri				646.280	0	646.280	646.280	646.280	100				
13	0000000-000	Babaeski Hayvan Barınağı Bina Yapımı	BL	2022	2022	646.280	0	646.280	646.280	646.280	100	100	BT		
Alpullu						3.013.620	0	3.013.620	2.020.160	2.020.160	67				
		Ulaştırma				3.013.620	0	3.013.620	2.020.160	2.020.160	67				
14	0000000-000	Alpullu Şehiriçi Yolları Parke Taş Kaplaması	BL	2022	2022	3.013.620	0	3.013.620	2.020.160	2.020.160	67	100	BT		
Büyükmandıra						2.124.350	0	2.124.350	846.350	846.350	40				
		Ulaştırma				300.000	0	300.000	300.000	300.000	100				
15	0000000-000	B.mandıra Şehiriçi Yol Yapımı ve Bakımı	BL	2022	2022	300.000	0	300.000	300.000	300.000	100	100	BT		
		Mekanik ve Taş Tozu Alımı													
		İçmesuyu				274.350	0	274.350	274.350	274.350	100				
16	0000000-000	B.mandıra İçmesuyu Kuyu Açılması	BL	2020	2022	274.350	0	274.350	274.350	274.350	100	100	BT		
		Kanalizasyon				50.000	0	50.000	0	0	0				
17	0000000-000	B.mandıra Kanalizasyon Şebekesi Yapımı	BL	2020	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB		
		Diğerleri				1.500.000	0	1.500.000	272.000	272.000	18				
18	0000000-000	B.mandıra Cenaze Aracı Alımı	BL	2020	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT		
19	0000000-000	B.mandıra Traktör Alımı	BL	2021	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	0	HB		
20	0000000-000	B.mandıra Çocuk Oyun Grubu Alımı	BL	2021	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	0	HB		
21	0000000-000	B.mandıra Çöp Konteyneri Alımı	BL	2021	2023	250.000	0	250.000	72.000	72.000	29		DE		
22	0000000-000	B.mandıra Kültür Parkı Kafeterya Binası Yapımı	BL	2021	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	0	HB		
23	0000000-000	B.mandıra Kültür Parkı Bakım ve Onarımı	BL	2021	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB		
Demirköy						2.302.372	0	2.302.372	449.877	449.877	20				
		Ulaştırma				45.872	0	45.872	45.872	45.872	100				
24	0000000-000	D.köy Şehiriçi Yol Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	45.872	0	45.872	45.872	45.872	100	100	BT		
		İçmesuyu				127.276	0	127.276	127.276	127.276	100				
25	0000000-000	D.köy İçme Suyu Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	127.276	0	127.276	127.276	127.276	100	100	BT		
		Kanalizasyon				46.729	0	46.729	46.729	46.729	100				
26	0000000-000	D.köy Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	46.729	0	46.729	46.729	46.729	100	100	BT		
		Diğerleri				2.082.495	0	2.082.495	230.000	230.000	11				
27	0000000-000	D.köy Bal Dolum Tesisi Yapımı	BL	2022	2022	2.082.495	0	2.082.495	230.000	230.000	11	90	DE		
Lüleburgaz						193.545.652	120.955.413	56.372.556	31.159.070	31.159.070	55				
		Ulaştırma				27.121.781	11.240.811	15.880.970	13.156.038	13.156.038	83				
28	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Yollar Asfalt Kapılma Yapımı	BL	2021	2022	20.596.781	10.596.781	10.000.000	9.351.663	9.351.663	94	99	DE		
29	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Yollar Pave Taş Yol Yapımı	BL	2020	2022	1.625.000	644.030	980.970	972.408	972.408	99	100	BT		
30	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Bozulan Yolların Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	50	DE		
31	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Yolların Çizgi Uygulaması	BL	2022	2022	1.100.000	0	1.100.000	1.060.850	1.060.850	96	98	DE		
32	0000000-000	L.burgaz Otopark Alanı Düzenlemesi	BL	2022	2022	1.800.000	0	1.800.000	1.771.117	1.771.117	98	100	BT		
		İçmesuyu				2.530.923	490.890	2.001.603	201.603	201.603	10				
33	0000000-000	L.burgaz İçmesuyu Su Abonelerinde Kullanılmak Üzere Akıllı Su Sayacı ve Mekaniz Su Sayacı Alımı	BL	2021	2022	2.329.320	490.890	1.800.000			0	0	35	DE	
34	0000000-000	L.burgaz İçme Suyu Hat Döşenmesi, Depo Hatlarının Birbiri ile Olan Bağlantılarının Yenilenmesi	BL	2022	2022	201.603	0	201.603	201.603	201.603	100	100	BT		

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Kanalizasyon				33.590.566	9.975.233	23.615.333	12.138.753	12.138.753	51		
35	0000000-000	L.burgaz Kanal Açma Hizmetleri	BL	2021	2024	32.609.944	9.609.944	23.000.000	11.543.617	11.543.617	50	30	DE
36	0000000-000	L.burgaz Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Çamurun Bertarafı	BL	2021	2022	465.289	365.289	100.000	79.803	79.803	80	99	DE
37	0000000-000	L.burgaz Kanalizasyon Tahliye Hattı Yapılması, Saha düzenlemesi ve Eski Bacaların İptal Edilerek Yeni Baca İmalatı Yapılması	BL	2022	2022	471.083	0	471.083	471.083	471.083	100	100	BT
38	0000000-000	L.burgaz Yağmur Suyu Hattı Bakım ve Onarımı (Araç Kiralama)	BL	2022	2022	44.250	0	44.250	44.250	44.250	100	100	BT
		Diğerleri				130.302.382	99.248.479	14.874.650	5.662.676	5.662.676	38		
39	0000000-000	Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi	BL	2016	2023	113.215.110	96.535.857	500.000	0	0	0	99	DE
40	0000000-000	L.burgaz Solar Çamur Kurutma Tesisi Yapımı	BL	2021	2023	8.540.222	2.540.222	6.000.000	339.633	339.633	6	70	DE
41	0000000-000	L.burgaz Okul Bakım ve Onarımları	BL	2021	2022	447.400	172.400	275.000	270.811	270.811	98	100	BT
42	0000000-000	L.burgaz Kent Ormanı Alan Düzenlemesi ve Kır Kahvesi Binası Yapımı	BL	2022	2023	5.000.000	0	5.000.000	3.589.281	3.589.281	72	99	DE
43	0000000-000	L.burgaz 8 Kasım Mahallesi Pazar Yeri Çevre Duvarı Yapımı	BL	2022	2022	300.000	0	300.000	248.738	248.738	83	100	BT
44	0000000-000	L.burgaz Açık Yüzme Havuzu Yapımı ve Süs Havuzu Bakım ve Onarımı	BL	2022	2023	1.500.000	0	1.500.000	481.921	481.921	32	50	DE
45	0000000-000	L.burgaz Evrensekiz Yolu Mezarlık Düzenlemesi	BL	2022	2023	1.299.650	0	1.299.650	732.292	732.292	56	95	DE
		Ahmetbey				3.246.190	33.884	3.212.306	3.112.706	3.112.706	97		
		Ulaştırma				3.246.190	33.884	3.212.306	3.112.706	3.112.706	97		
46	0000000-000	Ahmetbey Şehiriçi Stabilize Yol Yapımı	BL	2021	2022	228.977	33.884	195.093	95.493	95.493	49	100	BT
47	0000000-000	Ahmetbey Şehiriçi Tretuvar Düzenlemesi	BL	2022	2022	3.017.213	0	3.017.213	3.017.213	3.017.213	100	100	BT
		Büyükkarıştıran				4.344.960	0	4.344.960	0	0	0		
		Ulaştırma				2.972.620	0	2.972.620	0	0	0		
48	0000000-000	Büyükkarıştıran Şehiriçi Yol Yapımı (Kilit Taş, Prizma Taş, Bordür Taşı ve Yağmur Oluğu Alımı)	BL	2022	2022	1.551.700	0	1.551.700	0	0	0	100	BT
49	0000000-000	Büyükkarıştıran Şehiriçi Yol Yapımı (Taş Tozu, Mekanik Malzeme Alımı (5000ton-3000ton))	BL	2022	2022	1.109.600	0	1.109.600	0	0	0	100	BT
50	0000000-000	Büyükkarıştıran Şehiriçi Yol Yapımı (Dekoratif Aydınlatma Direği Alımı (10mt-140w))	BL	2022	2022	311.320	0	311.320	0	0	0	100	BT
		Diğerleri				1.372.340	0	1.372.340	0	0	0		
51	0000000-000	Küçükkarıştıran Çok Amaçlı Sundurma Yapım (306 m2)	BL	2022	2022	1.372.340	0	1.372.340	0	0	0	100	BT
		Evrensekiz				8.321.941	0	8.321.941	891.704	891.704	11		
		Ulaştırma				7.344.966	0	7.344.966	0	0	0		
52	0000000-000	Evrensekiz Şehiriçi Yolları Parke Taş Kaplaması ve Kaldırım Düzenlemesi	BL	2022	2023	7.344.966	0	7.344.966	0	0	0		DE
		İçmesuyu				417.979	0	417.979	417.979	417.979	100		
53	0000000-000	Evrensekiz İçmesuyu Kuyusu Sondajı	BL	2022	2022	417.979	0	417.979	417.979	417.979	100	100	BT
		Diğerleri				558.996	0	558.996	473.725	473.725	85		
54	0000000-000	Evrensekiz Belediye Binası Çatısının Yenilenmesi	BL	2022	2022	558.996	0	558.996	473.725	473.725	85	100	BT
		Pehlivanköy				16.956.000	0	3.098.304	0	0	0		
		Ulaştırma				8.456.000	0	3.098.302	0	0	0		
55	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Asfalt Kaplama Yapımı	BL	2022	2023	3.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
56	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Meydan Düzenlemesi	BL	2022	2023	1.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
57	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Kaldırım Düzenlemesi	BL	2022	2023	3.656.000	0	3.098.300	0	0	0		DE
		Diğerleri				8.500.000	0	2	0	0	0		
58	0000000-000	P.köy Kültür Merkezi Yapımı	BL	2022	2024	4.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
59	0000000-000	P.köy Küçük Sanayi Sitesi Yapımı	BL	2022	2024	4.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Pınarhisar				18.212.337	0	6.622.211	6.622.210	6.622.210	100		
		Diğerleri				18.212.337	0	6.622.211	6.622.210	6.622.210	100		
60	0000000-000	Pınarhisar Seracılık ve Kuluçka Merkezi	BL	2021	2022	8.752.037	0	1	0	0	0		DE
61	0000000-000	Pınarhisar Belediyesi Spor Kompleksi	BL	2021	2023	9.460.300	0	6.622.210	6.622.210	6.622.210	100	70	DE
		Vize				3.350.000	0	3.350.000	2.864.049	2.864.049	85		
		Ulaştırma				3.350.000	0	3.350.000	2.864.049	2.864.049	85		
62	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Parke Taş Yol Yapımı (6.550 m2 parke, 800 m bordür, 500 m oluk taşı, 1800 m2 50 x 50 x 8cm parke taş)	BL	2022	2022	1.500.000	0	1.500.000	1.248.322	1.248.322	83	100	BT
63	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Yol Yapımı (500 m3 hazır beton alımı)	BL	2022	2022	600.000	0	600.000	582.075	582.075	97	100	BT
64	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Asfalt Kaplama Yapımı (827 ton asfalt alımı)	BL	2022	2022	1.250.000	0	1.250.000	1.033.652	1.033.652	83	100	BT
		Kıyıköy				372.585	0	128.000	128.000	128.000	100		
		Ulaştırma				372.585	0	128.000	128.000	128.000	100		
65	0000000-000	Kıyıköy Şehiriçi Yollar Parke Taşı Yol Yapımı	BL	2021	2022	372.585	0	128.000	128.000	128.000	100	100	BT

