

KIRKLARELİ

2023 Kamu Yatırımları



kırkclareli

2023 kamu yatırımları

giriş

Proje sayısı: 540, Proje tutarı: 24.655.079.808

Önceki yıllar harcaması: 9.499.108.558, 2023 yılı harcaması: **4.786.401.322**

Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı

Sıra No	Sektör	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	540	24.655.079.808	9.499.108.558	5.882.866.592	4.804.813.227	4.786.401.332	81
1	Tarım	102	5.299.486.896	107.680.183	165.845.422	156.644.816	154.873.227	93
2	Madencilik	5	360.734.100	0	360.734.100	357.595.420	357.595.420	99
3	İmalat	2	384.500	0	384.500	384.500	384.500	100
4	Enerji	11	446.298.000	4.012.898	74.291.791	5.261.560	5.029.854	7
5	Ulaştırma	193	13.521.283.785	8.576.604.860	3.933.582.905	3.106.044.597	3.105.949.959	79
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	1	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.582.646	99
8	Konut	3	6.328.304	1.750.000	4.578.305	706.984	706.984	15
9	Eğitim	46	1.257.312.135	175.741.981	515.672.476	450.503.142	435.273.498	84
10	Sağlık	17	2.205.961.212	131.054.372	232.371.066	232.362.404	232.362.404	100
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	160	1.554.690.877	502.264.264	592.806.027	492.709.804	491.642.840	83
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	12	95.236.120	23.504.920	30.290.472	21.254.888	21.254.887	70
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	148	1.459.454.757	478.759.344	562.515.556	471.454.916	470.387.953	84

Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı

Sıra No	İlçe	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	540	24.655.079.808	9.499.108.558	5.882.866.592	4.804.813.227	4.786.401.332	81
1	Merkez	107	5.895.808.535	1.694.041.438	846.105.547	735.834.124	733.786.620	87
2	Babaeski	65	359.151.793	48.119.129	68.298.788	64.520.349	59.592.027	87
3	Demirköy	36	1.390.077.838	399.466.547	704.538.586	699.495.128	699.477.774	99
4	Koçgaz	32	1.453.141.374	9.632.787	9.839.458	8.403.703	8.403.703	85
5	Lüleburgaz	85	3.014.747.338	138.638.913	454.737.273	347.535.485	340.457.344	75
6	Pehlivanköy	15	2.617.047	0	2.568.347	2.145.081	2.145.081	84
7	Pınarhisar	30	287.995.443	100.589.700	80.639.020	75.479.657	75.469.739	94
8	Vize	59	187.798.011	9.574.969	87.687.815	77.691.055	77.682.428	89
9	Çoklu İlçeler	111	12.063.742.429	7.099.045.075	3.628.451.759	2.793.708.646	2.789.386.617	77

Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı

Sıra No	İlçe	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	540	24.655.079.808	9.499.108.558	5.882.866.592	4.804.813.227	4.786.401.332	81
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	8	5.965.079.399	2.792.592.484	2.170.537.001	2.059.855.656	2.059.855.656	95
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	38	5.249.897.106	106.176.339	103.148.472	103.148.445	101.474.995	98
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	18	326.691.023	164.478.498	139.343.567	126.811.249	126.811.249	91
4	TOKİ Başkanlığı	2	24.100.001	0	2	0	0	0
5	Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü	1	845.833	69.844	775.989	47.711	47.711	6
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	22	45.145.200	0	45.145.200	37.050.680	37.050.680	82
6	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	7	5.727.200	0	5.727.200	3.966.720	3.966.720	69
7	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	5	8.083.000	0	8.083.000	4.829.407	4.829.407	60
8	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	4	3.390.000	0	3.390.000	1.861.015	1.861.015	55
9	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	6	27.945.000	0	27.945.000	26.393.538	26.393.538	94
10	Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü	1	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.582.646	99
11	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	12	7.430.699.352	5.780.169.706	1.647.872.503	938.416.249	938.321.611	57
12	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	1	38.992.100	0	38.992.100	38.895.245	38.895.245	100
13	Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	1	1	0	1	0	0	0
14	TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü	11	446.298.000	4.012.898	74.291.791	5.261.560	5.029.854	7
15	TP Trakya Bölge Müdürlüğü	4	321.742.000	0	321.742.000	318.700.175	318.700.175	99
16	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	10	341.565.619	68.226.934	107.000.001	83.231.594	83.231.594	78
17	İl Özel İdaresi	223	144.604.863	18.577.821	124.398.947	117.623.310	117.515.559	94
18	Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	11	37.854.634	197.216	4.839.390	4.660.602	3.603.251	74
19	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	15	305.341.521	73.079.957	205.342.037	202.677.839	202.677.839	99
20	Valilik	5	82.325.345	24.465.174	16.419.444	16.282.512	16.282.512	99
21	İl Jandarma Komutanlığı	2	1.850.000	0	1.850.000	173.728	173.728	9
22	İl Emniyet Müdürlüğü	4	15.006.795	0	15.006.795	4.628.878	4.628.877	31
23	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	6	43.825.398	10.093.150	33.662.249	33.449.902	33.449.902	99
24	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	10	563.157.047	18.986.434	172.676.247	128.615.144	113.385.500	66
25	İl Sağlık Müdürlüğü	17	2.205.961.212	131.054.372	232.371.066	232.362.404	232.362.404	100
26	Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	5	958.683.457	305.258.519	370.251.938	304.624.803	304.624.803	82
27	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	21	63.312.565	235.212	16.896.511	13.312.565	13.312.565	79
28	Atatürk TSTMA Enstitüsü Müdürlüğü	14	2.624.750	1.434.000	826.754	826.750	826.750	100
29	Dereköy Gümrük Müdürlüğü	1	492.283	0	492.283	414.715	414.715	84
	KÖYDES	77	36.384.305	0	36.384.305	31.141.511	31.141.511	86

Proje Tutarı En Yüksek Sekiz Proje

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal. gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
1	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	7.414.164.586	5.776.664.586	1.637.500.000	929.792.001	929.792.001	57	86	DE
2	2019E04-208-134	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2026	2.237.000.000	1.243.018.738	610.871.000	610.871.000	610.871.000	100	83	DE
3	2018I00-145138	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)	GB	2018	2025	1.562.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
4	2016E04-208-274	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2026	1.462.808.000	1.171.743.156	203.329.933	133.211.120	133.211.120	66	95	DE
5	1977A010320	Lüleburgaz Lüleburgaz deresi 2. Kısım Taşkın Koruması	GB	2023	2025	1.270.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
6	2021E04-208-169	(Pınarhisar-Vize)Ayr. - Demirköy - İğneada Devlet Yolu Yapımı (9,3 km)	ÖB	2021	2026	1.197.000.000	374.522.490	638.057.999	638.057.999	638.057.999	100	69	DE
7	1977A010320	Koçgaz Kula 2 Göleti ve İletim Hattı (390.000 m3)	GB	2023	2026	650.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
8	2012E04-1560-2083	TEM Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Babaeski Kavşağı - Saray Kavşağı) Üstyapı İyileştirilmesi ve Büyük Onarımı (45 / 53 km)	ÖB	2022	2026	472.000.000	0	168.530.000	127.967.469	127.967.469	76	27	DE

En Çok Harcama Yapılan Sekiz Proje


Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal. gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
1	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	7.414.164.586	5.776.664.586	1.637.500.000	929.792.001	929.792.001	57	86	DE
2	2019E04-208-134	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2026	2.237.000.000	1.243.018.738	610.871.000	610.871.000	610.871.000	100	83	DE
3	2016E04-208-274	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2026	1.462.808.000	1.171.743.156	203.329.933	133.211.120	133.211.120	66	95	DE
4	2021E04-208-169	(Pınarhisar-Vize)Ayr. - Demirköy - İğneada Devlet Yolu Yapımı (9,3 km)	ÖB	2021	2026	1.197.000.000	374.522.490	638.057.999	638.057.999	638.057.999	100	69	DE
5	0000000-000	Kamulaştırmalar	ÖB	2023	2023	323.898.622	0	323.898.622	323.898.622	323.898.622	100	100	BT
6	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnş.	DG	2022	2024	303.683.457	163.431.520	140.251.937	140.251.937	140.251.937	100		DE
7	2006I00-166421-166445	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ)	GB	2014	2023	280.427.692	81.301.007	199.126.685	199.126.685	199.126.685	100	98	DE
8	0000000-000	Sondaj Yatırımları	KT	2023	2023	211.402.000	0	211.402.000	209.152.650	209.152.650	99	100	BT

Kamu Yatırımlarıyla İlgili Göstergeler

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nüfus (1)	351.684	356.050	360.860	361.836	361.737	366.363	369.347	
GSYH (TL) (1)	12.427.991.841	14.232.767.046	17.676.050.783	20.673.767.567	24.573.260.246	35.523.558.662	74.069.385.927	
GSYH (Zincirleme Hacim) (TL) (1)	7.638.055.182	7.908.220.014	8.330.797.080	8.557.334.751	8.931.438.947	9.907.509.230	9.806.607.905	
GSYH Zincirleme hacimdeki değişim (Büyüme) (yüzde) (1)	4,79	3,54	5,34	2,72	4,37	10,93	-1,02	
Kişi başına GSYH (dolar)	11.774	11.026	10.459	10.075	9.648	10.865	12.150	
Kamu yatırımları (TL)	302.895.315	395.160.059	357.673.589	569.857.849	698.475.047	1.143.219.557	3.131.012.394	4.786.401.332
Kamu yatırımlarının GSYH oranı (yüzde)	2,44	2,78	2,02	2,76	2,84	3,22	4,23	
Kişi başına kamu yatırımları (TL)	861	1.110	991	1.575	1.931	3.120	8.477	
Bütçe kamu giderleri (TL) (2)	956.452.000	1.051.216.000	1.302.243.000	1.727.618.000	2.187.175.000	2.590.654.000	4.717.173.195	9.581.621.178
Bütçe kamu giderlerinin GSYH oranı (yüzde)	7,70	7,39	7,37	8,36	8,90	7,29	6,37	
Kişi başına bütçe kamu giderleri (TL)	2.720	2.952	3.609	4.775	6.046	7.071	12.772	
Bütçe sermaye giderleri (TL) (2)	58.413.000	72.550.000	71.375.000	50.248.000	82.933.000	118.384.000	315.443.511	681.547.460
Sermaye giderlerinin kamu giderlerine oranı (yüzde)	6,11	6,90	5,48	2,91	3,79	4,57	6,69	7,11
Kişi başına bütçe sermaye giderleri (TL) (2)	166	204	198	139	229	323	854	

Kaynak: 1. TÜİK
2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

GSYH, Kamu Yatırımları, Bütçe Sermaye Giderleri ve Büyüme İlişkisi

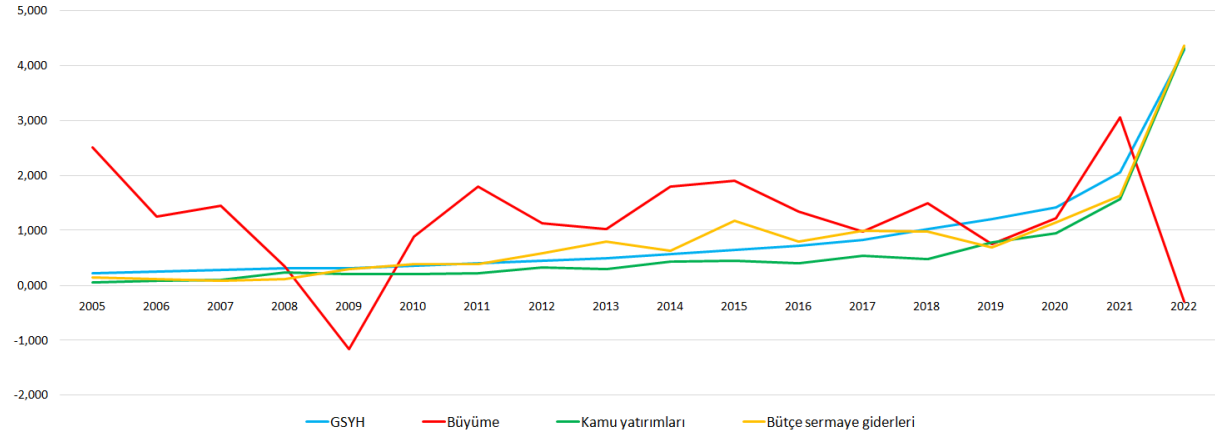

Grafik, gerçek değerlerin standart sapmaları hesaplanarak oluşturulmuştur.


Kamu Yatırımları

Cari fiyatlarla, TL

Yıllar	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Toplam	302.895.315	395.160.059	357.673.589	569.857.849	698.475.047	1.143.219.557	3.131.012.394	4.786.401.332
Tarım	67.863.708	64.324.290	61.101.815	24.686.766	11.519.102	26.856.305	60.024.797	154.873.227
Madencilik	39.770.164	45.005.183	5.897.128	65.363.732	76.524.241	167.289.452	439.715.534	357.595.420
İmalat	68.453	269.633	95.536	166.224	180.010	9.997	96.393	384.500
Enerji	51.655.354	71.789.800	93.229.161	102.168.912	3.392.122	26.006.149	54.968.694	5.029.854
Ulaştırma	27.360.509	55.802.903	64.823.649	196.669.628	485.375.597	712.922.043	1.828.556.491	3.105.949.959
Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0
Turizm	3.095.094	2.267.190	1.971.133	1.004.346	2.269.031	4.638.478	1.100.000	2.582.646
Konut	19.870	176.430	92.368	98.896	0	1.500.000	250.000	706.984
Eğitim	24.569.507	62.282.005	54.675.443	64.551.622	40.856.159	101.149.115	211.930.652	435.273.498
Sağlık	18.857.058	34.470.784	40.665.204	39.036.053	26.813.137	31.454.423	100.374.943	232.362.404
DKH Toplam	69.635.598	58.771.841	35.122.152	76.111.670	51.545.648	71.393.596	433.994.890	491.642.840
DKH İktisadi	9.666.087	29.269.710	4.760.027	12.233.299	2.705.881	9.123.131	12.602.332	21.254.887
DKH Sosyal	59.969.511	29.502.131	30.362.125	63.878.371	48.839.767	62.270.465	421.392.558	470.387.953

Kamu Yatırımları

Dolar

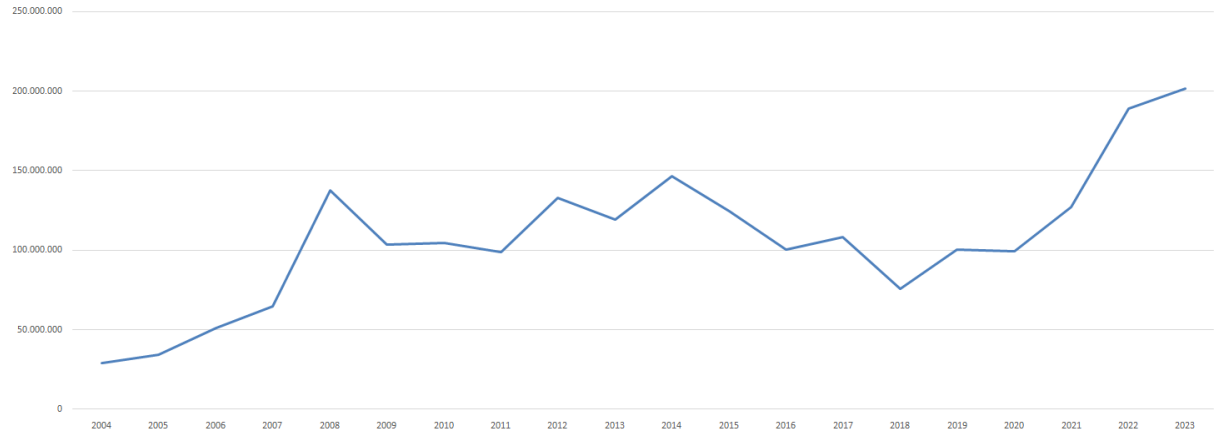

Kamu Yatırımları
Cari fiyatlarla

Yıllar	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Yılı ödeneği (TL)	Gelen ödenek (TL)	Harcama miktarı (TL)	Parasal gerçekleşme oranı (%)
2000	402	231.639.122	42.309.901	21.345.110	20.972.995	50
2001	356	275.417.450	52.291.665	44.115.661	43.713.823	84
2002	378	371.400.128	38.710.269	30.876.020	28.261.264	73
2003	296	415.841.247	42.353.633	31.159.119	29.322.428	69
2004	267	376.803.052	56.084.544	42.325.753	41.552.209	74
2005	278	446.659.556	82.001.431	50.033.006	46.298.552	56
2006	432	440.245.148	92.260.970	76.979.889	73.492.625	80
2007	512	727.614.735	104.493.438	85.996.915	83.801.785	80
2008	360	878.548.573	204.646.244	186.330.351	176.280.591	86
2009	312	966.022.862	205.380.876	169.168.883	160.210.094	78
2010	376	1.220.932.372	263.844.841	168.087.604	157.252.552	60
2011	448	1.349.708.528	285.594.635	189.049.030	165.828.636	58
2012	404	1.616.890.433	324.604.723	289.713.899	239.827.535	74
2013	578	1.896.065.762	340.219.866	255.941.281	226.594.170	67
2014	556	2.303.496.376	634.403.836	339.621.230	320.816.054	51
2015	677	2.075.219.551	510.837.524	468.072.981	337.192.257	66
2016	685	3.000.459.154	467.549.607	391.636.195	302.895.315	65
2017	723	2.996.153.329	491.324.551	404.546.932	395.160.059	80
2018	803	2.764.446.535	497.648.573	422.349.109	354.673.589	71
2019	595	3.367.461.467	741.051.338	676.788.774	569.857.849	77
2020	492	3.956.137.386	833.490.401	732.812.271	698.475.047	84
2021	489	5.603.883.665	1.352.059.769	1.174.830.578	1.143.219.557	85
2022	587	12.451.477.667	3.256.933.443	3.179.523.992	3.131.012.394	96
2023	540	24.655.079.808	5.882.866.592	4.804.813.227	4.786.401.332	81

KÖYDES ve BELDES Projeleri dahildir.
Belediye Yatırımlarını kapsamaz.

Yatırımların Dönemlere Göre Parasal Gerçekleşme Durumu
Yüzde

Yıllar	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2000		2					20		37			50
2001		6					43		78			84
2002		6					25		48			73
2003		8					24		44			69
2004		2					23		53			74
2005		4					15		30			56
2006		7					32		52			80
2007		11					38		57			80
2008		0		4				48				86
2009		3		13				56				78
2010		0		7				27			50	60
2011		6			10			27			53	58
2012		9			20			51			68	74
2013		3			15			36			64	67
2014		3			9			28				51
2015		17			29			46				66
2016		4			23			43				65
2017		16			27			52			58	80
2018		9			22			34				71
2019		17			30			46				77
2020		11		12	46							84
2021		22			39			66				85
2022		16			59			79				96
2023		19			41				64			81

tarım

Proje sayısı: 102, Proje tutarı: 5.299.486.896

Önceki yıllar harcaması: 107.680.183, 2023 yılı harcaması: **154.873.227**

Sulama

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

- **Su Depolama Tesisleri** (Erikler Göleti, Eriklice Göleti, Kadıköy Göleti, Sivrililer Göleti, Kofaz 2 Göleti, Elmacık 1 Göleti, Elmacık 2 Göleti, Kula 1 Göleti, Kula 2, Ahmetbey Göleti Yükseltmesi, Yenice Barajı) **11 adet (4'ü devam ediyor)**
- **Sulama Tesisleri** (Erikler, Eriklice, Kadıköy, Kızılcıkdere, Sivrililer, Kofaz 2, Elmacık 1, Elmacık 2, Kula 1, Kula 2, Ahmetbey, Yenice) **12 adet (4'i devam ediyor)**
- Taşkın Koruma Tesisleri

Bitkisel Üretim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Bitkisel üretimi geliştirme projeleri

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

- Araştırma projeleri (14 adet **3'ü bitti**)

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

- Arazi Toplulaştırma TİGH Projeleri

İl Özel İdaresi

- Bitkisel üretimi geliştirme projeleri

Hayvancılık

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Hayvancılığı geliştirme projeleri

İl Özel İdaresi

- HİS göletleri (Çeşmeköy, Aşağıkanara bitti, Kocayazı, Çeşmekolu) 4 adet 1'i bitti
- Hayvancılığı geliştirme projeleri

Ormancılık

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

- Orman Kadastro ve Tescili
- Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi
- Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı
- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele
- Orman Amenejman ve Orman Köyleri Etüdü
- Fidan Üretimi

Su Ürünleri

Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü

- İğneada Balıkçı Barınağı Etüd Proje İşleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Su ürünlerini geliştirme projeleri

Kırklareli Kızılcıkdere Sulaması

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: Sulama (14.220 dekar), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2025, Proje tutarı: 369.119.680, Harcama: 15.595.029, Fiziki gerçekleşme: yüzde 44

Kırklareli Eriklice Göleti ve Sulaması

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: Depolama (3.609.000 m³), Sulama (8.970dekar), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden yükseklik: 34,60 m, Depolama hacmi: 3,609 hm³, Gövde hacmi: 0,27 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 –2026, Proje tutarı: 385.000.000, Harcama: 0, Fiziki gerçekleşme: yüzde 0

Demirköy Sivrilere Göleti ve Sulaması

İlçesi: Demirköy, Karakteristiği: Depolama (390.000 m³), Sulama (1.220m³), İçmesuyu (90 m³), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden – talvegden yükseklik: 27,30 m/ 22,70 m, Depolama hacmi: 0,39 hm³, Gövde hacmi: 0,05 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2025, Proje tutarı: 46.950.243, Harcama: 927.701, Fiziki gerçekleşme: yüzde 19

Kırklareli Erikler Göleti ve Sulaması

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: Depolama (1.112.000 m³), Sulama (2.280 dekar), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden yükseklik: 33,35 m, Depolama hacmi: 1,11 hm³, Gövde hacmi: 0,21 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2026, Proje tutarı: 290.000.000, Harcama: 0, Fiziki gerçekleşme: yüzde 0

Kırklareli Kadıköy Göleti ve Sulaması

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: Depolama (1.930.000 m³), Sulama (4.180dekar), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden – talvegden yükseklik: 31,07 m / 27,48 m, Depolama hacmi: 1,93 hm³, Gövde hacmi: 0,14 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2025, Proje tutarı: 57.698.498, Harcama: 13.105.734, Fiziki gerçekleşme: yüzde 41

Kofçaz 2 Göleti ve Sulaması

İlçesi: Kofçaz, Karakteristiği: Depolama (860.000 m³), Sulama (2.170m³), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden – talvegden yükseklik: 31,70 m/ 26,80 m, Depolama hacmi: 0,86 hm³, Gövde hacmi: 0,13 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2024, Proje tutarı: 33.859.663 (78.542.956), Harcama: 14.098.524 (54.316.082), Fiziki gerçekleşme: yüzde 78

Kofçaz Elmacık 1 Göleti ve Sulaması

İlçesi: Kofçaz, Karakteristiği: Depolama (500.000 m³), Sulama (1.110dekar), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden yükseklik: 30,65 m, Depolama hacmi: 0,50 hm³, Gövde hacmi: 0,25 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2026, Proje tutarı: 202.000.000, Harcama: 0, Fiziki gerçekleşme: yüzde 0

Kofçaz Kula 1 Göleti, Sulaması ve İletim Hattı

İlçesi: Kofçaz, Karakteristiği: Depolama (1.720.000 m³), Sulama (2.040 dekar), İçmesuyu (10.810m³), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden yükseklik: 25,50 m, Depolama hacmi: 1,72 hm³, Gövde hacmi: 0,05 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2027, Proje tutarı: 450.000.000, Harcama: 0, Fiziki gerçekleşme: yüzde 0

Lüleburgaz Ahmetbey Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: Depolama (12.520.000 m³), Sulama (2.700m³), İçmesuyu (10.340.000 m³), Gövde tipi: Homojen dolgu, Temelden – talvegden yükseklik: 25,50 m / 23,00 m, Depolama hacmi: 12,52 hm³, Gövde hacmi: 0,68 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2025, Proje tutarı: 161.904.675 (216.099.343), Harcama: 32.081.169 (75.259.103), Fiziki gerçekleşme: yüzde 41

Kofçaz Elmacık 2 Göleti ve Sulaması

İlçesi: Kofçaz, Karakteristiği: Depolama (410.000 m³), Sulama (970dekar), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden yükseklik: 27,50 m, Depolama hacmi: 0,41 hm³, Gövde hacmi: 0,13 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2026, Proje tutarı: 111.750.000, Harcama: 0, Fiziki gerçekleşme: yüzde 0

Kofçaz Kula 2 Göleti ve İletim Hattı

İlçesi: Kofçaz, Karakteristiği: Depolama (387.000 m³), İçmesuyu (13.270m³), Gövde tipi: Kil çekirdekli kaya dolgu, Temelden yükseklik: 17,50 m, Depolama hacmi: 0,39 hm³, Gövde hacmi: 0,05 hm³, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2026, Proje tutarı: 650.000.000, Harcama: 0, Fiziki gerçekleşme: yüzde 0

Pınarhisar Yenice Barajı ve Sulaması

İlçesi: Pınarhisar, Karakteristiği: Depolama (3.800.000 m³), Sulama (14.070 dekar), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2025, Proje tutarı: 97.755.270, Harcama: 40.133.232, Fiziki gerçekleşme: yüzde 74
Sulama hattının toplam uzunluğu 38 500 metredir.



Kırklareli Kadıköy Göleti



Demirköy Sivrililer Göleti




Kofçaz 2 Göleti



Lüleburgaz Ahmetbey Göleti




Pınarhisar Yenice Barajı

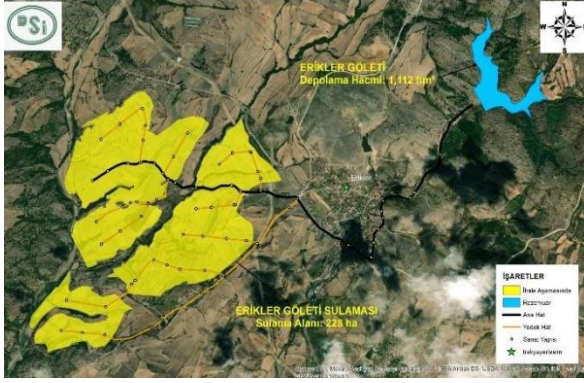


Kırklareli Erikler Göleti



Kırklareli Eriklice Göleti

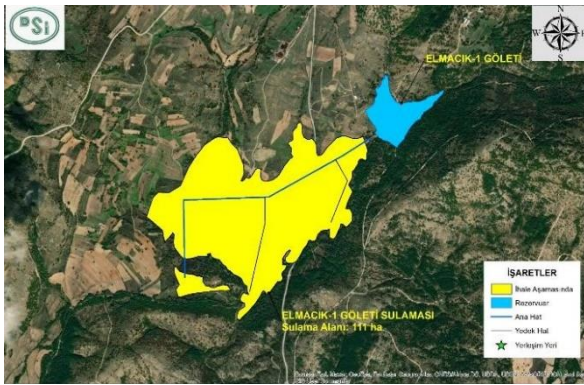

Kofçaz Elmacık 1 Göleti

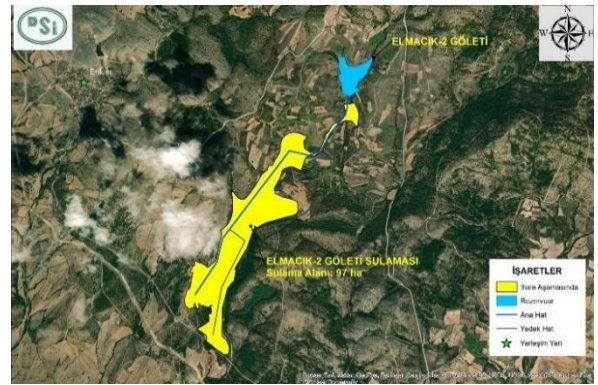

Kofçaz Elmacık 2 Göleti



Kofçaz Kula 1 Göleti



Kofçaz Kula 2 Göleti





Vize Müsellim HİS Göleti



Vize Pazarlı HİS Göleti

Meraya çıkan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar ile yaban hayatın can suyu olan Vize Müsellim ve Pazarlı hayvan içme suyu göletlerinin temizliği yapılmıştır.



Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı gerçekleştirilen harcamaları (TL)	Para salı (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
						5.299.486.896	107.680.183	165.845.422	156.644.816	154.873.227	93		
						4.801.873.921	71.902.978	64.270.678	64.270.256	62.596.806	97		
						4.801.773.921	71.902.978	64.170.678	64.170.653	62.497.203	97		
						370.249.525	16.102.244	2	0	0	0		
1	1984A01-94	K.eli Kızılıkdere Sulaması İkmalî (14.220 dekar)	GB	2016	2025	369.119.680	15.595.029	1	0	0	0	44	DE
2	1984A01-94	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı İlavesi	GB	2013	2023	1.129.845	507.215	1	0	0	0	0	DE
						2.486.918.349	48.250.389	53.096.291	53.096.280	52.095.971	98		
3	0000000-000	K.eli Erikler Göleti (1.110.000 m3)	GB	2023	2026	240.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
4	0000000-000	K.eli Erikler Göleti Sulaması (2.280 dekar)	GB	2023	2026	50.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
5	0000000-000	K.eli Eriklice Göleti (3.610.000 m3)	GB	2022	2026	185.000.000	0	999.999	999.999	0	0	0	İA
6	0000000-000	K.eli Eriklice Göleti Sulaması (8.970 dekar)	GB	2022	2025	200.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
7	1977A010320	K.eli Kadıköy Göleti ve Sulaması (1.930.000 m3, 4.180 dekar)	GB	2016	2025	57.698.498	4.105.921	8.999.814	8.999.814	8.999.813	100	41	DE
8	1977A010320	D.köy Sivrilir Göleti ve Sulaması (390.000 m3, 1.220 dekar)	GB	2016	2025	46.950.243	927.701	1	0	0	0	19	DE
9	1977A010320	Koçgaz 2 Göleti ve Sulaması (860.000 m3, 2.170 dekar)	GB	2016	2024	33.859.663	9.632.787	4.465.737	4.465.737	4.465.737	100	78	DE
10	1977A010320	Koçgaz Elmacık 1 Göleti (500.000 m3)	GB	2023	2026	145.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
11	1977A010320	Koçgaz Elmacık 1 Göleti Sulaması (1.110 dekar)	GB	2023	2025	57.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
12	1977A010320	Koçgaz Elmacık 2 Göleti (410.000 m3)	GB	2023	2026	84.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
13	1977A010320	Koçgaz Elmacık 2 Göleti Sulaması (970 dekar)	GB	2023	2026	27.750.000	0	1	0	0	0	0	HB
14	1977A010320	Koçgaz Kula 1 Göleti Sulaması (2.040 dekar)	GB	2023	2027	50.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
15	1977A010320	Koçgaz Kula 1 Göleti ve İletim Hattı (1.720.000 m3)	GB	2023	2025	400.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
16	1977A010320	Koçgaz Kula 2 Göleti ve İletim Hattı (390.000 m3)	GB	2023	2026	650.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
17	1977A010320	L.burgaz Ahmetbey Göleti Yükseltilmesi ve Sulaması (12.520.000 m3, 2.700 dekar)	GB	2016	2025	161.904.675	21.064.442	11.016.730	11.016.730	11.016.727	100	41	DE
18	2016A01-149838	P.hisar Yenice Barajı ve Sulaması (3.800.000 m3, 14.070 dekar)	GB	2016	2025	97.755.270	12.519.538	27.614.000	27.614.000	27.613.694	100	74	DE
						1.931.531.559	7.550.345	1.999.896	1.999.885	1.999.885	100		
19	0000000-000	K.eli Bağlıca Deresi Taşkın Koruması 1. Kısım	GB	2022	2024	20.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
20	0000000-000	K.eli Üsküp Yabanıkavak Deresi Taşkın Koruması	GB	2023	2024	45.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
21	1977A010320	K.eli Dolhan Köyü Deresi Taşkın Koruması	GB	2021	2024	40.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
22	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahallı (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2023	45.817.569	7.550.345	1	0	0	0	80	DE
23	0000000-000	B.eski Pekmezdere Taşkın Koruması 1. Kısım	GB	2022	2024	45.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
24	1977A010320	B.eski Yenimahalle Ana Dere Taşkın Koruması	GB	2021	2024	10.385.200	0	1.999.885	1.999.885	1.999.885	100	70	DE
25	1977A010320	Lüleburgaz Lüleburgaz Deresi 1. Kısım Taşkın Koruması	GB	2016	2025	239.465.790	0	1	0	0	0	0	DE
26	1977A010320	Lüleburgaz Lüleburgaz deresi 2. Kısım Taşkın Koruması	GB	2023	2025	1.270.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
27	1977A010320	Lüleburgaz Hamitabat Kaynar Deresi Taşkın Koruması	GB	2023	2025	99.298.000	0	1	0	0	0	0	İA
28	0000000-000	P.hisar Çayırdere Taşkın Koruması	GB	2022	2024	26.565.000	0	1	0	0	0	0	DE
29	0000000-000	Vize Kömürköy Köyü Deresi Taşkın Koruması	GB	2023	2024	40.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
30	2000A010060	Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları	GB	2023	2024	50.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
						13.074.488	0	9.074.489	9.074.488	8.401.347	93		
31	0000000-000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	2023	2023	900.000	0	900.000	900.000	226.874	25	100	BT
32	1985A010020	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2023	2023	4.324.981	0	4.324.981	4.324.981	4.324.972	100	100	BT
33	1987A010510	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2023	2023	3.849.507	0	3.849.507	3.849.507	3.849.501	100	100	BT
34	1977A010390	DSİ 112. Şube Müdürlüğü Hizmet Binaları İklimlendirme Sistemleri	GB	2023	2024	4.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
						100.000	0	100.000	99.603	99.603	100		
						100.000	0	100.000	99.603	99.603	100		
35	0000000-000	Sulama Göleti Bakım ve Onarımları	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	99.603	99.603	100	100	BT
						448.046.493	35.707.361	52.103.105	51.753.060	51.752.921	99		
						11.097.616	0	11.097.616	11.097.616	11.097.616	100		
36	0000000-000	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	GB	2023	2023	237.763	0	237.763	237.763	237.763	100	100	BT
37	0000000-000	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	GB	2023	2023	70.718	0	70.718	70.718	70.718	100	100	BT
38	0000000-000	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2023	2023	166.925	0	166.925	166.925	166.925	100	100	BT
39	0000000-000	Bitkisel Üretim Karantina Hizmetleri	GB	2023	2023	92.289	0	92.289	92.289	92.289	100	100	BT
40	0000000-000	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	GB	2023	2023	35.862	0	35.862	35.862	35.862	100	100	BT
41	0000000-000	Çayır, Mera Islahı ve Amenejman Projesi	GB	2023	2023	1.451.519	0	1.451.519	1.451.519	1.451.519	100	100	BT
42	0000000-000	Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi	GB	2023	2023	3.257.021	0	3.257.021	3.257.021	3.257.021	100	100	BT
43	0000000-000	Arazi Kullanım Planlaması Projesi	GB	2023	2023	340.973	0	340.973	340.973	340.973	100	100	BT
44	0000000-000	Mera Hizmetleri	GB	2023	2023	243.678	0	243.678	243.678	243.678	100	100	BT
45	0000000-000	İttri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştirilmesi Projesi	GB	2023	2023	9.920	0	9.920	9.920	9.920	100	100	BT
46	0000000-000	Organik Tarımın Yaygınlaştırılması ve Kontrolü	GB	2023	2023	39.259	0	39.259	39.259	39.259	100	100	BT
47	0000000-000	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2023	2023	5.151.691	0	5.151.691	5.151.691	5.151.691	100	100	BT

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal. gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü				2.624.750	1.434.000	826.754	826.750	826.750	100		
		Araştırma Projeleri (3 / 14 adet)				2.624.750	1.434.000	826.754	826.750	826.750	100		
		Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri				480.000	420.000	50.002	50.000	50.000	100		
48	2012A02-1505	Trakya Yör. Yapay Sin. Ağ. İle Kur. Tah. ve Coğ. Bil. Sis. İle Haritalanması	GB	2020	2023	20.000	20.000	1	0	0	0	99	DE
49	2012A02-1505	Trakya Böl. Palmer Kuraklık Şiddet İndisinin Buğday Bitkisi İçin Yeniden Modellenmesi	GB	2021	2024	80.000	60.000	10.000	10.000	10.000	100	75	DE
50	2012A02-1505	Çeltik Tar. Kaynaklı Sera Gazlarının Hesaplanmasında ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi	GB	2021	2023	280.000	240.000	40.000	40.000	40.000	100	99	DE
51	2012A02-1505	Trakya Yöresinde FAO-SHARP Aracı İle İklim Değişikliği Dayanıklılığının Değerlendirilmesi	GB	2021	2023	100.000	100.000	1	0	0	0	100	BT
		Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri				637.250	263.750	153.751	153.750	153.750	100		
52	2012A02-1505	Yavaş Salımlı Azotlu Gübreler ve Azaltılmış Dozlarının Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri	GB	2021	2023	95.000	68.000	27.000	27.000	27.000	100	100	BT
53	2012A02-1505	Trakya Koşullarında Yetiştirilen Lavanta Bitkisinin Azot ve Fosfor İhtiyacının Belirlenmesi	GB	2022	2026	147.250	31.750	28.750	28.750	28.750	100	40	DE
54	2012A02-1505	Kırklareli İli Alternatif Bitkisel Üretim Deserinini Belirlenmesi	GB	2022	2025	297.000	113.000	98.000	98.000	98.000	100	50	DE
55	2012A02-1505	Biyo gaz Çıktısı Sıvı Fermente Ürünün Toprak Özellikleri İle Mısır Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi	GB	2022	2024	98.000	51.000	1	0	0	0	99	DE
		Tarımsal Sulama ve Arazı Islahı Araştırma Projeleri				997.500	640.250	223.000	223.000	223.000	100		
56	2012A02-1505	Kırklareli Eysel Atıksu Arıtma Tesisi Çıksı Suyunun Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanakları ve Sera Gazı Salımlarına Etkisinin Araştırılması	GB	2022	2024	357.000	202.000	155.000	155.000	155.000	100	67	DE
57	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Buğday ve Ayçiçeği Bitkileri İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme	GB	2022	2024	254.000	173.000	24.000	24.000	24.000	100	67	DE
58	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Yonca (Medicago sativa) Bitkisi İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi	GB	2022	2024	254.000	173.000	24.000	24.000	24.000	100	67	DE
59	2012A02-1505	Kırklareli Koşullarında Yapay Meralarda Su Kısıtının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri	GB	2022	2024	132.500	92.250	20.000	20.000	20.000	100	67	DE
		Tarımsal Mekанизasyon ve Bilgi Teknolojileri Araştırmaları				510.000	110.000	400.001	400.000	400.000	100		
60	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Tar. Mek. Pl. Yeni Tek. Kul. Ve Pol. Ar. Geliştirilmesi	GB	2020	2023	110.000	110.000	1	0	0	0	99	DE
61	2012A02-1505	TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Altyapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu	GB	2023	2023	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100	100	BT
		DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				433.123.185	34.273.361	38.977.793	38.977.792	38.977.792	100		
62	2010A02-1188	Arazi Topulaştırma ve TİGH Projesi (40.000 hektar, 15 yerleşim yeri)	GB	2018	2024	170.780.287	30.191.026	37.500.000	37.500.000	37.500.000	100	60	DE
63	2010A02-1188	Arazi Topulaştırma ve TİGH Projesi 2. Kısım	GB	2022	2025	97.342.898	4.082.335	1.477.792	1.477.792	1.477.792	100	8	DE
64	2010A02-1188	Arazi Topulaştırma ve TİGH Projesi 3. Kısım	GB	2022	2026	165.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		İl Özel İdaresi				1.200.942	0	1.200.942	850.902	850.763	71		
65	0000000-000	Aromatik Bitki Yetiştiriciliği	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	199.960	199.960	100	100	BT
66	0000000-000	Dijital Toprak ve Yem Analiz Cihazı Satın Alınması	Öİ	2023	2023	550.942	0	550.942	550.942	550.942	100	100	BT
67	0000000-000	Optik Araç Alımı	Öİ	2023	2023	450.000	0	450.000	100.000	99.861	22	100	BT
		Tarım / Hayvancılık				3.476.550	0	3.451.551	3.424.210	3.326.210	96		
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				1.731.550	0	1.731.550	1.731.550	1.731.550	100		
68	0000000-000	Hayvan Hastalıkları ve Zararlılar ile Mücadele Projesi	GB	2023	2023	1.123.384	0	1.123.384	1.123.384	1.123.384	100	100	BT
69	0000000-000	Hayvancılığın Geliştirme Projesi	GB	2023	2023	435.991	0	435.991	435.991	435.991	100	100	BT
70	0000000-000	Hayvansal Üretim Artırılması	GB	2023	2023	172.174	0	172.174	172.174	172.174	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				1.745.000	0	1.720.001	1.692.660	1.594.660	93		
		Hayvan İçmesuyu Göletleri (1 / 4 adet)				165.000	0	140.001	118.000	20.000	14		
71	0000000-000	K.eli Çeşmeköy HİS Göleti Yapımı	Öİ	2020	2023	25.000	0	1	0	0	0	0	DE
72	0000000-000	Koçgaz Aşağıkanara HİS Göleti Yapımı	Öİ	2023	2023	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
73	0000000-000	Koçgaz Kocayazı HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2023	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
74	0000000-000	L.burgaz Çeşmeköy HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2023	100.000	0	100.000	98.000	0	0	0	İA
		Hayvancılık Projeleri				1.580.000	0	1.580.000	1.574.660	1.574.660	100		
75	0000000-000	Ancılık	Öİ	2023	2023	1.380.000	0	1.380.000	1.374.660	1.374.660	100	100	BT
76	0000000-000	Orman Köyleri Küçükbaş Hayvancılığı Yem Desteği	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	Para sal 2023 yılı harcamaları (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Tarım / Ormancılık				45.145.200	0	45.145.200	37.050.680	37.050.680	82	
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				5.727.200	0	5.727.200	3.966.720	3.966.720	69	
		Orman Kadastro ve Tescili				220.000	0	220.000	0	0	0	
77	2023A05-192873	Orman Kadastro ve Tescili	ÖB	2023	2023	220.000	0	220.000	0	0	0	HB
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele				39.000	0	39.000	0	0	0	
78	2023A05-192876	Orman Koruma	ÖB	2023	2023	39.000	0	39.000	0	0	0	HB
		Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi				3.968.200	0	3.968.200	3.966.720	3.966.720	100	
79	2023A05-192865	Ağaçlandırma	ÖB	2023	2023	3.739.000	0	3.739.000	3.737.546	3.737.546	100	BT
80	2023A05-192865	Rehabilitasyon	ÖB	2023	2023	188.000	0	188.000	188.000	188.000	100	BT
81	2023A05-192865	Etüd Proje	ÖB	2023	2023	41.200	0	41.200	41.174	41.174	100	BT
		Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
82	2023A05-192857	Stabilize	DS	2023	2023	700.000	0	700.000	0	0	0	HB
83	2023A05-192857	Sanat Yapısı	DS	2023	2023	800.000	0	800.000	0	0	0	HB
		Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü				8.083.000	0	8.083.000	4.829.407	4.829.407	60	
		Orman Kadastro ve Tescili				132.000	0	132.000	0	0	0	
84	2023A05-192873	Orman Kadastro ve Tescili	ÖB	2023	2023	132.000	0	132.000	0	0	0	HB
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele				26.000	0	26.000	0	0	0	
85	2023A05-192876	Fotokapan (Otlatma - Gözetleme)	ÖB	2023	2023	26.000	0	26.000	0	0	0	HB
		Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				7.925.000	0	7.925.000	4.829.407	4.829.407	61	
86	2023A05-192857	Yeni Yol	DS	2023	2023	2.200.000	0	2.200.000	1.043.685	1.043.685	47	BT
87	2023A05-192857	Stabilize	DS	2023	2023	1.900.000	0	1.900.000	1.888.692	1.888.692	99	BT
88	2023A05-192857	Köprü	DS	2023	2023	3.825.000	0	3.825.000	1.897.030	1.897.030	50	BT
		Vize Orman İşletme Müdürlüğü				3.390.000	0	3.390.000	1.861.015	1.861.015	55	
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele				390.000	0	390.000	0	0	0	
89	2023A05-192876	Makine Teçhizat Alımı	ÖB	2023	2023	390.000	0	390.000	0	0	0	HB
		Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				2.500.000	0	2.500.000	1.361.015	1.361.015	54	
90	2023A05-192857	Yeni Yol	DS	2023	2023	1.100.000	0	1.100.000	201.695	201.695	18	BT
91	2023A05-192857	Stabilize	DS	2023	2023	1.400.000	0	1.400.000	1.159.320	1.159.320	83	BT
		Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü				500.000	0	500.000	500.000	500.000	100	
92	2022A05-181925	Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü	DS	2023	2023	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100	BT
		Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü				27.945.000	0	27.945.000	26.393.538	26.393.538	94	
		Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi				2.400.000	0	2.400.000	2.399.470	2.399.470	100	
93	2023A05-192853	Fidan Üretimi	ÖB	2023	2023	2.400.000	0	2.400.000	2.399.470	2.399.470	100	BT
		Fidan Üretimi				25.545.000	0	25.545.000	23.994.068	23.994.068	94	
94	2023A05-192853	Fidan Üretimi	DS	2023	2023	5.500.000	0	5.500.000	5.000.000	5.000.000	91	BT
95	2023A05-192853	Fidan Bakımı	DS	2023	2023	6.300.000	0	6.300.000	6.298.571	6.298.571	100	BT
96	2023A05-192853	Tohum Üretimi	DS	2023	2023	850.000	0	850.000	850.000	850.000	100	BT
97	2023A05-192853	Tesisler	DS	2023	2023	11.301.000	0	11.301.000	10.345.748	10.345.748	92	BT
98	2023A05-192853	Makine Teçhizat Alımı	DS	2023	2023	1.594.000	0	1.594.000	1.499.750	1.499.750	94	BT
		Tarım / Su Ürünleri				944.732	69.844	874.888	146.610	146.610	17	
		Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü				845.833	69.844	775.989	47.711	47.711	6	
99	2020A04-150875	D.köy İçneada Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri	GB	2022	2023	845.833	69.844	775.989	47.711	47.711	6	DE
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				98.899	0	98.899	98.899	98.899	100	
100	0000000-000	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2023	2023	32.796	0	32.796	32.796	32.796	100	BT
101	0000000-000	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2023	2023	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100	BT
102	0000000-000	Sularda Tanımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	GB	2023	2023	11.103	0	11.103	11.103	11.103	100	BT

madencilik

Proje sayısı: 5, Proje tutarı: 360.734.100


Önceki yıllar harcaması: 0, 2023 yılı harcaması: **357.595.420**

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü

- Maden Arama Çalışmaları

TP Trakya Bölge Müdürlüğü

- Petrol ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları

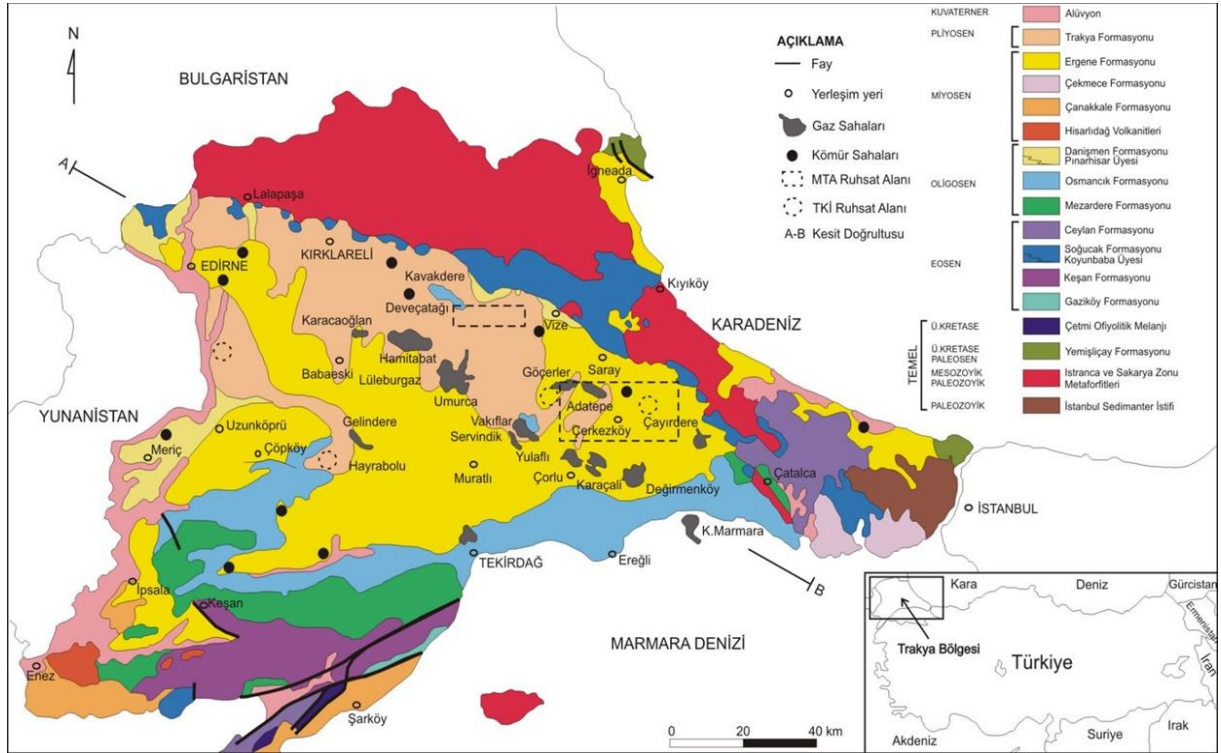

MR-8000 BD-6



F-320 RIG11



F-200/10



MR-7000/2



TP Sondaj Kuleleri

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		Madencilik				360.734.100	0	360.734.100	357.595.420	357.595.420	99		
		MTA Marmara Bölge Müdürlüğü				38.992.100	0	38.992.100	38.895.245	38.895.245	100		
103	0000000-000	Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları	ÖB	2023	2023	38.992.100	0	38.992.100	38.895.245	38.895.245	100	100	BT
		TP Trakya Bölge Müdürlüğü				321.742.000	0	321.742.000	318.700.175	318.700.175	99		
104	0000000-000	Sondaj Yatırımları	KT	2023	2023	211.402.000	0	211.402.000	209.152.650	209.152.650	99	100	BT
105	0000000-000	Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları	KT	2023	2023	14.570.000	0	14.570.000	14.569.000	14.569.000	100	100	BT
106	0000000-000	Kuyu Tamamlama Yatırımları	KT	2023	2023	91.265.000	0	91.265.000	91.068.698	91.068.698	100	100	BT
107	0000000-000	İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı	KT	2023	2023	4.505.000	0	4.505.000	3.909.827	3.909.827	87	100	BT

İmalat

Proje sayısı: 2, Proje tutarı: 384.500
Önceki yıllar harcaması: 0, 2023 yılı harcaması: **384.500**

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Gıda hizmeti projeleri

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		İmalat				384.500	0	384.500	384.500	384.500	100	100	
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				384.500	0	384.500	384.500	384.500	100	100	
108	0000000-000	Gıda Hizmetleri	GB	2023	2023	341.500	0	341.500	341.500	341.500	100	100	BT
109	0000000-000	Gıda ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2023	2023	43.000	0	43.000	43.000	43.000	100	100	BT

enerji

Proje sayısı: 11, Proje tutarı: 446.298.000

Önceki yıllar harcaması: 4.012.898, 2023 yılı harcaması: **5.029.854**

TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü

- **Trafo merkezi yapımı** (Kırklareli OSB) 1 TM
- **Trafo merkezi yenileme** (Lüleburgaz, Hamitabat, Vize) 3 TM
- **Enerji nakil hattı** (Kırklareli – Pınarhisar Brş.) – Kırklareli OSB, **Balkaya – Vize**, Sergen – Vize, **Sergen – Evrencik**, Vize – Vize OSB, **(Babaeski – Hamitabat) – Lüleburgaz**, Demirköy – Kıyıköy 7 hat

						Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para salı (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Enerji							446.298.000	4.012.898	74.291.791	5.261.560	5.029.854	7		
		TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü							446.298.000	4.012.898	74.291.791	5.261.560	5.029.854	7		
		Trafo Merkezleri							187.921.000	2.821.193	14.912.789	4.912.787	4.681.081	31		
110	2017D000490	L.burgaz Hamitabat TM Tevsiat 400 kV,1 Fider (Reaktör) + 400/154 kV, Ototrafo Fideri + 250 MVA Ototrafo + 420 kV, 160-250 MVAr Ayarlanabilir Reaktör	KT	2017	2024	100.000.000		1.812.980	10.000.000			0	0	0	0	İA
111	2020D00-149430-149455	Vize 380 Havza TM Tevsiat 400 kV 3 Fider (Babaeski, Yedek, Reaktör) + 154 kV, 4 fider (Balkaya RES, Sergen RES, Modern Karton, ASB)))	KT	2020	2025	50.000.000		0	1			0	0	0	0	İA
112	18D002500	Lüleburgaz TM Tevsiat (154 kV, 2 Fider)	KT	2021	2023	5.921.000		1.008.213	4.912.787			4.912.787	4.681.081	95	100	BT
113	2022D00-175939-176964	Kırklareli OSB TM 154/33 kV, 1. ve 2. Trafo Fideri	KT	2022	2025	32.000.000		0	1			0	0	0	0	İA
		Enerji İletim Hatları				258.377.000		1.191.705	59.379.002			348.773	348.773	1		
114	2018D002490	(Babaeski - Hamitabat) Brş. N. - Lüleburgaz EİH (154 kV 2x1272 MCM, 4 km)	KT	2018	2025	11.000.000		7.249	2.000			394	394	20	0	İA
115	2018D002550	Balkaya RES - Kiyıköy RES EİH 154 kV, 1272 MCM, 18 km	KT	2018	2025	30.000.000		150.815	1			0	0	0	0	İA
116	2020D00-149430-149454	Balkaya RES YEKA - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 14+14 km(İki Ayrı Hat)	KT	2020	2024	77.000.000		0	8.000.000			105.459	105.459	1	0	İA
117	2020D00-149430-149458	Sergen RES - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 22 km)	KT	2020	2024	65.000.000		31.762	7.000.000			173.088	173.088	2	0	İA
118	2020D00-149430-149459	Sergen RES - Evrencik RES EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 9 km)	KT	2020	2024	27.000.000		1.879	3.000.000			67.720	67.720	2	0	İA
119	2020D00-149430-149518	(Pınarhisar - Traçım) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH (TTFO)(154 kV, 1272 MCM, (6 + 6) km (İki Ayrı Hat)	KT	2020	2023	42.377.000		1.000.000	41.377.000			2.112	2.112	0	1	DE
120	2022D00-175939-176972	(Kırklareli – Pınarhisar) Brş. N. – Kırklareli OSB EİH (154 kV, 1272 MCM, 2+2 km (İki Ayrı Hat)	KT	2022	2025	6.000.000		0	1			0	0	0	0	İA

ulařtırma

Proje sayısı: 193, Proje tutarı: 13.521.283.785

Önceki yıllar harcaması: 8.576.604.860, 2023 yılı harcaması: **3.105.949.959**

Demiryolu

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

- Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (76 + 153 km)
- Demiryolları Bakım ve Onarımları

Karayolu

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

- TEM Otoyolu Üstyapı İyileřtirmesi ve Büyük Onarımı (45 km)
- Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (71,1 km)
- (Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 km)
- (Pınarhisar - Vize) Ayrım - Demirköy - İğneada Yolu (30,9 km)
- Lüleburgaz Sokullu Mehmet Pařa Köprüsü (90 m)
- Kiyıköy Köprüsü (316 m)

İl Özel İdaresi

- Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı

Kentiçi Ulaşım

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Şehiriçi Yolları ve Kaldırım Yapımı (Kavaklı, Evrensekiz, Pehlivan köy, Pınarhisar) 4 adet 4'ü de bitti

Halkalı – Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı

Halkalı - Çerkezköy (76 km) Çerkezköy - Kapıkule (153 km)


Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşaatı, İlçesi: Babaeski, Lüleburgaz, Başlama ve bitiş tarihi: 2007 – 2024, Proje tutarı: 7.414.164.586, Harcama: 6.706.456.587, Nakdi gerçekleşme: % 86, Fiziki gerçekleşme: % 86

Toplam 229 km uzunluğa sahip hat tamamlandığında Halkalı - Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek, mevcut hat kapasitesi de 4 kat daha artacaktır. Ayrıca bölgedeki yoğun kara trafiğini azaltacak ulaşımın gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Halkalı-Çerkezköy demiryolu kesimlerinden oluşuyor. Çift hatlı, 200 km hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilen hatta yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje ile birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacaktır.


Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattıyla, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacaktır. Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacaktır. Bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihracat imkanları artacak, imalat sanayine gerekli olan hammaddelerin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetleri azalacaktır.



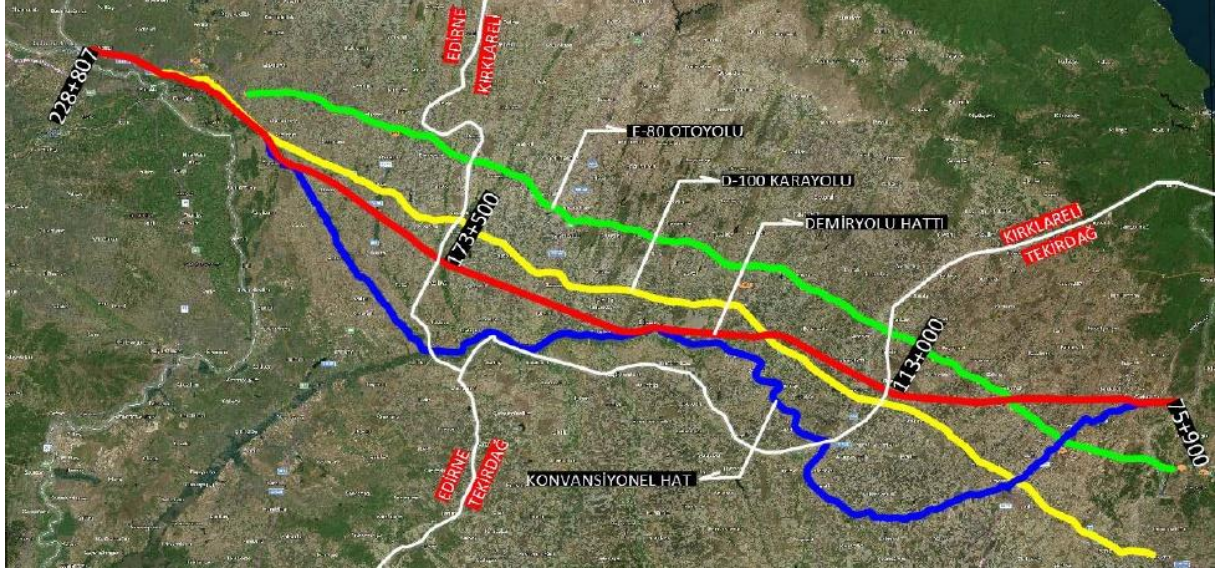

Çerkezköy 75,900 km (**Tekirdağ: 37,100 km**), Kırklareli il sınırı 113,000 km (**Kırklareli: 60,500 km**)
Kırklareli il sınırı 173,500 km, Kapıkule 228,807 km (**Edirne: 55,307 km**)

İstasyon Noktaları

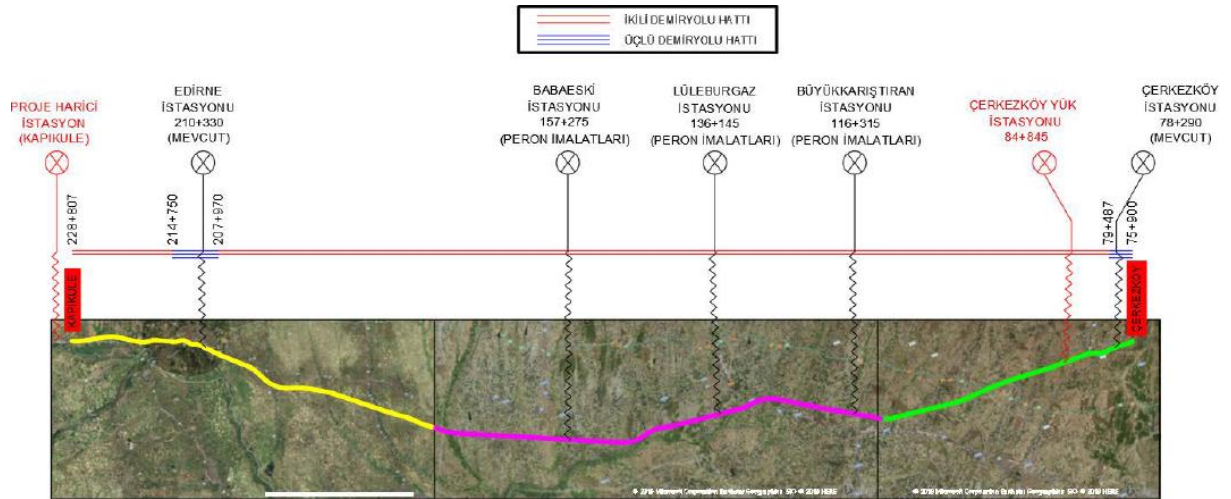

Kapıkule, Edirne (210,330), Babaeski (157,275), Lüleburgaz (136,145), Büyükkarıştıran (116,315), Çerkezköy Yük İstasyonu (84,845), Çerkezköy (78,290)

Hat bilgileri: Toplam hat: 152,906 km (İkili hat: 142,546 km + Üçlü hat: 10,360)

Toprak işleri: Güzergah ve temel kazısı: 63.792.000 m³, Dolgu:10.334.02 m³

Sanat yapıları: Menfez:181, Aç-Kapa Tünel: 8, Altgeçit: 52, Üstgeçit: 62, Demiryolu köprüsü: 32, Viyadük: 2

63,792,000 m³ kazının, 61,253,848 m³'ü (%94)tamamlandı.

10,334,029 m³ dolgunun, 6,581,775 m³'ü (%60)tamamlandı.

8 adet aç kapa tünel ve karayolu geçişi (6 adet tamamlandı – 2 adet devam ediyor)

2 adet viyadük (1 adet tamamlandı - 1 adet devam ediyor)

62 adet üst geçit (32 adet tamamlandı – 30 adet devam ediyor)

52 adet altgeçit (46 adet tamamlandı – 6 adet devam ediyor)

32 adet demiryolu köprüsü (14 adet tamamlandı – 18 adet devam ediyor)

181 adet menfez (141 adet tamamlandı – 40 adet devam ediyor)

353 Km'lik hattın yaklaşık 90 km'lik kısmının serimi yapılmıştır.

Projede yaklaşık 900.000 m³ balast ihtiyaç vardır, yaklaşık 223.321 m³ balast üretimi gerçekleştirilmiş olup, 197,321 m³ balast serimi yapılmıştır.

317 deplase imalatı (217 adet tamamlandı – 100 adet devam ediyor.)



Kırklareli – Edirne Bölünmüş Yolu

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 26,5 / 47,5 km, Başlama ve bitiş tarihi: 2013 – 2024, Proje tutarı: 1.462.808.000, Harcama: 1.304.954.276
Kırklareli il sınırları içinde 21,5 km yol tamamlanarak hizmete açılmıştır. 391 m uzunluğunda 6 köprü (İnece, Dolapdere, Bostanlı, Akardere, Hasköy, Sazlıdere) yapılmıştır.

Saray – Kırklareli Yolu

İlçesi: Merkez, Pınarhisar, Vize, Karakteristiği: 71,1 km (32,1 BY, 39 TY), 4 köprü (186 m), Başlama ve bitiş tarihi: 2019 – 2025, Proje tutarı: 2.237.000.000, Harcama: 1.853.889.738

Kırklareli'yi Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan Saray-Kırklareli yolu projesi kapsamında 7,4 kilometrelik Pınarhisar çevre yolu ile 3 kilometrelik Çakıllı çevre yolu ve Kaynarca çevre yolumuzun yapımı tamamlanarak hizmete açılmıştır. Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Yolun 26,5 km BY-BSK; 5 km TY-BSK ve 1 adet 2x96 m köprü tamamlanmıştır. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor. Vize çevre yolunun bu yıl tamamlanması beklenmektedir.

Projenin tamamlanmasıyla, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Yıllık toplam 128,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7.275 ton azaltılacak.



Pınarhisar Çevre Yolu



Kaynarca Çevre Yolu



Kırkırelı – Edırne Bölünmüş Yolu



Çakılı Çevre Yolu



Kıyıköy Köprüsü

(Pınarhisar – Vize Ayrımı) – Demirköy – İğneada Yolu Rehabilitasyonu

İlçesi: Demirköy, Karakteristiği: 30, 9 km (İlk kısım: 9,3 km (1A, 12 m) (5,5 km Demirköy Çevre yolu), İkinci kısım: 21,6 km (1A, 12 m), Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2024, Proje tutarı: 1.197.000.000, Harcama: 1.012.580.489

Km: 0+000-5+450 ve 21+000-24+820 Arası: 9,3 km tek yol ile 200 metre uzunluğunda 3 köprü yapılacaktır. Yüzde 88 tamamlanmıştır. 1x75 m olan 1 adet köprü tamamlanmıştır.

Km: 5+450+21+000 ve 24+820-27+684 Arası: 18,4 km tek yol yapılacaktır. Yüzde 9 tamamlanmıştır.



Demirköy – İğneada yolu



Demirköy çevre yolu



TEM Otoyolu Üstyapı İyileřtirmesi ve Büyük Onarımı



TEM Otoyolu Üstyapı İyileřtirmesi ve Büyük Onarımı

İl Özel İdaresi**Köy Yolları Yapım Bakım ve Onarımı**

İlçesi: Muhtelif, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2023, Harcama: 79.008.318

Köy yolları yapım, bakım ve onarımı

İkinci kat asfalt kaplama **9 km (tamamı yapıldı)**

Birinci kat asfalt kaplama **18,850 km (tamamı yapıldı)**

Parke taş kaplaması **49.680 m2 (tamamı yapıldı)**

Köprü, menfez ve sanat yapıları **9 adet (6 adet yapıldı)**

KÖYDES**Köy Yolları Yapım Bakım ve Onarımı (KÖYDES)**

İlçesi: Muhtelif, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2023, Proje tutarı: 27.423.594, Harcama: 23.398.451

Köy yolları yapım, bakım ve onarımı

İkinci kat asfalt kaplama **10 km (tamamı yapıldı)**

Birinci kat asfalt kaplama **25,600 km (tamamı yapıldı)**

Parke taş kaplaması **17.940 m2 (tamamı yapıldı)**

Köprü, menfez ve sanat yapıları **1 trapez kanal (0 adet yapıldı)**



Toplam 2611 km. köy yolu ağının 28 km.lik kısmı BSK asfalt, 19 km.lik kısmı beton yol, 1.368 km.lik kısmı sathi asfalt kaplama, 270 km.lik kısmı parke taş, 810 km.lik kısmı stabilize kaplama, 16 km.lik kısmı tesviye, 100 km.lik kısmı ise ham yol standardındadır.

İl Özel İdaresi'nce İller Bankasından kullanılan 30 milyon lira borçlanma karşılığı; 3 damperli kamyon, 1 karla mücadele kamyonu, 1 çekici TIR ve lowbeti, 2 greyder, 1 ekskavatör, 1 dozer ve 2 4x4 pick-up arazi aracı alınmıştır.



Isuzu D-Max V-Go 4x4 M/T Pick-Up



Ford Trucks 6x4 çekici ve 3 dingilli lowbed



Mercedes Benz Arocs 3345K/6x4/3600 mm, Euro 6 Motorlu, Havuz Tipi, 7 m³ Kapasite Solüsyonsuz Tuz Sericili Damperli Kamyon



Vize Kızılağaç



Babaeski Kuzuçardağı – Karacaoğlan köy yolu üzerinde bulunan eski köprü yıkılmış, yenisi yapılmıştır.



Sel felaketinde zarar gören Lüleburgaz Turgutbey Köprüsü yenilenmiştir.



Kavakdere köprüsü yeniden yapıldı.



İller Bankası Evrensekiz şehir içi yol yapımı

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
						13.521.283.785	8.576.604.860	3.933.582.905	3.106.044.597	3.105.949.959	79		
						7.430.699.352	5.780.169.706	1.647.872.503	938.416.249	938.321.611	57		
						7.430.699.352	5.780.169.706	1.647.872.503	938.416.249	938.321.611	57		
121	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	7.414.164.586	5.776.664.586	1.637.500.000	929.792.001	929.792.001	57	86	DE
122	2017.E010110.01.03	Alpullu Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2024	48.550	13.900	34.650	34.650	0	0	60	DE
123	2017.E010110.01.03	Lüleburgaz Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2024	27.610	7.900	19.710	19.710	0	0	60	DE
124	2017.E010110.01.03	Pehlivanköy Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2024	49.968	14.328	35.640	35.640	0	0	80	DE
125	2020.E010190.01.14	Alpullu Çatalca Çorlu Kurfalı Lüleburgaz Muratlı Pehlivanköy Velimese Peron Peronbej Uzatma	KT	2022	2023	6.596.952	2.064.452	4.532.500	3.521.453	3.521.453	78	100	BT
126	2020.E010190.01.14	İstasyonların Saha Aydınlatmalarının Yapılması	KT	2022	2023	2.273.815	973.815	1.300.000	1.300.000	1.295.362	100	100	BT
127	2020.E010190.01.14	Lüleburgaz İstasyon Sahasında Bulunan Muhtelif Binaların Restorasyonunun Yapılması	KT	2023	2024	1	0	1	0	0	0	0	HB
128	2020.E010190.01.14	Mevcut Demiryolu Güzergâhında (Sirkeci - Uzunköprü / Pehlivanköy - Kapıkule / Kırklareli - Mandıra / Muratlı -Tekirdağ / Haydarpaşa - Ankara Hat kesimleri) Altyapı İyileştirmesine Yönelik Etüd, Proje, Mühendislik ve Hizmet Alımı	KT	2021	2024	4.217.445	430.725	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	57	DE
129	2020.E010190.01.14	Sinyalizasyon Sistemi İstasyon İçi Yol Sinyallerinin Led Tipi Sinyale Dönüştürülmesi	KT	2023	2024	1.320.423	0	450.000	0	0	0		DE
130	2020.E010190.01.14	Alpullu Akaryakıt Dolum Tesisine Yangın Söndürme Sistemi Kurulması ve İtfaiye Raporunun Alınması	KT	2023	2024	2.000.000	0	2.000.000	1.712.795	1.712.795	86	86	DE
131	2020.E010190.01.21	Alpullu İstasyon Sahasında Bulunan Binaların Bakım ve Onarımı	KT	2023	2024	1	0	1	0	0	0	0	İA
132	2020.E010190.01.21	Hemzemin Geçitte Kamera Sistemi Kurulması (65 adet)	KT	2023	2024	1	0	1	0	0	0	0	İA
						6.075.163.347	2.793.059.434	2.279.996.002	2.162.262.425	2.162.262.425	95		
						5.965.079.399	2.792.592.484	2.170.537.001	2.059.855.656	2.059.855.656	95		
						472.000.000	0	168.530.000	127.967.469	127.967.469	76		
133	2012E04-1560-2083	TEM Otoyolu ve Bağlantı Yolları (Babaeski Kavşağı - Saray Kavşağı) Üstükapı İyileştirilmesi ve Büyük Onarımı (45 / 53 km)	ÖB	2022	2026	472.000.000	0	168.530.000	127.967.469	127.967.469	76	27	DE
						4.896.808.000	2.789.284.384	1.452.258.932	1.382.140.119	1.382.140.119	95		
134	2019E04-208-134	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2026	2.237.000.000	1.243.018.738	610.871.000	610.871.000	610.871.000	100	83	DE
135	2016E04-208-274	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2026	1.462.808.000	1.171.743.156	203.329.933	133.211.120	133.211.120	66	95	DE
136	2021E04-208-169	(Pınarhisar-Vize)Ayr.-Demirköy-İğneada Devlet Yolu Yapımı (9,3 km)	ÖB	2021	2026	1.197.000.000	374.522.490	638.057.999	638.057.999	638.057.999	100	69	DE
						68.810.000	3.308.100	22.286.670	22.286.669	22.286.669	100		
137	2014E04-208-257	Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (90 m)	ÖB	2015	2026	43.000.000	0	1	0	0	0	0	YT
138	2022E04-208-211	Kıyıköy Köprüsü yapımı (316 m)	ÖB	2022	2026	25.810.000	3.308.100	22.286.669	22.286.669	22.286.669	100	99	DE
						203.562.777	0	203.562.777	203.562.777	203.562.777	100		
139	1991E040090	Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Çalışmaları	ÖB	2023	2023	203.562.777	0	203.562.777	203.562.777	203.562.777	100	100	BT
						323.898.622	0	323.898.622	323.898.622	323.898.622	100		
140	0000000-000	Kamulaştırmalar	ÖB	2023	2023	323.898.622	0	323.898.622	323.898.622	323.898.622	100	100	BT
						82.660.354	466.950	82.035.407	79.008.318	79.008.318	96		
141	0000000-000	Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı				82.660.354	466.950	82.035.407	79.008.318	79.008.318	96	100	BT
						27.423.594	0	27.423.594	23.398.451	23.398.451	85		
147	0000000-000	Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı				27.423.594	0	27.423.594	23.398.451	23.398.451	85	100	BT
						15.421.086	3.375.720	5.714.400	5.365.923	5.365.923	94		
						15.421.086	3.375.720	5.714.400	5.365.923	5.365.923	94		
311	0000000-000	K.eli Kavaklı Kilitli Beton Parke Taşı Alımı	İB	2023	2023	465.120	0	465.120	465.120	465.120	100	100	BT
312	0000000-000	L.burgaz Evrensekiz Şehirçi Yolları Parke Taşı Kaplama ve Kaldırım Yapımı	İB	2022	2023	7.344.966	3.375.720	3.249.280	2.900.803	2.900.803	89	100	BT
313	0000000-000	Pehlivanköy Beton Parke Taşı Alımı	İB	2023	2023	548.700	0	500.000	500.000	500.000	100	100	BT
314	0000000-000	Pınarhisar Beton Bordür Beton Parke Taşı ve Beton Elemanları Alımı	İB	2023	2023	7.062.300	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	BT

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	Para sal 2022 yılı harcamaları (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme Açıklaması (%)
İl Özel İdaresi						82.660.354	466.950	82.035.407	79.008.318	79.008.318	96	
Köy Yolları Yapımı						82.660.354	466.950	82.035.407	79.008.318	79.008.318	96	
Stabilize Kaplama (0 / ... km)						1.520.000	0	1.520.000	0	0	0	
141	0000000-000	Köy yolları Stabilize Kaplama (... km)	GB	2023	2023	1.520.000	0	1.520.000	0	0	0	HB
1. Kat Asfalt Kaplama (18,850 / 18,850 km)						3.513.002	0	3.513.002	3.513.000	3.513.000	100	
142	0000000-000	Arızbaba - Edirne İl Hd. (Bostanlı) Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (2,500 km)	GB	2023	2023	1	0	1	0	0	0	BT
143	0000000-000	Avclar - Dy. İlt. Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	GB	2023	2023	1	0	1	0	0	0	BT
144	0000000-000	Akçaköy - TEM Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	GB	2023	2023	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	100	BT
145	0000000-000	L.burgaz Köy yolları 1. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	GB	2023	2023	263.000	0	263.000	263.000	263.000	100	BT
146	0000000-000	Hacıfaklı - Üsküp Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (0,350 km)	GB	2023	2023	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	BT
147	0000000-000	Soğucak - Sergen Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	GB	2023	2023	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100	BT
2. Kat Asfalt Kaplama (9 / 9 km)						150.001	0	150.001	150.000	150.000	100	
148	0000000-000	B.eski Oruncu Köyü Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	GB	2023	2023	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	BT
149	0000000-000	Avclar - Dy. İlt. Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	GB	2023	2023	1	0	1	0	0	0	BT
Parke Taşı Kaplaması (49.680 / 49.680 m2)						14.242.000	0	14.242.000	13.212.245	13.212.245	93	
150	0000000-000	K.eli Arızbaba Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	BT
151	0000000-000	K.eli Asitbeyli Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
152	0000000-000	K.eli Bayramdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
153	0000000-000	K.eli Beypınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
154	0000000-000	K.eli Çabalayık Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
155	0000000-000	K.eli Çayırılı Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
156	0000000-000	K.eli Çukurpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
157	0000000-000	K.eli Değirmençik Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
158	0000000-000	K.eli Demircihallı Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	BT
159	0000000-000	K.eli Dereköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
160	0000000-000	K.eli Deveçatağı Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.663	131.663	88	BT
161	0000000-000	K.eli Dokuzhöyük Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
162	0000000-000	K.eli Dolhan Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.663	131.663	88	BT
163	0000000-000	K.eli Erikler Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
164	0000000-000	K.eli Kapaklı Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
165	0000000-000	K.eli Karadere Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
166	0000000-000	K.eli Karncak Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
167	0000000-000	K.eli Kavakdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
168	0000000-000	K.eli Kayalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.663	131.663	88	BT
169	0000000-000	K.eli Kızılköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
170	0000000-000	K.eli Kocahidir Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	BT
171	0000000-000	K.eli Koyunbaba Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	BT
172	0000000-000	K.eli Ürünli Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.663	131.663	88	BT
173	0000000-000	K.eli Üsküpdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	88.238	88.238	88	BT
174	0000000-000	K.eli Yörükbayır Köyü Parke Taşı Kaplaması (313 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	BT
175	0000000-000	B.eski Çengerli Köyü Parke Taşı Kaplaması (633 m²)	Öİ	2023	2023	172.000	0	172.000	172.684	172.684	100	BT
176	0000000-000	B.eski Çiğdemli Köyü Parke Taşı Kaplaması (728 m²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	198.467	198.467	99	BT
177	0000000-000	B.eski Karabayır Köyü Parke Taşı Kaplaması (728 m²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	198.467	198.467	99	BT
178	0000000-000	B.eski Karacaoğlan Köyü Parke Taşı Kaplaması (551 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.429	150.429	100	BT
179	0000000-000	B.eski Karamesutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (728 m²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	150.430	150.430	75	BT
180	0000000-000	B.eski Katranca Köyü Parke Taşı Kaplaması (728 m²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	150.429	150.429	75	BT
181	0000000-000	B.eski Kuleli Köyü Parke Taşı Kaplaması (551 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.429	150.429	100	BT
182	0000000-000	B.eski Kuzugardağı Köyü Parke Taşı Kaplaması (551 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.429	150.429	100	BT
183	0000000-000	B.eski Nacak Köyü Parke Taşı Kaplaması (728 m²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	150.429	150.429	75	BT
184	0000000-000	B.eski Nadırlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (367 m²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.492	100.492	100	BT
185	0000000-000	B.eski Orulu Köyü Parke Taşı Kaplaması (551 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.430	150.430	100	BT
186	0000000-000	B.eski Osmaniye Köyü Parke Taşı Kaplaması (551 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.429	150.429	100	BT
187	0000000-000	B.eski Pancarköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (551 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.429	150.429	100	BT
188	0000000-000	B.eski Sofuhalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (922 m²)	Öİ	2023	2023	250.000	0	250.000	251.119	251.119	100	BT
189	0000000-000	B.eski Taşgöl Köyü Parke Taşı Kaplaması (922 m²)	Öİ	2023	2023	250.000	0	250.000	251.119	251.119	100	BT
190	0000000-000	B.eski Terzili Köyü Parke Taşı Kaplaması (728 m²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	198.467	198.467	99	BT
191	0000000-000	B.eski Yeniköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (551 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	198.467	198.467	132	BT
192	0000000-000	B.eski Yenimahalle Köyü Parke Taşı Kaplaması (728 m²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	198.467	198.467	99	BT
193	0000000-000	D.köy Armutveren Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.312	146.312	98	BT
194	0000000-000	D.köy Avclar Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.312	146.312	98	BT
195	0000000-000	D.köy Beğendik Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.312	146.312	98	BT
196	0000000-000	D.köy Gökyaka Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.311	146.311	98	BT
197	0000000-000	D.köy Hamdibey Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.312	146.312	98	BT
198	0000000-000	D.köy Karacadağ Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.312	146.312	98	BT
199	0000000-000	D.köy Limanköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.312	146.312	98	BT

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	Para sal 2022 yılı harcamaları (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
200	0000000-000	D.köy Sivirler Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	146.311	146.311	98	100	BT
201	0000000-000	Koçgaz Ahlatlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	100	BT
202	0000000-000	Koçgaz Ahmetler Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	100	BT
203	0000000-000	Koçgaz Beyci Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.663	131.663	88	100	BT
204	0000000-000	Koçgaz Devletliagaç Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	100	BT
205	0000000-000	Koçgaz Malkoçlar Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	131.662	131.662	88	100	BT
206	0000000-000	Koçgaz Terzidere Köyü Parke Taşı Kaplaması (650 m ²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	176.444	176.444	88	100	BT
207	0000000-000	L.burgaz Akçaköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (379 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	87.465	87.465	87	100	BT
208	0000000-000	L.burgaz Ayvalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (379 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	87.465	87.465	87	100	BT
209	0000000-000	L.burgaz Ceylan Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	162.248	162.248	81	100	BT
210	0000000-000	L.burgaz Çiftlikköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (379 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	87.465	87.465	87	100	BT
211	0000000-000	L.burgaz Düşüncübaşı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.100 m ²)	Öİ	2023	2023	190.000	0	190.000	253.367	253.367	133	100	BT
212	0000000-000	L.burgaz Emirali Köyü Parke Taşı Kaplaması (509 m ²)	Öİ	2023	2023	140.000	0	140.000	117.378	117.378	84	100	BT
213	0000000-000	L.burgaz Ertuğrul Köyü Parke Taşı Kaplaması (539 m ²)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	124.281	124.281	83	100	BT
214	0000000-000	L.burgaz Esktaşlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (639 m ²)	Öİ	2023	2023	180.000	0	180.000	147.291	147.291	82	100	BT
215	0000000-000	L.burgaz Hamitabat Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.210 m ²)	Öİ	2023	2023	250.000	0	250.000	278.678	278.678	111	100	BT
216	0000000-000	L.burgaz Karaağaç Köyü Parke Taşı Kaplaması (509 m ²)	Öİ	2023	2023	140.000	0	140.000	117.378	117.378	84	100	BT
217	0000000-000	L.burgaz Kırkköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (379 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	87.465	87.465	87	100	BT
218	0000000-000	L.burgaz Oklağlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (669 m ²)	Öİ	2023	2023	190.000	0	190.000	154.194	154.194	81	100	BT
219	0000000-000	L.burgaz Ovacak Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	162.248	162.248	81	100	BT
220	0000000-000	L.burgaz Sakızköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (639 m ²)	Öİ	2023	2023	180.000	0	180.000	147.291	147.291	82	100	BT
221	0000000-000	L.burgaz Sarıcaali Köyü Parke Taşı Kaplaması (379 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	87.465	87.465	87	100	BT
222	0000000-000	L.burgaz Tatarköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (379 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	87.465	87.465	87	100	BT
223	0000000-000	L.burgaz Turgutbey Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	162.248	162.248	81	100	BT
224	0000000-000	P.köy İmampazarı Köyü Parke Taşı Kaplaması (369 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	101.035	101.035	101	100	BT
225	0000000-000	P.köy Kumuköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (369 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	101.035	101.035	101	100	BT
226	0000000-000	P.köy Yeşilova Köyü Parke Taşı Kaplaması (369 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	101.035	101.035	101	100	BT
227	0000000-000	P.köy Yeşilpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (369 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	101.035	101.035	101	100	BT
228	0000000-000	P.hisar Sütlüce Köyü Parke Taşı Kaplaması (739 m ²)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	149.123	149.123	75	100	BT
229	0000000-000	P.hisar Tozaklı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.495 m ²)	Öİ	2023	2023	400.000	0	400.000	301.692	301.692	75	100	BT
230	0000000-000	Vize Akıncılar Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
231	0000000-000	Vize Akpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
232	0000000-000	Vize Aksicim Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
233	0000000-000	Vize Balkaya Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.167	98.167	98	100	BT
234	0000000-000	Vize Cavuşköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
235	0000000-000	Vize Develi Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
236	0000000-000	Vize Doğanca Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
237	0000000-000	Vize Düzoza Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.167	98.167	98	100	BT
238	0000000-000	Vize Evrenli Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
239	0000000-000	Vize Hamidiye Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
240	0000000-000	Vize Hasbuğa Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
241	0000000-000	Vize Kışlacık Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.167	98.167	98	100	BT
242	0000000-000	Vize Kızılağaç Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
243	0000000-000	Vize Kömürköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
244	0000000-000	Vize Küçükyayla Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
245	0000000-000	Vize Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.167	98.167	98	100	BT
246	0000000-000	Vize Okçular Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
247	0000000-000	Vize Pazarlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
248	0000000-000	Vize Serden Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
249	0000000-000	Vize Soğucak Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.167	98.167	98	100	BT
250	0000000-000	Vize Topçuköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (325 m ²)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	98.168	98.168	98	100	BT
Köprü, Menfez ve Sanat Yapıları						14.503.000	0	14.345.003	13.917.159	13.917.159	97		
251	0000000-000	K.eli Kavakdere Köprüsü Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	7.140.000	0	7.140.000	7.140.000	7.140.000	100	100	BT
252	0000000-000	B.eski Çengerli Menfez ve Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2023	120.000	0	120.000	0	0	0	100	BT
253	0000000-000	B.eski Kuzucağırdığı Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2023	75.000	0	75.000	0	0	0	100	BT
254	0000000-000	B.eski Taşağıl Menfez Yapımı	Öİ	2022	2023	150.000	0	150.000	0	0	0	100	BT
255	0000000-000	D.köy Hamdibey Bariyer Yapımı	Öİ	2023	2023	250.000	0	250.000	167.159	167.159	67	100	BT
256	0000000-000	Koçgaz Beyci Köyü Kapalı İzgara ve Kanal Yapımı	Öİ	2022	2023	28.000	0	1	0	0	0	0	HB
257	0000000-000	Koçgaz Tatlıpınar Köyü Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2023	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
258	0000000-000	Koçgaz Terzidere Köyü Menfez Yapımı	Öİ	2023	2023	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
259	0000000-000	L.burgaz Turgutbey Köprüsü Bakım ve Onanımı	Öİ	2023	2023	6.610.000	0	6.610.000	6.610.000	6.610.000	100	100	BT
Diğerleri						48.732.351	466.950	48.265.401	48.215.914	48.215.914	100		
260	0000000-000	Köy yolları Yapım, Bakım ve Onarımları	Öİ	2020	2023	37.553.656	0	37.553.656	37.553.656	37.553.656	100	100	BT
261	0000000-000	Araç Takip Sistemi Alımı	Öİ	2020	2023	80.000	30.513	49.487	0	0	0	100	BT
262	0000000-000	Yedek Parça Alımı	Öİ	2023	2023	8.000.000	0	8.000.000	8.000.000	8.000.000	100	100	BT
263	0000000-000	Hareketli İş Makinesi Alımı	Öİ	2022	2023	3.098.695	436.437	2.662.258	2.662.258	2.662.258	100	100	BT
264	0000000-000	Hareketli İş Makinesi Alımı	Öİ	2022	2023	3.098.695	436.437	2.662.258	1.999.214	1.999.214	75		DE

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para salı (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		KÖYDES				27.423.594	0	27.423.594	23.398.451	23.398.451	85		
		1. Kat Asfalt Kaplama (25,600 / 25,600 km)				15.049.184	0	15.049.184	12.115.945	12.115.945	81		
265	0000000-000	Ky. İlt. - Karadere - Şükrüpaşa - Dereköy İlçe Hd.(Armutveren) Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (9 km)	KP	2023	2023	5.181.766	0	5.181.766	3.979.566	3.979.566	77	100	BT
266	0000000-000	Dy. İlt. Yeşilce - Karacadağ Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2023	2023	2.223.185	0	2.223.185	1.408.657	1.408.657	63	100	BT
267	0000000-000	Ky. İlt. Ahmetler - Ahlatlı Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2023	2023	1.600.000	0	1.600.000	909.006	909.006	57	100	BT
268	0000000-000	Ky. İlt. - Terzidere - Topçular Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (1 km)	KP	2023	2023	800.000	0	800.000	454.503	454.503	57	100	BT
269	0000000-000	Koçgaz - Tastepe - Yukarıkanara - Beyci - Tatlıpınar - Topçular Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (0,600 km)	KP	2023	2023	443.000	0	443.000	235.702	235.702	53	100	BT
270	0000000-000	Lüleburgaz İmar Siniri - Alacaoglu - Çengelli - Davutlu - Ky. İlt. (Seyitler) Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2023	2023	2.499.900	0	2.499.900	2.833.100	2.833.100	113	100	BT
271	0000000-000	İly. İlt. - Kızılağaç - Demirköy İlçe Hd. (Sivirler) Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2023	2023	1.131.956	0	1.131.956	1.142.377	1.142.377	101	100	BT
272	0000000-000	Düzova - Vize Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2023	2023	1.169.377	0	1.169.377	1.153.034	1.153.034	99	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (10 / 10 km)				5.634.878	0	5.634.878	5.592.605	5.592.605	99		
273	0000000-000	Taşagül - Karacaoğlan - Kuzuçardağı - (Karahalil Belde) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2023	2023	1.800.000	0	1.800.000	1.781.137	1.781.137	99	100	BT
274	0000000-000	Demirköy - Sivirler - Vize İlçe Hd. (Kızılağaç) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2023	2023	1.204.528	0	1.204.528	1.159.825	1.159.825	96	100	BT
275	0000000-000	Dy. İlt. - Kırkköy - Dy. İlt (Otoban) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2023	2023	1.630.350	0	1.630.350	1.671.000	1.671.000	102	100	BT
276	0000000-000	Osmancık - Lüleburgaz İlçe Hd. (Celaliye) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2023	2023	1.000.000	0	1.000.000	980.643	980.643	98	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (17.940 / 17.940 m²)				5.139.532	0	5.139.532	4.239.901	4.239.901	82		
277	0000000-000	K.eli Düzorman Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	115.764	115.764	77	100	BT
278	0000000-000	K.eli Paşayeri Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	115.764	115.764	77	100	BT
279	0000000-000	K.eli Yündolan Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	115.764	115.764	77	100	BT
280	0000000-000	B.eksi Katranca Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (446 m2)	KP	2023	2023	130.084	0	130.084	96.323	96.323	74	100	BT
281	0000000-000	B.eksi Kumrular Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	111.191	111.191	74	100	BT
282	0000000-000	B.eksi Nadirli Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (1.047 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	323.261	323.261	216	100	BT
283	0000000-000	B.eksi Taşagül Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (601 m2)	KP	2023	2023	175.000	0	175.000	129.776	129.776	74	100	BT
284	0000000-000	B.eksi Yeniköy Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	111.191	111.191	74	100	BT
285	0000000-000	L.burgaz Çiftlikköy Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (808 m2)	KP	2023	2023	250.000	0	250.000	195.110	195.110	78	100	BT
286	0000000-000	L.burgaz Eskitaşı Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (808 m2)	KP	2023	2023	250.000	0	250.000	195.110	195.110	78	100	BT
287	0000000-000	L.burgaz Seyitler Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (645 m2)	KP	2023	2023	200.000	0	200.000	157.048	157.048	79	100	BT
288	0000000-000	L.burgaz Turgutbey Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (809 m2)	KP	2023	2023	250.000	0	250.000	195.110	195.110	78	100	BT
289	0000000-000	L.burgaz Yenitaşı Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (645 m2)	KP	2023	2023	200.000	0	200.000	157.048	157.048	79	100	BT
290	0000000-000	P.köy Kumköy Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (578 m2)	KP	2023	2023	168.347	0	168.347	121.722	121.722	72	100	BT
291	0000000-000	P.köy Kuştepe Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (687 m2)	KP	2023	2023	200.000	0	200.000	144.672	144.672	72	100	BT
292	0000000-000	P.köy Yeşilova Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (687 m2)	KP	2023	2023	200.000	0	200.000	144.672	144.672	72	100	BT
293	0000000-000	P.hisar Cevizköy Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (687 m2)	KP	2023	2023	200.000	0	200.000	212.995	212.995	106	100	BT
294	0000000-000	P.hisar Çayırdere Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	126.277	126.277	84	100	BT
295	0000000-000	P.hisar Evciler Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (1.030 m2)	KP	2023	2023	300.000	0	300.000	312.350	312.350	104	100	BT
296	0000000-000	P.hisar İslambeyli Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (330 m2)	KP	2023	2023	96.101	0	96.101	69.603	69.603	72	100	BT
297	0000000-000	P.hisar Yenice Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	108.624	108.624	72	100	BT
298	0000000-000	Vize Çavuşköy Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (343 m2)	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	74.292	74.292	74	100	BT
299	0000000-000	Vize Develi Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (343 m2)	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	74.292	74.292	74	100	BT
300	0000000-000	Vize Evrencik Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (343 m2)	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	74.292	74.292	74	100	BT
301	0000000-000	Vize Evrenli Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	111.546	111.546	74	100	BT
302	0000000-000	Vize Hasbuğa Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (343 m2)	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	74.292	74.292	74	100	BT
303	0000000-000	Vize Kışlacık Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (343 m2)	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	74.292	74.292	74	100	BT
304	0000000-000	Vize Kızılağaç Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (343 m2)	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	74.292	74.292	74	100	BT
305	0000000-000	Vize Müsellim Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	111.546	111.546	74	100	BT
306	0000000-000	Vize Pazarköy Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	111.546	111.546	74	100	BT
307	0000000-000	Vize Seren Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (515 m2)	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	111.546	111.546	74	100	BT
308	0000000-000	Vize Topçuköy Köyü Köy İçerisi Parke Taş Yapımı (409 m2)	KP	2023	2023	120.000	0	120.000	88.590	88.590	74	100	BT
		Menfez Yapımı (0 / 1 adet)				150.000	0	150.000	0	0	0		
309	0000000-000	P.köy Hıdırca Trapez Kanal Yapımı	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	0	0	0	0	İA
		Ortam Alım				1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100		
310	0000000-000	Yönetim Giderleri ve Ortak Alımlar	KP	2023	2023	1.450.000	0	1.450.000	1.450.000	1.450.000	100	100	BT

turizm

Proje sayısı: 1, Proje tutarı: 2.600.000
Önceki yıllar harcaması: 0, 2023 yılı harcaması: **2.582.646**

Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü

- İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Alan Düzenlemesi

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal	Fiziki	gerçekleşme (%)	gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Turizm				2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.582.646	99				
		Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü				2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.582.646	99				
315	2020F00-138560	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Erikli Gölü Dünya İskele ve Tak Yapımı	GB	2023	2023	2.600.000	0	2.600.000	2.600.000	2.582.646	99	100	BT		



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

konut

Proje sayısı: 3, Proje tutarı: 6.328.304

Önceki yıllar harcaması: 1.750.000, 2023 yılı harcaması: **706.984**

Valilik

- Pınarhisar Kaymakam Evi

İl Jandarma Komutanlığı

- Jandarma Lojmanları Bakım ve Onarımı

İl Emniyet Müdürlüğü

- Emniyet Lojmanları Doğal Gaz Dönüşümü

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Konut				6.328.304	1.750.000	4.578.305	706.984	706.984	15	0	
		Valilik				1.750.000	1.750.000	1	0	0	0	0	
316	00000000-000	P.hisar Kaymakamevi İnşaatı	GB	2021	2023	1.750.000	1.750.000	1	0	0	0	0	DE
		İl Jandarma Komutanlığı				1.150.000	0	1.150.000	149.536	149.536	13	0	
317	00000000-000	Jandarma Lojmanları Bakım ve Onarımı	GB	2023	2023	1.150.000	0	1.150.000	149.536	149.536	13	0	DE
		İl Emniyet Müdürlüğü				3.428.304	0	3.428.304	557.448	557.448	16	0	
318	00000000-000	Emniyet Lojmanları Doğal Gaz Dönüşümü	GB	2023	2023	3.428.304	0	3.428.304	557.448	557.448	16	0	DE

eğitim

Proje sayısı: 46, Proje tutarı: 1.257.312.135

Önceki yıllar harcaması: 175.741.981, 2023 yılı harcaması: **435.273.498**

İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- Anaokulu (Babaeski, Lüleburgaz, Lüleburgaz Özel Eğitim) 3 adet (2'si devam ediyor)
- İlkokul (Kırklareli) 1 adet Bitti
- Ortaokul (Kırklareli, Babaeski) 2 adet (1'i devam ediyor)
- Bakım ve onarımlar

Mesleki ve Teknik Eğitim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- Lise (Kırklareli, Lüleburgaz) 2 adet
- Bakım ve onarımlar

Yüksek Öğretim

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
- Muhtelif İşler
- Kampüs Altyapısı
- Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi İnşaatı
- Kütüphane ve Kültür Merkezi
- Yayın Alımları

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

- Vize Yükseköğretim Öğrenci Yurdu
- Yükseköğretim Öğrenci Yurtları Bakım ve Onarımı bitti

2023 yılında biten işler

Kırklareli 100. Yıl İlkokulu

Kültür

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

- Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı
- Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı **bitti**
- Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı **bitti**
- Babaeski Sarı Saltuk Kültür Evi Yapımı
- Eski Eser Restorasyonlarına Yardım
- Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım

İl Özel İdaresi

- Kırklareli Tarihi Gar Binası Röleve ve Restorasyonu **bitti**
- Kırklareli Kocahıdır İlköğretim Okulu Röleve Restitüsyon ve Restorasyonu
- Kırklareli Yapraklı Mahallesiindeki Taşınmazın Restitüsyon ve Restorasyonu **bitti**
- Babaeski Sinanlı Osmanlı Çeşmesi Onarımı
- Lüleburgaz Oklağlı Camii Bakım ve Onarımı
- Pınarhisar Kalesi ve Surları Koruma Planı Yapımı
- Pınarhisar Poyralı Cami Bakım ve Onarımı
- Vize Hükümet Konağı Röleve ve Restitüsyon Projesi

Beden Eğitimi ve Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

- Kırklareli Spor Salonu Yapımı
- Kırklareli Kavaklı Açık Basketbol Sahası Yapımı **bitti**
- Kırklareli Üsküp Spor Tesis Yapımı **bitti**
- Kırklareli Armağan Spor Alanı Üzerinin Kapatılması **bitti**
- Babaeski Alpullu Fitness Salonu Yapımı **bitti**
- Babaeski Büyükmandıra Spor Tesis Yapımı **bitti**
- Demirköy Spor Salonu Yapımı
- Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı (2000 seyircili)
- Lüleburgaz Kapalı Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı
- Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım ve Onarımı
- Lüleburgaz Evrensekiz Spor Tesis Yapımı **bitti**

Babaeski TOBB Anaokulu

İlçesi: Babaeski, Karakteristiği: 6 derslik, Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2024, Proje tutarı: 11.494.000, Harcama: 6.721.124, Fiziki gerçekleştirme: yüzde 75

Lüleburgaz Dt. Şeyma Biran (Dere Mah.) Özel Eğitim Anaokulu

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: 12 derslik, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2024, Proje tutarı: 41.865.000, Harcama: 0, Fiziki gerçekleştirme: yüzde 40

Kırklareli Bademlik Mahallesi İlkokulu

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 16 derslik, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Harcama: 32.688.047, Fiziki gerçekleştirme: **yüzde 100**

Kırklareli İstiklal Ortaokulu

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 24 derslik ve atölye, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2024, Proje tutarı: 52.290.000, Harcama: 19.337.155, Fiziki gerçekleştirme: yüzde 60



Babaeski Anaokulu



Lüleburgaz Dt. Şeyma Biran Anaokulu



Kırklareli 100. Yıl (Bademlik (Camikebir) Mahallesi) İlkokulu



Kırklareli İstiklal Ortaokulu

Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 25 derslik, 20 laboratuvar ve 1 konferans salonu, 15.700 m2, Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2024, Proje tutarı: 126.500.000, Harcama: 98.925.746, Fiziki gerçekleşme: yüzde 99

Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: 2.555 m2, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2024, Proje tutarı: 26.462.854, Harcama: 26.462.854

Babaeski Sarı Saltuk Kültür Evi

İlçesi: Babaeski, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2024, Proje tutarı: 16.686.707, Harcama: 16.686.707

Kırklareli Spor Salonu Yapımı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 2.000 kişilik, Başlama ve bitiş tarihi: 2015 – 2024 (Sözleşme tarihi: 29.09.2020, Bitiş tarihi: 11.02.2022), Proje tutarı: 38.775.240 (Sözleşme bedeli: 30.318.000 + KDV), Harcama: 20.115.711

Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: 2.000 kişilik, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2024, Proje tutarı: 149.768.369, Harcama: 149.768.369

Lüleburgaz Kapalı Yüzme Havuzu Yapımı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: Yarı olimpik, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2024, Proje tutarı: 19.525.196, Harcama: 16.861.001



Kırklareli Tıp Fakültesi



Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi



Babaeski Sarı Saltuk Kültür Evi



Kırklareli Merkez Yayla Mahallesi 728 ada 40 parselde bulunan yapı restore edilmiş, geçici kabulü yapılmış ve yapı kullanım izni alınmıştır



Kırklareli Spor Salonu



Lüleburgaz Spor Salonu



Lüleburgaz Yüzme Havuzu



Demirköy spor salonu



Üsküp Spor Tesisi



Evrensekiz Spor Tesisi



Büyükmandıra Spor Tesisi



AlpuluFitness Salonu



Kavaklı



Kırklareli Armağan

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki inşaat (%)	Açıklamalar
		Eğitim				1.257.312.135	175.741.981	515.672.476	450.503.142	435.273.498	84		
		İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				260.452.047	18.904.306	108.971.247	101.292.272	91.987.650	84		
		İl Millî Eğitim Müdürlüğü				260.452.047	18.904.306	108.971.247	101.292.272	91.987.650	84		
		Anaokulu İnşaatları (24 drs)				68.044.000	1.061.670	16.932.331	9.253.356	5.659.454	33		
319	0000000-000	B.eski TOBB Anaokulu İnşaatı (6 drs)	DG	2020	2023	11.494.000	1.061.670	10.432.330	7.753.356	5.659.454	54	75	DE
320	0000000-000	L.burgaz TOBB Anaokulu İnşaatı (6 drs)	DG	2022	2023	14.685.000	0	6.500.000	1.500.000	0	0	0	PA
321	0000000-000	L.burgaz Dt. Şeyma Biran (Dere Mah.) Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı (12 drs)	Öİ	2022	2023	41.865.000	0	1	0	0	0	40	DE
		İlkokul İnşaatları (16 drs)				32.688.047	9.950.100	22.737.947	22.737.947	22.737.947	100		
322	0000000-000	K.eli Bademlik (Camikebir) Mah. İlkokulu Yapımı (16 drs)	Öİ	2021	2023	32.688.047	9.950.100	22.737.947	22.737.947	22.737.947	100	100	BT
		Ortaokul İnşaatları (48 drs)				104.235.000	8.708	22.328.447	22.328.447	19.495.247	87		
323	0000000-000	K.eli İstiklal Ortaokulu İnşaatı (24 drs)	Öİ	2022	2024	52.290.000	8.708	19.328.447	19.328.447	19.328.447	100	60	DE
324	0000000-000	B.eski Ortaokulu İnşaatı (24 drs)	Öİ	2022	2023	51.945.000	0	3.000.000	3.000.000	166.800	6	0	PA
		Diğerleri				55.485.000	7.883.828	46.972.522	46.972.522	44.095.002	94		
325	0000000-000	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim Kurumları Bakım ve Onarımları	GB	2023	2023	55.485.000	7.883.828	46.972.522	46.972.522	44.095.002	94	100	BT
		Mesleki ve Teknik Eğitim				302.705.000	82.128	63.705.000	27.322.872	21.397.850	34		
		İl Millî Eğitim Müdürlüğü				302.705.000	82.128	63.705.000	27.322.872	21.397.850	34		
		Lise İnşaatları (40 derslik)				280.800.000	82.128	41.800.000	5.417.872	169.440	0		
326	2010H02-373-185175	K.eli OSB Mesleki ve Teknik Lise (16 derslik + 3 Atölye + Spor Salonu)	GB	2021	2024	148.000.000	0	14.800.000	0	0	0	0	İA
327	2010H02-373-67440	Lülieburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı (24 derslik, 3 atölye, spor salonu)	GB	2015	2024	132.800.000	82.128	27.000.000	5.417.872	169.440	1	0	İA
		Diğerleri				21.905.000	0	21.905.000	21.905.000	21.228.410	97		
328	0000000-000	Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Bakım ve Onarımları	GB	2023	2023	21.905.000	0	21.905.000	21.905.000	21.228.410	97	100	BT
		Yüksek Öğretim				329.441.841	56.261.315	106.841.842	89.073.434	89.073.434	83		
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				320.600.000	56.261.315	98.000.001	80.231.594	80.231.594	82		
		Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				500.000	0	500.000	0	0	0		
329	2023H03-212770	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2023	2023	500.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
		Muhtelif İşler				35.000.000	0	35.000.000	32.179.687	32.179.687	92		
330	2023H03-212772	Muhtelif Bakım ve Onarımlar	ÖB	2023	2023	3.500.000	0	3.500.000	2.796.170	2.796.170	80	100	BT
331	2023H03-212772	Makine Teçhizat, Okul ve Büro Mefruşatı, Demirbaş, Bilgisayar, Yazılım ve Taht Alımı	ÖB	2023	2023	30.000.000	0	30.000.000	28.304.439	28.304.439	94	100	BT
332	2023H03-212772	Rektörlük ve Bağlı Birimleri Mekanik ve Elektrik Bakım ve Onarımı	ÖB	2023	2023	1.500.000	0	1.500.000	1.079.078	1.079.078	72	100	BT
		Kampus Altyapısı				5.600.000	0	4.500.000	375.795	375.795	8		
333	2020H03-151237	Kayalı Yerleşkesi Kampüs Girişinden Camiye Kadar Olan Hatın Peyzaj ve Aydınlatması	ÖB	2021	2023	1.100.000	1.059.035	1	0	0	0	100	BT
334	2020H03-151237	Kayalı Yerleşkesi Enerji ve Haberleşme Hattı Altyapısı	ÖB	2023	2023	4.500.000	0	4.500.000	375.795	375.795	8	100	BT
		Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı				276.500.000	55.500.000	55.000.000	44.676.266	44.676.266	81		
335	2009H03-1060	Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi İnşaatı (... derslik, 15.700 m2)	ÖB	2020	2024	126.500.000	55.202.280	45.000.000	43.723.466	43.723.466	97	99	DE
336	2009H03-1060	Kütüphane ve Kültür Merkezi (10.000 m2)	ÖB	2023	2025	150.000.000	0	10.000.000	952.800	952.800	10	0	HB
		Yayın Alımları				3.000.000	0	3.000.000	2.999.846	2.999.846	100		
337	2023H03-212768	Yayın Alımları	ÖB	2023	2023	3.000.000	0	3.000.000	2.999.846	2.999.846	100	100	BT
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				8.841.841	0	8.841.841	8.841.840	8.841.840	100		
338	0000000-000	Yükseköğretim Öğrenci Yurtları Bakım ve Onarımı	GB	2023	2023	8.841.840	0	8.841.840	8.841.840	8.841.840	100	100	BT
339	0000000-000	Vize Yüksekokul Öğrenci Yurdu Yapımı	GB	2023	2024	1	0	1	0	0	0	0	PA

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	gerçekleşme (%)	gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Kültür				75.590.641	27.414.275	47.031.265	46.355.639	46.355.639	99			
		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				43.825.398	10.093.150	33.662.249	33.449.902	33.449.902	99			
340	1976H04-53	L.burgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı (2.555 m2)	GB	2017	2023	26.462.854	10.093.150	16.369.704	16.369.704	16.369.704	100			DE
341	1976H04-53	Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı	GB	2022	2023	260.000	0	260.000	47.655	47.655	18	100		BT
342	0000000-000	Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı	GB	2023	2023	345.836	0	345.836	345.836	345.836	100	100		BT
343	0000000-000	B.eski San Saltuk Kültür Evi Yapım	Öİ	2022	2023	16.686.707	0	16.686.707	16.686.707	16.686.707	100			DE
344	0000000-000	Eski Eser Restorasyonlarına Yardım	GB	2023	2023	1	0	1	0	0	0	0	0	HB
345	0000000-000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım	GB	2023	2023	70.000	0	1	0	0	0	0	0	HB
		İl Özel İdaresi				31.765.243	17.321.125	13.369.016	12.905.737	12.905.737	97			
346	0000000-000	K.eli Tarihi Gar Binasının Röleve ve Restorasyon Projelerinin Uygulanması	DG	2020	2023	6.572.574	6.500.601	71.973	0	0	0	100		BT
347	0000000-000	K.eli Kocahıdır İlköğretim Okulu Röleve Restitüsyon ve Restorasyonu	Öİ	2020	2023	1.071.000	0	1	0	0	0			DE
348	0000000-000	K.eli Yapraklı Mahallesindeki Taşınmazın Restitüsyon ve Restorasyonu	Öİ	2019	2023	10.831.004	8.468.877	2.362.127	2.362.127	2.362.127	100	100		BT
349	0000000-000	B.eski Sinanlı Osmanlı Çeşmesi Onarımı	Öİ	2018	2023	93.500	0	93.500	0	0	0	0	0	PA
350	0000000-000	L.burgaz Oklağı Camii Bakım ve Onarımı	DG	2018	2023	302.302	22.302	280.000	0	0	0	0	0	DE
351	0000000-000	Pınarhisar Kalesi ve Surları Koruma Planı Yapımı	DG	2020	2023	225.000	220.896	1	0	0	0	0	0	DE
352	0000000-000	Pınarhisar Poyralı Camii Bakım ve Onarımı	DG	2021	2023	104.304	0	104.304	86.500	86.500	83			DE
353	0000000-000	Vize Hükümet Konağı Röleve ve Restitüsyon Projesi	DG	2021	2023	12.565.559	2.108.449	10.457.110	10.457.110	10.457.110	100			DE
		Beden Eğitimi ve Spor				289.122.606	73.079.957	189.123.122	186.458.925	186.458.925	99			
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				289.122.606	73.079.957	189.123.122	186.458.925	186.458.925	99			
354	0000000-000	K.eli Spor Salonu Yapımı	GB	2015	2023	38.775.240	20.115.711	1	0	0	0	70		YK
355	0000000-000	K.eli Kavaklı Açık Basketbol Sahası Yapımı	GB	2023	2023	900.000	0	900.000	900.000	900.000	100	100		BT
356	0000000-000	K.eli Üsküp Spor Tesisi Yapımı	GB	2023	2023	13.526.817	0	13.526.817	13.526.817	13.526.817	100	100		BT
357	0000000-000	K.eli Armağan Spor Alanı Üzerinin Kapatılması	DG	2021	2023	907.170	0	907.170	907.170	907.170	100	100		BT
358	0000000-000	B.eski Alpullu Fitness Salonu Yapımı	GB	2023	2023	3.872.202	0	3.872.202	3.872.202	3.872.202	100	100		BT
359	0000000-000	B.eski Büyükmandıra Spor Tesisi Yapımı	GB	2023	2023	13.715.956	0	13.715.956	13.715.956	13.715.956	100	100		BT
360	0000000-000	Demirköy Spor Salonu Yapımı	GB	2023	2024	26.049.695	0	26.049.695	26.049.695	26.049.695	100	75		DE
361	0000000-000	Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı (2000 seyircili)	DG	2021	2023	149.768.369	47.339.050	102.429.319	102.429.319	102.429.319	100	99		DE
362	0000000-000	Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı	DG	2021	2023	19.525.196	5.625.196	13.900.000	11.235.805	11.235.805	81	60		DE
363	0000000-000	Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım ve Onarımı	DG	2021	2023	8.260.000	0	1	0	0	0	0	0	PA
364	0000000-000	L.burgaz Evrensekiz Spor Tesisi Yapımı	GB	2023	2023	13.821.961	0	13.821.961	13.821.961	13.821.961	100	100		BT

sağlık

Proje sayısı: 17, Proje tutarı: 2.205.961.212

Önceki yıllar harcaması: 131.054.372, 2023 yılı harcaması: **232.362.404**

İl Sağlık Müdürlüğü

- İl / ilçe sağlık müdürlüğü (Kırklareli, Babaeski, Lüleburgaz **bitti**) **3 adet (1'i bitti)**
- Hastane (Kırklareli)
- Toplum Sağlığı Merkezi (Kırklareli)
- Aile Sağlığı Merkezi (Kırklareli, Kırklareli 6 **bitti**, Babaeski, Babaeski Atatürk, Alpullu, İğneada. Lüleburgaz 1, Lüleburgaz 2 **bitti**, Lüleburgaz 6, Lüleburgaz Özden Gökçe **bitti**, Büyükkarıştıran, Pınarhisar) **12 adet (3'ü bitti)**
- 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (Kırklareli, Babaeski, Babaeski Atatürk, Alpullu, Demirköy, İğneada, Lüleburgaz **bitti**, Lüleburgaz 1, Lüleburgaz 1, Lüleburgaz (prefabrik), Büyükkarıştıran, Pınarhisar) **12 adet (1'i bitti)**
- Sağlık Evi (K.eli Dolhan)
- Sağlıklı Hayat Merkezi (Babaeski, Lüleburgaz 1, Lüleburgaz **bitti**) **3 adet (1'i bitti)**
- Halk Sağlığı Laboratuvarı (Kırklareli)

2023 yılında biten işler

Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası
Kırklareli 6 Nolu Pınar Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi
Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi
Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi
Lüleburgaz 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu
Lüleburgaz Sağlıklı Hayat Merkezi

Kırklareli Sağlık Kompleksi İnşaatı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ, Başlama ve bitiş tarihi: 2014 – 2023, Proje tutarı: 280.427.692, Harcama: 280.427.692, Fiziki gerçekleşme: yüzde 98

Babaeski Sağlık Kompleksi İnşaatı

İlçesi: Babaeski, Karakteristiği: İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi + Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ, Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2025, Proje tutarı: 122.225.000, Harcama: 0, ihale aşamasındadır.

Lüleburgaz Sağlık Kompleksi İnşaatı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATipi) + Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ, Başlama ve bitiş tarihi: 2014 – 2023, Harcama: 57.684.582, İnşaat tamamlanmış ve hizmete açılmıştır.



Kırklareli Sağlık Kompleksi



Lüleburgaz Sağlık Kompleksi



Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi



Kırklareli 6 Nolu Pınar Mah. Aile Sağlığı Merkezi

Babaeski Devlet Hastanesi bünyesinde mevcut 9 yataklı olarak hizmet veren Palyatif Bakım Merkezi hastanedeki modern yeni ve nitelikli alanında 02.10.2023 tarihinde hizmete alındı. İl düzeyinde Palyatif Bakım Merkezi hizmet sunumunu 4 hastanede toplam 51 yatak ile sürdürülmektedir. 2023 yılında ilk 9 ayda palyatif bakım hizmetinden 692 hasta yararlanmıştır.



Babaeski 4 nolu Atatürk mah.aile sağlığı merkezi



Lüleburgaz 6 nolu aile sağlığı merkezi



Kırklareli OSB'nde kurulan 112 ASH İstasyonunda kullanılmak üzere Kırklareli OSB tarafından tam donanımlı acil sağlık ambulansı alındı. Mevcut 53 acil sağlık ambulansı sayısı 54 oldu.

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki inşaat (%)	Açıklamalar
		Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü				2.205.961.212	131.054.372	232.371.066	232.362.404	232.362.404	100		
		Hastane İnşaatları				2.205.961.212	131.054.372	232.371.066	232.362.404	232.362.404	100		
		Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ İnşaatları				1.562.500.000	0	1	0	0	0	0	
365	2018100-145138	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)	GB	2018	2025	1.562.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ İnşaatları				180.100.885	1.583.781	23.553.177	23.553.171	23.553.171	100		
366	2006100-823-133235	K.eli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) İnşaatı	GB	2014	2025	6.664.928	1.518.781	5.146.147	5.146.147	5.146.147	100	100	BT
367	2006100-823-133280	Babaeski Atatürk Mahallesi 4 Nolu ASM + 112 ASHİ	GB	2023	2024	12.654.320	0	5.802.968	5.802.968	5.802.968	100	45	DE
368	2006100-823-133280	Babaeski Alpullu 3 Hekimli ASM + 112 ASHİ	GB	2021	2024	11.500.000	0	178.174	178.174	178.174	100	0	İA
369	20161001500	D.köy İlneada Aile Sağlığı Merkezi (2AHB) + 112 ASHİ	GB	2022	2025	12.250.000	0	1	0	0	0	0	İA
370	20161001500	Demirköy 112 ASHİ	GB	2022	2023	1.939.927	0	1	0	0	0	0	İA
371	2006100-166421-166448	L.burgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (SHB (B) + 8 AHB + 112 ASHİ (2 ad))	GB	2014	2024	105.500.000	65.000	178.174	178.174	178.174	100	0	İA
372	2006100-823-133235	L.burgaz 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)	GB	2018	2024	12.247.708	0	12.247.708	12.247.708	12.247.708	100	85	DE
373	0000000-000	L.burgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	DG	2021	2023	1	0	1	0	0	0	100	BT
374	0000000-000	L.burgaz 112 ASHİ Demontaj ve Montajı	GB	2023	2024	1.594.000	0	1	0	0	0	80	DE
375	0000000-000	L.burgaz B.kanştran Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB + 112 ASHİ)	DG	2023	2024	1	0	1	0	0	0	0	PA
376	20161001500	Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu	GB	2021	2025	15.750.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğer İnşaatlar				463.310.874	129.470.591	208.768.435	208.768.433	208.768.433	100		
377	2006100-166421-166445	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ)	GB	2014	2023	280.427.692	81.301.007	199.126.685	199.126.685	199.126.685	100	98	DE
378	2006100-166421-166451	Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü + Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + SHM + 112 ASHİ	GB	2016	2025	122.225.000	65.000	1	0	0	0	0	İA
379	20161001500	Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATİPİ) + Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ	GB	2014	2023	57.684.582	48.042.834	9.641.748	9.641.748	9.641.748	100	100	BT
380	2006100-823-133246	Kırklareli Dolhan Sağlık Evi	GB	2014	2024	2.973.600	61.750	1	0	0	0	0	İA
		Diğer				49.453	0	49.453	40.800	40.800	83		
381	0000000-000	Sağlık Birimleri Büyük Onarımları	GB	2023	2023	49.453		49.453	40.800	40.800	83	100	BT

dkh iktisadi

Proje sayısı: 12, Proje tutarı: 95.236.120

Önceki yıllar harcaması: 23.504.920, 2023 yılı harcaması: **21.254.887**

Genel İdare

Valilik

- Demirköy Hükümet Konağı İnşaatı
- Hükümet Konakları Bakım Onarımı
- Doğal Afet Giderleri

Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü

- Kırklareli Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaatı

Dereköy Gümrük Müdürlüğü

- Dereköy Gümrük Kapısının Modernizasyonu

Güvenlik Hizmetleri

İl Emniyet Müdürlüğü

- Hizmet Binası Bakım ve Onarımları
- Kent Güvenlik Sistemi Çevre Güvenlik Kamera Sistemi, Plaka Tanıma Sistemi ve Bilişim Kurulum Sistemi
- Malzeme Alımı ile Diğer Bakım ve Onarımlar

İl Özel İdaresi

- Okullara Kent Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması
- Köy Güvenlik Kamera Sistemleri Bakım ve Onarımı

Demirköy Hükümet Konağı İnşaatı

İlçesi: Demirköy, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2024, Proje tutarı: 57.723.240, Harcama: 16.282.512, TOKİ tarafından yapılmaktadır.

Kırklareli Tapu ve Kadastro Hizmet Binası İnşaatı

İlçesi: Merkez, TOKİ tarafından yapılmaktadır.



Demirköy Hükümet Konağı



Tapu ve Kadastro Hizmet Binası

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	Para sal 2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		DKH İktisadi Genel İdare Valilik				95.236.120	23.504.920	30.290.472	21.254.888	21.254.887	70	
						81.067.629	22.715.174	16.911.727	16.697.227	16.697.227	99	
						80.575.345	22.715.174	16.419.443	16.282.512	16.282.512	99	
382	0000000-000	D.köy Hükümet Konağı Yapımı (3.258 m2)	GB	2022	2024	57.723.240	0	16.282.512	16.282.512	16.282.512	100	DE
383	0000000-000	L.burgaz Hükümet Konağı Bakım ve Onanımı	GB	2021	2023	116.601	0	116.601	0	0	0	DE
384	0000000-000	Vize Hükümet Konağı Bakım ve Onanımı	GB	2021	2023	20.329	0	20.329	0	0	0	DE
385	0000000-000	Doğal Afet Giderleri	GB	2018	2023	22.715.175	22.715.174	1	0	0	0	DE
		Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü				1	0	1	0	0	0	
386	0000000-000	Kırklareli Tapu ve Kadastro Hizmet Binası Yapımı	DS	2022	2023	1	0	1	0	0	0	27 DE
		Dereköy Gümrük Müdürlüğü				492.283	0	492.283	414.715	414.715	84	
387	0000000-000	Dereköy Gümrük Kapısının Modernizasyonu	GB	2023	2023	492.283	0	492.283	414.715	414.715	84	DE
		Güvenlik Hizmetleri İl Jandarma Komutanlığı				14.168.491	789.746	13.378.745	4.557.661	4.557.660	34	
						700.000	0	700.000	24.192	24.192	3	
388	0000000-000	Vize İlçe Jandarma K.lığı Etüd Proje İşleri	GB	2023	2023	700.000	0	700.000	24.192	24.192	3	DE
		İl Emniyet Müdürlüğü				11.578.491	0	11.578.491	4.071.430	4.071.429	35	
389	0000000-000	Emniyet Hizmet Binaları Bakım ve Onarımları	GB	2023	2023	6.750.800	0	6.750.800	1	0	0	HB
390	0000000-000	Malzeme Alımı ile Diğer Bakım ve Onarımlar	GB	2023	2023	827.691	0	827.691	71.429	71.429	9	DE
391	0000000-000	Kent Güvenlik Sistemi Çevre Güvenlik Kamera Sistemi Plaka Tanımlı Sistemi ve Bilgişim Kurulum Sistemi	GB	2023	2023	4.000.000	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000	100	100 BT
		İl Özel İdaresi				1.890.000	789.746	1.100.254	462.039	462.039	42	
392	0000000-000	Köy Güvenlik Kamera Sistemleri Bakım ve Onanımı	Öİ	2023	2023	1.000.000	0	1.000.000	462.039	462.039	46	100 BT
393	0000000-000	Okullara Kent Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	Öİ	2018	2023	890.000	789.746	100.254	0	0	0	DE

dkh sosyal

Proje sayısı: 148, Proje tutarı: 1.459.454.757

Önceki yıllar harcaması: 478.759.344, 2023 yılı harcaması: **470.387.953**

İçmesuyu

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- İçmesuyu tesisleri (Alpullu bitti, İğneada bitti, Pınarhisar bitti) 3 adet 3'ü de bitti
- İçmesuyu arıtma tesisleri (Alpullu bitti, İğneada bitti) 2 adet 2'si de bitti
- Malzeme alımı (Kavaklı bitti, Büyükmandıra bitti) 2 adet 2'si de bitti

İl Özel İdaresi

- Köy içmesuyu yapım bakım ve onarımları 37 / 46 köy

Kanalizasyon

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Kanalizasyon tesisleri (Alpullu bitti, Pınarhisar bitti) 2 adet 2'si de bitti
- Atıksu arıtma tesisleri (Çakıllı bitti, Kıyıköy) 2 adet 1'i bitti
- Yağmursuyu tesisleri (Pınarhisar bitti) 1 adet bitti

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

- Kırklareli Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımı

İl Özel İdaresi

- Köy kanalizasyonu yapım bakım ve onarımları 10 / 14 köy

Kırsal Alan Planlaması

İl Özel İdaresi

- Köy işleri

Belediye Hizmetleri

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Pınarhisar Güneş Enerji Santrali

2023 yılında biten işler

Alpullu İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi
İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi
Pınarhisar İçmesuyu

Alpullu Kanalizasyonu
Pınarhisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu
Çakıllı Paket Atıksu Arıtma Tesisi

Şehirleşme

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- İmar planları: Babaeski, Ahmetbey

TOKİ Başkanlığı

- Kırklareli Millet Bahçesi
- Pınarhisar Millet Bahçesi

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

- Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Altyapı İnşaatı
- Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı
- Lüleburgaz Büyükkarıştırıcı Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatı
- Lüleburgaz Büyükkarıştırıcı Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
- Lüleburgaz Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Altyapı (Kanalizasyon ve Yağmursuyu) İnşaatı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Kırklareli Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi

Teknolojik Araştırma

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

- Gıda Odak Alan İhtisaslaşma Projesi

Afetler

İl Özel İdaresi

- Acil Arama ve Kurtarma Hizmetleri

Sosyal İçerme

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

- Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası (Etüd - proje)
- Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m²)
- Kırklareli Çocuk Evleri Sitesi
- Kırklareli Huzurevi İhata Duvarı Yapımı
- Kırklareli Huzurevi Röleve Projesi Hazırlanması **Bitti**
- Kırklareli İl Müdürlüğü Hizmet Binası Data Telefon Kurulumu **Bitti**
- Kırklareli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Hizmet Binası Elektrik, Telefon ve İnternet İşleri **Bitti**
- Kırklareli İl Müdürlüğü ve Kırklareli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Hizmet Binası Doğal Gaz Dönüşümü **Bitti**
- Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Tefrişatı **Bitti**
- Vize Sosyal Hizmet Merkezi Bakım ve Onarımı **Bitti**

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

- Kırklareli Gençlik Merkezi Bakım ve Onarımı **Bitti**
- Vize Gençlik Merkezi Yapımı **Bitti**

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü**İçmesuyu İnşaatları**

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: İçmesuyu ve içmesuyu arıtma tesisi yapımı, Başlama ve bitiş tarihi: 2019 – 2023, Harcama: 97.324.569

Alpullu İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı **Bitti**
İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı **Bitti**
Pınarhisar İçmesuyu İnşaatı **Bitti**

Kanalizasyon İnşaatları

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: Kanalizasyon ve kanalizasyon arıtma tesisi yapımı ve yağmursuyu inşaatı, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Proje tutarı: 139.015.405, Harcama: 132.031.441

Alpullu Kanalizasyon İnşaatı **Bitti**
Pınarhisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı **Bitti**
Çakıllı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı **Bitti**
Kıyıköy Kanalizasyonu Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

İl Özel İdaresi**Köy İçmesuları**

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: 46 köy, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2023, Proje tutarı: 16.858.831, Harcama: 14.575.752

İl Özel İdaresi: 16 / 23 köy, 8.328.831 / 9.348.831
KÖYDES: 21 / 23 köy, 6.264.921 / 7.510.000

İçme suyu sağlayan tesislerdeki 218 abonenin elektrik enerji maliyetlerini ortadan kaldırmak için Karakoç Köyünde kurulacak "Güneş Enerji Santrali Tesisi" yapım çalışmaları devam etmektedir.

Köy Kanalizasyonları

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: 14 köy, Başlama ve bitiş tarihi: 2023 – 2023, Proje tutarı: 2.790.711, Harcama: 2.328.139

İl Özel İdaresi: 4 / 6 köy, 850.000 / 1.340.000
KÖYDES: 6 / 8 köy, 1.478.139 / 1.450.711



Alpullu içmesuyu



İğneada içmesuyu



Pınarhisar



Çakıllı paket atıksu arıtma tesisi



Kıyıköy paket atıksu arıtma tesisi



K.eli Karakoç Güneş Enerji Santrali



Ürnlü kuyu sondajı



Merkez Kuzulu içmesuyu 4.200 metrelik isale hattı yenilendi.



Vize Kışlacık içmesuyu 4.000 metre ilave isale hattı döşendi.

Kırkireli Millet Bahçesi

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanları yapımı, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2024

TOKİ tarafından yapılmaktadır. Yeşillikler içerisinde, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacaktır. Mevcut yeşil alan 3 kat arttıracaktır.

Pınarhisar Millet Bahçesi

İlçesi: Pınarhisar, TOKİ tarafından yapılmaktadır.

Kırkireli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Altyapı İnşaatı

İlçesi: Merkez, Başlama ve bitiş tarihi: 2005 – 2023, Harcama: 171.803.966

Yolların altyapısı tamamlanarak betonla kaplanmış, dere ıslahı yapılmış, atık su arıtma tesisinin ek yapıları ile doğal gaz ve içme suyu tesisleri bitirilmiştir.

Son 3 yılda; Beton Yollar, Kuşaklama Kanalı, 2800m³/gün Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi, 8. Bulvar Peyzaj Düzenlemesi, Giriş Kapı Düzenlemesi, OSB Yönlendirme Projesi işleri yapılmış ve bitirilmiştir.

Kırkireli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı

İlçesi: Merkez, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2024, Harcama: 233.042.474

OSB İlave Alan Yer Seçim ve İmar Planı yapılmış ve bitirilmiştir. Ayrıca, idari ve sosyal tesisler alanı tasarım projesi hazırlanmıştır.

Güvenlik Duvarı ve Çit Yapımı, İdari Bina Yapımı, Kreş Yapımı, Cami Yapımı, Rekreasyon Alanı Yapımı, Restoran ve Büfe Yapımı, İtfaiye, 112 Acil ve Jandarma Merkezi Yapımı, Elektrik ve Doğalgaz İşletme Binaları Yapımı, İlave Alan Altyapı Yapımı, GES, RES Fizibilite Çalışmaları devam etmektedir.

Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Altyapı ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

İlçesi: Lüleburgaz, Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2024, Harcama: 134.372.866

Altyapı ihalesi yapılmıştır. Tutarı 175 milyon liradır. Tamamı kredilendirilmiştir. Kanalizasyon, içmesuyu, yağmursuyu ve yollar yapılacaktır. Müteahhit tarafından 01.09.2022 tarihinden itibaren saha çalışmalarına başlanmıştır. 84.696.703 lira harcama yapılmıştır.

Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı yapım ihalesi yapılmıştır. Tutarı 197 milyon liradır. Tamamı kredilendirilmiştir. Müteahhit tarafından 15.11.2022 tarihinden itibaren saha çalışmalarına başlanmıştır. 49.676.163 lira harcama yapılmıştır.



Kırklareli Millet Bahçesi



Pınarhisar Millet Bahçesi





Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi



Büyükkarıştıran OSB Atıksu Arıtma Tesisi



Pınarhisar güneş enerji santrali



Vize Gençlik Merkezi

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		DKH Sosyal İşler Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				1.459.454.757	478.759.344	562.515.556	471.454.916	470.387.953	84	95	
						114.183.408	75.939.587	37.873.824	35.978.734	35.978.734	95	100	
						97.324.577	75.939.587	21.384.990	21.384.982	21.384.982	100	100	
394	0000000-000	K.eli Kavaklı İçmesuyu Temiz Su Hattı Kangal Boru Alımı	İB	2023	2023	153.400	0	153.400	153.400	153.400	100	100	BT
395	0000000-000	B.eski Alpulu İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2020	2023	10.643.971	10.593.075	50.896	50.892	50.892	100	100	BT
396	0000000-000	B.eski Büyükmandıra İçmesuyu İsale Hattı Polietilen İçme Su Boruları Bağlantı Parçaları Alımı	İB	2023	2023	249.392	0	249.392	249.392	249.392	100	100	BT
397	0000000-000	D.köy İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2019	2023	24.877.814	23.946.512	931.302	931.298	931.298	100	100	BT
398	0000000-000	Pınarhisar İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2023	61.400.000	41.400.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				9.348.831	0	8.978.834	8.328.831	8.328.831	93	93	
		İçmesuyu (16 / 23 adet)				9.348.831	0	8.978.834	8.328.831	8.328.831	93	93	
399	0000000-000	K.eli Ahmetçe İçmesuyu Su Deposu Yapımı	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
400	0000000-000	K.eli Armağan İçmesuyu Bakım ve Onarımı ile Boru Alımı	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
401	0000000-000	K.eli Dereköy İçmesuyu Kaptaj Yapımı ve Depo Bağlantısı	Öİ	2022	2023	50.000	0	1	0	0	0	0	DE
402	0000000-000	K.eli Düzorman İçmesuyu Tesisi Yenilemesi	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
403	0000000-000	K.eli Koruköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
404	0000000-000	K.eli Kula İçmesuyu Sondaj Pompasının Değiştirilmesi	Öİ	2023	2023	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	DE
405	0000000-000	K.eli Kuzulu İçmesuyu Su Deposu Yapımı	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
406	0000000-000	K.eli Ahmetçe - Karakoç İçmesuyu Sondaj Pompasının Değiştirilmesi	Öİ	2023	2023	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100	100	DE
407	0000000-000	B.eski Köyleri İçmesuyu Pompa Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	0	0	0	0	DE
408	0000000-000	D.köy Beğendik İçmesuyu Tesisi	Öİ	2023	2023	5.512.371	0	5.512.371	5.512.371	5.512.371	100	100	BT
409	0000000-000	D.köy Limanköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2023	2023	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100	100	BT
410	0000000-000	Koçgaz Ahmetler İçmesuyu Su Deposu Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
411	0000000-000	Koçgaz Tastede İçmesuyu Su Deposu Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	BT
412	0000000-000	L.burgaz Eskibedir İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	Öİ	2023	2023	230.000	0	230.000	230.000	230.000	100	100	BT
413	0000000-000	L.burgaz Müsellim İçmesuyu Klor Makinesi Alımı	Öİ	2023	2023	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
414	0000000-000	L.burgaz Sakızköy İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	Öİ	2023	2023	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
415	0000000-000	L.burgaz Turgutbey İçmesuyu Klor Makinesi Alımı	Öİ	2023	2023	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
416	0000000-000	P.köy Akarca İçmesuyu Su Deposu Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	0	0	0	0	DE
417	0000000-000	P.köy Köyleri İçmesuyu Pompa Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	0	0	0	0	DE
418	0000000-000	P.hisar Ataköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2023	2023	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100	100	BT
419	0000000-000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu İlave Su Deposu Yapımı	Öİ	2023	2023	352.230	0	352.230	352.230	352.230	100	100	BT
420	0000000-000	P.hisar Osmanlık İçmesuyu İlave Su Deposu Yapımı	Öİ	2023	2023	352.230	0	352.230	352.230	352.230	100	100	BT
421	0000000-000	Vize Aksidim İçmesuyu ve Sondaj Enerji Bağlantısı	Öİ	2023	2023	250.000	0	250.000	0	0	0	0	DE
422	0000000-000	Vize Kışlacık İçmesuyu Kuyu Sondajı ve Bağlantısı	Öİ	2022	2023	300.000	0	1	0	0	0	0	İA
423	0000000-000	Vize Serger İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2023	20.000	0	1	0	0	0	0	İA
		KÖYDES (21 / 23)				7.510.000	0	7.510.000	6.264.921	6.264.921	83	83	
424	0000000-000	K.eli Ahmetçe İçmesuyu Gömme Su Deposu (100 m3) Yapımı	KP	2023	2023	830.000	0	830.000	822.419	822.419	99	100	BT
425	0000000-000	K.eli Çeşmeköy - Karahamza İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	99.951	99.951	100	100	BT
426	0000000-000	K.eli Demircihali İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	600.000	0	600.000	382.800	382.800	64	100	BT
427	0000000-000	K.eli Koruköy İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2023	2023	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100	100	BT
428	0000000-000	K.eli Ürünli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2023	2023	450.000	0	450.000	401.282	401.282	89	100	BT
429	0000000-000	B.eski Çiğdemli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2023	2023	0	0	0	588.000	588.000	100	100	BT
430	0000000-000	B.eski Ertuğral İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	500.000	0	500.000	396.000	396.000	79	100	BT
431	0000000-000	B.eski Karamesutlu İçmesuyu Su Deposu Onarımı ve Terfi - İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2023	2023	250.000	0	250.000	0	0	0	0	DE
432	0000000-000	B.eski Nacak İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	0	0	0	0	0	100	100	BT
433	0000000-000	B.eski Nadrılı İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	150.000	0	150.000	148.561	148.561	99	100	BT
434	0000000-000	B.eski Taşagül İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	800.000	0	800.000	548.700	548.700	69	100	BT
435	0000000-000	B.eski Yenimahalle İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	400.000	0	400.000	336.000	336.000	84	100	BT
436	0000000-000	Koçgaz Ahmetler İçmesuyu Su Deposu Bakım ve Onarımı	KP	2023	2023	250.000	0	250.000	198.000	198.000	79	100	BT
437	0000000-000	L.burgaz Ayvalı İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	650.000	0	650.000	563.730	563.730	87	100	BT
438	0000000-000	L.burgaz Celaliye İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	57.000	57.000	57	100	BT
439	0000000-000	L.burgaz Düğüncübaşı İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	80.000	0	80.000	45.000	45.000	56	100	BT
440	0000000-000	L.burgaz Eskibedir İçmesuyu Şebeke Hattı Boru Değişimi	KP	2023	2023	500.000	0	500.000	165.000	165.000	33	100	BT
441	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	300.000	0	300.000	272.964	272.964	91	100	BT
442	0000000-000	L.burgaz Kırıkköy İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	300.000	0	300.000	149.105	149.105	50	100	BT
443	0000000-000	L.burgaz Oklağlı İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2023	2023	500.000	0	500.000	436.600	436.600	87	100	BT
444	0000000-000	P.köy Kuştepe İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2023	2023	0	0	0	218.200	218.200	100	100	BT
445	0000000-000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2023	2023	0	0	0	85.610	85.610	100	100	BT
446	0000000-000	Vize Aksidim İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2023	2023	400.000	0	400.000	0	0	0	0	DE

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal. leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		Kanalizasyon DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				156.806.116	81.768.669	60.037.334	52.590.911	52.590.911	88		
		DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				15.000.000	0	1	0	0	0	0	
447	2012K050150	K.eli Atıksu Arıtma Tesisi Bakım ve Onarımı	GB	2023	2025	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				139.015.405	81.768.669	57.246.622	50.262.772	50.262.772	88		
448	0000000-000	B.eski Alpullu Kanalizasyon İnşaatı	İB	2021	2023	36.131.073	36.130.958	1	0	0	0	100	BT
449	0000000-000	P.hisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	İB	2021	2023	62.329.416	41.479.291	20.850.125	20.850.125	20.850.125	100	100	BT
450	0000000-000	Vize Çakılı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2021	2023	4.447.604	4.158.420	289.184	289.184	289.184	100	100	BT
451	0000000-000	Vize Kiyıköy Kanalizasyonu Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2021	2023	36.107.312	0	36.107.312	29.123.463	29.123.463	81	77	DE
		İl Özel İdaresi				1.340.000	0	1.340.000	850.000	850.000	63		
		Kanalizasyon (4 / 6 adet)				1.340.000	0	1.340.000	850.000	850.000	63		
452	0000000-000	D.köy Köy Kanalizasyonları Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2023	90.000	0	90.000	0	0	0	0	HB
453	0000000-000	L.burgaz Celaliye Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
454	0000000-000	L.burgaz Çiftlikköy Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
455	0000000-000	L.burgaz Hamzabey Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2023	2023	400.000	0	400.000	0	0	0	0	HB
456	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2023	2023	350.000	0	350.000	350.000	350.000	100	100	BT
457	0000000-000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
		KÖYDES (6 / 8)				1.450.711	0	1.450.711	1.478.139	1.478.139	102		
458	0000000-000	B.eski Kuzuca'dağ Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	50.000	0	50.000	49.371	49.371	99	100	BT
459	0000000-000	B.eski Nacaz Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	43.096	43.096	43	100	BT
460	0000000-000	B.eski Nadirli Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	250.000	0	250.000	247.302	247.302	99	100	BT
461	0000000-000	B.eski Terzili Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	250.000	0	250.000	84.606	84.606	34	100	BT
462	0000000-000	Koçgaz Devletli'dağ Kanalizasyonu Şebeke Hattı Bakım ve Onarımı	KP	2023	2023	100.711	0	100.711	96.000	96.000	95	100	BT
463	0000000-000	P.köy Doğanca Kanalizasyonu İlave Şebeke Yapımı	KP	2023	2023	200.000	0	200.000	111.675	111.675	56	100	BT
464	0000000-000	Vize Çövenli Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2023	2023	400.000	0	400.000	573.900	573.900	143		DE
465	0000000-000	Vize Kömürköy Kanalizasyonu Şebeke Hattı Bakım ve Onarımı	KP	2023	2023	100.000	0	100.000	272.189	272.189	272		DE
		Kırsal Alan Planlaması İl Özel İdaresi				13.742.960	0	13.742.960	12.950.773	12.941.161	94		
		İl Özel İdaresi				13.742.960	0	13.742.960	12.950.773	12.941.161	94		
466	0000000-000	K.eli Köyleri Köy Konağı Yapım, Bakım ve Onarımı (7 köy)	Öİ	2023	2023	670.000	0	670.000	670.000	670.000	100	100	BT
467	0000000-000	K.eli Köyleri Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı (4 köy)	Öİ	2023	2023	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100	100	BT
468	0000000-000	K.eli Köyleri Tuvalet Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
469	0000000-000	K.eli Köyleri Çöp Konteynır Alımı	Öİ	2022	2023	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100	100	BT
470	0000000-000	B.eski Köyleri Köy Konağı Yapım, Bakım ve Onarımı (7 köy)	Öİ	2023	2023	630.000	0	630.000	630.000	630.000	100	100	BT
471	0000000-000	B.eski Köyleri Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı (5 köy)	Öİ	2023	2023	680.000	0	680.000	680.000	680.000	100	100	BT
472	0000000-000	B.eski Köyleri Cami Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
473	0000000-000	B.eski Köyleri Mezarlık Yapım, Bakım ve Onarımı (5 köy)	Öİ	2023	2023	410.000	0	410.000	410.000	410.000	100	100	BT
474	0000000-000	B.eski Köyleri Lojman Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
475	0000000-000	B.eski Köyleri Tuvalet Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	170.000	0	170.000	170.000	170.000	100	100	BT
476	0000000-000	B.eski Köyleri Çocuk Oyun Parkı Yapımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
477	0000000-000	B.eski Köyleri Çöp Toplama Hizmetleri	Öİ	2023	2023	300.000	0	300.000	200.000	200.000	67	100	BT
478	0000000-000	B.eski Köyleri Diğer Yapım, Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	600.000	0	600.000	600.000	600.000	100	100	BT
479	0000000-000	D.köy Köyleri Köy Konağı Yapım, Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2022	2023	310.000	0	310.000	310.000	310.000	100	100	BT
480	0000000-000	D.köy Köyleri Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
481	0000000-000	D.köy Köyleri Mezarlık Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
482	0000000-000	D.köy Köyleri Tuvalet Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	118.000	0	118.000	118.000	118.000	100	100	BT
483	0000000-000	D.köy Köyleri Çöp Konteynır Alımı	Öİ	2022	2023	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
484	0000000-000	D.köy Köyleri Yapım, Bakım ve Onarımları	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
485	0000000-000	Koçgaz Köyleri Köy Konağı Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
486	0000000-000	Koçgaz Köyleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2023	2023	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100	100	BT
487	0000000-000	Koçgaz Köyleri Cami Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
488	0000000-000	Koçgaz Köyleri Tuvalet Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	110.000	0	110.000	110.000	110.000	100	100	BT
489	0000000-000	Koçgaz Köyleri Lojman Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
490	0000000-000	Koçgaz Köyleri Diğer Yapım, Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	365.000	0	365.000	365.000	365.000	100	100	BT
491	0000000-000	L.burgaz Köyleri Köy Konağı Yapım, Bakım ve Onarımı (5 köy)	Öİ	2023	2023	390.000	0	390.000	390.000	390.000	100	100	BT
492	0000000-000	L.burgaz Köyleri Atatürk Büstü Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
493	0000000-000	L.burgaz Köyleri Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2023	2023	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100	100	BT
494	0000000-000	L.burgaz Köyleri Güvenlik Kamerası Takılması (1 köy)	Öİ	2023	2023	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para salı %	Fiziki gerçekleşme %	Açıklamalar
495	0000000-000	L.burgaz Köyleri Tuvalet Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100	100	BT
496	0000000-000	L.burgaz Köyleri Mezarlık Yapım, Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
497	0000000-000	L.burgaz Köyleri Gasilhane Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
498	0000000-000	L.burgaz Köyleri Lojman Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
499	0000000-000	L.burgaz Köyleri Çocuk Oyun Parkı Yapım, Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2023	2023	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT
500	0000000-000	L.burgaz Köylerine Çöp Konteynır Alımı (1 köy)	Öİ	2022	2023	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
501	0000000-000	L.burgaz Köyleri Bekleme Durağı Yapım, Bakım ve Onarımı (9 köy)	Öİ	2023	2023	500.000	0	500.000	500.000	500.000	100	100	BT
502	0000000-000	L.burgaz Köyleri Araç Yıkama Makinesi Alımı (16 adet)	Öİ	2022	2023	640.000	0	640.000	345.088	345.088	54	100	BT
503	0000000-000	P.köy Köylerine Atatürk Büstü Yapımı (2 köy)	Öİ	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
504	0000000-000	P.köy Köyleri Diğer Yapım, Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100	100	BT
505	0000000-000	P.hisarar Köyleri Köy Konağı Yapım, Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2022	2023	530.000	0	530.000	530.000	520.388	98	100	BT
506	0000000-000	P.hisarar Köyleri Sosyal Tesis Yapım, Bakım ve Onarımı (3 köy)	Öİ	2023	2023	400.000	0	400.000	400.000	400.000	100	100	BT
507	0000000-000	P.hisarar Köyleri Çöp Konteynırın Alımı (14 köy, 36 adet)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
508	0000000-000	P.hisarar Köyleri Yapım, Bakım ve Onarımları	Öİ	2023	2023	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
509	0000000-000	Vize Köyleri Köy Konağı Yapım, Bakım ve Onarımı (1 köy)	Öİ	2023	2023	200.000	0	200.000	100.000	100.000	50	100	BT
510	0000000-000	Vize Köyleri Lojman Yapım, Bakım ve Onarımı	Öİ	2023	2023	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
511	0000000-000	Vize Köyleri Çöp Toplama Hizmetleri	Öİ	2023	2023	398.000	0	398.000	398.000	398.000	100	100	BT
512	0000000-000	Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyonu	Öİ	2023	2023	1.000.000	0	1.000.000	854.337	854.337	85	100	BT
513	0000000-000	Köylere Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Grubu Kurulumu	Öİ	2023	2023	391.960	0	391.960	240.348	240.348	61	100	BT
Belediye Hizmetleri						74.682.391	3.238.447	54.997.553	49.797.572	49.797.572	91		
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						74.682.391	3.238.447	54.997.553	49.797.572	49.797.572	91		
514	0000000-000	Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Ön İşlem Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması	İB	2021	2023	236.000	18.472	217.528	0	0	0	75	DE
515	0000000-000	K.eli Karakoç Güneş Enerji Santrali Tesisi Yapımı	İB	2023	2023	65.182.800	0	50.000.000	49.797.572	49.797.572	100	70	DE
516	0000000-000	Pınarhisar Güneş Enerji Santrali Yapımı	İB	2021	2023	9.263.591	3.219.975	4.780.025	0	0	0	36	YK
Şehirci						1.033.031.022	305.649.806	373.835.888	304.624.803	304.624.803	81		
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						247.564	156.075	2	0	0	0		
517	0000000-000	B.eski İmar Planı	İB	2018	2023	141.482	71.210	1	0	0	0	50	YK
518	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey İmar Planı	İB	2017	2023	106.082	84.865	1	0	0	0	80	YK
TOKİ Başkanlığı						24.100.001	0	2	0	0	0		
519	0000000-000	Kırklareli Millet Bahçesi	GB	2022	2023	24.100.000	0	1	0	0	0	97	DE
520	0000000-000	Pınarhisar Millet Bahçesi	GB	2022	2023	1	0	1	0	0	0	80	DE
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü						958.683.457	305.258.519	370.251.938	304.624.803	304.624.803	82		
521	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnş.	DG	2022	2024	303.683.457	163.431.520	140.251.937	140.251.937	140.251.937	100		DE
522	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2023	175.000.000	141.803.966	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	98	DE
523	2013C33-1916	L.burgaz Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatı	DG	2020	2024	175.000.000	0	100.000.000	84.696.703	84.696.703	85		DE
524	2013C33-1916	L.burgaz Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	DG	2020	2024	200.000.000	23.033	100.000.000	49.676.163	49.676.163	50		DE
525	2013C33-1916	L.burgaz Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Altyapı (Kanalizasyon ve Yağmursuyu) İnşaatı	DG	2020	2024	105.000.000	0	1	0	0	0	0	PA
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						50.000.000	235.212	3.583.946	0	0	0		
526	0000000-000	Kırklareli Kavaklı Tanırma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi	DG	2021	2023	50.000.000	235.212	3.583.946	0	0	0	0	PA
Teknolojik Araştırma Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü						20.965.619	11.965.619	9.000.000	3.000.000	3.000.000	33		
Gıda Odak Alan. İhtisaslaşma Projesi						20.965.619	11.965.619	9.000.000	3.000.000	3.000.000	33		
527	2021K12-169139	Gıda Odak Alan. İhtisaslaşma Projesi	ÖB	2021	2025	20.965.619	11.965.619	9.000.000	3.000.000	3.000.000	33		DE
Afetler İl Özel İdaresi						811.533	0	811.533	474.447	474.447	58		
Acil Arama ve Kurtarma Hizmetleri						811.533	0	811.533	474.447	474.447	58		
528	0000000-000	Kırklareli Huzurevi İhata Duvar Yapımı	Öİ	2023	2023	811.533	0	811.533	474.447	474.447	58	100	BT
Sosyal İçerme						45.231.708	197.216	12.216.464	12.037.672	10.980.325	90		
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü						37.854.634	197.216	4.839.390	4.660.602	3.603.251	74		
529	2018K170390	K.eli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası (Etüd - proje)	GB	2018	2023	498.263	0	1	0	0	0	0	HB
530	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m ²)	GB	2014	2023	33.000.000	0	680.234	501.448	501.448	74	0	HB
531	0000000-000	K.eli Çocuk Evleri Sitesi	GB	2023	2025	1	0	1	0	0	0	0	HB
532	0000000-000	Kırklareli Huzurevi İhata Duvar Yapımı	GB	2022	2023	429.619	0	429.619	429.619	0	0	0	HB
533	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Röleve Projesi Hazırlanması	GB	2022	2023	216.334	0	216.334	216.334	166.000	77	100	BT
534	0000000-000	K.eli İl Md.lüğü Hizmet Binası Data Telefon Yapısal Kabloleme ve Sistem Odası Yapımı	GB	2023	2023	353.720	0	353.720	353.720	312.269	88	100	BT
535	0000000-000	K.eli Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası Data Telefon Yapısal Kabloleme ve Sistem Odası Yapımı	GB	2023	2023	336.580	0	336.580	336.580	204.000	61	100	BT
536	0000000-000	K.eli Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Hizmet Binası Elektrik, Telefon ve İnternet İşleri	GB	2023	2023	203.364	0	203.364	203.364	178.217	88	100	BT
537	0000000-000	K.eli İl Md.lüğü ve K.eli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Hizmet Binası Doğalgaz Dönüşümü	GB	2023	2023	1.924.642	0	1.924.642	1.924.642	1.556.269	81	100	BT
538	0000000-000	Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Tefrisatı	GB	2022	2023	241.906	197.216	44.690	44.690	43.470	97	100	BT
539	0000000-000	Vize Sosyal Hizmet Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2023	2023	650.205	0	650.205	650.205	641.578	99	100	BT
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü						7.377.074	0	7.377.074	7.377.074	7.377.074	100		
540	0000000-000	K.eli Gençlik Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2023	2023	1.485.242	0	1.485.242	1.485.242	1.485.242	100	100	BT
541	0000000-000	Vize Gençlik Merkezi Yapımı (Mahalle Tipi)	GB	2023	2023	5.891.832	0	5.891.832	5.891.832	5.891.832	100	100	BT

belediyeler

Proje sayısı: 63, Proje tutarı: 447.072.865

Önceki yıllar harcaması: 159.891.444, 2023 yılı harcaması: **161.863.581**

Sıra No	Sektör	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçekteleşme (%)
	Toplam	63	447.072.865	159.891.444	226.430.951	168.612.139	161.863.581	71
1	Kırklareli	4	32.965.000	0	32.965.000	30.089.364	30.089.364	91
2	İnece	0	0	0	0	0	0	0
3	Kavaklı	0	0	0	0	0	0	0
4	Üsküp	4	2.337.000	0	2.337.000	1.802.480	1.802.480	77
5	Babaeski	2	13.900.000	0	13.900.000	5.130.968	5.130.968	37
6	Alpullu	1	11.750.000	0	11.750.000	11.750.000	11.750.000	100
7	Büyükmandıra	8	3.741.841	72.000	3.669.841	1.425.841	1.299.493	35
8	Karahalil	0	0	0	0	0	0	0
9	Demirköy	4	13.753.433	230.000	13.523.433	11.469.073	11.469.073	85
10	İğneada	0	0	0	0	0	0	0
11	Koçgaz	3	1.660.000	0	1.660.000	0	0	0
12	Lüleburgaz	15	242.411.049	149.277.020	62.383.055	52.338.302	52.338.302	84
13	Ahmetbey	7	21.153.336	0	21.153.336	0	0	0
14	Büyükkaştıran	3	13.592.000	0	12.392.500	12.392.500	12.392.500	100
15	Evrensekiz	1	3.060.802	0	3.060.802	2.593.900	2.593.900	85
16	Pehlivan köyü	5	42.635.914	3.690.214	10.145.704	10.111.733	10.111.733	100
17	Pınarhisar	2	20.200.210	6.622.210	13.578.000	11.414.742	4.792.532	35
18	Kaynarca	0	0	0	0	0	0	0
19	Vize	4	23.912.280	0	23.912.280	18.093.236	18.093.236	76
20	Çakıllı	0	0	0	0	0	0	0
21	Kıyıköy	0	0	0	0	0	0	0



Kırklareli



Üsküp



Üsküp sıcak asfalt yol yapımı



Üsküp kanalizasyon çalışmaları



Demirköy yol yapımı



Demirköy içmesuyu



Demirköy Bal Dolum Tesisi



Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi



Lüleburgaz



Lüleburgaz



Lüleburgaz Solar Çamur Kurutma Tesisi



Lüleburgaz Kent Ormanı



Lüleburgaz Yüzme Havuzu



Lüleburgaz Yeni Mezarlık ve Dua Kubbesi



Lüleburgaz Balkan Evi



Büyükkarıştıran kapalı pazar yeri



Evrensekiz



Evrensekiz park yapımı



Pehlivan köy yol yapımı



Pınarhisar yol yapımı



Pınarhisar Spor Kompleksi



Pınarhisar Seracılık ve Kuluçka Merkezi



Vize beton yol yapımı



Vize Geçici Hayvan Barınağı yapımı

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçeğe leşme (%)	Fiziki gerçeğe leşme (%)	Açıklama Malar
		Kırklareli				32.965.000	0	32.965.000	30.089.364	30.089.364	91		
		Ulaştırma				32.965.000	0	32.965.000	30.089.364	30.089.364	91		
1	0000000-000	K.eli Şehirçi Yolları Sıcak ve Soğuk Asfalt Yapımı	BL	2023	2023	13.935.000	0	13.935.000	13.131.643	13.131.643	94	100	BT
2	0000000-000	K.eli Şehirçi Yolları Taş Tozu Mıdır Meknik Malzeme Mal Alımı	BL	2023	2023	7.560.000	0	7.560.000	5.487.721	5.487.721	73	100	BT
3	0000000-000	K.eli Şehirçi Yolları Aydınlatma Direği Alımı	BL	2023	2023	5.360.000	0	5.360.000	5.360.000	5.360.000	100	100	BT
4	0000000-000	K.eli Şehirçi Yolları Asfalt Malzemesi Plent Altı Alımı	BL	2023	2023	6.110.000	0	6.110.000	6.110.000	6.110.000	100	100	BT
		Üsküp				2.337.000	0	2.337.000	1.802.480	1.802.480	77		
		Ulaştırma				320.000	0	320.000	173.060	173.060	54		
5	0000000-000	Üsküp Şehirçi Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	320.000	0	320.000	173.060	173.060	54	54	DE
		İçmesuyu				400.000	0	400.000	154.940	154.940	39		
6	0000000-000	Üsküp İçmesuyu Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	400.000	0	400.000	154.940	154.940	39	39	DE
		Kanalizasyon				83.000	0	83.000	79.985	79.985	96		
7	0000000-000	Üsküp Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	83.000	0	83.000	79.985	79.985	96	96	DE
		Diğerleri				1.534.000	0	1.534.000	1.394.495	1.394.495	91		
8	0000000-000	Üsküp Yapım ve Onarım İşleri	BL	2023	2023	1.534.000	0	1.534.000	1.394.495	1.394.495	91	91	DE
		Babaeski				13.900.000	0	13.900.000	5.130.968	5.130.968	37		
		Ulaştırma				10.000.000	0	10.000.000	5.130.968	5.130.968	51		
9	0000000-000	B.eski Şehirçi Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	10.000.000	0	10.000.000	5.130.968	5.130.968	51	100	BT
		Diğerleri				3.900.000	0	3.900.000	0	0	0		
10	0000000-000	Babaeski Spor Sahası Zeminlerinin Yenilenmesi	BL	2023	2023	3.900.000	0	3.900.000	0	0	0	0	PA
		Alpullu				11.750.000	0	11.750.000	11.750.000	11.750.000	100		
		Ulaştırma				11.750.000	0	11.750.000	11.750.000	11.750.000	100		
11	0000000-000	Alpullu Şehirçi Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	11.750.000	0	11.750.000	11.750.000	11.750.000	100		DE
		Büyükmandıra				3.741.841	72.000	3.669.841	1.425.841	1.299.493	35		
		Ulaştırma				500.000	0	500.000	0	0	0		
12	0000000-000	B.mandıra Şehirçi Yol Yapımı ve Bakımı Mekanik ve Taş Tozu Alımı	BL	2023	2023	500.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
		İçmesuyu				275.000	0	275.000	275.000	222.393	81		
13	0000000-000	B.mandıra İçmesuyu Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları (Malzeme Alımı)	BL	2023	2023	275.000	0	275.000	275.000	222.393	81	100	BT
		Kanalizasyon				100.000	0	100.000	100.000	26.259	26		
14	0000000-000	B.mandıra Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarım Çalışmaları	BL	2023	2023	100.000	0	100.000	100.000	26.259	26	26	DE
		Diğerleri				2.866.841	72.000	2.794.841	1.050.841	1.050.841	38		
15	0000000-000	B.mandıra Çocuk Oyun Grubu Alımı	BL	2023	2023	1.000.000	0	1.000.000	256.000	256.000	26	100	BT
16	0000000-000	B.mandıra Çöp Konteyneri Alımı	BL	2021	2023	372.000	72.000	300.000	0	0	0	0	HB
17	0000000-000	B.mandıra Kültür Parkı Kafeterya Binası Yapımı	BL	2023	2023	600.000	0	600.000	0	0	0	0	HB
18	0000000-000	B.mandıra Kültür Parkı Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
19	0000000-000	B.mandıra Kapalı Pazar Yeri Malzeme Alımı	BL	2023	2023	794.841	0	794.841	794.841	794.841	100	100	BT
		Demirköy				13.753.433	230.000	13.523.433	11.469.073	11.469.073	85		
		Ulaştırma				9.000.000	0	9.000.000	6.945.640	6.945.640	77		
20	0000000-000	D.köy Şehirçi Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	9.000.000	0	9.000.000	6.945.640	6.945.640	77	77	BT
		İçmesuyu				1.803.305	0	1.803.305	1.803.305	1.803.305	100		
21	0000000-000	D.köy İçme Suyu Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	1.803.305	0	1.803.305	1.803.305	1.803.305	100	100	BT
		Kanalizasyon				714.380	0	714.380	714.380	714.380	100		
22	0000000-000	D.köy Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	714.380	0	714.380	714.380	714.380	100	100	BT
		Diğerleri				2.235.748	230.000	2.005.748	2.005.748	2.005.748	100		
23	0000000-000	D.köy Bal Dolum Tesisi Yapımı	BL	2023	2023	2.235.748	230.000	2.005.748	2.005.748	2.005.748	100	96	BT
		Koçgaz				1.660.000	0	1.660.000	0	0	0		
		Ulaştırma				1.220.000	0	1.220.000	0	0	0		
24	0000000-000	Koçgaz Şehirçi Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	1.220.000	0	1.220.000	0	0	0	0	HB
		İçmesuyu				220.000	0	220.000	0	0	0		
25	0000000-000	Koçgaz İçme Suyu Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	220.000	0	220.000	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				220.000	0	220.000	0	0	0		
26	0000000-000	Koçgaz Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	220.000	0	220.000	0	0	0	0	HB
		Lüleburgaz				242.411.049	149.277.020	62.383.055	52.338.302	52.338.302	84		
		Ulaştırma				60.807.417	21.818.267	32.200.001	30.664.519	30.664.519	95		
27	0000000-000	L.burgaz Şehirçi Yollar Parke Taş Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2021	2022	8.500.000	0	1.750.000	1.702.425	1.702.425	97		DE
28	0000000-000	L.burgaz Şehirçi Yollar Asfalt Kapalma Yapımı	BL	2021	2022	26.948.444	19.948.444	7.000.000	6.969.510	6.969.510	100	100	BT
29	0000000-000	L.burgaz Şehirçi Bozulan Yolların Bakım ve Onarımı	BL	2022	2023	2.408.973	808.973	1.600.000	1.178.257	1.178.257	74	100	BT
30	0000000-000	L.burgaz Şehirçi Bozulan Yolların Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	7.100.000	0	7.100.000	6.793.222	6.793.222	96	100	BT
31	0000000-000	L.burgaz Şehirçi Yolları Parke Taş Kaplaması ve Emrullah Efendi Caddesi Bakım ve Onarımı	BL	2023	2023	4.750.000	0	4.750.000	4.715.379	4.715.379	99	100	BT

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2023 yılı programı (TL)	2023 yılında gönderilen ödenek (TL)	2023 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
32	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Yeni Yollar Açılması Hafriyatı, Dolgu Malzemesi Temini ve Serilmesi	BL	2023	2023	10.000.000	0	10.000.000	9.305.726	9.305.726	93	100	BT
33	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Yolları Çizgi Uygulaması İçmesuyu	BL	2022	2023	1.100.000	1.060.850	1	0	0	0	100	BT
34	0000000-000	L.burgaz İçmesuyu Su Abonelerinde Kullanılmak Üzere Akıllı Su Sayacı ve Mekaniz Su Sayacı Alımı	BL	2021	2023	2.329.320	1.678.549	1	0	0	0	100	BT
		Kanalizasyon				32.609.944	21.153.561	11.000.000	4.914.095	4.914.095	45		
35	0000000-000	L.burgaz Kanal Açma Hizmetleri Diğerleri	BL	2021	2024	32.609.944	21.153.561	11.000.000	4.914.095	4.914.095	45	80	DE
36	0000000-000	Lülebürgaz Yıldızları Sanat Akademisi	BL	2016	2023	146.664.368	104.626.643	19.183.053	16.759.688	16.759.688	87		
37	0000000-000	L.burgaz Solar Çamur Kurutma Tesisi Yapımı	BL	2021	2023	113.215.110	96.535.857	1	0	0	0	100	BT
38	0000000-000	L.burgaz Kent Ormanı Alan Düzenlemesi ve Kır Kahvesi Binası Yapımı	BL	2022	2023	8.879.855	2.879.855	1	0	0	0	100	BT
39	0000000-000	L.burgaz Açık Yüzme Havuzu Yapımı ve Süs Havuzu Bakım ve Onarımı	BL	2022	2023	6.500.000	3.589.281	2.752.656	2.752.656	2.752.656	100	100	BT
40	0000000-000	L.burgaz Evrensekiz Yolu Mezarlık Düzenlemesi	BL	2022	2023	1.769.753	889.358	880.395	880.395	880.395	100	100	BT
41	0000000-000	L.burgaz Balkan Evi Binası, Çevre Yapıları Yapımı ve Alan Düzenlemesi	BL	2023	2023	1.299.650	732.292	550.000	399.863	399.863	73	100	BT
		Ahmetbey				15.000.000	0	15.000.000	12.726.774	12.726.774	85		DE
		Ulaştırma				13.208.896	0	13.208.896	0	0	0		
42	0000000-000	Ahmetbey Şehiriçi Yollar Stabilize Kaplama Yapımı	BL	2023	2023	1.757.360	0	1.757.360	0	0	0	0	HB
43	0000000-000	Ahmetbey Şehiriçi Yollar Stabilize Kaplama Yapımı	BL	2023	2023	3.264.786	0	3.264.786	0	0	0	0	HB
44	0000000-000	Ahmetbey Şehiriçi Yollar Tretuvar Düzenlemesi Diğerleri	BL	2023	2023	8.186.750	0	8.186.750	0	0	0	0	HB
45	0000000-000	Ahmetbey Park Yapımı	BL	2023	2023	7.944.440	0	7.944.440	0	0	0		
46	0000000-000	Ahmetbey Spor Tesisi Yapımı	BL	2023	2023	1.900.000	0	1.900.000	0	0	0	0	HB
47	0000000-000	Ahmetbey 18. Madde Uygulaması	BL	2023	2023	4.875.000	0	4.875.000	0	0	0	0	HB
48	0000000-000	Ahmetbey Kamulaştırma	BL	2023	2023	410.987	0	410.987	0	0	0	0	HB
		Büyükkarıştıran				758.453	0	758.453	0	0	0	0	HB
		Ulaştırma				1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	100		
49	0000000-000	Büyükkarıştıran Şehiriçi Yol Yapımı (Kilit Taş, Prizma Taş ve Bordür Taşı Alımı)	BL	2023	2023	1.147.000	0	1.147.000	1.147.000	1.147.000	100	100	BT
		Diğerleri				12.445.000	0	11.245.500	11.245.500	11.245.500	100		
50	0000000-000	Taşıt Kantarı Alınması (60 Ton Kapasiteli, 3x16 mt Zemin Üstü)	BL	2023	2023	450.000	0	450.000	450.000	450.000	100	100	BT
51	0000000-000	Çelik Konstrüksiyon Pazayeri Alanı Yapılması	BL	2023	2023	11.995.000	0	10.795.500	10.795.500	10.795.500	100	90	DE
		Evrensekiz				3.060.802	0	3.060.802	2.593.900	2.593.900	85		
		Diğerleri				3.060.802	0	3.060.802	2.593.900	2.593.900	85		
52	0000000-000	Evrensekiz 100. Yıl Parkı Düzenlemesi	BL	2023	2023	3.060.802	0	3.060.802	2.593.900	2.593.900	85	100	BT
		Pehlivanköy				42.635.914	3.690.214	10.145.704	10.111.733	10.111.733	100		
		Ulaştırma				21.135.914	3.690.214	10.145.702	10.111.733	10.111.733	100		
53	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Asfalt Kaplama Yapımı	BL	2022	2023	10.145.700	0	10.145.700	10.111.733	10.111.733	100	100	BT
54	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Meydan Düzenlemesi	BL	2022	2023	7.300.000	0	1	0	0	0	0	HB
55	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Kaldırım Düzenlemesi Diğerleri	BL	2022	2023	3.690.214	3.690.214	1	0	0	0	100	BT
56	0000000-000	P.köy Kültür Merkezi Yapımı	BL	2022	2024	21.500.000	0	2	0	0	0		
57	0000000-000	P.köy Küçük Sanayi Sitesi Yapımı	BL	2022	2024	7.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Pınarhisar				14.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				20.200.210	6.622.210	13.578.000	11.414.742	4.792.532	35		
58	0000000-000	Pınarhisar Seracılık ve Kuluçka Merkezi	BL	2021	2023	20.200.210	6.622.210	13.578.000	11.414.742	4.792.532	76		
59	0000000-000	Pınarhisar Belediyesi Spor Kompleksi	BL	2021	2023	6.030.000	0	6.030.000	3.866.742	3.866.742	64	100	BT
		Vize				14.170.210	6.622.210	7.548.000	7.548.000	925.790	12	100	BT
		Ulaştırma				17.912.280	0	17.912.280	14.145.386	14.145.386	79		
60	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Yol Yapımı (C25 hazır beton alımı)	BL	2023	2023	1.112.280	0	1.112.280	1.112.280	1.112.280	100	100	BT
61	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Yol Yapımı (C25 hazır beton alımı)	BL	2023	2023	4.800.000	0	4.800.000	2.955.000	2.955.000	62	75	DE
62	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Sathi Kaplama Yapımı Diğerleri	BL	2023	2023	12.000.000	0	12.000.000	10.078.106	10.078.106	84	87	DE
63	0000000-000	Vize Geçici Hayvan Barınağı Yapımı	BL	2023	2024	6.000.000	0	6.000.000	3.947.850	3.947.850	66	69	DE

