

T.C.
Kırkırelı Valılıęı
İl Planlama ve Koordinasyon M¼d¼rl¼ę¼

Kırkırelı İl Koordinasyon Kurulu
2014 Yılı 1. D¼nem Toplantısı

Kırkırelı İli 2013 Yılı Yatırımları D¼nem Deęerlendirme Raporu

Kırkırelı, 17 Ocak 2014

Kırkıareli İl Koordinasyon Kurulu
2014 Yılı 1. D nem Toplantısı
17 Ocak 2014

Kırkıareli İli
2013 Yılı Yatırımları
D nem Deęerlendirme
Raporu

İl Koordinasyon Kurulu'nun Sayın Üyeleri,

Değerli Basın Mensupları,

Kırklareli İli 2014 Yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na hoş geldiniz.

Değerli Kurul Üyeleri;

Yatırımcı Kuruluşlardan alınan Dönem Raporlarına göre;

2013 yılında, İlimizde 36 kamu kurum ve kuruluşunca 463 proje uygulanmıştır.

Bu projelerin toplam tutarı 1 milyar 921 milyon,
2013 yılı programı 335 milyon liradır.
Dönem sonu itibariyle 213 milyon lira harcama yapılmıştır.

Yüzde 64 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

170 proje tamamlanmıştır.
98 proje devam etmektedir.
32 proje ihale aşamasındadır.
163 projeye başlanmamıştır.

Belediyeler tarafından da toplam 55 milyon 684 bin liralık yatırım yapılmıştır.

Değerli Kurul Üyeleri;

Bu toplantımızda; söz alacak yetkililerin kurumsal faaliyet konuları ile ilgili özet değerlendirme yapmalarını ve yürüttükleri yatırım çalışmaları ile 2014 yılında yapmayı planladıkları işler hakkında kurulu bilgilendirmelerini rica ediyorum.

Bunun yanında; Kuruluş temsilcileri, kendi kuruluşlarına ait yatırımlar hakkında bilgi verirlerken, devam eden projelerin uygulanmasında karşılaşılan sorunları, koordinasyonu gerektiren işleri, hangi kurumlarla koordinasyona ihtiyaç duyduklarını dile getirebilirler.

Kırklareli İl Koordinasyon Kurulu 2014 Yılı 1. Dönem Toplantısı

Gündem

- 1 Açılış
- 2 Vali Sayın Mustafa YAMAN'ın Açış Konuşması
- 3 Kuruluşların 2013 Yılı Yatırımları Hakkında Bilgi Vermesi ve Bunlarla İlgili Soruları Cevaplamaları
- 4 Dilek ve Temenniler
- 5 Kapanış

Görüşme Sırası

1	Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü	25
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	9, 54
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	50, 52, 53, 57
4	İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	18, 30
5	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	15, 16, 17
6	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	15
7	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	16
8	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	17
9	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	17
10	İstanbul Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü	34, 58
11	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	34, 58
12	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	21, 30
13	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	19
14	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	40, 44
15	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	41
16	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	42
17	Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	50
18	Kadastro Müdürlüğü	50
19	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	20
20	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	22
21	EÜAŞ Genel Müdürlüğü	23
22	Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	21
23	BOTAŞ Şube Müdürlüğü	32
24	Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	59
25	İl Özel İdaresi	10, 14, 27, 34, 40, 41, 44, 49, 55, 57
26	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	11, 13, 18, 21
27	Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Md.lüğü	12
28	TMO Şube Müdürlüğü	12
29	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	35, 48, 50, 58
30	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	37, 40
31	İl Sağlık Müdürlüğü	45
32	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	60
33	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	57
34	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	43, 61
35	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	33, 42

İçindekiler

Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme 3

1 Genel Durum	3	4 Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme	5
2 Sektörlere Göre Değerlendirme	3	5 Kuruluşlara Göre Değerlendirme	6
3 İlçelere Göre Değerlendirme	4		

İkinci Bölüm: Sektörlere Göre Yatırım Projelerinin Durumu 7

1 Tarım	7	9 Eğitim	36
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	9	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	37
İl Özel İdaresi	10	İl Milli Eğitim Müdürlüğü	40
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	11	İl Özel İdaresi	40
Atatürk Top. Su ve Tar. M. A. İst.		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	40
Md.lüğü	12	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	41
TMO Şube Müdürlüğü	12	İl Özel İdaresi	41
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	13	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	42
İl Özel İdaresi	14	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	42
Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	15	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	43
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü ...	16	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	44
Vize Orman İşletme Müdürlüğü	17	İl Özel İdaresi	44
Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	17	10 Sağlık	45
İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve		İl Sağlık Müdürlüğü	45
Haberleşme Bölge Müdürlüğü	18	11 DKH / İktisadi	48
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	18	Valilik	48
2 Madencilik	19	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	48
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	19	Defterdarlık	49
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	20	İl Özel İdaresi	49
3 İmalat	21	İl Emniyet Müdürlüğü	49
Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	21	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	50
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	21	Kadastro Müdürlüğü	50
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	21	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	50
4 Enerji	22	Cumhuriyet Başsavcılığı	51
TEİAŞ 20. İl. Tes. ve İşlt. Grup Md.lüğü	22	12 DKH / Sosyal	51
EÜAŞ Genel Müdürlüğü	23	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	52
5 Ulaştırma	24	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	53
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	25	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	54
İl Özel İdaresi	27	İl Özel İdaresi	55
İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	57
Haberleşme Bölge Müdürlüğü	30	İl Özel İdaresi	57
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	30	Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	57
BOTAŞ Şube Müdürlüğü	32	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	58
7 Turizm	33	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ...	58
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	33	Sosyal Güvenlik İl Md.lüğü	59
Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ...	34	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ..	60
İl Özel İdaresi	34	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	61
8 Konut	35	13 KÖYDES Projesi	62
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	35		

Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları 66

0 Genel Durum	66	14 Ahmetbey Belediyesi	71
1 Kırklareli Belediyesi	67	15 Büyükkarıştıran Belediyesi	72
2 İnce Belediyesi	67	16 Evrensekiz Belediyesi	72
3 Kavaklı Belediyesi	67	17 Kırıkköy Belediyesi	72
4 Üsküp Belediyesi	68	18 Sakızköy Belediyesi	73
5 Babaeski Belediyesi	68	19 Pehlivan köy Belediyesi	73
6 Alpullu Belediyesi	68	20 Pınarhisar Belediyesi	73
7 Büyükmandıra Belediyesi	69	21 Kaynarca Belediyesi	74
8 Karahalil Belediyesi	69	22 Yenice Belediyesi	74
9 Sinanlı Belediyesi	69	23 Vize Belediyesi	74
10 Demirköy Belediyesi	70	24 Çakıllı Belediyesi	74
11 İğneada Belediyesi	70	25 Kırıkköy Belediyesi	75
12 Kofçaz Belediyesi	70	26 Sergen Belediyesi	5
13 Lüleburgaz Belediyesi	71		

Ekler 1

1 Kuruluşlara Göre Yatırımlar	3
-------------------------------------	---

**Kırklareli İli
2013 Yılı Yatırımları
Dönem Değerlendirme
Raporu**

Kamu Yatırımları

Yıllar	Proje Sayısı	Proje Tutarı (TL)	Yılı Ödeneği (TL)	Gelen Ödenek (TL)	Harcama Miktarı (TL)	Parasal Gerçekleşme Oranı (%)
2000	402	231.639.122	42.309.901	21.345.110	20.972.995	50
2001	356	275.417.450	52.291.665	44.115.661	43.713.823	84
2002	378	371.400.128	38.710.269	30.876.020	28.261.264	73
2003	295	415.104.468	42.240.789	31.159.119	29.322.428	69
2004	267	376.647.015	55.486.703	42.273.384	41.500.244	75
2005	272	445.585.047	76.282.590	49.573.985	45.839.530	60
2006	236	424.284.539	77.899.202	64.214.358	61.396.856	79
2007	282	710.626.831	83.483.015	71.950.549	69.816.905	84
2008	296	872.178.842	189.443.336	181.834.924	171.873.238	91
2009	279	972.825.035	174.382.297	163.102.034	154.340.154	89
2010	288	1.196.646.819	244.858.317	164.471.077	149.109.300	61
2011	373	1.331.026.608	279.436.964	185.561.810	160.820.711	58
2012	351	1.612.731.069	322.040.722	285.603.454	236.341.901	73
2013	463	1.920.969.323	334.625.872	245.781.389	213.471.558	64

Belediye Yatırımlarını kapsamaz.
KÖYDES ve BELDES Projeleri dahil değildir.

Sektörlere Göre Kamu Yatırımları

TL	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toplam yatırım miktarı	73.239.856	82.330.802	175.914.568	155.914.154	153.272.209	165.543.362	238.905.901	218.264.258
Sektörler toplamı	61.396.856	69.816.905	171.873.238	154.340.154	149.109.300	160.820.711	236.341.901	213.471.558
Tarım	8.626.765	8.145.566	9.861.641	6.532.502	9.325.820	20.815.931	28.342.884	39.353.678
Madencilik	9.953.283	17.364.796	84.228.525	19.534.000	14.756.000	26.054.464	113.722.121	9.227.067
İmalat	72.000	669.000	490.000	73.000	188.000	86.000	0	33.357
Enerji	15.686.425	9.894.073	19.125.651	50.633.539	14.313.586	8.751.528	4.927.275	23.798
Ulaştırma	15.957.157	18.023.110	44.972.940	53.798.709	89.828.724	76.248.176	44.168.410	50.072.627
Haberleşme	0	0	159.299	0	0	48.740	0	
Turizm	478.200	536.109	0	0	0	0	138.822	156.356
Konut	39.745	0	0	0	63.596	96.564	0	36.580
Eğitim	6.010.529	9.633.225	9.111.983	21.362.310	18.886.160	20.325.547	28.081.819	43.584.761
Sağlık	732.815	2.490.409	607.317	206.038	180.871	485.916	628.201	9.968.559
Diğer Kamu Hizmetleri	3.839.937	3.060.617	3.315.882	2.200.056	1.566.543	7.907.845	16.332.369	61.014.775
İktisadi	3.284.777	1.389.046	1.129.225	1.546.166	610.131	1.766.085	3.189.943	11.526.317
Sosyal	555.160	1.671.571	2.186.657	653.890	956.412	6.141.760	13.142.426	49.488.458
KÖYDES	11.843.000	10.284.000	2.098.000	1.574.000	4.162.909	4.722.651	2.564.000	4.792.700
BELDES	0	2.229.897	1.943.330	0	0	0	0	0

Belediye Yatırımlarını kapsamaz.

Yatırımların Dönemlere Göre Parasal Gerçekleşme Durumu

Yüzde	Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
2000		2				20			37			50
2001		6				43			78			84
2002		6				25			48			73
2003		8				24			44			69
2004		2				23			53			75
2005		4				15			30			60
2006		7				32			52			79
2007		11				38			57			84
2008		0		4				48				91
2009		3		13				56				89
2010		0		7				27			50	61
2011		6			10			27			53	58
2012		9			20			51			68	73
2013		3			15			36			64	


Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme

1 Genel Durum


2013 yılında, ilimizde 36 kamu kurum ve kuruluşunca 463 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 1.920.969.323 liradır. 2013 yılı programı 334.625.872 liradır. Bu ödenğin 245.781.389 lirası gönderilmiş, 213.471.558 lira harcama yapılmıştır. Yılı ödenğine göre yüzde 64, gönderilen ödenek miktarına göre yüzde 87 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

170 proje (% 37) tamamlanmış olup, 98 proje (% 21) devam etmektedir. 32 proje (% 7) ihale aşamasında olup, 163 projeye (% 35) başlanmamıştır.

2013 Yılı Yatırımları Program, Ödenek ve Harcama Durumu

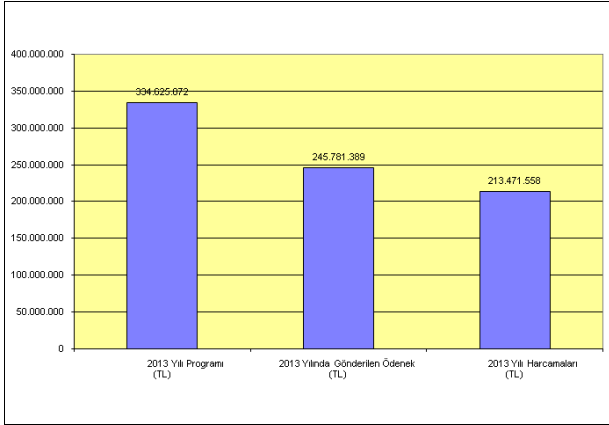

2013 Yılı Yatırımları Fiziki Gerçekleşme Durumu

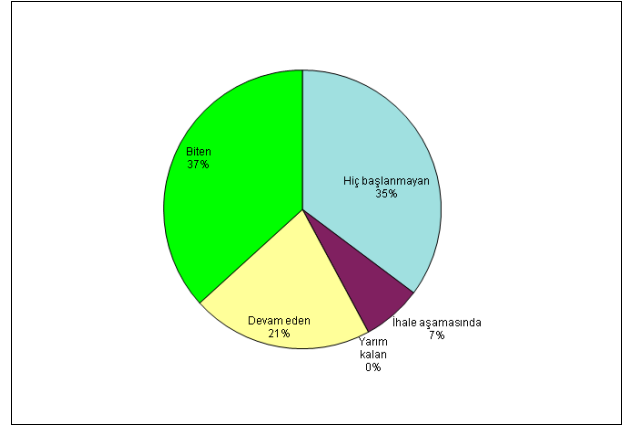

2 Sektörlere Göre Değerlendirme


Proje tutarına göre; 873.933.900 lira ile ulaştırma başta yer almaktadır. Bunu 270.875.084 lira ile tarım, 189.075.948 lira ile eğitim izlemektedir. 40.000 lira ile en az proje tutarına sahip sektör konuttur.

Yapılan harcama miktarına göre; 50.072.627 lira ile ulaştırma başta yer almaktadır. Bunu 49.488.458 lira ile diğer kamu hizmetleri/sosyal, 43.584.761 lira ile eğitim izlemektedir. Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 100 gerçekleşme ile konut başta yer almaktadır. Bunu yüzde 90 ile tarım, yüzde 82 ile ulaştırma izlemektedir.


2013 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		463	1.920.969.323	296.802.060	334.625.872	245.781.389	213.471.558	163	32	0	98	170	64
1	Tarım	114	270.875.084	32.511.971	43.800.117	40.391.679	39.353.678	36	5	0	15	58	90
2	Madencilik	9	38.037.000	981.472	29.388.410	28.008.000	9.227.067	0	0	0	5	4	31
3	İmalat	5	4.220.250	9.000	564.252	37.500	33.357	2	1	0	1	1	6
4	Enerji	23	184.291.950	737.950	22.490.348	100.798	23.798	6	10	0	3	4	0
5	Ulaştırma	102	873.933.900	184.739.715	60.911.606	52.362.605	50.072.627	19	3	0	16	64	82
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	6	6.227.000	0	2.927.001	1.656.356	156.356	2	0	0	2	2	5
8	Konut	1	40.000	0	36.580	36.580	36.580	0	0	0	0	1	100
9	Eğitim	42	189.075.948	59.038.163	73.956.625	50.826.819	43.584.761	12	4	0	17	9	59
10	Sağlık	17	147.964.380	8.127.340	15.430.422	10.747.976	9.968.559	6	4	0	6	1	65
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	144	206.303.811	10.656.449	85.120.511	61.613.076	61.014.775	80	5	0	33	26	72
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	26	28.010.321	1.572.461	16.962.360	11.678.197	11.526.317	5	1	0	10	10	68
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	118	178.293.490	9.083.988	68.158.151	49.934.879	49.488.458	75	4	0	23	16	73

2013 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu

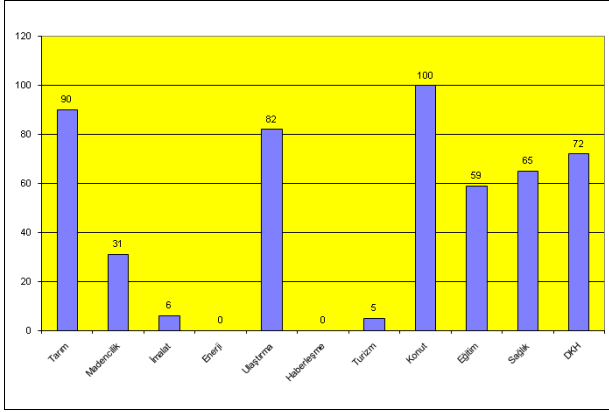

2013 Yılı Yatırım Harcamalarının Sektörlere Göre Dağılımı

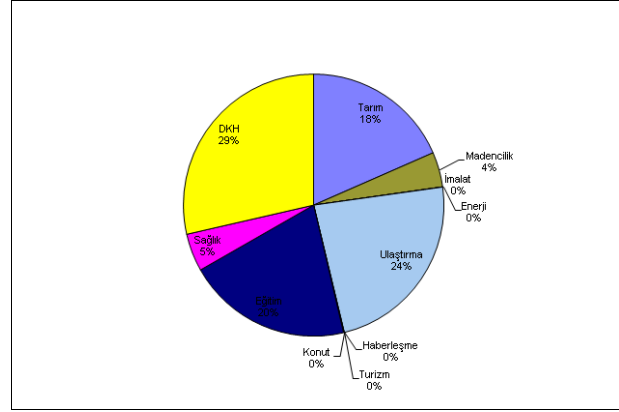

3 İlçelere Göre Değerlendirme

Proje tutarına göre; 759.712.916 lira ile çoklu ilçeler başta yer almaktadır. Bunu 469.198.167 lira ile Merkez ilçe, 323.437.247 lira ile Lüleburgaz ilçesi izlemektedir. En az proje tutarına sahip ilçe 576.002 lira ile Kofçaz ilçesidir.


Yapılan harcama miktarına göre; 67.695.840 lira ile Merkez ilçe başta yer almaktadır. Bunu 67.540.281 lira ile çoklu ilçeler, 32.180.066 lira ile Babaeski ilçesi izlemektedir.

Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 100 gerçekleşme ile Pehlivan köy ilçesi başta yer almaktadır. Bunu yüzde 69 ile Pınarhisar, yüzde 68'lik gerçekleşme oranlarıyla Demirköy izlemektedir.


2013 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada olan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		463	1.920.969.323	296.802.060	334.625.872	245.781.389	213.471.558	163	32	0	98	170	64
1	Merkez	92	469.198.167	181.383.788	92.510.020	74.583.587	67.695.840	35	8	0	22	27	73
2	Babaeski	53	171.441.473	45.813.037	48.270.428	32.904.094	32.180.066	22	5	0	9	17	67
3	Demirköy	24	45.308.579	19.058.950	10.548.324	9.334.835	7.811.935	8	1	0	2	13	74
4	Kofçaz	14	576.002	0	103.828	43.313	43.306	10	0	0	1	3	42
5	Lüleburgaz	97	323.437.247	2.818.625	49.913.914	12.194.516	10.415.617	42	6	0	17	32	21
6	Pehlivan köy	7	935.001	0	270.005	270.000	270.000	4	0	0	0	3	100
7	Pınarhisar	24	80.789.644	9.678.932	27.247.997	24.066.611	23.742.147	13	2	0	4	5	87
8	Vize	60	69.570.294	323.895	5.988.763	4.691.574	3.772.366	25	6	0	4	25	63
9	Çoklu İlçeler	92	759.712.916	37.724.833	99.772.593	87.692.860	67.540.281	4	4	0	39	45	68

2013 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Gerçekleşme Durumu

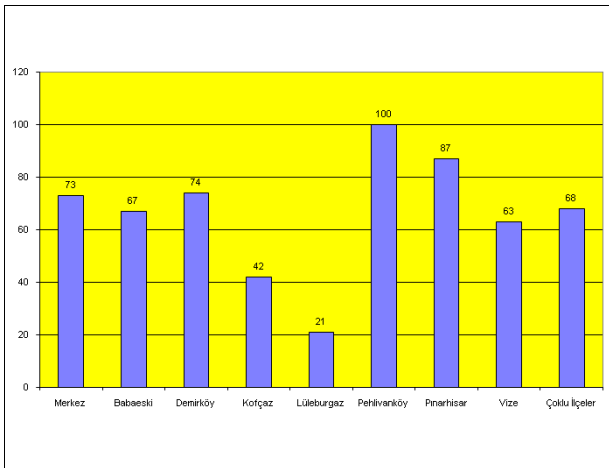

2013 Yılı Yatırım Harcamalarının İlçelere Göre Dağılımı

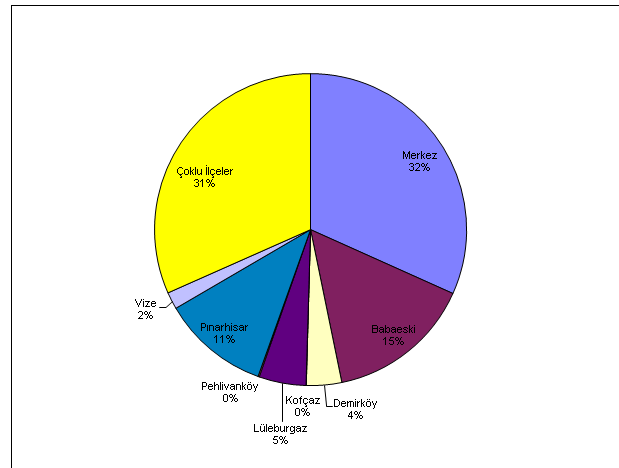

4 Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme

Proje tutarına göre; 1.381.696.893 lira genel bütçe başta yer almaktadır. Bunu 253.000.519 lira ile KİT'ler, 121.264.509 lira ile özel bütçe izlemektedir. En az proje tutarına sahip bütçe türü 3.807.000 lira ile döner sermayedir.


Yapılan harcama miktarına göre; 130.914.778 lira ile genel bütçe başta yer almaktadır. Bunu 27.745.522 lira ile Özel bütçe, 16.950.664 lira ile KİT'ler izlemektedir.

Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 89 ile döner sermaye, yüzde 80 ile genel bütçe ve yüzde 77'lik gerçekleşme oranıyla özel bütçe başta yer almaktadır.


2013 Yılı Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	463	1.920.969.323	296.802.060	334.625.872	245.781.389	213.471.558	163	32	0	98	170	64
1	Genel bütçe	190	1.381.696.893	209.474.978	163.863.558	137.816.615	130.914.778	45	14	0	46	85	80
2	Özel bütçe	22	121.264.509	55.342.000	36.085.194	32.020.447	27.745.522	6	0	0	7	9	77
3	KİT	53	253.000.519	22.181.747	68.123.719	35.814.087	16.950.664	9	13	0	17	14	25
4	Özelleştirme kapsamına alınan KİT	3	3.836.000	9.000	180.002	0	0	2	0	0	1	0	0
5	İller Bankası	28	91.909.143	2.900.233	27.832.397	13.809.366	13.809.367	3	3	0	15	7	50
6	Döner sermaye	21	3.807.000	0	3.807.000	3.379.222	3.379.222	0	0	0	0	21	89
7	Sosyal güvenlik kurumları	2	6.159.194	1.000.000	2.774.194	774.194	774.194	0	0	0	1	1	28
8	İl Özel İdaresi	127	27.410.158	370.972	9.137.902	5.688.726	4.052.875	98	1	0	8	20	44
9	Kalkınma Ajansı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Diğerleri	17	31.885.907	5.523.130	22.821.906	16.478.732	15.844.936	0	1	0	3	13	69

2013 Yılı Yatırımlarının Bütçelere Göre Gerçekleşme Durumu

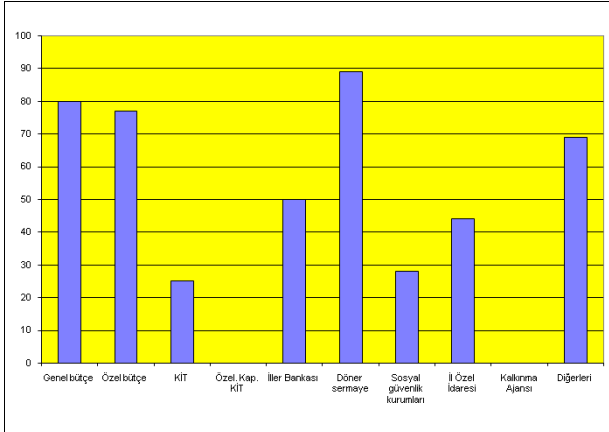

2013 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçelere Göre Dağılımı

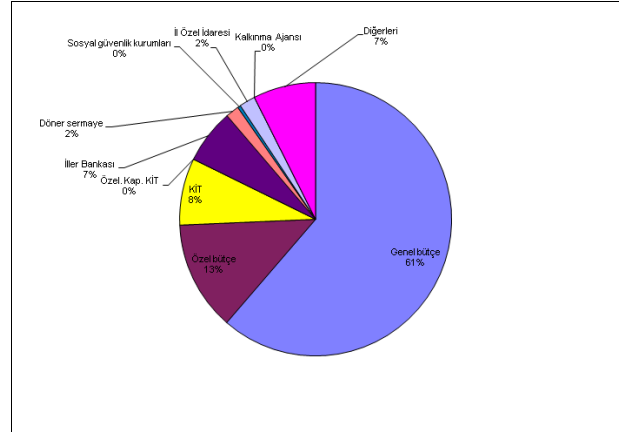

5 Kuruluşlara Göre Değerlendirme

Proje tutarına göre; 513.456.963 lira ile İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 347.247.368 lira ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 256.554.928 lira ile DSİ 11. Bölge Müdürlüğü izlemektedir.

Yapılan harcama miktarına göre; 43.740.079 lira ile DSİ 11. Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 35.095.974 lira ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 23.983.958 lira ile Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü izlemektedir.

Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 100 gerçekleşme ile Cumhuriyet Başsavcılığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunları yüzde 99 ile DSİ 11. Bölge Müdürlüğü, yüzde 95 ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü izlemektedir.

2013 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		463	1.920.969.323	296.802.060	334.625.872	245.781.389	213.471.558	163	32	0	98	170	64
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	21	347.247.368	165.808.390	36.813.857	35.095.974	35.095.974	11	1	0	5	4	95
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	20	256.554.928	11.609.443	44.110.682	44.110.675	43.740.079	2	5	0	8	5	99
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	27	91.853.202	2.900.233	27.776.456	13.757.196	13.757.197	3	3	0	15	6	50
4	İstanbul Ulaştırma, Den. ve Hab. Bölge Müdürlüğü	3	513.456.963	19.056.000	5.524.001	5.524.000	4.885.937	1	0	0	1	1	88
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	30	7.052.750	0	7.052.750	6.461.261	6.461.261	0	0	0	1	29	92
5	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	10	3.562.750	0	3.562.750	3.337.403	3.337.403	0	0	0	0	10	94
6	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	9	1.568.500	0	1.568.500	1.390.889	1.390.889	0	0	0	0	9	89
7	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	10	808.000	0	808.000	688.469	688.469	0	0	0	1	9	85
8	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	1	1.113.500	0	1.113.500	1.044.500	1.044.500	0	0	0	0	1	94
9	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	3	457.000	0	262.000	150.006	150.006	0	0	0	1	2	57
10	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	18	34.333.569	18.192.325	14.572.370	7.560.289	7.560.289	1	3	0	8	6	52
11	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	4	9.072.000	0	1.423.410	43.000	43.000	0	0	0	0	4	3
12	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	6	84.442.883	55.342.000	28.258.883	28.258.883	23.983.958	1	0	0	5	0	85
13	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0
14	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	4	1.409.561	0	509.561	134.525	134.525	3	0	0	1	0	26
	Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	3	2.034.906	936.888	1.098.018	746.595	746.595	0	0	0	2	1	68
15	Kırklareli Kadastro Müdürlüğü	3	2.034.906	936.888	1.098.018	746.595	746.595	0	0	0	2	1	68
16	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	28.965.000	981.472	27.965.000	27.965.000	9.184.067	0	0	0	5	0	33
17	TEİAŞ 20. İletim Tesi ve İşletme Grup Müdürlüğü	10	52.200.000	0	100.348	100.348	23.348	0	10	0	0	0	23
18	EÜAŞ Genel Müdürlüğü	13	132.091.950	737.950	22.390.000	450	450	6	0	0	3	4	0
19	Alpulu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	3	3.836.000	9.000	180.002	0	0	2	0	0	1	0	0
20	BOTAŞ Şube Müdürlüğü	5	1.090.000	739.000	350.001	188.000	182.510	1	0	0	0	4	52
21	Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü	2	6.159.194	1.000.000	2.774.194	774.194	774.194	0	0	0	1	1	28
22	İl Özel İdaresi	189	42.244.568	679.882	23.663.402	12.459.202	8.587.024	108	2	0	13	66	36
23	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	15	877.757	0	877.757	856.828	822.861	0	0	0	0	15	94
24	Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü	10	690.178	315.528	215.650	215.650	215.650	0	0	0	5	5	100
25	TMO Şube Müdürlüğü	2	4.320.000	1.531.000	2.746.000	0	0	1	0	0	1	0	0
26	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	4	1.140.000	87.867	1.007.713	407.713	354.290	1	0	0	0	3	35
27	Valilik	2	8.190.000	168.065	821.935	21.935	0	1	0	0	0	1	0
28	Cumhuriyet Başsavcılığı	1	9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	0	0	0	0	1	100
29	İl Emniyet Müdürlüğü	4	3.112.454	0	3.112.454	872.657	860.786	2	0	0	2	0	28
30	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	15	53.512.188	3.612.552	27.855.789	17.734.771	15.467.670	2	2	0	9	2	56
31	İl Sağlık Müdürlüğü	17	147.964.380	8.127.340	15.430.422	10.747.976	9.968.559	6	4	0	6	1	65
32	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	8	658.208	137.000	521.208	477.207	154.306	4	0	0	0	4	30
33	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	0	0	0	1	0	100
34	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	8	15.766.315	0	8.871.001	6.364.050	5.630.254	0	2	0	3	3	63
35	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	6	3.775.001	0	275.004	275.000	208.764	4	0	0	0	2	76
36	Defterdarlık	2	2.612.000	0	488.000	0	0	1	0	0	1	0	0

İkinci Bölüm: Sektörlere Göre Yatırım Projelerinin Durumu

1 Tarım

Tarımsal Üretim Değeri

Bin TL

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toplam	712.362	726.485	884.512	1.003.647	894.564	1.267.098	1.492.930	1.710.181
Bitkisel üretim	378.688	358.713	420.222	524.585	438.375	500.409	594.725	605.031
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler	320.363	274.445	330.393					
Sebzeler	44.590	69.771	72.106					
Meyveler, içecek ve baharat bitkileri	13.736	14.495	17.723					
Canlı hayvanlar	209.935	228.371	274.938	284.450	286.134	445.854	697.161	821.558
Büyükbaş	168.819	184.676	224.244					
Siğir	167.710	183.188	222.221					
Manda	1.109	1.488	2.023					
Küçükbaş	36.613	39.116	46.195					
Koyun	31.124	33.542	40.720					
Kıl keçisi	5.489	5.574	5.467					
Tiftik keçisi	0	0	8					
Diğerleri	4.503	4.579	4.499					
Hayvasal ürünler	123.739	139.401	189.352	194.612	170.055	320.835	201.044	283.592
Et	27.402	28.261	59.686					
Yumurta	4.587	4.740	5.836					
Süt	85.765	99.036	117.689					
Deri	370	369	643					
Bal	4.706	5.926	4.838					
Diğerleri	909	1.069	660					
Kırsal nüfus			120.866	118.871	116.035	113.458	111.199	109.064
Kırsal nüfus başına tarımsal üretim değeri (TL)			7.318	8.443	7.709	11.168	13.426	15.681

Üretim değeri, bitkisel ve hayvasal ürünlere ilişkin veriler ile bunlara ait birim fiyatlarının çarpımından elde edilmektedir.

2011 ve 2012 yıllarında hayvasal ürün değerine kırmızı et, beyaz et, yumurta ve deri dahil değildir.

Kaynak: TÜİK

Tarım sektöründe 2013 yılında 114 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 270.875.084 liradır. 2013 yılı programı 43.800.117 liradır. 39.353.678 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 90 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

Tarım Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Tarım	114	270.875.084	32.511.971	43.800.117	40.391.679	39.353.678	36	5	0	15	58	90
	Sulama	31	223.085.936	11.609.443	27.351.310	27.301.290	26.931.195	16	5	0	7	3	98
1	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	17	219.885.936	11.609.443	27.301.297	27.301.290	26.931.195	2	5	0	7	3	99
2	İl Özel İdaresi	14	3.200.000	0	50.013	0	0	14	0	0	0	0	0
	Bitkisel Üretim	9	597.825	0	597.825	588.419	573.978	0	0	0	0	9	96
3	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	9	597.825	0	597.825	588.419	573.978	0	0	0	0	9	96
	Hayvancılık	28	1.131.432	0	306.582	295.059	279.769	19	0	0	0	9	91
4	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	3	236.432	0	236.432	224.909	209.638	0	0	0	0	3	89
5	İl Özel İdaresi	25	895.000	0	70.150	70.150	70.131	19	0	0	0	6	100
	Ormanlık	30	7.052.750	0	7.052.750	6.461.261	6.461.261	0	0	0	1	29	92
6	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	10	3.562.750	0	3.562.750	3.337.403	3.337.403	0	0	0	0	10	94
7	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	9	1.568.500	0	1.568.500	1.390.889	1.390.889	0	0	0	0	9	89
8	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	10	808.000	0	808.000	688.469	688.469	0	0	0	1	9	85
9	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	1	1.113.500	0	1.113.500	1.044.500	1.044.500	0	0	0	0	1	94
	Su Ürünleri	4	33.996.963	19.056.000	5.530.000	5.530.000	4.891.825	0	0	0	1	3	88
10	İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	2	33.990.963	19.056.000	5.524.000	5.524.000	4.885.937	0	0	0	1	1	88
11	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	6.000	0	6.000	6.000	5.888	0	0	0	0	2	98
	Diğerleri	12	5.010.178	1.846.528	2.961.650	215.650	215.650	1	0	0	6	5	7
12	Atatürk TSKM İstasyonu Müdürlüğü	10	690.178	315.528	215.650	215.650	215.650	0	0	0	5	5	100
13	TMO Şube Müdürlüğü	2	4.320.000	1.531.000	2.746.000	0	0	1	0	0	1	0	0

Sulama

Sulamalar


	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Tarım alanı	2.384.980	2.293.190	2.346.530	2.305.460	2.323.580	2.250.600	1.914.200	
Devlet sulamaları							614.194	670.884
DSİ							314.790	372.480
İl Özel İdaresi							149.564	149.564
Halk sulamaları							149.840	149.840

Yılı İçinde Hizmete Giren Sulamalar

Dekar	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toplam	2.140	1.000	2.500	9.800	1.490	0	3.410	57.690	
DSİ	2.140	1.000	2.500	9.800	1.490	0	3.410	57.690	0
Baraj								57.690	0
Gölet	2.140						3.410		0
YAS sulaması		1.000	2.500	9.800	1.490	0	0	0	
İl Özel İdaresi									

2012 yılında, Kırklareli sulaması (51.790 dekar) ve Armağan Çukurpınar sulaması (5.900 dekar); 2011 yılında, Vize Segen sulaması (3.410 dekar); 2005 yılında Kırklareli Dolhan sulaması (1.720 dekar) ve Lüleburgaz Turgutbey sulaması (420 dekar) hizmete girmiştir.

Çayırdere Barajı Sulaması

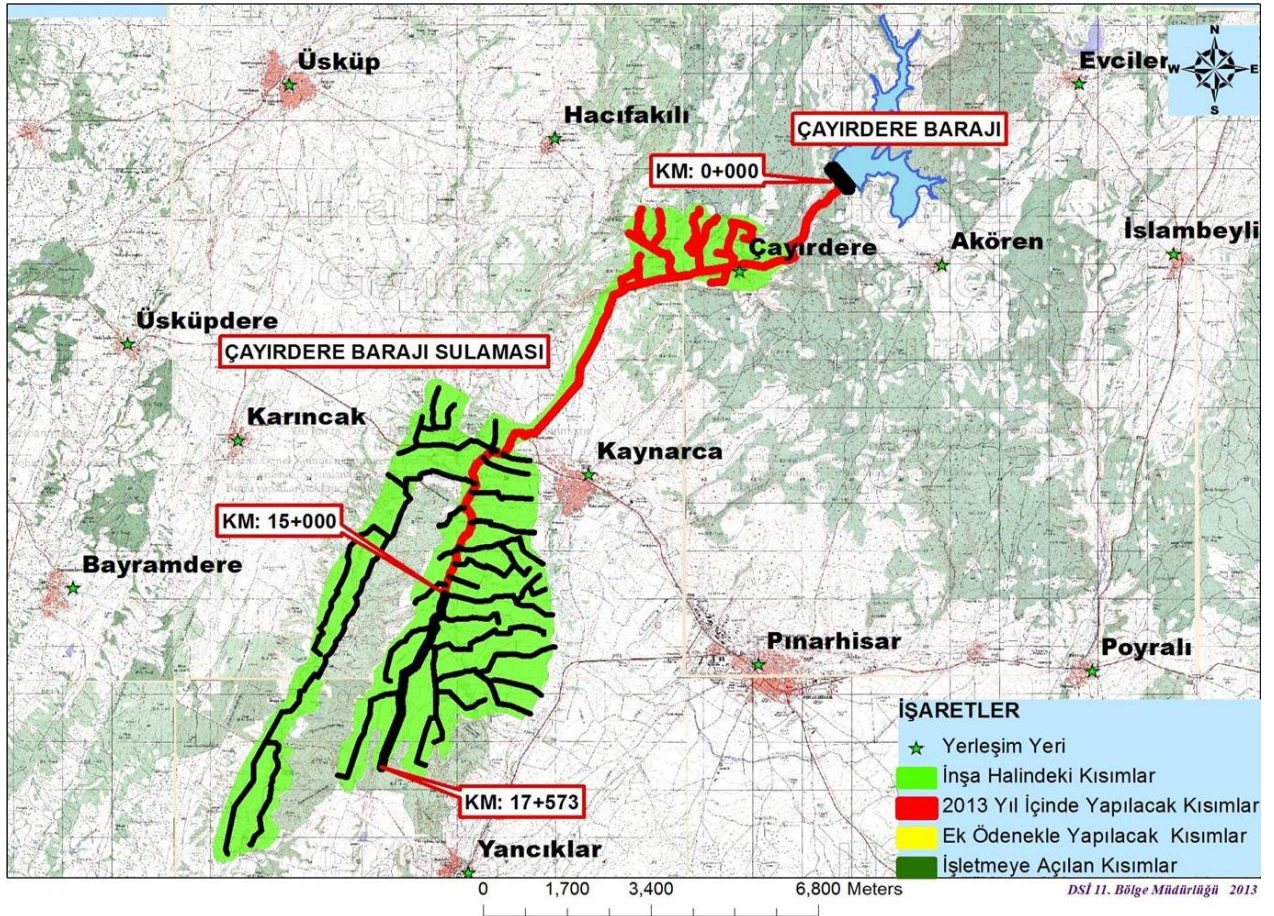

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 17 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 219.885.936 liradır. 2013 yılı programı 27.301.297 liradır. 27.301.290 lira gönderilmiş ve 26.931.195 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 99 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 3 proje bitmiştir. 7 proje devam etmektedir. 5 proje ihale aşamasındadır. 2 projeye hiç başlanmamıştır.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları


Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü						219.885.936	11.609.443	27.301.297	27.301.290	26.931.195	99		
Kırklareli Projesi						44.000.000	0	2	0	0	0		
1	1984A010180	K.eli Kızılıkdere Sulaması (14.220 dekar)	GB	2013	2014	42.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
2	1984A010180	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı	GB	2013	2014	2.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
Poyralı Projesi						42.687.260	8.557.625	19.530.369	19.530.369	19.521.821	100		
3	2010A010140	Çayırdere Barajı	GB	2010	2015	26.845.444	8.557.625	8.461.173	8.461.173	8.452.625	100	57	DE
4	2010A010140	Çayırdere Barajı Sulaması (25.830 dekar)	GB	2012	2015	15.841.816	0	11.069.196	11.069.196	11.069.196	100	72	DE
Alçak Baraj (Göletler)						11.000.000	0	299.926	299.925	299.925	100		
5	00000000000	P.hisar Kurudere Göleti ve Sulaması (3.420 dekar)	GB	2013	2015	10.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
6	00000000000	Vize Sergen Göleti ve Sulaması İkmali	GB	2011	2014	1.000.000	0	299.925	299.925	299.925	100	100	BT
Taşkın Koruma						62.075.695	1.353.690	997.316	997.312	818.588	82		
7	1977A010320	K.eli İnece (Yenibağlık Deresi) Taşkın Koruması	GB	2012	2015	1.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
8	1977A010320	L.burgaz Evrensekiz (Kavak Dere) Taşkın Koruması	GB	2011	2013	1.026.695	731.022	295.673	295.673	192.534	65	100	BT
9	1977A010320	L.burgaz Çengelli (Arzılı Dere) Taşkın Koruması	GB	2010	2013	1.049.000	622.668	426.332	426.332	350.747	82	100	BT
10	1977A010320	L.burgaz Umurca (Kavak Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2014	3.000.000	0	275.307	275.307	275.307	100	10	DE
11	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2014	11.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
12	1977A010320	K.eli 1. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2015	20.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
13	1977A010320	K.eli 2. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2015	25.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları						30.396.299	0	3.000.000	3.000.000	2.999.995	100		
14	2000A010060	Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları	GB	2012	2014	30.396.299	0	3.000.000	3.000.000	2.999.995	100	10	DE
Diğerleri						29.726.682	1.698.128	3.473.684	3.473.684	3.290.866	95		
15	00000000000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	1984	2016	14.187.500	1.355.301	117.236	117.236	117.236	100	10	DE
16	00000000000	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2002	2014	13.439.182	342.827	1.880.548	1.880.548	1.775.042	94	16	DE
17	00000000000	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2013	2013	2.100.000	0	1.475.900	1.475.900	1.398.588	95	67	DE

Bütçe türü: GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), KT (KİT), ÖK (Özelleştirme İdaresi kapsamına alınanlar), İB (İller Bankası), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumları), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), KA (Kalkınma Ajansı).

Açıklamalar: BT (Bitti), DE (Devam ediyor), YK (Yarım kaldı), İA (İhale aşamasında), HB (Hiç başlamadı).



Armağan Çıkarpınar Sulaması

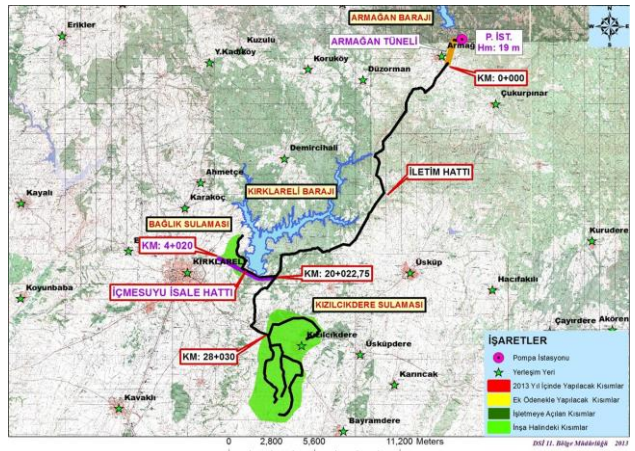

Kızılıkdere Sulaması

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresinin 2013 yılında 14 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 3.200.000 liradır. 2013 yılı programı 50.013 liradır. 14 projeye de başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Tarım Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
İl Özel İdaresi						3.200.000	0	50.013	0	0	0	0	
Sulama Göleti Bakım ve Onarımları (14 adet)						3.200.000	0	50.013	0	0	0	0	
18	000000000000	K.eli Çukurpınar Sulama	Öİ	2013	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
19	000000000000	B.eski Çavuşköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
20	000000000000	B.eski Çengerli Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
21	000000000000	B.eski Ertuğrul Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
22	000000000000	B.eski Karacaoğlan Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
23	000000000000	B.eski Terzili Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
24	000000000000	B.eski Terzili Göletten Sulama	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
25	000000000000	L.burgaz Sakızköy Göletten Sulama	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
26	000000000000	L.burgaz Sakızköy Tırtandere Gölet Dolu Savak Onarım	Öİ	2013	2013	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
27	000000000000	L.burgaz Celaliye Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
28	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
29	000000000000	L.burgaz Karaağaç Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
30	000000000000	P.hisar Yeniceköy Göletten Sulama	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
31	000000000000	P.hisar Ataköy Sulama Kanalı (Çayırılar Bölgesi)	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB



Sulama Çalışmaları



Pınarhisar Ataköy Sulaması

Bitkisel Üretim

Bitkisel Üretim

Ton

	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Toplam tahıl ve diğer bitkisel ürün üretimi	1.073.253	1.122.494	1.007.920	1.031.141	1.097.354	1.149.610
Buğday (diğer)	462.198	481.042	362.672	307.107	365.081	415.520
Arpa (diğer)	82.067	71.897	55.495	48.326	55.158	52.760
Çeltik	11.019	14.375	10.576	15.488	18.473	22.806
Ayçiçeği (Yağlık)	118.465	116.610	121.017	139.407	130.889	103.314
Şeker pancarı	35.800	42.923	43.338	27.896	12.655	13.423
Saman ve Ot	221.712	242.198	249.934	334.970	360.722	397.138
Toplam sebze üretimi	83.639	87.857	94.534	85.015	83.964	81.278
Toplam meyve üretimi	9.885	9.839	10.937	12.406	13.779	15.223

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2013 yılında 9 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 597.825 liradır. 2013 yılı programı 597.825 liradır. 588.419 lira ödenek gönderilmiş ve 573.978 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 96 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 9 proje de bitmiştir.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
		İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü				597.825	0	597.825	588.419	573.978	96		
32	2009A020050	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi	GB	2013	2013	9.500	0	9.500	9.500	9.381	99	100	BT
33	2010A020040	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2013	2013	222.000	0	222.000	212.594	202.107	91	100	BT
34	2010A020060	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	39.152	0	39.152	39.152	35.941	92	100	BT
35	2012A020050	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	4.074	0	4.074	4.074	3.969	97	100	BT
36	2012A020060	Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi	GB	2013	2013	21.200	0	21.200	21.200	20.939	99	100	BT
37	2012A020110	Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	25.000	0	25.000	25.000	24.891	100	100	BT
38	00000000000	İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2013	2013	5.000	0	5.000	5.000	4.878	98	100	BT
39	00000000000	Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi	GB	2013	2013	2.400	0	2.400	2.400	2.399	100	100	BT
40	00000000000	Mera Hizmetleri	GB	2013	2013	269.499	0	269.499	269.499	269.473	100	100	BT

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nün 2013 yılında 10 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 690.178 liradır. 2013 yılı programı 215.650 liradır. 215.650 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 5 proje bitmiştir. 5 proje devam etmektedir.

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü						690.178	315.528	215.650	215.650	215.650	100		
Araştırma Projeleri						690.178	315.528	215.650	215.650	215.650	100		
Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri						100.500	100.500	0	0	0	0		
41	000000000000	Farklı Eğim Derecelerindeki Kor. ve Otlatılan Mera Baz. Is. Met. Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkileri	GB	2008	2013	100.500	100.500	0	0	0	0	100	BT
Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri						430.928	112.928	185.500	185.500	185.500	100		
42	000000000000	Trakya Yöresinde Ayçiçeği Yetiştir. Bor Elementinin Verim Üzerine Etkileri	GB	2012	2014	146.428	112.928	18.500	18.500	18.500	100	67	DE
43	000000000000	Kuru Koş. Ayçiçeğinin Azotlu Güb. Ön. İn. Olarak Kul. Param. Ve Azotun Su Kul. Ran. Üz. Et. Ar.	GB	2013	2015	110.000	0	50.000	50.000	50.000	100	33	DE
44	000000000000	Trakya Yör. Tar. Top. Bit. Bes. Mad. Ve Pot. Toksit El. Kap. Bel., Veri Tab. Ol. ve Har.	GB	2013	2014	174.500	0	117.000	117.000	117.000	100	50	DE
Tarım Ekonomisi Araştırma Projeleri						57.000	32.550	17.450	17.450	17.450	100		
45	000000000000	Trakya Böl. Buğday, Ayçiçeği, Mısır ve Çeltik Ür. Yap. Tarım İşt. Yap. Öz. Ekonomik An. Ve Etkinliklerinin Bel.	GB	2011	2013	36.000	25.550	10.450	10.450	10.450	100	100	BT
46	000000000000	K.eli, Edirne, T.dağ ve Ç.kale Ürt. İyi Tarım Uyg. Yak. Ve Uyg. Ekonomik Analizi	GB	2012	2014	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	67	DE
Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Projeleri						101.750	69.550	12.700	12.700	12.700	100		
47	000000000000	İkinci Ür. Ayçiçeği ve İkinci Ür. Silajlık Mısır Üretiminde Uy. Far. Toprak İş. ve Ek. Yön. Tek. ve Ek. Yön. Arş.	GB	2008	2013	63.550	63.550	0	0	0	0	100	BT
48	000000000000	K.eli Tarım Mekan. Düz. ve Tarım Kavn. İş. Kaz. Belirlenmesi	GB	2012	2013	4.250	3.000	1.250	1.250	1.250	100	100	BT
49	000000000000	Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti ve Sonuçları (Kırklareli İli Örneği)	GB	2012	2013	4.250	3.000	1.250	1.250	1.250	100	100	BT
50	000000000000	Min. Top.İşl. Yön. Mera Top. Yap. Nem Dep. ve Ver. Olan Et. Bel.	GB	2013	2016	29.700	0	10.200	10.200	10.200	100	25	DE

TMO Şube Müdürlüğü

TMO Şube Müdürlüğü'nün 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 4.320.000 liradır. 2013 yılı programı 2.746.000 liradır. Harcama yapılmamıştır. 1 proje devam etmektedir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

TMO Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
TMO Şube Müdürlüğü						4.320.000	1.531.000	2.746.000	0	0	0		
51	2011A020090	B.eski Depolama Tesisleri (10.000 ton YD)	KT	2011	2013	3.950.000	1.531.000	2.376.000	0	0	0		DE
52	000000000000	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	KT	2013	2013	370.000	0	370.000	0	0	0	0	HB



TMO Depolama Tesisi Temel Atma Töreni 19 Eylül 2012



TMO Depolama Tesisi Temel Atma Töreni 19 Eylül 2012

Hayvancılık

Hayvancılık

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Küçükbaş hayvan sayısı	240.858	223.175	238.484	201.552	199.196	213.591	283.555
Koyun	189.214	179.779	184.539	159.497	156.578	164.925	215.161
Kıl keçisi	51.644	43.351	53.945	42.055	42.618	48.666	68.394
Tiftik keçisi	0	45	0	0	0	0	0
Büyükbaş hayvan sayısı	98.971	112.969	107.660	110.067	112.381	132.922	152.862
Siğir	97.854	111.703	106.008	108.503	110.959	131.458	151.315
Kültür	72.855	84.787	83.439	90.254	95.559	113.610	133.018
Melez	20.746	21.429	18.434	13.442	11.396	13.967	14.675
Yerli	4.253	5.487	4.135	4.807	4.004	3.881	3.622
Manda	1.117	1.266	1.652	1.564	1.422	1.464	1.547
Kümes hayvanı sayısı	330.625	345.558	348.620	348.772	342.848	352.788	418.358
Arıcılık (kovan sayısı)	37.272	35.586	36.112	40.682	42.896	43.831	46.257
Süt üretimi (ton)	151.204	167.480	165.855	170.376	169.996	206.268	265.154
Deri üretimi (adet)	31.940	29.370	18.424	13.251	11.122		
Yapağı, kıl, tiftik üretimi (ton)	331	311	326	279	276	292	383
Yumurta üretimi (Bin adet)	28.732	26.933	25.932	26.396	25.831		
Bal üretimi (ton)	535	439	451	550	582	676	652
Balmumu üretimi (ton)	24	18	14	17	17	46	30

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 236.432 liradır. 2013 yılı programı 236.432 liradır. 224.909 lira ödenek gönderilmiş ve 209.638 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 89 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 3 proje bitmiştir.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık
		İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü				236.432	0	236.432	224.909	209.638	89		
53	2003A030020	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2013	2013	159.000	0	159.000	147.477	138.366	87	100	BT
54	2010A030010	Hayvancılık Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	69.432	0	69.432	69.432	63.484	91	100	BT
55	2013A030010	Hayvancılık Kooperatiflerinin Desteklenmesi Projesi	GB	2013	2013	8.000	0	8.000	8.000	7.788	97	100	BT

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresinin 2013 yılında 25 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 895.000 liradır. 2013 yılı programı 70.150 liradır. 70.131 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 6 proje bitmiştir. 19 projeye hiç başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Tarım Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Turu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Fiziki 2013 yılı gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
İl Özel İdaresi						895.000	0	70.150	70.150	70.131	100		
Hayvan İçmesuyu Göletleri (25 adet)						895.000	0	70.150	70.150	70.131	100		
56	000000000000	K.eli Beypınar HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
57	000000000000	K.eli Çukurpınar HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
58	000000000000	K.eli Dokuzhöyük HİS Göleti	Öİ	2013	2013	30.000	0	12.893	12.893	12.893	100	100	BT
59	000000000000	K.eli Erikler HİS Göleti	Öİ	2013	2013	50.000	0	1	1	0	0	0	HB
60	000000000000	K.eli Geçitağı HİS Göleti	Öİ	2013	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
61	000000000000	K.eli Kadıköy HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
62	000000000000	K.eli Karahamza HİS Göleti	Öİ	2013	2013	40.000	0	6.086	6.086	6.086	100	100	BT
63	000000000000	K.eli Karakoç HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
64	000000000000	D.köy İğneada HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
65	000000000000	Koçaz HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	14.254	14.254	14.254	100	100	BT
66	000000000000	Koçaz Ahmetler HİS Göleti	Öİ	2012	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
67	000000000000	Koçaz Devletiağaç HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
68	000000000000	Koçaz Karaabalar HİS Göleti	Öİ	2013	2013	25.000	0	1	1	0	0	0	HB
69	000000000000	Koçaz Kocayazı HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
70	000000000000	Koçaz Kula HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
71	000000000000	Koçaz Malkoçlar HİS Göleti	Öİ	2013	2013	40.000	0	3.564	3.564	3.564	100	100	BT
72	000000000000	Koçaz Terzidere HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
73	000000000000	Koçaz Topçular HİS Göleti	Öİ	2010	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
74	000000000000	L.burgaz Celaliye HİS Göleti	Öİ	2013	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
75	000000000000	L.burgaz Müsellim HİS Göleti	Öİ	2010	2013	30.000	0	3.804	3.804	3.804	100	100	BT
76	000000000000	P.hisar Ataköy HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
77	000000000000	Vize Doğanca HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
78	000000000000	Vize Evrencik HİS Göleti	Öİ	2012	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
79	000000000000	Vize Kömürköy HİS Göleti	Öİ	2010	2013	50.000	0	29.530	29.530	29.530	100	100	BT
80	000000000000	Vize Sofular HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB



Kırklareli Beypınar Hayvan İçmesuyu Göleti



Vize Küçükayla Hayvan İçmesuyu Göleti

Ormancılık

Ormancılık

		2011	2012	2013
Yüzölçümü (hektar)		655.000	655.000	655.000
Toplam orman alanı (hektar)		258.696	258.696	258.696
Ağaçlandırma	A	390	100	486
	B	466.800	539.000	1.099.000
Kırklareli	A	190	100	344
	B	420.000	488.000	913.000
Demirköy	A	0	0	72
	B	0	0	33000
Vize	A	200	0	70
	B	46.800	51.000	153.000
Fidan üretimi (adet)			2.900.000	3.550.000
Demirköy			1.700.000	2.420.000
Lüleburgaz			1.200.000	1.130.000
ORKÖY kredileri	C	2.149.881	2.150.881	3.878.215
	D	132	133	206
Kırklareli	C	1.436.000	1.436.000	1.940.300
	D	82	82	116
Demirköy	C	408.881	409.881	1.259.415
	D	30	31	56
Vize	C	305.000	305.000	678.500
	D	20	20	34

A: Ağaçlandırma yapılan alan (hektar), B: Ağaçlandırmada dikilen fidan sayısı (adet).

C: Verilen kredi miktarı (TL), D: Kredi verilen kişi sayısı

Kaynak: İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2013 yılında 10 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 3.562.750 liradır. 2013 yılı programı 3.562.750 liradır. 3.337.403 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 94 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 10 proje de bitmiştir.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Turu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				3.562.750	0	3.562.750	3.337.403	3.337.403	94		
		Orman Kadastro				100.000	0	100.000	21.470	21.470	21		
81	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2013	2013	100.000	0	100.000	21.470	21.470	21	90	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				588.500	0	588.500	448.187	448.187	76		
82	2013A050170	Aplikasyon	DS	2013	2013	23.500	0	23.500	0	0	0	100	BT
83	2013A050170	Yeni Yol	DS	2013	2013	65.000	0	65.000	30.142	30.142	46	90	BT
84	2013A050170	B.Onarım	DS	2013	2013	56.000	0	56.000	31.105	31.105	56	100	BT
85	2013A050170	Üst Yapı	DS	2013	2013	114.000	0	114.000	109.000	109.000	96	100	BT
86	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2013	2013	200.000	0	200.000	172.940	172.940	86	100	BT
87	2013A050170	Planlama, Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2013	2013	130.000	0	130.000	105.000	105.000	81	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				2.800.250	0	2.800.250	2.800.250	2.800.250	100		
88	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2013	2013	2.800.250	0	2.800.250	2.800.250	2.800.250	100	100	BT
		Diğerleri				74.000	0	74.000	67.496	67.496	91		
89	2013A050110	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	DS	2013	2013	70.000	0	70.000	67.496	67.496	96	100	BT
90	2013A050140	ORKÖY	ÖB	2013	2013	4.000	0	4.000	0	0	0	100	BT



Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2013 yılında 9 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.568.500 liradır. 2013 yılı programı 1.568.500 liradır. 1.390.889 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 89 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 9 proje de bitmiştir.

Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü						1.568.500	0	1.568.500	1.390.889	1.390.889	89		
Orman Kadastro						55.000	0	55.000	22.319	22.319	41		
91	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2013	2013	55.000	0	55.000	22.319	22.319	41	100	BT
Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi						1.004.500	0	1.004.500	954.341	954.341	95		
92	2013A050170	Aplikasyon	DS	2013	2013	15.500	0	15.500	0	0	0	100	BT
93	2013A050170	B.Onarım	DS	2013	2013	79.000	0	79.000	74.047	74.047	94	100	BT
94	2013A050170	Üst Yapı	DS	2013	2013	376.000	0	376.000	370.585	370.585	99	100	BT
95	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2013	2013	234.000	0	234.000	227.709	227.709	97	100	BT
96	2013A050170	Planlama, Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2013	2013	300.000	0	300.000	282.000	282.000	94	100	BT
Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi						60.000	0	60.000	33.000	33.000	55		
97	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2013	2013	60.000	0	60.000	33.000	33.000	55	100	BT
Diğerleri						449.000	0	449.000	381.229	381.229	85		
98	2011A050180	Orman Amenejman Projesi	DS	2013	2013	446.000	0	446.000	381.229	381.229	85	100	BT
99	2013A050140	ORKÖY	ÖB	2013	2013	3.000	0	3.000	0	0	0	100	BT

Vize Orman İşletme Müdürlüğü

Vize Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2013 yılında 10 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 808.000 liradır. 2013 yılı programı 808.000 liradır. 688.469 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 85 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 9 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir.

Vize Orman İşletme Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık
Vize Orman İşletme Müdürlüğü						808.000	0	808.000	688.469	688.469	85		
Orman Kadastro						11.000	0	11.000	0	0	0		
100	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2013	2013	11.000	0	11.000	0	0	0	50	DE
Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi						510.500	0	510.500	430.375	430.375	84		
101	2013A050170	Aplikasyon	DS	2011	2013	19.500	0	19.500	0	0	0	100	BT
102	2013A050170	Yeni Yol	DS	2013	2013	130.000	0	130.000	122.719	122.719	94	100	BT
103	2013A050170	B.Onarım	DS	2013	2013	36.000	0	36.000	28.471	28.471	79	100	BT
104	2013A050170	Üst Yapı	DS	2013	2013	210.000	0	210.000	175.900	175.900	84	100	BT
105	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2013	2013	115.000	0	115.000	103.285	103.285	90	100	BT
Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi						209.500	0	209.500	205.000	205.000	98		
106	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2013	2013	209.500	0	209.500	205.000	205.000	98	100	BT
Diğerleri						77.000	0	77.000	53.094	53.094	69		
107	2013A050110	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	DS	2013	2013	39.000	0	39.000	35.000	35.000	90	100	BT
108	2011A050180	Orman Amenejman Projesi (Büro)	DS	2013	2013	35.000	0	35.000	18.094	18.094	52	100	BT
109	2013A050140	ORKÖY	ÖB	2013	2013	3.000	0	3.000	0	0	0	100	BT

Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü

Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 1.113.500 liradır. 2013 yılı programı 1.113.500 liradır. 1.044.500 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 94 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir.

Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık
Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü						1.113.500	0	1.113.500	1.044.500	1.044.500	94		
110	2013A050180	Fidan Üretimi	DS	2013	2013	1.113.500	0	1.113.500	1.044.500	1.044.500	94	95	BT



Demirköy Fidanlığı



Lüleburgaz Fidanlığı

Su Ürünleri

Su Ürünleri

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Avçılık ruhsatı olan gerçek kişi sayısı	1.201	1.277	1.288	1.368	1.391	1.438
Ruhsatlı gemi sayısı	218	202	191	191	183	170
Avlanan tatlısu ürünü (ton)	67	73	58	80	87	79
Yetiştiricilik üretimi (ton)	586	312	239	194	57	58

İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü

İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 33.990.963 liradır. 2013 yılı programı 5.524.000 liradır. 5.524.000 lira ödenek gönderilmiş ve 4.885.937 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 88 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir.

İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü						33.990.963	19.056.000	5.524.000	5.524.000	4.885.937	88		
111	1995A040170	D.köy Beğendik Balıkçı Barınağı İnşaatı	GB	1995	2014	33.690.963	19.056.000	5.224.000	5.224.000	4.629.142	89	95	DE
112	1995A040170	Vize Kıyıköy Balıkçı Barınağı Çekme Yeri ve Rıhtım Tivsii İnşaatı	GB	2013	2013	300.000	0	300.000	300.000	256.795	86	100	BT



Beğendik Balıkçı Barınağı İnşaatı



İğneada Balıkçı Barınağı Rıhtım Yenileme Çalışması (2012)

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 6.000 liradır. 2013 yılı programı 6.000 liradır. 6.000 lira ödenek gönderilmiş ve 5.888 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 98 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 de proje bitmiştir.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü						6.000	0	6.000	6.000	5.888	98		
113	1985A040220	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	3.000	0	3.000	3.000	2.896	97	100	BT
114	2010A040050	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2013	2013	3.000	0	3.000	3.000	2.992	100	100	BT

2 Madencilik

Madencilik Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasalar gerçekleştiren (%)
	Madencilik	9	38.037.000	981.472	29.388.410	28.008.000	9.227.067	0	0	0	5	4	31
1	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	4	9.072.000	0	1.423.410	43.000	43.000	0	0	0	0	4	3
2	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	28.965.000	981.472	27.965.000	27.965.000	9.184.067	0	0	0	5	0	33

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 9.072.000 liradır. 2013 yılı programı 1.423.410 liradır. 43.000 lira ödenek gönderilmiştir. 43.000 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 3 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 4 proje de bitmiştir.

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalar gerçekleştiren (%)	Fiziki gerçekleştiren (%)	Açıklamalar
		MTA Marmara Bölge Müdürlüğü				9.072.000	0	1.423.410	43.000	43.000	3		
115	2013B400140	Tekirdağ (Malkara)-Edirne (İpsala) Oligosen Havzası Kömür Aramaları	GB	2012	2013	1.000.000	0	250.000	0	0	0	100	BT
116	2013B400140	Trakya Jeotermal Enerji Aramaları	GB	2013	2013	2.992.000	0	997.333	43.000	43.000	4	100	BT
117	2013B400160	Istranca Masifinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan'daki İstiflerle Korelasyonu	GB	2013	2013	477.000	0	119.250	0	0	0	100	BT
118	000000000000	Maden Ön Etütleri	GB	2013	2013	4.603.000	0	56.827	0	0	0	100	BT

2013-33-13-07 Tekirdağ (Malkara)-Edirne (İpsala) Oligosen Havzası Kömür Aramaları: 2012-33-13-03-1 kod nolu 2012 yılı projesidir. Arazi çalışmaları 2013 yılında yeni kod numarasıyla "sarkan iş" olarak devam etmiştir. Planlanan 5.000 m sondaj için 14.12.2012 tarihinde başlanan çalışmalar 14.03.2013 tarihinde sonlandırılmıştır. 14.05.2013 tarihi itibarıyla tamamlanan 2012 yılından sarkan iş çalışmalarında 11 lokasyonda toplam 5.123,00 m. sondaj, 1.190 km² 1/100.000 ölçekli prospeksiyon ve 216 km² 1/25.000 ölçekli detay jeoloji çalışması ve çeşitli numune alımları gerçekleştirilmiştir. Projenin kamp merkezi Tekirdağ ili olduğundan harcamaların tamamı bu ilde gösterilmiş, Kırklareli ilinde harcama gösterilmemiştir.

2013-32-13-20 Maden Ön Etütleri: 19.07.2013 - 08.10.2013 tarihleri arasında Tekirdağ'da gerçekleştirilen kampta, bentonit-bentonitik kile yönelik olarak 9 adet ruhsat sahasında 1000 ± %20 m olarak sondajlı çalışma planlanmış olup, plan çerçevesinde 23 lokasyonda 1.157,20 m sondaj gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 9 adet X-RD, 4 adet Min+Pet, 14 adet kimyasal, 138 adet ön teknoloji ve 9 adet tam teknoloji numunesi derlenmiştir. Projenin kamp merkezi Tekirdağ ili olduğundan harcamaların tamamı bu ilde gösterilmiş, Kırklareli ilinde harcama gösterilmemiştir.

2013-33-13-19 Trakya Jeotermal Enerji Aramaları: 20.04.2013 - 21.09.2013 tarihleri arasında Kırklareli ve Tekirdağ il sınırlarında jeolojik ve jeofizik etüt çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalarda toplam 500 km² 1/25.000 ölçekli detay jeoloji çalışması ve 218 noktada jeofizik elektrik ölçüm gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı için sahada 2.000 m sondaj planlanmıştır. Bu çalışmanın yapıldı jeofizik etüt sonuçlarının çıkması beklenilmiş olup, sondaj 2013 yılına yetiemediğinden 2014 yılında gerçekleştirilecektir. Projenin kamp merkezi 18.05.2013 tarihinden itibaren Tekirdağ ili olduğundan bu tarihten sonraki harcamalar Kırklareli ilinde gösterilmemiştir.

2013-30-14-21 Istranca Masifinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan'daki İstiflerle Korelasyonu: Bölge sınırlarımız içinde bulunan Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy'de 07.05.2013 - 31.10.2013 tarihleri arasında yürütülen kampta E19, 20 ve F19, 20, 21 paftalarında 2.508 km² 1/25.000 ölçekli jeolojik detay çalışması ile 7.500 km² 1/25.000 ölçekli revizyon gerçekleştirilmiş, ayrıca 718 adet petrografik, 612 adet paleontolojik, 84 adet kimyasal maj.-min. el. analizi ve 35 adet de jeokronolojik yaş tayini numunesi derlenmiştir. Projenin kamp merkezi Tekirdağ ili olduğundan harcamaların tamamı bu ilde gösterilmiş, Kırklareli ilinde harcama gösterilmemiştir.

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 28.965.000 liradır. 2013 yılı programı 27.965.000 liradır. 27.965.000 lira ödenek gönderilmiştir. 9.184.067 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 33 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 5 proje devam etmektedir.

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık malar
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü						28.965.000	981.472	27.965.000	27.965.000	9.184.067	33		
119	2013B000010	Jeoloji (Sondaj öncesi arama yatırımları sismik çalışması)	KT	2013	2013	718.000	0	718.000	718.000	50.387	7	7	DE
120	2013B040020	Sondaj (Petrol ve Doğalgaz arama)	KT	2013	2013	13.209.000	0	13.209.000	13.209.000	1.363.235	10	10	DE
121	2013B040040	KTH (Petrol ve doğalgaz kuyularını alma çalışmaları)	KT	2013	2013	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	465.032	35	35	DE
122	2013B040060	Muhtelif İşler (İdame ve Yenileme Yatırımları)	KT	2013	2013	9.628.000	0	9.628.000	9.628.000	5.522.242	57	57	DE
123	2010B040050	İnşaat İşleri (Bekar pansiyonu ve güvenlik binası inşaatı)	KT	2012	2013	4.100.000	981.472	3.100.000	3.100.000	1.783.171	58	70	DE



Sondaj Çalışmaları



Bekar Pansiyonu

3 İmalat

İmalat Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	İmalat	5	4.220.250	9.000	564.252	37.500	33.357	2	1	0	1	1	6
1	Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	3	3.836.000	9.000	180.002	0	0	2	0	0	1	0	0
2	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	1	37.500	0	37.500	37.500	33.357	0	0	0	0	1	89
3	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	1	346.750	0	346.750	0	0	0	1	0	0	0	0

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü'nün 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 3.836.000 liradır. 2013 yılı programı 180.002 liradır. 1 proje devam etmektedir. 2 projeye hiç başlanmamıştır.

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü				3.836.000	9.000	180.002	0	0	0		
124	2008C010040	Hacimsel Debi Ölçüm vb. Komple	ÖK	2012	2013	25.000	9.000	1	0	0	0		DE
125	2013C010070	2, 3 ve 4 nolu Melas Tankı Emniyet Duvarı Yapılması	ÖK	2013	2013	180.000	0	180.000	0	0	0	0	HB
126	2013C010080	Atıksu Arıtma Tesisi	ÖK	2007	2013	3.631.000	0	1	0	0	0	0	HB

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 37.500 liradır. 2013 yılı programı 37.500 liradır. 37.500 lira ödenek gönderilmiş ve 33.357 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 89 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü				37.500	0	37.500	37.500	33.357	89		
127	2009C010050	Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi	GB	2013	2013	37.500	0	37.500	37.500	33.357	89	100	BT

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

TCDD 1.Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 346.750 liradır. 2013 yılı programı 346.750 liradır. Proje ihale aşamasındadır.

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		TCDD 1. Bölge Müdürlüğü				346.750	0	346.750	0	0	0		
128	2008C280020	Alpullu Depo Şefliği Akaryakıt Tesisi Kurulması (1 adet)	KT	2012	2013	346.750	0	346.750	0	0	0	0	İA

4 Enerji

Elektrik Tüketimi

MWh

	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Toplam	811.966	1.770.844	1.680.453	1.604.707	1.574.076	1.696.744
Mesken	169.171	186.070	203.347	199.475	210.566	222.255
Ticaret	53.628	76.124	84.047	78.268	89.291	93.022
Resmi Daire	26.967	105.125	26.006	26.364	27.437	48.407
Sanayi	472.505	1.352.824	1.244.947	1.188.122	1.151.337	1.237.452
Tarimsal Sulama	1.765	2.660	2.447	2.923	3.172	4.880
Aydınlatma	17.388	16.940	15.481	22.945	23.097	24.107
Diğer	70.541	31.100	104.179	86.610	69.176	66.621
Kişi başına toplam elektrik tüketimi (kWh/yıl)		5.314	4.987	4.816	4.730	4.988

TREDAŞ İl genelinde **191.337** aboneye hizmet vermektedir. Tüketilen elektrik miktarı ise **1.696.744** kwh 'dır. Kayıp enerji oranı ise % 6,2'dir. Kırklareli, kişi başına elektrik tüketimi bakımından hem toplamda, hem de sanayide 81 il içerisinde 6. sırada bulunmaktadır.

Enerji Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Enerji	23	184.291.950	737.950	22.490.348	100.798	23.798	6	10	0	3	4	0
1	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	10	52.200.000	0	100.348	100.348	23.348	0	10	0	0	0	23
2	EÜAŞ Genel Müdürlüğü	13	132.091.950	737.950	22.390.000	450	450	6	0	0	3	4	0

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'nün 2013 yılında 10 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 52.200.000 liradır. 2013 yılı programı 100.348 liradır. 100.348 lira ödenek gönderilmiş ve 23.348 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 23 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 10 proje ihale aşamasındadır.

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık
		TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü				52.200.000	0	100.348	100.348	23.348	23		
129	2012D030340	Babaeski TM Tevsiat (154 kV 1 Adet Fider İlavesi)	KT	2012	2014	500.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
130	2013D030350	Babaeski - Edirne EİH Yenilemesi (Toprak teli fiber optikli)	KT	2013	2016	10.000.000	0	23.348	23.348	23.348	100	0	İA
131	2012D031340	Demirköy TM	KT	2012	2015	2.500.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
132	2009D030670	B.karşıtıran TM Fider İlavesi (154 kV 1 fider)	KT	2011	2014	500.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
133	2013D090050	Hamitabat DGKÇS - Delta DGKÇS EİH Yenilemesi	KT	2013	2016	2.300.000	0	5.000	5.000	0	0	0	İA
134	2013D030150	Hamitabat 380 kV Havza TM	KT	2013	2015	32.500.000	0	52.000	52.000	0	0	0	İA
135	2013D030360	Kırıköy TM Tevsiat	KT	2013	2015	1.200.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
136	2013D090040	(Hamitabat - Alibeyköy) Brş N - Hamitabat 380 TM	KT	2013	2015	1.200.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
137	2013D090050	Traçim - Demirköy EİH	KT	2013	2014	1.300.000	0	8.000	8.000	0	0	0	İA
138	2013D090050	Traçim TM Tevsiat	KT	2013	2014	200.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA

"BÜYÜKKARIŞTIRAN TM' de FİDER İLAVESİ" projesinde, 154 kV Büyükkarıştıran TM mevcut Hat(Zorlu) Fideri Trafo Fiderine dönüştürülecek ve tesis edilecek yeni fider ise 154 kV Hat (Zorlu)Fideri olacaktır. Bu proje henüz ihale aşamasındadır.

"BABAESKİ TM TEVSİAT" projesinde, 380 kV Babaeski TM 'de mevcut 154/31,5 kV trafonun yanına 1 adet ilave 154/31,5 kV trafo ve trafo fideri yapılacaktır. Bu proje henüz ihale aşamasındadır.

"Hamitabat 380 Havza TM" projesinde, Vize ileçesine yapılacak 380 kV Trafo Merkezi sayesinde bölgede tesis edilecek rüzgar santrallerinin iletim sistemine irtibatı sağlanacak ve bu bölgenin rüzgar gücü ekonomiye kazandırılmış olacaktır.

"Demirköy TM" projesinde, Demirköy ilçesine 154/31.5 kV bir Trafo Merkezi yapılacak ve bölgede sık sık meydana gelen elektrik kesintilerinin önüne geçilecektir.

"Kıyıköy TM Tevsiat": Mevcut durumda 154 kV Transfer fideri olmayan Trafo Merkezinde kesici arızası durumunda enerji kesintileri meydana gelmekteydi. Proje ile enerji akışının devamlı olmasını sağlamak için 1 adet 154 kV Transfer fideri, artan yük taleplerini karşılamak ve mevcut 1 adet 50 MVA'lık trafonun yedeği olmak üzere 1 adet Trafo fideri, aynı zamanda Anabara+Transfer olarak yenilenecek sisteme uygunluğunun sağlanması için 154 kV Çerkezköy fiderinin yenilenmesi hedeflenmektedir.

"(Hamitabat-Alibeyköy) Brş.N-Hamitabat 380 Havza TM" projesinde 380 kV Hamitabat Havza TM'nin iletim sistemi ile irtibatı sağlanacaktır.

"Traçim-Demirköy EİH ": Yeni tesis edilecek 154 kV Demirköy TM'nin iletim sistemine irtibatı söz konusu hat üzerinden sağlanacaktır.

"Traçim TM Tevsiat": 154 kV Traçim-Demirköy E.İ.Hattının Traçim TM bağlantısı için fider ilavesi gerektiğinden Traçim T.M.'de Tevsiat çalışması yapılacaktır.

"Hamitabat DGKÇS-Delta DGKÇS EİH Yenileme" projesinde, iletim sisteminin artan yüklerini karşılamayan Enerji İletim Hattının yenilenmesi ile söz konusu hat üzerinde 2 kat daha fazla elektrik enerjisi taşınabilecektir.

"Babaeski-Edirne EİH Yenileme": Söz konusu hattın yenilenmesi ile enerji taşıma kapasitesi artacak, Edirne bölgesinin enerji ihtiyacını uzun süre sorunsuz biçimde karşılanacaktır. 24.09.2013 tarihinde yer teslimi yapılmıştır. Zemin etüdü çalışmaları tamamlanmıştır. 17.04.2014 tarihinde çalışmalara başlanacaktır.

EÜAŞ Genel Müdürlüğü

EÜAŞ Genel Müdürlüğü'nün 2013 yılında 13 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 132.091.950 liradır. 2013 yılı programı 22.390.000 liradır. 450 lira ödenek gönderilmiş ve 450 lira harcama yapılmıştır. 4 proje bitmiştir. 3 proje devam etmektedir. 6 projeye hiç başlanmamıştır.

EÜAŞ Genel Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık malar
EÜAŞ Genel Müdürlüğü						132.091.950	737.950	22.390.000	450	450	0		
139	2009D070570	Gaz ve Buhar Türbin Generatörlerin İkaz ve İkaz Kontrol Sistemlerinin Yenilenmesi	KT	2009	2014	9.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	HB
140	2010D070290	Buhar Türbinleri 6 Kv Az Yağlı Kesicilerinin Vakumlu Tip Kesicilere Dönüştürülmesi (24 Ad. 800 Amper, 6 Ad. 1250 Amper Kesici)	KT	2010	2013	500.000	396.000	100.000	0	0	0	100	BT
141	2010D070520	A-B Gaz Türbinleri İçin Fogging (Sisleme) Sistem Kurulması	KT	2010	2013	700.000	0	560.000	450	450	0	70	DE
142	2010D070530	Su Arıtma 1. Ünitesinin Kapasitesinin 35 m3 /h Artırılması	KT	2010	2013	600.000	0	480.000	0	0	0	100	BT
143	2010D070540	Gaz Türbinleri Start Ekipmanlarının Yenilenmesi	KT	2010	2013	8.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	HB
144	2012D010090	Yanma Odası, Yakıcı ve Kontrol Sistemlerinin Değişimi	KT	2012	2014	55.000.000	0	5.500.000	0	0	0	0	HB
145	2012D071100	Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi	KT	2012	2014	597.000	277.000	320.000	0	0	0	100	BT
146	2012D071110	Biyolojik Arıtma Tesisi	KT	2012	2014	144.950	64.950	80.000	0	0	0	100	BT
147	2013D010020	C1 ve C2 Gaz Tribünlerinin GT 13 DM Modele Upgrade Edilmesi	KT	2013	2015	52.750.000	0	5.300.000	0	0	0	0	HB
148	2013D070290	Lojman Tesisatlarının Yenilenmesi	KT	2013	2014	1.500.000	0	750.000	0	0	0	0	HB
149	2013D070700	Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler	KT	2013	2013	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	DE
150	2013D070890	380 kV (10 ad) ve 154 kV (3 ad) Yüksek Gerilim Kesicilerinin Yenilenmesi	KT	2013	2013	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	HB
151	2013D080060	Yıl İçinde Alınması Zorunlu Makine Teshizat	KT	2013	2013	300.000	0	300.000	0	0	0	0	DE

5 Ulaştırma

Ulaştırma

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toplam karayolu uzunluğu (otoyol+devlet yolu+il yolu) (km)	626	619	619	619	619	622	622	622
Otoyol (km)	77	77	77	77	77	77	77	77
Devlet ve İl yolu toplamı (km)	549	542	542	542	542	545	545	545
Sıcak asfalt kaplama (km)	80	96	129	156	156	167	202	202
Sathi kaplama (km)	469	446	412	385	385	374	342	342
Bölünmüş yol (km)	56	59	86	115	115	132	137	137
Sıcak asfalt kaplama (km)	29	32	56	99	99	122	137	137
Sathi kaplama (km)	27	27	30	16	16	10	0	0
Devlet Yolu (km)	342	342	342	342	342	342	342	342
İl Yolu (km)	207	200	200	200	200	203	203	203
Köy Yolu (km)		1.970	1.922	1.921	1.924	1.921	1.921	1.910
Asfalt köy yolu (km)		1.174	1.152	1.175	1.181	1.213	1.242	1.242
Stabilize köy yolu (km)		662	647	632	628	593	553	553
Kilometrekareye düşen Devlet ve İl Yolu ağı (m)	84	83	83	83	83	83	83	83
Kilometrekareye düşen Köy Yolu ağı (m)		301	293	293	294	293	292	292
Kilometrekareye düşen Asfalt Köy Yolu ağı (m)		179	176	179	180	185	190	190
Toplam Motorlu Araç Sayısı (2)	37.142	39.723	42.618	45.656	49.436	53.564	57.779	
Otomobil	25.893	27.413	29.161	31.365	33.798	36.436	39.254	
Trafik kazası sayısı	490	579	557	539	542	704	767	
Trafik kazalarında ölü sayısı	29	33	25	23	45	22	33	
Trafik kazalarında yaralı sayısı	868	1.004	963	999	1.014	1.283	1.389	
Bir milyon nüfusta trafik kazalarında ölü sayısı	99	74	69	135	65	97		
Bir milyon araç başına ölü sayısı	441	444	337	294	540	246	347	

2 Traktör, iş makineleri, motosiklet ve özel amaçlı araç toplama dahil değildir.

Kırklareli il sınırları içinde 77 kilometre otoyol, 342 kilometre devlet yolu, 203 kilometre il yolu bulunmaktadır. İl içinde karayolunun toplam uzunluğu 622 kilometredir. D-100 ve TEM Otoyolu ana bağlantıları oluşturmaktadır. Devlet ve İl yollarımızın 137 km si bölünmüş yol, 202 km si bitümlü sıcak karışım kaplama, 342 km.si sathi kaplamalı yollardır.

2003-2013 yıllarında toplam 130 km bölünmüş yol yapılmıştır.

Devlet ve İl yolları dışında 1.910 km köy yolu bulunmaktadır. Bunun 1.242 kilometresi asfalt, 553 kilometresi stabilize, 16 kilometresi tesviye, 99 kilometresi de ham yoldur. Tüm köylerimizin yolu asfalttır.

Ulaştırma Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Ulaştırma	102	873.933.900	184.739.715	60.911.606	52.362.605	50.072.627	19	3	0	16	64	82
	Karayolu Ulaştırması	79	359.391.081	165.808.390	46.335.984	44.614.316	42.329.828	16	1	0	8	54	91
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	21	347.247.368	165.808.390	36.813.857	35.095.974	35.095.974	11	1	0	5	4	95
2	İl Özel İdaresi	58	12.143.713	0	9.522.127	9.518.342	7.233.854	5	0	0	3	50	76
	Demiryolu Ulaştırması	18	513.452.819	18.192.325	14.225.621	7.560.289	7.560.289	2	2	0	8	6	53
3	İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	1	479.466.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
4	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	17	33.986.819	18.192.325	14.225.620	7.560.289	7.560.289	1	2	0	8	6	53
	Boru Hattı Ulaştırması	5	1.090.000	739.000	350.001	188.000	182.510	1	0	0	0	4	52
5	BOTAŞ Şube Müdürlüğü	5	1.090.000	739.000	350.001	188.000	182.510	1	0	0	0	4	52

Ulaştırma sektöründe 2013 yılında 102 proje uygulanmıştır. Bunların toplam proje tutarı 873.933.900 liradır. 50.072.627 lira harcama yapılmış ve yüzde 82 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 50 proje tamamlanmıştır.

Karayolu

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü


Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 21 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 347.247.368 liradır. 2013 yılı programı 36.813.857 liradır. 35.095.974 lira ödenek gönderilmiş ve 35.095.974 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 95 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 4 proje bitmiştir. 5 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır. 11 projeye hiç başlanmamıştır.

Otoyol Ayrımı-K.eli-Dereköy-Aziziye-Bulgaristan Hudut Yolu ile Babaeski-Trakya Otoyolu Arası Bölünmüş Yolu tamamlanmıştır. Kesin hesap çalışmaları yapılmaktadır.

Kırklareli – Edirne Bölünmüş Yolu toplam 47 km uzunluğundadır. 26 km si Kırklareli'nde bulunmaktadır. 2 X 2 B.Y. - 1 A standartlarındaki yolun ihalesi 16.03.2012 tarihinde, 53.933.000 lira bedelle yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü						347.247.368	165.808.390	36.813.857	35.095.974	35.095.974	95		
						236.229.000	135.644.307	5.567.050	4.749.043	4.749.043	85		
152	1991E040090	Otoyol Ayrımı-K.eli-Dereköy-Aziziye-Bulgaristan Hudut Yolu (1A, BY 63 km.)	GB	1995	2016	129.737.000	107.065.000	598.000	0	0	0	100	BT
153	1993E040860	Babaeski-Trakya Otoyolu Arası Bölünmüş Yolu (14 km)	GB	2003	2016	25.869.000	10.500.000	200.000	0	0	0	100	BT
154	2011E040690	Yenice - Demirköy Yolu İyileştirmesi (1A, 22 km)	GB	2011	2016	52.500.000	15.797.307	4.749.043	4.749.043	4.749.043	100	88	DE
155	1986E040360	Lüleburgaz Çevre Yolu (BY 10 km)	GB	2010	2016	17.208.000	7.000	2.000	0	0	0	0	HB
		Üsküpdere Grubu Köprüleri											
156	2003E040260	Üsküpdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (25 m)	GB	2009	2013	1.200.000	821.000	2.000	0	0	0	0	HB
		Babaeski Grubu Köprüleri											
157	2003E040260	Müsellim Köprüsü (Babaeski - Lüleburgaz yolunda) (25 m)	GB	2009	2016	1.400.000	1.164.000	2.000	0	0	0		DE
		Soğucak Grubu Köprüleri											
158	2003E040260	Soğucak (Suluca) Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (22 m)	GB	2010	2013	600.000	107.000	2.000	0	0	0	0	HB
159	2003E040260	Poyralıdere Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (33 m)	GB	2010	2013	900.000	181.000	2.000	0	0	0	0	HB
		Kırklareli Grubu Köprüleri											
160	2003E040260	Ürünli Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (11 m)	GB	2012	2016	300.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
161	2003E040260	Saksağandere Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (2x30 m)	GB	2012	2016	1.550.000	0	1	0	0	0	0	HB
162	2003E040260	İnce Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (108 m)	GB	2012	2016	2.800.000	0	1	0	0	0	0	HB
163	2003E040260	Kurtidere (Çayırder) Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (32 m)	GB	2012	2016	830.000	0	1	0	0	0	0	HB
164	2003E040260	Manastırdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (20 m)	GB	2012	2016	520.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğer Köprüler											
165	2000E040020	Alpullu (Sinanlı) Köprüsü (125 m)	GB	2010	2014	300.000	2.000	1	0	0	0	0	İA
		Köprü Onarımları											
166	2001E040110	Asker Köprüsü (İğneada - Poyralı yolunda)	GB	2012	2013	215.000	0	1	0	0	0	0	HB
167	2001E040110	Poyralı Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda)	GB	2012	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
						111.018.368	30.164.083	31.246.807	30.346.931	30.346.931	97		
Bölünmüş Yollar (50,5 km)						99.018.368	30.164.083	19.246.807	19.246.807	19.246.807	100		
168	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz İlçe Hd.-Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu (17,5 km)	GB	2009	2013	22.200.000	20.738.287	1.460.000	1.460.000	1.460.000	100	100	BT
169	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz - Babaeski - Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu Üstyapı İşleri (28,5 km)	GB	2013	2014	25.000.000	0	11.190.599	11.190.599	11.190.599	100		DE
170	000000000000	Kırklareli - Kofçaz Bölünmüş Yolu (7 km)	GB	2011	2013	16.867.385	9.425.796	3.606.208	3.606.208	3.606.208	100	100	BT
171	000000000000	020-02 Devlet Yolu Kırklareli - Edirne Bölünmüş Yolu (26 / 47 km)	GB	2013	2016	34.950.983	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000	100		DE
Diğerleri						12.000.000	0	12.000.000	11.100.124	11.100.124	93		
172	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2013	2013	12.000.000	0	12.000.000	11.100.124	11.100.124	93		DE

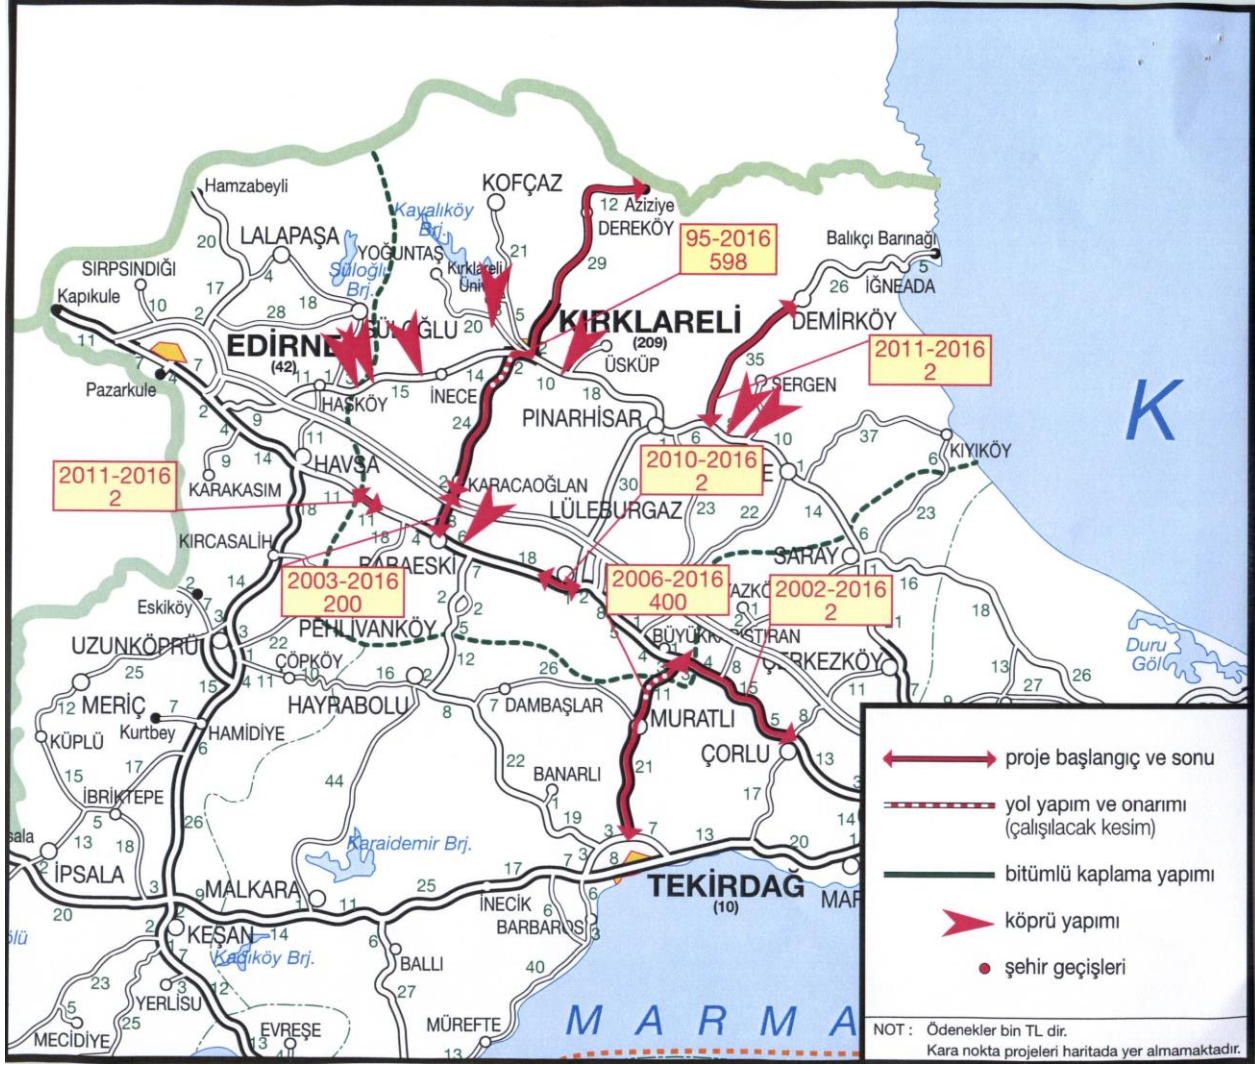

Kırklareli – Kofçaz Bölünmüş Yolu



Kırklareli – Edirne Bölünmüş yolu

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresinin 2013 yılında 58 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 12.143.713 liradır. 2013 yılı programı 9.522.127 liradır. 9.518.342 lira ödenek gönderilmiş ve 7.233.854 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 76 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 50 proje bitmiştir. 3 proje devam etmektedir. 5 projeye hiç başlanmamıştır.

Köy yolu Çalışmaları

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Harcamalar		5.416.557	9.971.269	2.191.378	2.842.953	5.004.699	7.588.386	6.858.386	9.792.570
	Ö	930.000	1.010.000	379.586	1.683.640	1.530.575	3.274.314	5.149.861	7.233.854
	K	4.486.557	8.961.269	1.811.792	1.159.313	3.474.124	4.314.072	1.708.525	2.558.716
Köy yolu onarımı (km)		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	.
	K	.	6,0	.	.	.	.	.	.
Köy yolu stabilize kaplama (km)		27,0	67,0	25,5	50,5	23,5	0,0	7,0	15,0
	Ö	.	67,0	23,0	49,0	12,0	.	7,0	15,0
	K	27,0	.	2,5	1,5	11,5	.	.	.
Köy yolu birinci kat asfalt kaplama (km)		59,5	48,5	16,0	9,4	22,0	4,0	33,0	57,6
	Ö	.	16,5	16,0	9,0	16,0	1,0	22,0	57,6
	K	59,5	32,0	.	0,4	6,0	3,0	11,0	.
Köy yolu ikinci kat asfalt kaplama (km)		120,8	132,5	80,5	77,0	88,8	182,0	81,3	139,5
	Ö	62,3	36,5	18,0	36,0	18,0	84,0	69,0	109,0
	K	58,5	96,0	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	30,5
Köy yolu parke taşı kaplaması (m ²)		23.204	239.170	0	4.134	50.574	27.227	27.896	41.236
	Ö	.	.	.	.	.	7.187	8.244	12.722
	K	23.204	239.170	.	4.134	50.574	20.040	19.652	28.514
Köprü		2	1	0	0	0	0	0	0
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	.
	K	2	1	.	.	.	.	.	.
Menfez		14	3	2	1	2	8	7	9
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	5
	K	14	3	2	1	2	8	7	4

Ö: İl Özel İdaresi (Afet, TPAO vb. dahil), K: KÖYDES Projesi

İl Özel İdaresi tarafından 2013 yılında KÖYDES, Özel İdare, Afet İşleri, TPAO kaynaklarıyla 28 km stabilize kaplama, 57,6 km 1. Kat asfalt kaplama, 153,5 km 2. Kat asfalt kaplama, 39 köyde 58.272 m² parke taşı kaplaması, 15 menfez yapımı planlanmıştır.

Bunlardan, 15 km stabilize kaplama, 57,6 km 1. Kat asfalt kaplama, 139,5 km 2. Kat asfalt kaplama, 41.236 m² parke taşı kaplaması ve 9 menfez tamamlanmıştır. Diğerlerinde çalışmalar devam etmektedir.



Kızılcıkdere Köyiçi 2. Kat Asfalt Kaplama



Devlet yolu İltihak – Müsellim 2. Kat Asfalt Kaplaması

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		İl Özel İdaresi				12.143.713	0	9.522.127	9.518.342	7.233.854	76		
		Köy Yolları Yapımı				12.143.713	0	9.522.127	9.518.342	7.233.854	76		
		Stabilize Kaplama (28 km)				2.321.553	0	1.030.002	1.030.000	0	0		
		Özel idare (9 km)				1.291.552	0	1	0	0	0		
173	000000000000	Aksicim - T.daş İl Hd. (Saray) Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (9 km) Afet işleri (13 km)	Öİ	2013	2013	1.291.552	0	1	0	0	0	100	BT
174	000000000000	Dy. İlt.-Ovacık Köy yolu Stabilize Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	HB
175	000000000000	Sinanlı-Oklağlı Köy yolu Stabilize Kaplama (8 km) TPAO (6 km)	GB	2013	2013	630.000	0	630.000	630.000	0	0	0	HB
176	000000000000	Düğünçübaşı - Alacaoğlu Köy yolu Stabilize kaplama (6 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
		1. Kat Asfalt Kaplama (57,6 km)				1.791.558	0	500.007	500.000	500.000	100		
		Özel idare (14 km)				1.291.553	0	2	0	0	0		
177	000000000000	Kuştepe - İmampazarı Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (5 km)	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
178	000000000000	Aksicim - T.daş İl Hd. (Saray) Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (9 km) Afet işleri (22 km)	Öİ	2013	2013	1.291.552	0	1	0	0	0	100	BT
179	000000000000	Dy. İlt. -Çiftlikköy Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (4 km)	GB	2013	2013	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
180	000000000000	Karamusul-Kayabeyli Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (2 km)	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
181	000000000000	Kayabeyli-Tren İstasyonu (Seyitler) Köy yolu 1. Kat asfalt kaplama (3 km)	GB	2013	2013	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
182	000000000000	Dy. İlt. (Eskitaşlı)-Celaliye Köy yolu 1. Kat asfalt kaplama (6 km)	GB	2013	2013	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
183	000000000000	Eskibedir - Yenibedir Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
184	000000000000	Eskibedir - Lüleburgaz Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (4 km) TPAO (21,6 km)	GB	2013	2013	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
185	000000000000	İly. İlt. (Kofçaz) - Ky. İlt. (Erikler) Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (8 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
186	000000000000	Kumrular - Hamitabat Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (5 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
187	000000000000	Düğünçübaşı - Alacaoğlu Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (6 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
188	000000000000	Ky. İlt. (Cevizköy) - TPAO Atıksu depo yolu 1. Kat asfalt kaplama (1,6 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
189	000000000000	Ky. İlt. - TPAO Sondaj park 1. Kat asfalt kaplama (1 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (109 km)				2.925.007	0	2.925.007	2.925.002	2.925.000	100		
		Afet işleri (73 km)				2.925.002	0	2.925.002	2.925.002	2.925.000	100		
190	000000000000	B.mandıra - T.daş İl Hd. (Karakavak) Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	GB	2013	2013	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
191	000000000000	B.mandıra - Katranca Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
192	000000000000	Kuleli-Ağayeri Köy yolu 2. Kat asfalt kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
193	000000000000	Ağayeri-Yeşilova Köy yolu 2. Kat asfalt kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
194	000000000000	İly. İlt. (Tozaklı) - Ertuğrul Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	GB	2013	2013	315.000	0	315.000	315.000	315.000	100	100	BT
195	000000000000	Lüleburgaz - Eskibedir Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	1	0	1	1	0	0	100	BT
196	000000000000	Eskibedir - Ovacık Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
197	000000000000	Eskibedir - Yenibedir Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	1	0	1	1	0	0	100	BT
198	000000000000	Karamusul - Çiftlikköy Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
199	000000000000	Tren İst. - Düğünçübaşı Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	225.000	0	225.000	225.000	225.000	100	100	BT
200	000000000000	Tren İst. - Alacaoğlu Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
201	000000000000	Ovacık - Kayabeyli Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
202	000000000000	Dy. İlt. - Karamusul Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
203	000000000000	Ertuğrul - Karaağaç Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
204	000000000000	Kuştepe-Hıdırcı Köy yolu 2. Kat asfalt kaplama (5 km)	GB	2013	2013	225.000	0	225.000	225.000	225.000	100	100	BT
205	000000000000	İmampazarı - Kumköy Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	GB	2013	2013	45.000	0	45.000	45.000	45.000	100	100	BT
206	000000000000	Poyralı - İly. İlt. (Tozaklı) Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	225.000	0	225.000	225.000	225.000	100	100	BT
207	000000000000	Akıncılar - T.daş İl Hd. (Kadıköy) Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
208	000000000000	Müsellim - Hasbuğa Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		TPAO (36 km)				5	0	5	0	0	0	0	
209	000000000000	İnece - Kavaklı Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
210	000000000000	Dy. İlt. - Düşüncülü Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
211	000000000000	Tastepe - Yukarıkanara Köyü 2. Kat asfalt kaplama (10 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
212	000000000000	Düşüncülü Köyü - T. dağ İl Hd. (Avlubaşı) Köyü 2. Kat asfalt kaplama (4 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
213	000000000000	Pazarlı - Çavuşköy - Develi - Vize Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (12.722 m²)				435.941	0	435.941	432.170	52.170	12		
		Afet işleri (10.622 m²)				380.000	0	380.000	380.000	0	0		
214	000000000000	Vize Akıncılar Köyü Parke Taşı Kaplaması (3.042 m²)	GB	2013	2013	110.000	0	110.000	110.000	0	0	100	BT
215	000000000000	Vize Çövenli Köyü Parke Taşı Kaplaması (2.833 m²)	GB	2013	2013	110.000	0	110.000	110.000	0	0	100	BT
216	000000000000	Vize Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (3.592 m²)	GB	2013	2013	110.000	0	110.000	110.000	0	0	100	BT
217	000000000000	Vize Topçuköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.155 m²)	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	0	0	100	BT
		İller Bankası (2.100 m²)				55.941	0	55.941	52.170	52.170	93		
218	000000000000	B. eski Minnetler Köyü Parke Taşı Kaplaması (2.100 m²)	İB	2013	2013	55.941	0	55.941	52.170	52.170	93	100	BT
		Menfez Yapımı (10 adet)				578.484	0	540.000	540.000	0	0		
		Özel İdare (1 adet)				38.484	0	0	0	0	0		
219	000000000000	Vize Okçular Köyü Menfez Yapımı	Öİ	2013	2013	38.484	0	0	0	0	0	100	BT
		Afet işleri (9 adet)				540.000	0	540.000	540.000	0	0		
220	000000000000	L.burgaz Ayvalı Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
221	000000000000	L.burgaz Düşüncülü Köyü Menfez Yapımı (2 adet)	GB	2013	2013	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	HB
222	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
223	000000000000	L.burgaz Ovacık Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	HB
224	000000000000	L.burgaz Tatarköy Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
225	000000000000	Vize Akıncılar Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
226	000000000000	Vize Müsellim Menfez Yapımı (2 adet)	GB	2013	2013	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	HB
		Diğerleri				4.091.170	0	4.091.170	4.091.170	3.756.684	92		
227	000000000000	Köy Yolları Yapım Projesi	Öİ	2013	2013	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
228	000000000000	Köy Yolları Bakım ve Onarımları	Öİ	2013	2013	1.519.954	0	1.519.954	1.519.954	1.519.954	100		DE
229	000000000000	Akaryakıt Alımları	Öİ	2013	2013	1.596.216	0	1.596.216	1.596.216	1.596.216	100		DE
230	000000000000	Akaryakıt Alımları (Afet işleri)	GB	2013	2013	725.000	0	725.000	725.000	390.514	54		DE



Yeşilce – Karacadağ 1. Kat Asfalt Kaplama



Trafik işaretleme çalışmaları

Demiryolu

İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü

İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 473.466.000 liradır. 2013 yılı programı 1 liradır. Harcama yapılmamıştır. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

Halkalı Bulgaristan Hududu Demiryolu İnşaatında 230 km nin 60 km si Kırklareli il sınırları içinde yer almaktadır. Etüd proje ve mühendislik hizmetleri tamamlanmış olup, kamulaştırma çalışmaları devam etmektedir.

Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri kapsamında; 1/25.000 ölçekli güzergah araştırması ve amenejman etüdü, 1/2.000 ölçekli şeritvari haritaların hazırlanması, güzergah üzerinde gerekli sondajlar ile laboratuvar deneylerinin ve diğer zemin araştırma işleri, tüneller, köprüler, istinat duvarları gibi sanat yapıları ile istasyon tesislerinin ve demiryolunun teknik şartnamelerdeki esaslara göre projeleri, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon projeleri ile ÇED raporu tamamlanmıştır.

İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü				479.466.000	0	1	0	0	0	0	
231	2007E010140	Halkalı Kapıkule Bulgaristan Hududu Demiryolu İnşaatı (60/230 km)	GB	2007	2016	479.466.000	0	1	0	0	0	0	HB

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 17 proje uygulaması mevcuttur. Projelerin toplam tutarı 33.986.819 liradır. 2013 yılı programı 14.225.620 liradır. 7.560.289 lira ödenek gönderilmiş ve 7.560.289 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 53 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 6 proje bitmiştir. 8 proje devam etmektedir. 2 proje ihale aşamasındadır. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		TCDD 1. Bölge Müdürlüğü				33.986.819	18.192.325	14.225.620	7.560.289	7.560.289	53		
232	2013E010050	1.Bölge Müdürlüğü mntkasında 33 adet Gar ve İstasyon ile 9 adet trafo merkezinde kameralı güvenlik sistemi kurulması (Kırklareli 2 Adet)	KT	2011	2014	4.031.567	2.720.567	1.311.000	1.031.000	1.031.000	79	95	BT
233	2013E010010	Sirkeci -Demirköprü (Hudut) Hattı, Çerkezköy - Seyitler -Pehlivan köy Arası 218 Km Yol Yenilemesi Ve Altyapı İyileştirilmesi Tamamlama İşleri	KT	2011	2013	11.445.578	7.945.578	3.000.000	2.899.448	2.899.448	97	100	BT
234	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğüne 60 Adet 60 E1 Profilindeki Raylara Uygun Basit Makas Temini ve Montajı (Edirne 23, Kırklareli 20, Tekirdağ 17)	KT	2011	2014	8.360.050	6.760.050	1.600.000	501.929	501.929	31	90	DE
235	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğü mntkasında 37 adet hemzemin geçitte kaplama yapılması (İstanbul-Uzunköprü hattı 15 adet H.Paşa-(Eskişehir) Ankara hattı 17 adet Arifiye-Adapazarı hattı 1 adet Pehlivan köy - Kapıkule hattı 4 adet)	KT	2012	2014	1.842.710	0	1.842.705	0	0	0	0	HB
236	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğü mntkasında 20 Adet 60 E1'lik Makas Temini ve Montajı (Edirne 4 Adet, Kırklareli 14 Adet, Tekirdağ 2 Adet)	KT	2012	2013	2.566.000	0	2.566.000	2.476.871	2.476.871	97	100	BT
237	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğü mntkasında 15107 m istasyon yolu yenilemesi İstanbul-Demirköprü Hattı 1.825 m, Mandıra-Kırklareli Hattı 1.556 m, Pehlivan köy-Kapıkule Hattı 11.726 m (Kırklareli 3381 Mt. Edirne 11726 Mt.dir.)	KT	2012	2014	1.200.000	0	1.200.000	330.947	330.947	28	30	DE
238	2012E010040	Hemzemin Geçitlerin Kontrollü Hale Getirilmesi ve Kamera Sistemi Kurulması	KT	2012	2013	935.000	766.130	1	0	0	0	100	BT

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
239	2013E010040	1. Bölge Müdürlüğü mntığında 22 adet S49 makas temini ve montajı (İstanbul - Demirköprü hattı 5 adet Pehlivan köy - Kapıkule hattı 17 adet)	KT	2013	2014	194.876	0	194.876	0	0	0	0	DE
240	2013E010010	İstanbul - Demirköprü Hattı Muratlı - Alpullu Arası Km:181+200 - 228+100 Arasında 6.000 m Panel Tipi İhata Yapılması	KT	2013	2014	525.000	0	525.000	177.625	177.625	34	0	DE
241	2013E010010	İstanbul - Demirköprü Hattı Muratlı - Alpullu Arası Km:132+200 - 281+100 ve P.köy Kapıkule Hattı km 0+500 - 67+500 Arası Altyapı İşlerinin Projelendirilmesi	KT	2013	2014	491.180	0	491.180	0	0	0	0	İA
242	2013E010010	İstanbul - Demirköprü Hattı Çerkezköy - Halkalı İstasyonları Arası Km:38 - 56, 74 - 96, 105 - 111 Arası Altyapı İşlerinin Projelendirilmesi	KT	2013	2014	300.000	0	300.000	0	0	0	0	İA
243	2013E010040	Bozüyük, Bilecik, Çerkezköy, Lüleburgaz, Edirne'ye sinyalizasyon ve elektrifikasyon malzemeleri için 500 m2 kapalı depo yapılması	KT	2013	2013	536.348	0	536.348	1.245	1.245	0	0	DE
244	2013E010040	Çerkezköy Kapıkule arasında bulunan yerel kumanda masalarının yenilenmesi	KT	2013	2013	270.000	0	270.000	0	0	0	5	DE
245	2013E010040	Edirne Kapıkule Pehlivan köy ve Uzunköprü Santrallerine 48 V 30 Ah 1 er adet redresör alımı	KT	2013	2013	6.500	0	6.500	6.500	6.500	100	100	BT
246	2013E010040	Pehlivan köy-Pityon hattının PRI olarak çalıştırılması için 2 adet PRI kartı alınması ve bağlantısının sağlanması	KT	2013	2013	20.000	0	20.000	12.850	12.850	64	100	BT
247	2013E010040	Kırklareli İli Sınırları İçerisinde Yeralan Hizmetevlerine Doğal Gaz Bağlanması ve Sıhhi Tesisatlarının Yenilenmesi	KT	2013	2014	120.000	0	120.000	118.269	118.269	99	98	DE
248	2013E010030	Pehlivan köy istasyon binası restorasyonu ve çevre düzenlemesi ile saha aydınlatması	KT	2013	2014	1.142.010	0	242.010	3.605	3.605	1	10	DE



Alpullu Gar Binası



Geçit Kaplama Çalışmaları

Boru Hattı

BOTAŞ Şube Müdürlüğü

BOTAŞ Şube Müdürlüğü'nün 2013 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Projelerin toplam tutarı 1.090.000 liradır. 2013 yılı programı 350.001 liradır. 188.000 lira ödenek gönderilmiş ve 182.510 lira harcama yapılmıştır. 4 proje bitmiştir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

BOTAŞ Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
BOTAŞ Şube Müdürlüğü						1.090.000	739.000	350.001	188.000	182.510	52		
249	2007E050060	K.eli CS-1 Kompresör İstasyonu Yangın Alarm Sistemlerinin Revizyonu	KT	2011	2013	740.000	739.000	1	0	0	0	100	BT
250	2013E050010	Sekiz Evler Banyo WC'lerin Yenilenmesi	KT	2013	2013	25.000	0	25.000	25.000	23.900	96	100	BT
251	2013E050010	İdari Bina Zemininde Çöken Kısımların Tadilatının Yapılması	KT	2013	2013	13.000	0	13.000	13.000	10.660	82	100	BT
252	2013E050010	Pig Kovanı Bağlantı Hattı Yapılması	KT	2013	2013	150.000	0	150.000	150.000	147.950	99	100	BT
253	2013E050010	Ambar ve Mekanik Atölye Dış Cephelerinin Revizyonu	KT	2013	2013	162.000	0	162.000	0	0	0	0	HB

7 Turizm

Turizm

		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Turizm işletme belgeli konaklama tesisleri	A	5	5	4	3	1	2	3
	B	263	263	221	161	89	215	256
	C	532	532	448	328	178	430	512
Belediye belgeli konaklama tesisleri	A		33	33	33	45	45	41
	B		642	642	642	884	884	1.153
	C		1.411	1.411	1.411	2.028	2.028	2.499
Turizm işletme belgeli tesislerde geceleme	T	44.334	43.986	33.775	18.449	23.008	40.522	
	D	41.788	39.792	31.153	16.925	22.050	38.572	
	E	2.546	4.194	2.622	1.524	958	1.950	
Turizm işletme belgeli tesislerde ortalama kalış süresi	T	2,05	2,09	1,74	1,93	2,25	1,82	
	D	2,01	2,02	1,72	1,86	2,25	1,79	
	E	2,83	3,21	1,94	3,47	2,16	2,60	
Belediye belgeli tesislerde geceleme	T	75.644	82.491	86.996	118.689	149.270	192.708	
	D	74.424	81.805	85.983	112.322	142.239	185.570	
	E	1.220	686	1.013	6.367	7.031	7.138	
Belediye belgeli tesislerde ortalama kalış süresi	T	1,10	1,35	1,50	1,17	1,26	1,29	
	D	1,10	1,35	1,50	1,17	1,26	1,27	
	E	1,32	1,30	1,60	1,24	1,30	1,96	

A: Tesis sayısı, B: Oda sayısı, C: Yatak sayısı

T: Toplam, D: Yerli, E: Yabancı

Turizm Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler	İhale aşamasında kalan projeler	Yarım kalan projeler	Devam eden projeler	Biten projeler	Parasalar
Turizm		6	6.227.000	0	2.927.001	1.656.356	156.356	2	0	0	2	2	5
1	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	1	2.000.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	2	187.000	0	187.000	150.006	150.006	0	0	0	0	2	80
3	İl Özel İdaresi	3	4.040.000	0	2.740.000	1.506.350	6.350	1	0	0	2	0	0

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 2.000.000 liradır. 2013 yılı programı 1 liradır. Harcama yapılmamıştır. 1 projeye henüz başlanmamıştır

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalar	Fiziki
		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				2.000.000	0	1	0	0	0	
254	000000000000	Dupnisa Mağarası Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatması	GB	2010	2013	2.000.000	0	1	0	0	0	HB



Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nün 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2013 yılı programı 187.000 liradır. 150.006 lira ödenek gönderilmiş ve 150.006 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 80 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Fiziki 2013 yılı gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü						187.000	0	187.000	150.006	150.006	80	
255	2001F000080	Milli Park Projesi (etüd, proje, uygulama)	GB	2013	2013	155.000	0	155.000	119.127	119.127	77	BT
256	2013F000080	K.eli Orman ve Su İşleri Şb. Md.lüğü Hiz. Bin. Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	32.000	0	32.000	30.879	30.879	96	BT

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi'nin 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 4.040.000 liradır. 2013 yılı programı 2.740.000 liradır. 1.506.350 lira ödenek gönderilmiş ve 6.350 lira harcama yapılmıştır. 2 proje devam etmektedir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Fiziki 2013 yılı gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
İl Özel İdaresi						4.040.000	0	2.740.000	1.506.350	6.350	0	
257	000000000000	K.eli Vali Faik İlköğretim Okulu Restorasyonu	Öİ	2013	2014	3.000.000	0	1.700.000	1.500.000	0	0	DE
258	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Köyü İlkokulu Restorasyonu	Öİ	2013	2013	40.000	0	40.000	6.350	6.350	16	DE
259	000000000000	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Yolları	Öİ	2013	2013	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	HB

8 Konut

Konut sektöründe 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2013 yılı programı 40.000 liradır. 36.580 lira harcama yapılmış ve proje tamamlanmıştır.

Konut Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Konut	1	40.000	0	36.580	36.580	36.580	0	0	0	0	1	100
1	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	40.000	0	36.580	36.580	36.580	0	0	0	0	1	100

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 40.000 liradır. 2013 yılı programı, gönderilen ödenek ve harcama miktarı 36.580 liradır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Proje bitmiştir..

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				40.000	0	36.580	36.580	36.580	100		
260	2013G000140	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojmanları Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	40.000	0	36.580	36.580	36.580	100	100	BT

9 Eğitim

Eğitim

	2008	2009	2010	2011	2012
Okuma yazma oranı (6 yaş üstü)	95,58	95,83	96,33	96,89	97,10
Erkek	98,07	98,22	98,46	98,77	98,87
Kadın	93,00	93,39	94,15	94,90	95,23
15 yaş üstü İlkokul mezunlarının oranı (%)	42,59	42,93	35,57	33,35	32,67
15 yaş üstü İlköğretim mezunlarının oranı (%)	9,09	9,17	15,60	17,82	18,40
15 yaş üstü Lise veya dengi okul mezunlarının oranı (%)	20,98	21,63	23,07	23,97	24,03
15 yaş üstü Yüksekokul veya fakülte mezunlarının oranı (%)	6,29	7,44	7,88	9,25	9,90
Okul öncesi okullaşma oranı					
3 - 5 Yaş			35,42	37,20	41,38
4 - 5 Yaş			50,76	52,41	58,93
5 Yaş				75,66	80,51
İlköğretim okullaşma oranı					
Brüt	103,74	105,49	106,95	107,78	105,46
Net	98,01	99,08	99,03	99,05	99,26
Orta öğretim okullaşma oranı					
Brüt	92,34	97,86	99,95	100,64	103,62
Net	79,87	84,39	83,92	83,77	85,32

Yılı İçinde Hizmete Açılan Derslik Sayısı

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Toplam	20	74	24	86	74	8	16	8
Anaokulu	8			4	8	8		8
İlköğretim	8	50	24	58	66		16	
İlkokul								
Ortaokul								
Ortaöğretim		24		24				
Diğerleri	4							

Eğitim sektöründe 2013 yılında 42 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 189.075.948 liradır. 2013 yılı programı 73.956.625 liradır. 43.584.761 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 59 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 9 proje tamamlanmıştır. 17 proje devam etmektedir. 4 ihale aşamasındadır. 12 projeye henüz başlanmamıştır.

Eğitim Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Eğitim	42	189.075.948	59.038.163	73.956.625	50.826.819	43.584.761	12	4	0	17	9	59
	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim	12	35.303.216	1.194.589	19.214.780	12.142.461	9.875.360	2	1	0	7	2	51
1	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	12	35.303.216	1.194.589	19.214.780	12.142.461	9.875.360	2	1	0	7	2	51
	Mesleki ve Teknik Eğitim	4	24.208.972	2.417.963	14.641.009	5.600.570	5.600.570	0	2	0	2	0	38
2	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	3	18.208.972	2.417.963	8.641.009	5.592.310	5.592.310	0	1	0	2	0	65
3	İl Özel İdaresi	1	6.000.000	0	6.000.000	8.260	8.260	0	1	0	0	0	0
	Yüksek Öğretim	8	106.313.060	48.612.000	28.959.060	25.759.060	21.484.135	4	0	0	4	0	74
4	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	5	75.213.060	48.612.000	25.759.060	25.759.060	21.484.135	1	0	0	4	0	83
5	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0
6	İl Özel İdaresi	1	100.000	0	100.000	0	0	1	0	0	0	0	0
	Kültür	9	3.184.562	0	784.564	409.525	343.289	6	0	0	1	2	44
7	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	4	1.409.561	0	509.561	134.525	134.525	3	0	0	1	0	26
8	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	5	1.775.001	0	275.003	275.000	208.764	3	0	0	0	2	76
	Beden Eğitimi ve Spor	9	20.066.138	6.813.611	10.357.212	6.915.203	6.281.407	0	1	0	3	5	61
9	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	5	9.666.315	0	6.771.000	4.280.642	3.646.846	0	0	0	2	3	54
10	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	1	9.229.823	6.730.000	2.499.823	2.499.823	2.499.823	0	0	0	1	0	100
11	İl Özel İdaresi	3	1.170.000	83.611	1.086.389	134.738	134.738	0	1	0	0	2	12

İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2013 yılında 12 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 35.303.216 liradır. 2013 yılı programı 19.214.780 liradır. 12.142.461 lira ödenek gönderilmiş ve 9.875.360 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 51 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 7 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır. 2 projeye başlanmamıştır.

Babaeski Gazi Kemal Mahallesi Anaokulu (4 drs) ve Pınarhisar Dere Mahallesi Anaokulu (4 drs) inşaatları tamamlanmıştır.

93 okul ve kurumda yapılmakta olan bakım ve onarımlardan 80'i bitirilmiştir. 13'ünde çalışmalar devam etmektedir.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Milli Eğitim Müdürlüğü						35.303.216	1.194.589	19.214.780	12.142.461	9.875.360	51		
Anaokulu İnşaatları (8 drs)						3.367.863	789.963	1.657.987	1.657.987	1.520.136	92		
261	000000000000	B.eski Gazi Kemal Mah. (Ayçiçeği) Anaokulu İnş. (4 drs)	GB	2011	2013	1.480.486	242.246	895.878	895.878	840.146	94	100	BT
262	000000000000	P.hisar Dere Mah. (Yıldız) Anaokulu İnş. (4 drs)	GB	2010	2013	1.887.377	547.717	762.109	762.109	679.990	89	100	BT
İlkokul İnşaatları (40 drs)						7.000.000	0	925.000	745.000	7.670	1		
263	000000000000	K.eli Kavaklı Atatürk İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2014	1.500.000	0	175.000	175.000	7.670	4		DE
264	000000000000	L.burgaz İstiklal Mah. İlkokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2014	4.000.000	0	500.000	320.000	0	0	0	HB
265	000000000000	Vize Devlet Mah. İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2014	1.500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	HB
Ortaokul İnşaatları (48 drs)						8.894.540	2.950	2.756.318	2.756.318	1.547.548	56		
266	000000000000	K.eli Karacaibrahim Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2014	2.000.000	0	437.500	437.500	7.198	2		DE
267	000000000000	D.köy Fatih Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2012	2013	2.894.540	2.950	2.218.818	2.218.818	1.524.100	69		DE
268	000000000000	L.burgaz Zafer Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2014	4.000.000	0	100.000	100.000	16.250	16	0	İA
Lise İnşaatları (16 drs)						4.100.002	392.590	3.707.412	2.315.940	2.315.940	62		
269	1994H010080	Pınarhisar Anadolu Lisesi İnşaatı (16 Drs, 5.691 m ²)	GB	2011	2014	4.100.002	392.590	3.707.412	2.315.940	2.315.940	62	85	DE
Yurt ve Pansiyon İnşaatları						8.000.000	9.086	6.743.812	1.242.965	1.242.965	18		
270	1997H010270	B.eski Öğrenci Pansiyonu İnşaatı (200 öğrenci)	GB	2012	2014	4.000.000	4.366	3.371.899	1.179.395	1.179.395	35	30	DE
271	1997H010270	L.burgaz R. Yaman Fen Lisesi Öğrenci Pansiyon İnşaatı (200 öğrenci)	GB	2012	2014	4.000.000	4.720	3.371.913	63.570	63.570	2	20	DE
Diğerleri						3.940.811	0	3.424.251	3.424.251	3.241.101	95		
272	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2010	2013	3.940.811	0	3.424.251	3.424.251	3.241.101	95		DE



Babaeski Gazi Mahallesi (Ayçiçeği) Anaokulu



Pınarhisar Beylik Mahallesi (Yıldız) Anaokulu



Kırklareli Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi İnşaatı



Pınarhisar Anadolu Lisesi İnşaatı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bakım ve Onarımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Milli Eğitim Müdürlüğü						4.738.820	0	4.222.260	4.222.260	4.039.110	96		
Anaokulu Bakım ve Onarımları						136.460	0	120.417	120.417	120.417	100		
1	000000000000	K.eli Bilal Yapıcı Anaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	7.956	0	7.956	7.956	7.956	100	100	BT
2	000000000000	K.eli Bilal Yapıcı Anaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	4.554	0	4.554	4.554	4.554	100	100	BT
3	000000000000	K.eli Hüsamettin Ateş Anaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	5.000	0	5.000	5.000	5.000	100	100	BT
4	000000000000	K.eli Zübeyde Hanım Anaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	83.957	83.957	83.957	100	100	BT
5	000000000000	L.burgaz Zübeyde Hanım Anaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	18.950	0	18.950	18.950	18.950	100	100	BT
İlkokul Bakım ve Onarımları						1.455.672	0	1.243.799	1.243.799	1.243.799	100		
6	000000000000	K.eli Ahmet Yener İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	17.000	0	17.000	17.000	17.000	100	100	BT
7	000000000000	K.eli Atatürk İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	16.974	0	16.974	16.974	16.974	100	100	BT
8	000000000000	K.eli Doğan Işıkalp İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	79.473	79.473	79.473	100	100	BT
9	000000000000	K.eli Gaziosmanpaşa İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	16.756	0	16.756	16.756	16.756	100	100	BT
10	000000000000	K.eli Karahadır İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	74.077	0	52.746	52.746	52.746	100	100	BT
11	000000000000	K.eli Kırkşehitler İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	19.000	0	19.000	19.000	19.000	100	100	BT
12	000000000000	K.eli TOKİ Abdullah Cevdet Paşa İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	6.239	0	6.239	6.239	6.239	100	100	BT
13	000000000000	K.eli Vali Faik Üstün İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	17.051	0	17.051	17.051	17.051	100	100	BT
14	000000000000	K.eli Vali Faik Üstün İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	27.500	0	27.500	27.500	27.500	100	100	BT
15	000000000000	K.eli Kayalı Yoğuntaş İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	16.933	0	16.933	16.933	16.933	100	100	BT
16	000000000000	B.eski Gaziosmanpaşa İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	24.740	0	24.740	24.740	24.740	100	100	BT
17	000000000000	B.eski Alpullu İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	17.000	0	17.000	17.000	17.000	100	100	BT
18	000000000000	B.eski Kuleli İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	2.714	0	2.714	2.714	2.714	100	100	BT
19	000000000000	B.eski Nadırlı MFÖ İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	2.596	0	2.596	2.596	2.596	100	100	BT
20	000000000000	D.köy Atatürk İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	16.874	0	16.874	16.874	16.874	100	100	BT
21	000000000000	D.köy İğneada Atatürk İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	7.080	0	7.080	7.080	7.080	100	100	BT
22	000000000000	L.burgaz Atatürk İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	180.988	0	180.988	180.988	180.988	100	100	BT
23	000000000000	L.burgaz Bahçelievler İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	37.900	0	37.900	37.900	37.900	100	100	BT
24	000000000000	L.burgaz Durak İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	27.453	0	27.453	27.453	27.453	100	100	BT
25	000000000000	L.burgaz Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	18.900	0	18.900	18.900	18.900	100	100	BT
26	000000000000	L.burgaz General Ferhat Akat İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	87.615	87.615	87.615	100	100	BT
27	000000000000	L.burgaz İstiklal İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	26.400	0	26.400	26.400	26.400	100	100	BT
28	000000000000	L.burgaz Kocasinan İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	32.168	32.168	32.168	100	100	BT
29	000000000000	L.burgaz Ramazan Yaman İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	49.900	0	49.900	49.900	49.900	100	100	BT
30	000000000000	L.burgaz Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	19.000	0	19.000	19.000	19.000	100	100	BT
31	000000000000	L.burgaz B.karıştrın İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	31.610	0	31.610	31.610	31.610	100	100	BT
32	000000000000	L.burgaz Karaağaç ŞM İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	18.995	0	18.995	18.995	18.995	100	100	BT
33	000000000000	P.hisar Atatürk İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	76.063	76.063	76.063	100	100	BT
34	000000000000	P.hisar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	23.411	0	23.411	23.411	23.411	100	100	BT
35	000000000000	P.hisar 19 Evler İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	4.230	0	4.230	4.230	4.230	100	100	BT
36	000000000000	P.hisar Kaynarca İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	79.237	79.237	79.237	100	100	BT

İl Millî Eğitim Müdürlüğü Bakım ve Onarımları (Devam)

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
37	000000000000	P.hisar Tozaklı İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	4.130	0	4.130	4.130	4.130	100	100	BT
38	000000000000	Vize Adalet Erez İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	50.480	0	50.480	50.480	50.480	100	100	BT
39	000000000000	Vize Atatürk İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	50.000	0	41.300	41.300	41.300	100	100	BT
40	000000000000	Vize Cumhuriyet İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	63.602	63.602	63.602	100	100	BT
41	000000000000	Vize Namık Kemal İlkokulu Bakım ve Onr.	Öİ	2013	2013	7.021	0	7.021	7.021	7.021	100	100	BT
42	000000000000	Vize Evrenli İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	11.422	0	11.422	11.422	11.422	100	100	BT
43	000000000000	Vize Hasbuğa İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	11.298	0	11.298	11.298	11.298	100	100	BT
Ortaokul Bakım ve Onarımları						1.546.575	0	1.257.931	1.257.931	1.257.931	100	100	
44	000000000000	K.eli Cumhuriyet Ortaokulu Bakım ve Onr.	Öİ	2013	2013	100.000	0	96.347	96.347	96.347	100	100	BT
45	000000000000	K.eli İstiklal Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	84.193	84.193	84.193	100	100	BT
46	000000000000	K.eli Mustafa Dalcı Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	70.611	70.611	70.611	100	100	BT
47	000000000000	K.eli İmam Hatip Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	12.154	0	12.154	12.154	12.154	100	100	BT
48	000000000000	K.eli İnece Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	16.402	0	16.402	16.402	16.402	100	100	BT
49	000000000000	K.eli Kavaklı ŞVÇ Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	79.005	79.005	79.005	100	100	BT
50	000000000000	K.eli Üsküp Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	17.000	0	17.000	17.000	17.000	100	100	BT
51	000000000000	K.eli Dereköy Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	16.933	0	16.933	16.933	16.933	100	100	BT
52	000000000000	B.eski Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	70.676	70.676	70.676	100	100	BT
53	000000000000	B.eski Atatürk Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	72.865	72.865	72.865	100	100	BT
54	000000000000	B.eski Fatih Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	43.070	43.070	43.070	100	100	BT
55	000000000000	B.eski Plevne Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	27.740	0	27.740	27.740	27.740	100	100	BT
56	000000000000	L.burgaz Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	103.221	0	103.221	103.221	103.221	100	100	BT
57	000000000000	L.burgaz 8 Kasım Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	50.000	0	32.869	32.869	32.869	100	100	BT
58	000000000000	L.burgaz 80. Yıl Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	114.625	0	114.625	114.625	114.625	100	100	BT
59	000000000000	L.burgaz Emrullah Efendi Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	69.195	69.195	69.195	100	100	BT
60	000000000000	L.burgaz Fehmi Mutlu Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	88.500	0	88.500	88.500	88.500	100	100	BT
61	000000000000	L.burgaz Hürriyet Ortaokulu Bakım ve Onr.	Öİ	2013	2013	100.000	0	87.308	87.308	87.308	100	100	BT
62	000000000000	L.burgaz İmam Hatip Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	79.225	79.225	79.225	100	100	BT
63	000000000000	P.hisar Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2013	2013	100.000	0	75.992	75.992	75.992	100	100	BT
Genel Lise Bakım ve Onarımları						607.154	0	607.154	607.154	607.154	100	100	
64	000000000000	K.eli Atatürk Anadolu Lisesi Bekim ve Onr.	GB	2012	2013	8.500	0	8.500	8.500	8.500	100	100	BT
65	000000000000	K.eli Atatürk Anadolu Lisesi Spor Salonu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	16.915	0	16.915	16.915	16.915	100	100	BT
66	000000000000	K.eli Spor Lisesi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	3.422	0	3.422	3.422	3.422	100	100	BT
67	000000000000	B.eski B.mandıra Çok Programlı Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	47.377	0	47.377	47.377	47.377	100	95	DE
68	000000000000	L.burgaz Anadolu Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	92.880	0	92.880	92.880	92.880	100	100	BT
69	000000000000	L.burgaz Atatürk Anadolu Lisesi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	63.665	0	63.665	63.665	63.665	100	100	BT
70	000000000000	L.burgaz Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	13.250	0	13.250	13.250	13.250	100	100	BT
71	000000000000	L.burgaz Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	45.000	0	45.000	45.000	45.000	100	100	BT
72	000000000000	L.burgaz Düvenciler Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	42.000	0	42.000	42.000	42.000	100	100	BT
73	000000000000	L.burgaz Kepirtepe Anadolu Öğretmen Lisesi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	83.259	0	83.259	83.259	83.259	100	100	BT
74	000000000000	L.burgaz Güzel Sanatlar Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	32.000	0	32.000	32.000	32.000	100	100	BT
75	000000000000	P.köy Çok Programlı Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	42.469	0	42.469	42.469	42.469	100	100	BT
76	000000000000	Vize Lisesi Bekim ve Onarımı	GB	2013	2013	116.417	0	116.417	116.417	116.417	100	95	DE
Mesleki ve Teknik Lise Bakım ve Onarımları						798.009	0	798.009	798.009	798.009	100	100	
77	000000000000	K.eli Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Bakım ve Onarımı	GB	2012	2013	110.747	0	110.747	110.747	110.747	100	100	BT
78	000000000000	K.eli Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Kantin Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	17.051	0	17.051	17.051	17.051	100	100	BT
79	000000000000	K.eli Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi Pansiyonu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	80.476	0	80.476	80.476	80.476	100	100	BT
80	000000000000	K.eli Kız Meslek Lisesi Pansiyonu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	158.120	0	158.120	158.120	158.120	100	95	DE
81	000000000000	K.eli İmam Hatip Lisesi Pansiyonu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	95	DE
82	000000000000	K.eli Mesleki Eğitim Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
83	000000000000	K.eli Ticaret Meslek Lisesi Spor Salonu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	95	DE
84	000000000000	B.eski İMKB Ticaret Lisesi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	37.706	0	37.706	37.706	37.706	100	95	DE
85	000000000000	L.burgaz Ticaret Lisesi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	44.194	0	44.194	44.194	44.194	100	95	DE
86	000000000000	L.burgaz B.karıştrın Kız Meslek Lisesi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	57.175	0	57.175	57.175	57.175	100	95	DE
87	000000000000	L.burgaz Mesleki Eğitim Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	9.540	0	9.540	9.540	9.540	100	100	BT
88	000000000000	P.hisar Mesleki Eğitim Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	68.000	0	68.000	68.000	68.000	100	95	DE
Diğer Bakım ve Onarımlar						194.950	0	194.950	194.950	11.800	6		
89	000000000000	K.eli İl Millî Eğitim Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	3.150	0	3.150	3.150	0	0	0	HB
90	000000000000	K.eli Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	HB
91	000000000000	K.eli Halk Eğitim Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	11.800	0	11.800	11.800	11.800	100	100	BT
92	000000000000	B.eski Halk Eğitim Merkezi Bakım ve Onr.	GB	2013	2013	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	DE
93	000000000000	L.burgaz Halk Eğitim Merkezi Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	0	0	90	DE

Mesleki ve Teknik Eğitim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2013 yılında mesleki ve teknik alanında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 18.208.972 liradır. 2013 yılı programı 8.641.009 liradır. 5.592.310 lira ödenek gönderilmiş ve 5.592.310 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 65 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Milli Eğitim Müdürlüğü						18.208.972	2.417.963	8.641.009	5.592.310	5.592.310	65		
Lise İnşaatları (28 drs)						17.410.963	2.417.963	7.843.000	4.794.301	4.794.301	61		
273	1983H020010	K.eli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (12 Drs, 60 yt. uyg. oteli (9.400 m2))	GB	2010	2014	9.410.963	2.417.963	6.993.000	4.787.457	4.787.457	68	95	DE
274	1991H020610	K.eli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (16 Drs)	GB	2013	2015	8.000.000	0	850.000	6.844	6.844	1	0	İA
Diğerleri						798.009	0	798.009	798.009	798.009	100		
275	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2010	2013	798.009	0	798.009	798.009	798.009	100		DE

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi'nin 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2013 yılı programı 6.000.000 liradır. 8.260 lira ödenek gönderilmiş ve 8.260 lira harcama yapılmıştır. Proje ihale aşamasındadır. Lüleburgaz Kız Meslek Lisesi TPAO tarafından yaptırılacaktır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Özel İdaresi						6.000.000	0	6.000.000	8.260	8.260	0		
276	000000000000	L.burgaz Kız Meslek Lisesi (24 derslik)	DG	2013	2013	6.000.000	0	6.000.000	8.260	8.260	0	0	İA

Yüksek Öğretim

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'nün 2013 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 75.213.060 liradır. 2013 yılı programı ve gönderilen ödenek 25.759.060 liradır. 21.484.135 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 83 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 4 proje de devam etmektedir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü						75.213.060	48.612.000	25.759.060	25.759.060	21.484.135	83		
277	2013H030270	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2013	2013	100.000	0	100.000	100.000	59.401	59	50	DE
278	2012H032330	Muhtelif İşler (B. onr., Mak. tec. Bil. don. vb.)	ÖB	2013	2013	3.039.000	0	3.000.000	3.000.000	1.197.804	40	85	DE
279	2009H031670	Kampüs Altyapısı (Kanalizasyon, elektrik, su, çevre düzenlemesi, gaz, yol, ısı merkezi, artıma, trafo, telefon)	ÖB	2009	2015	15.000.000	11.697.000	3.000.000	3.000.000	1.067.870	36	95	DE
280	2009H031680	Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı (17.800 m2 dersane, 14.000 m2 yemekhane, 6.000 m2 Vize MYO)	ÖB	2009	2015	56.074.060	36.915.000	19.159.060	19.159.060	19.159.060	100	97	DE
281	2013H040060	K.eli Gar Binası Restorasyonu	ÖB	2013	2014	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	HB



KÜ Kayalı Kampüsü Merkezi derslikler, Ağustos 2013



KÜ Kayalı Kampüsü Yemekhane, kantin ve çarşı, Ağustos 2013

YURT-KUR Yurt Müdürlüğü

YURT-KUR Yurt Müdürlüğü'nün 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 31.000.000 liradır. 2013 yılı programı 3.100.000 liradır. Harcama yapılmamıştır. 2 projeye hiç başlanmamıştır.

Arsalarla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

YURT-KUR Yurt Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
YURT-KUR Yurt Müdürlüğü						31.000.000	0	3.100.000	0	0	0	0	
282	2005H032940	B.eski Yurt İnşaatı (300 kişilik)	ÖB	2012	2014	14.000.000	0	1.400.000	0	0	0	0	HB
283	2005H032940	L.burgaz Yurt İnşaatı (400 kişilik)	ÖB	2011	2014	17.000.000	0	1.700.000	0	0	0	0	HB

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi'nin 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı ve 2013 yılı programı 100.000 liradır. Projeye hiç başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
İl Özel İdaresi						100.000	0	100.000	0	0	0	0	
284	000000000000	Kırklareli Üniversitesi Laboratuvar Bakım ve Onarımı	DG	2013	2013	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB

Kültür

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.409.561 liradır. 2013 yılı programı 509.561 liradır. 134.525 lira ödenek gönderilmiş ve 134.525 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 26 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje devam etmektedir. 3 projeye hiç başlanmamıştır.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü						1.409.561	0	509.561	134.525	134.525	26		
285	000000000000	K.eli Eski Evkaf Dairesi Restorasyonu	ÖB	2012	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
286	1995H040360	L.burgaz Kadı Ali Camii Restorasyonu	ÖB	2013	2014	1.000.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
287	1995H040360	P.hisar Hundi Hatun Camii Restorasyonu	ÖB	2013	2013	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
288	1995H040360	Tarihi Yapılar Kurşun Bakım ve Onarımı	ÖB	2013	2013	259.560	0	259.560	134.525	134.525	52	52	DE



Demirköy Fatih Demir Dökümhanesi



Vize Antik Amfi Tiyatrosu

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2013 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.775.001 liradır. 2013 yılı programı 275.003 liradır. 275.000 lira ödenek gönderilmiş ve 208.764 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 76 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 3 projeye hiç başlanmamıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü						1.775.001	0	275.003	275.000	208.764	76		
289	000000000000	Kırklareli Evi Bakım ve Onarımı Teşhir ve Tanzimi	GB	2013	2013	1.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
290	000000000000	Vize Anfi Tiyatro Çevre Düzenlemesi	GB	2013	2013	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
291	000000000000	Kırklareli Höyüğü Kazı Çalışmaları	Öİ	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	8.967	45	100	BT
			GB			95.000	0	95.000	95.000	71.120	75		
292	2013H040250	D.köy Fatih Dökümhanesi Kazı Çalışmaları	GB	2013	2015	160.000	0	160.000	160.000	128.677	80	100	BT
293	000000000000	Vize Kazı Çalışmaları	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB

Beden Eğitimi ve Spor



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 9.666.315 liradır. 2013 yılı programı 6.771.000 liradır. 4.280.642 lira ödenek gönderilmiş ve 3.646.846 lira harcama yapılmıştır. 3 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Fiziki 2013 yılı gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü						9.666.315	0	6.771.000	4.280.642	3.646.846	54		
294	1990H050050	K.eli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	GB	2012	2014	5.500.000	0	3.000.000	2.000.172	2.000.172	67	40	DE
295	1990H050050	K.eli Sentetik Atletizm Pisti Yapımı	GB	2012	2014	2.200.000	0	2.000.000	935.470	935.470	47	55	DE
296	00000000000	B.eski Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı	DG	2013	2013	400.000	0	400.000	400.000	0	0	100	BT
297	00000000000	L.burgaz Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması	ÖB	2012	2013	1.166.315	0	971.000	545.000	545.000	56	100	BT
298	00000000000	P.hisar Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması	DG	2013	2013	400.000	0	400.000	400.000	166.204	42	100	BT



Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı



Lüleburgaz Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Kırklareli Üniversitesi'nin 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 9.229.823 liradır. 2013 yılı programı, gönderilen ödenek ve harcama miktarı 2.499.823 liradır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü						9.229.823	6.730.000	2.499.823	2.499.823	2.499.823	100		
299	2009H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı (Spor Salonu, Futbol Sahası (sunî çim), Basketbol ve Voleybol Sahası (2 adet), Tenis Kortu (2 adet))	ÖB	2009	2014	9.229.823	6.730.000	2.499.823	2.499.823	2.499.823	100	80	DE



Kayalı Kampüsü Futbol Sahası



Kayalı Kampüsü Spor salonu

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi'nin 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.170.000 liradır. 2013 yılı programı 1.086.389 liradır. 134.738 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 12 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 1 proje ihale aşamasındadır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
İl Özel İdaresi						1.170.000	83.611	1.086.389	134.738	134.738	12		
300	000000000000	K.eli Sporcu Evi Onarımı	GB	2013	2013	200.000	83.611	116.389	113.794	113.794	98	100	BT
301	000000000000	K.eli Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası	GB	2013	2014	950.000	0	950.000	944	944	0	0	İA
302	000000000000	D.köy İlçesinde Futbol Sahası Soyunma Odası Yapımı	Öİ	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT

10 Sağlık

Sağlık

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Hastane sayısı	7	7	7	8	8	8	8
Kamu	6	6	5	5	5	5	5
Özel	1	1	2	3	3	3	3
Tıp merkezi (özel)				4	4	5	4
Ağız ve diş sağlığı merkezi		1	1	1	1	1	1
Toplum sağlığı merkezi					8	8	8
Aile sağlığı merkezi					41	41	42
Aile hekimliği					94	94	94
Toplam Yatak Sayısı		737	798	791	791	804	791
Kamu hastaneleri yatak sayısı		705	713	672	672	672	667
Özel hastaneler yatak sayısı		24	77	111	111	124	124
Yatak işgal oranı (%)	46	45,8	41,0	41,0	44,0	44,0	49,0
Yatak başına düşen kişi sayısı		452	422	421	421	430	431
Toplam sağlık personeli		1.296	1.595	1.591	1.660	1.842	2.291
Toplam uzman hekim		138	168	182	202	213	214
Pratisyen hekim		163	181	174	168	184	180
Diş hekimi		21	85	25	85	78	91
Hemşire, yardımcı hemşire	333	351	401	400	373	424	447
Ebe, ebe-hemşire	287	284	286	305	293	295	312
Toplam sağlık memuru		307	320	348	386	266	416
Bir doktora düşen kişi sayısı		1.107	965	936	899	857	870

Sağlık Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler	İhale aşamasında kalan projeler	Yarım kalan projeler	Devam eden projeler	Biten projeler	Parasal olarak gerçekleşen projeler (%)
	Sağlık	17	147.964.380	8.127.340	15.430.422	10.747.976	9.968.559	6	4	0	6	1	65
1	İl Sağlık Müdürlüğü	17	147.964.380	8.127.340	15.430.422	10.747.976	9.968.559	6	4	0	6	1	65

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2013 yılında 17 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 147.964.380 liradır. 2013 yılı programı 15.430.422 liradır. 10.747.976 lira ödenek gönderilmiş ve 9.968.559 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 65 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 6 proje devam etmektedir. 4 proje ihale aşamasındadır. 6 projeye hiç başlanmamıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal olarak gerçekleşen (%)	Fiziki olarak gerçekleşen (%)	Açıklama
		İl Sağlık Müdürlüğü				147.964.380	8.127.340	15.430.422	10.747.976	9.968.559	65		
		Devlet Hastanesi İnşaatları				133.987.806	7.647.894	13.608.108	10.108.106	9.678.689	71		
303	1991I000030	Kırklareli Devlet Hastanesi İnşaatı (250 Yt, 40.279 m ²)	GB	2012	2015	45.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	İA
304	1991I000040	Babaeski Devlet Hastanesi İnşaatı (100 Yt, 16.547 m ²)	GB	2005	2015	16.756.000	7.647.894	9.108.106	9.108.106	9.108.106	100	100	BT
305	000000000000	Lüleburgaz Devlet Hastanesi İnşaatı (300 Yt)	GB	2010	2015	58.500.000	0	1	0	0	0	0	İA
306	000000000000	Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Ek Bina İnşaatı	GB	2013	2013	2.031.806	0	1.000.000	1.000.000	570.583	57	10	DE
307	1991I000040	Pınarhisar Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 5.000 m ²)	GB	2011	2015	5.850.000	0	500.000	0	0	0	0	İA
308	000000000000	Vize Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt)	GB	2010	2015	5.850.000	0	1	0	0	0	0	HB



Babaeski Devlet Hastanesi İnşaatı



Babaeski Pancarköy Sağlık Evi Maketi

İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatları						3.500.001	0	1.000.001	0	0	0	0	
309	2005I001400	K.eli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (20 ünit, 3.147 m ²)	GB	2009	2014	3.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	İA
310	2005I001400	L.burgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (50 ünit, m ²)	GB	2014	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
Diğer İnşaatlar						9.250.001	0	350.002	350.000	0	0	0	
311	000000000000	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İl Sağlık Md, VSD, AÇSAP, 112 ASHİ, 112 KKM)	GB	2013	2014	8.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
312	2006I001500	D.köy Sağlık Birimleri İnşaatı (3-4 hekimlik TSM, ASM, 112 ASH)	GB	2012	2014	600.000	0	200.000	200.000	0	0	0	HB
313	000000000000	L.burgaz Sağlık Kompleksi İnşaatı (İlçe Sağlık Md, TSM, 112 ASHİ)	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
314	000000000000	B.eski Pancarköy Sağlık Evi İnşaatı	GB	2012	2014	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	HB
Diğerleri						1.226.572	479.446	472.311	289.870	289.870	61	61	
315	000000000000	Tıbbi Cihaz Alımı	GB	2012	2013	169.055	94.052	75.003	74.080	74.080	99		DE
316	000000000000	Devlet Hastaneleri Büyük Onarımı	GB	2013	2013	128.764	0	128.764	67.691	67.691	53		DE
317	000000000000	L.burgaz Devlet Hastanesi Büyük Onarımı	GB	2013	2013	33.040	0	33.040	33.040	33.040	100		DE
318	000000000000	Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2012	2013	814.953	385.394	154.744	36.609	36.609	24		DE
319	000000000000	İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2013	2013	80.760	0	80.760	78.450	78.450	97		DE



Kırklareli Devlet Hastanesi Maketi



Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Maketi

Kırklareli Devlet Hastanesinin yapılması planlanan arazinin Sağlık Bakanlığına tahsisleri yapılmıştır. TOKİ tarafından ihalesi 06.11.2013 tarihinde yapılmıştır. İhale değerlendirme aşamasındadır.

Babaeski 100 Yataklı Devlet Hastanesinin ihalesi TOKİ tarafından 25 Temmuz 2011 tarihinde yapılmıştır. İnşaat tamamlanmıştır.

Lüleburgaz Devlet Hastanesinin yapılacağı arazinin tahsisi yapılmıştır. Hastane projesinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar Sağlık Bakanlığı nezdinde devam etmektedir. Proje ihale aşamasındadır.

Pınarhisar Devlet Hastanesinin yapılacağı arsa ile ilgili gerekli izinler alınmış ve arsa ifraz çalışmaları tamamlanmıştır. TOKİ'de ihale hazırlık süreci devam etmektedir.

Vize Devlet Hastanesi için uygun arazi bulma çalışmaları devam etmektedir.

Kırklareli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi için Genel bütçe kaynaklarından gönderilen 3.250.0000 TL ödenek İl Özel İdaresine aktarılmıştır. İhalenin yapılması için gereken ön hazırlıklar sürdürülmektedir.

Kırklareli Sağlık Kompleksi (Sağlık Müd + VSD + AÇSAP + 112 Acil Sağ. + 112 KKM) proje hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Demirköy Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Hizmet Binası Yapımı 2012 yılı yatırım programına alınmıştır. Yapımı planlanan hizmet binasının 2005 yılında yapımı durdurulan ve özel idareye devredilen devlet hastanesi inşaatının yıkılarak aynı arsa üzerine yapılması düşünülmektedir. Sağlık Bakanlığı tarafından proje hazırlıkları sürdürülmektedir.

Babaeski Pancarköy Sağlık Evi yapımı talebi Sağlık Bakanlığınca uygun görülmüş ve 2012 yılı yatırım programına alınmış ve 2012 yılında proje için 150.000 TL ödenek gönderilmiştir. Ödenek İl Özel İdaresine aktarılmıştır. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından tip proje mevcut arsaya revize edilerek hazırlanmasına müteakip ihale işlemlerine başlanacaktır.

Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil - Ek Bina İnşaatının ihalesi 30.05.2013, yer teslimi 24.09.2013 tarihinde yapılmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. İşin süresi 150 gündür.

11 Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi

İktisadi Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 2013 yılında 26 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 28.010.321 liradır. 2013 yılı programı 16.962.360 liradır. 11.526.317 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 68 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 10 proje tamamlanmıştır.

DKH / İktisadi Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler	İhale aşamada kalan projeler	Yarım kalan projeler	Devam eden projeler	Biten projeler	Parasal gerçekleşme (%)
	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	26	28.010.321	1.572.461	16.962.360	11.678.197	11.526.317	5	1	0	10	10	68
	Genel İdare	9	12.508.361	434.426	2.708.935	436.335	349.749	3	0	0	2	4	13
1	Valilik	2	8.190.000	168.065	821.935	21.935	0	1	0	0	0	1	0
2	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	200.000	0	159.000	159.000	159.000	0	0	0	0	1	100
3	Defterdarlık	2	2.612.000	0	488.000	0	0	1	0	0	1	0	0
4	İl Özel İdaresi	4	1.506.361	266.361	1.240.000	255.400	190.749	1	0	0	1	2	15
	Güvenlik Hizmetleri	4	3.112.454	0	3.112.454	872.657	860.786	2	0	0	2	0	28
5	İl Emniyet Müdürlüğü	4	3.112.454	0	3.112.454	872.657	860.786	2	0	0	2	0	28
6	İl Özel İdaresi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#SAY I/0!
	Harita Tapu Kadastro	12	3.150.506	1.138.035	1.901.971	1.130.205	1.076.782	0	1	0	6	5	57
7	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	8	815.600	113.280	591.820	171.477	171.477	0	1	0	4	3	29
8	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	300.000	87.867	212.133	212.133	158.710	0	0	0	0	1	75
9	Kadastro Müdürlüğü	3	2.034.906	936.888	1.098.018	746.595	746.595	0	0	0	2	1	68
	Adalet	1	9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	0	0	0	0	1	100
10	Cumhuriyet Başsavcılığı	1	9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	0	0	0	0	1	100

Genel İdare

Valilik

Valiliğin 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 8.190.000 liradır. 2013 yılı programı 821.935 liradır. 21.935 lira ödenek gönderilmiş ve harcama yapılmamıştır. 1 proje bitmiştir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

Valilik Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Valilik				8.190.000	168.065	821.935	21.935	0	0		
320	1985K010190	Lüleburgaz Hükümet Konağı İnşaatı	GB	2013	2016	8.000.000	0	800.000	0	0	0	0	HB
321	000000000000	Kırklareli Hükümet Konağı Doğal Gaz Dönüşümü ve Mantolaması	GB	2011	2013	190.000	168.065	21.935	21.935	0	0	100	BT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2013 yılı programı 200.000 TL'dir. 1 proje devam etmektedir.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				200.000	0	159.000	159.000	159.000	100		
322	2013G000140	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesinin Ofise Dönüştürülmesi	GB	2013	2013	200.000	0	159.000	159.000	159.000	100	100	BT

Defterdarlık

Defterdarlığın 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 2.612.000 liradır. 2013 yılı programı 488.000 liradır. Harcama yapılmamıştır. 1 proje devam etmektedir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

Belediye Meclisi Kararı ile İmar planı tadilatı yapılarak konut alanı resmi kurum alanına dönüştürülmüş, arsa plankotesi hazırlanmıştır. Hizmet binasının yapılacağı alanda bulunan kullanım dışı lojmanların yıkım kararının ardından lojmanların yıkımı gerçekleştirilmiştir. Ön ihtiyaç programı çerçevesinde yapılacak binanın zemin etüdü ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri yaklaşık maliyet ücret hesap cetveli çıkarılarak talep edilecek ödenek miktarı tespit edilmiştir. Yapım işine esas olacak proje ihalesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sonuçlandırılmış onay için yatırımcı kuruluşuna gönderilmiştir.

Defterdarlık Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Defterdarlık						2.612.000	0	488.000	0	0	0	0	
323	2000K010650	B.eksi Vergi Dairesi İnşaatı Proje Yapımı	GB	2013	2013	112.000	0	88.000	0	0	0	0	DE
324	2000K010650	B.eksi Vergi Dairesi İnşaatı	GB	2012	2016	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	HB

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi'nin 2013 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.506.361 liradır. 2013 yılı programı 1.240.000 liradır. 255.400 lira ödenek gönderilmiş ve 190.749 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 15 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Özel İdaresi						1.506.361	266.361	1.240.000	255.400	190.749	15		
325	000000000000	K.eli 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	GB	2012	2013	750.000	0	750.000	0	0	0	0	HB
326	000000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2012	2013	566.361	266.361	300.000	65.400	31.760	11	100	BT
327	000000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2013	2013	150.000	0	150.000	150.000	118.989	79		DE
328	000000000000	Taahhüt Alımı	Öİ	2012	2013	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT

Güvenlik

İl Emniyet Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2013 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2013 yılı programı 3.112.454 liradır. 872.657 lira ödenek gönderilmiş ve 860.786 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 28 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje devam etmektedir. 2 projeye hiç başlanmamıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İl Emniyet Müdürlüğü						3.112.454	0	3.112.454	872.657	860.786	28		
329	2012K020030	K.eli Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası (Etüd - Proje)	GB	2012	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
330	2012K020030	Koçgaz İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası (Etüd - Proje)	GB	2012	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
331	000000000000	Makine Teçhizat Alımı	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	38.129	76		DE
332	000000000000	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımları	GB	2012	2013	2.962.454	0	2.962.454	822.657	822.657	28		DE

Harita, Tapu ve Kadastro

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 8 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 815.600 liradır. 2013 yılı programı 591.820 liradır. 171.477 lira ödenek gönderilmiş ve 171.477 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 29 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 3 proje bitmiştir. 4 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						815.600	113.280	591.820	171.477	171.477	29		
333	000000000000	Kırklareli Harita Yapımı	İB	2013	2013	78.750	0	78.750	18.585	18.585	24	100	BT
334	000000000000	K.eli Kavaklı Harita Yapımı	İB	2013	2014	114.000	0	57.000			0		DE
335	000000000000	Koçgaz Harita Yapımı	İB	2013	2013	36.000	0	36.000	25.488	25.488	71	60	DE
336	000000000000	L.burgaz Ahmetbey Harita Yapımı	İB	2013	2014	62.000	0	31.000	0	0	0	0	DE
337	000000000000	Pınarhisar Harita Yapımı	İB	2012	2013	100.000	0	100.000	0	0	0	0	İA
338	000000000000	Vize Harita Yapımı	İB	2012	2013	320.000	113.280	206.720	113.280	113.280	55	100	BT
339	000000000000	Vize Çakıllı Harita Yapımı	İB	2013	2014	45.000	0	22.500			0		DE
340	000000000000	Vize Kıyıköy Harita Yapımı	İB	2013	2013	59.850	0	59.850	14.124	14.124	24	100	BT

Kadastro Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü'nün 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 2.034.906 liradır. 2013 yılı programı 1.098.017 liradır. 746.595 lira ödenek gönderilmiş ve 746.595 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 68 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir.

Kadastro Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Kadastro Müdürlüğü						2.034.906	936.888	1.098.018	746.595	746.595	68		
341	000000000000	Babaeski Kadastro Yenileme Çalışması	DG	2012	2013	854.543	258.675	595.868	371.068	371.068	62	95	DE
342	000000000000	Lüleburgaz Kadastro Yenileme Çalışması	DG	2011	2013	621.353	434.330	187.023	60.400	60.400	32	95	DE
343	000000000000	Sayısal Harita Yapımı (11 adet)	GB	2012	2013	559.010	243.883	315.127	315.127	315.127	100	100	BT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 300.000 liradır. 2013 yılı programı ve gönderilen ödenek 212.133 liradır. 158.710 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 75 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Proje tamamlanmıştır.

Demirköy ve Vize kıyı şeridini kapsayan kıyı alanlarına ilişkin halihazır harita alımı işi tamamlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü						300.000	87.867	212.133	212.133	158.710	75		
344	2011G000300	Kırklareli Kıyı Alanlarına İlişkin Sayısal Halihazır Harita Alımı	Öİ	2011	2013	300.000	87.867	212.133	212.133	158.710	75	100	BT

Adalet

Cumhuriyet Başsavcılığı

Cumhuriyet Başsavcılığının 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı, 2013 yılı programı, gönderilen ödenek ve harcama miktarı 9.239.000 liradır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Proje bitmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığı Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Cumhuriyet Başsavcılığı				9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	100		
345	1983K150320	K.eli Açık Ceza İnfaz Kurumu (Etüd - Proje - İnşaat)	GB	2010	2014	9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	100	100	BT

12 Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal

Sosyal Diğer Kamu Hizmetleri sektöründe 2013 yılında 118 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 178.293.490 liradır. 2013 yılı programı 68.158.151 liradır. 49.488.458 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 73 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 16 proje tamamlanmıştır.

DKH / Sosyal Sektörü Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	118	178.293.490	9.083.988	68.158.151	49.934.879	49.488.458	75	4	0	23	16	73
	İçmesuyu	5	9.253.491	2.683.338	4.091.720	2.095.732	2.095.732	0	1	0	2	2	51
1	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	5	9.253.491	2.683.338	4.091.720	2.095.732	2.095.732	0	1	0	2	2	51
	Kanalizasyon	14	117.548.300	0	39.365.687	27.978.549	27.978.049	3	0	0	9	2	71
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	3	36.668.992	0	16.809.385	16.809.385	16.808.884	0	0	0	1	2	100
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	11	80.879.308	0	22.556.302	11.169.164	11.169.165	3	0	0	8	0	50
	Kırsal Alan Planlaması	79	12.375.508	329.910	2.040.737	963.769	940.749	67	0	0	6	6	46
4	İl Özel İdaresi	79	12.375.508	329.910	2.040.737	963.769	940.749	67	0	0	6	6	46
	Belediye Hizmetleri	4	1.718.789	103.615	1.350.600	323.016	323.016	0	1	0	2	1	24
5	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	3	904.803	103.615	536.614	320.823	320.823	0	1	0	1	1	60
6	İl Özel İdaresi	1	813.986	0	813.986	2.193	2.193	0	0	0	1	0	0
	Yerleşme Şehirleşme	1	23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	0	0	0	1	0	100
7	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	0	0	0	1	0	100
	Çevre	2	870.000	0	675.000	0	0	1	0	0	1	0	0
8	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	600.000	0	600.000	0	0	1	0	0	0	0	0
9	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	1	270.000	0	75.000	0	0	0	0	0	1	0	0
	Sosyal Güvenlik	2	6.159.194	1.000.000	2.774.194	774.194	774.194	0	0	0	1	1	28
10	Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	2	6.159.194	1.000.000	2.774.194	774.194	774.194	0	0	0	1	1	28
	Sosyal İçerme	11	6.758.208	137.000	2.621.209	2.560.615	2.137.714	4	2	0	1	4	82
11	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	8	658.208	137.000	521.208	477.207	154.306	4	0	0	0	4	30
12	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	3	6.100.000	0	2.100.001	2.083.408	1.983.408	0	2	0	1	0	94

İçmesuyu

Kırklareli'nin, 1'i İl merkezi, 7'si ilçe, 18'i de belde olmak üzere toplam 26 belediyesi bulunmaktadır. İl nüfusunun yüzde 81'i belediye teşkilatı olan yerleşimlerde yaşamaktadır.

İlçe beldelerde yaşayan nüfusun yüzde 100'üne içme ve kullanma suyu şebeke ile sağlanmaktadır. 103.498 aboneye 9.849.502 metreküp su dağıtılmaktadır. Kişi başına kullanılan su miktarı 95,17 metreküp olup 120,3 metreküp olan Türkiye ortalamasının altındadır. Toplam çekilen suyun yüzde 16,3'ü kaynaktan, yüzde 29,2'si barajdan, yüzde 52,6'sı ise kuyudan gelmektedir.

Belediye Su İstatistikleri

	2001	2002	2003	2004	2006	2007	2008	2009	2010
İçme ve kullanma suyu şebekesi ile hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı (yüzde)	99	99	99	99	99		99		100
Belediyelerde kişi başı çekilen günlük su miktarı (litre/kişi-gün)	151	160	166	173	297		258		185
Belediyeler tarafından çekilen toplam su miktarı (1000 m3/yıl)	13.074	13.813	14.351	15.013	28.140		24.410		17.833
Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesi ile dağıtılan su miktarı (m3 / yıl)				5.372.970	9.030.865		8.959.414		9.849.502
İçme ve kullanma suyu arıtma tesisi ile hizmet verilen nüfusun toplam belediye nüfusuna oranı (%)	6	5	9	9	25		25		24
Belediyeler tarafından arıtılan içme ve kullanma suyu miktarı (1000 m3/yıl)	604	547	1.005	1.104	6.171		6.349		5.728
Belediyelerde içme ve kullanma suyu şebekesi için çekilen yüzey suyu miktarı (1000 m3/yıl)	2.404	2.662	2.609	2.754	6.002		6.293		5.550
Belediyelerde içme ve kullanma suyu şebekesi için çekilen yeraltı suyu miktarı (1000 m3/yıl)	10.670	11.150	11.742	12.260	22.137		18.117		12.284
Belediyelerin su temini işleri ve hizmetleri çevresel yatırım harcamaları (TL)	62.674	205.707	119.962	95.977	170.654	273.951	1.296.277	28.642	214.306

Kaynak: TÜİK (www.tuik.gov.tr / Bölgesel istatistikler)

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 9.253.491 liradır. 2013 yılı programı 4.091.720 liradır. 2.095.732 lira ödenek gönderilmiş ve 2.095.732 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 51 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						9.253.491	2.683.338	4.091.720	2.095.732	2.095.732	51		
346	000000000000	K.eli Üsküp İçmesuyu	İB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	İA
347	000000000000	Babaeski İçmesuyu Terfi Hattı Yapımı	İB	2011	2013	5.000.000	2.050.596	2.572.050	1.434.515	1.434.515	56	100	BT
348	000000000000	B.eski Sinanlı İçmesuyu (SUKAP)	İB	2012	2013	2.372.432	351.807	470.995	457.758	457.758	97	100	BT
349	000000000000	L.burgaz Sakızköy İçmesuyu (SUKAP)	İB	2012	2013	1.624.458	280.935	792.074	203.459	203.459	26		DE
350	000000000000	İçmesuyu Projesi (3 adet)	İB	2012	2013	256.600	0	256.600	0	0	0		DE



Babaeski İçmesuyu Terfi Hattı Yapım İnşaatı



Babaeski Sinanlı İçmesuyu İnşaatı

Kanalizasyon

Nüfusun yüzde 94'üne kanalizasyon şebekesi hizmeti verilmektedir. 26 belediyeden 1'inde arıtma tesisi bulunmaktadır.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 11 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 80.879.308 liradır. 2013 yılı programı 22.556.302 liradır. 11.169.164 lira ödenek gönderilmiş ve 11.169.165 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 50 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 8 proje devam etmektedir. 3 projeye hiç başlanmamıştır.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						80.879.308	0	22.556.302	11.169.164	11.169.165	50		
351	000000000000	K.eli İnece Atıksu Arıtma İnşaatı	İB	2013	2014	4.000.000	0	2.394.504	1.344.425	1.344.425	56		DE
352	000000000000	K.eli Kavaklı Kanalizasyonu	İB	2012	2013	7.962.400	0	1	0	0	0	0	HB
353	000000000000	B.eski Kanalizasyonu	İB	2013	2014	21.000.000	0	8.679.355	3.489.638	3.489.638	40		DE
354	000000000000	B.eski Büyükmandıra Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2014	2.491.000	0	2.491.000	879.000	879.000	35		DE
355	000000000000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyonu	İB	2012	2013	9.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
356	000000000000	L.burgaz Büyükkarıştıran Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2012	2013	2.491.391	0	2.491.391	879.967	879.967	35		DE
357	000000000000	L.burgaz Evrensekiz Kanalizasyonu (SUKAP)	İB	2012	2014	6.000.000	0	2.056.393	2.008.523	2.008.523	98		DE
358	000000000000	P.hisar Kanalizasyonu	İB	2012	2014	12.500.000	0	1.871.094	833.192	833.192	45		DE
359	000000000000	Vize Kanalizasyonu	İB	2012	2014	10.000.000	0	2.532.599	1.734.420	1.734.420	68		DE
360	000000000000	Vize Kiyıköy Kanalizasyonu (SUKAP)	İB	2012	2013	4.994.554	0	1	0	0	0	0	HB
361	000000000000	Kanalizasyon Projesi (2 ad)	İB	2010	2013	39.963	0	39.963	0	0	0		DE



L.burgaz Evrensekiz Kanalizasyon İnşaatı



Vize Çakıllı Kanalizasyon Şebeke İnşaatı

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 36.668.992 liradır. 2013 yılı programı ve gönderilen ödenek 16.809.385 liradır. 16.808.884 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü						36.668.992	0	16.809.385	16.809.385	16.808.884	100		
Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi						36.668.992	0	16.809.385	16.809.385	16.808.884	100		
362	2012K050150	K.eli ve Vize Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2014	15.443.000	0	14.947.636	14.947.636	14.947.135	100	100	BT
363	2012K050150	K.eli ve Vize Atıksu Arıtma Tesisi Karayolları Kesişimi İmalatları	GB	2013	2014	5.992	0	5.992	5.992	5.992	100	100	BT
364	2012K050150	Babaeski, Pınarhisar ve Malkara Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2014	21.220.000	0	1.855.757	1.855.757	1.855.757	100	15	DE



Kırklareli Atıksu Arıtma Tesisi 12.12.2013



Kırklareli Atıksu Arıtma Tesisi 12.12.2013

Kırsal Alan Planlaması

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi'nin 2013 yılında 79 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 12.375.508 liradır. 2013 yılı programı 2.040.737 liradır. 963.769 lira ödenek gönderilmiş ve 940.749 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 46 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 6 proje bitmiştir. 6 proje devam etmektedir. 67 projeye hiç başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
İl Özel İdaresi						12.375.508	329.910	2.040.737	963.769	940.749	46		
İçmesuyu (19 adet)						2.746.282	329.910	1.865.681	818.768	795.749	43		
365	000000000000	K.eli Dolhan İçmesuyu Su Deposu ve ENH	Öİ	2012	2013	33.311	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
366	000000000000	K.eli Paşayeri İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2013	32.000	0	1	0	0	0	0	HB
367	000000000000	B.eski Karamesutlu İçmesuyu Ayaklı Depo İnşaatı ve Terfi İsale Hattı Bağlantısı	Öİ	2012	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
368	000000000000	B.eski Kumrular İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2013	14.318	0	1	0	0	0	0	HB
369	000000000000	B.eski Terzili İçmesuyu Kuyu Sondajı + Bağlantı + Depo Onarımı	Öİ	2013	2013	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
370	000000000000	D.köy Sivrilir İçmesuyu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
371	000000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2012	2013	40.000	0	40.000	0	0	0		DE
372	000000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Su Deposu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
373	000000000000	L.burgaz Çeşmekolu İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
374	000000000000	L.burgaz Turgutbey İçmesuyu Gömme Depo İnşaatı	Öİ	2012	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
375	000000000000	L.burgaz Turgutbey İçmesuyu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
376	000000000000	Vize Balkaya İçmesuyu Trfi Hattı Boru Yenilemesi	Öİ	2013	2013	16.068	0	1	0	0	0	0	HB
377	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuyu İnşaatları Malzeme Alımı	Öİ	2012	2013	82.129	16.744	65.385	65.385	58.661	90		DE
378	2012K050260	B.eski Cebesoy Kışlası Askeri İçmesuyu Kuyu Sondajı	GB	2012	2013	275.000	63.576	211.424	211.424	200.000	95	100	BT
379	2012K050260	B.eski Özden Kışlası Askeri İçmesuyu İnşaatı	GB	2012	2013	294.590	249.590	45.000	45.000	40.129	89	100	BT
380	2013K050270	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.N.Kemal ERSUN Kışlası)	GB	2013	2013	617.934	0	617.934	102.883	102.883	17		DE
381	2013K050270	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.Muhittin ÖNÜR Kışlası)	GB	2013	2013	376.000	0	376.000	226.698	226.698	60		DE
382	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (DORA Kışlası)	GB	2013	2013	421.656	0	421.656	114.598	114.598	27		DE
383	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.p.Tug.K.lığı (PAMİR, DORA ve YAZICI Kışlası)	GB	2013	2013	63.272	0	63.272	27.780	27.780	44		DE



Babaeski Sofuhalil Kanalizasyon İnşaatı



Özden Kışlası Kuyu Sondajı

İl Özel İdaresi Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Gerçekleşme (%)	Fiziki İşleme (%)	Açıklama
Kanalizasyon (60 adet)						9.629.226	0	175.056	145.001	145.000	83		
384	000000000000	K.eli Bayramdere Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	260.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
385	000000000000	K.eli Çeşmeköy Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2013	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
386	000000000000	K.eli Çukurpınar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	190.000	0	1	0	0	0	0	HB
387	000000000000	K.eli Dokuzhöyük Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	260.000	0	1	0	0	0	0	HB
388	000000000000	K.eli Dolhan Kanalizasyonu Artması	Öİ	2013	2013	30.000	0	30.000	25.000	25.000	83	100	BT
389	000000000000	K.eli Eriklice Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	140.000	0	1	0	0	0	0	HB
390	000000000000	K.eli Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	190.000	0	1	0	0	0	0	HB
391	000000000000	K.eli Karahamza Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	210.000	0	1	0	0	0	0	HB
392	000000000000	K.eli Kavakdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
393	000000000000	K.eli Kayalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
394	000000000000	B.eski Çiğdemli Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	135.000	0	1	1	0	0	0	HB
395	000000000000	B.eski Erikliyurdu Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
396	000000000000	B.eski Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	160.000	0	1	0	0	0	0	HB
397	000000000000	B.eski Karabayır Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
398	000000000000	B.eski Kumrular Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
399	000000000000	B.eski Nadırlı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
400	000000000000	B.eski Pancarköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	65.000	0	1	0	0	0	0	HB
401	000000000000	B.eski Taşgöl Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	14.218	0	1	0	0	0	0	HB
402	000000000000	B.eski Terzili Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
403	000000000000	D.köy Balaban Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
404	000000000000	D.köy Sivriiler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
405	000000000000	Koçgaz Kocayazı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	170.000	0	1	0	0	0	0	HB
406	000000000000	L.burgaz Akçaköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
407	000000000000	L.burgaz Ayvalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	220.000	0	1	0	0	0	0	HB
408	000000000000	L.burgaz Celaliye Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
409	000000000000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	140.000	0	1	0	0	0	0	HB
410	000000000000	L.burgaz Çeşmekolu Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	230.000	0	1	0	0	0	0	HB
411	000000000000	L.burgaz Çiftlikköy Kanalizasyonu (Arıtma)	Öİ	2013	2013	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
412	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	260.000	0	1	0	0	0	0	HB
413	000000000000	L.burgaz Eskitaşı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
414	000000000000	L.burgaz Hamzabey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	225.000	0	1	0	0	0	0	HB
415	000000000000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	130.000	0	1	0	0	0	0	HB
416	000000000000	L.burgaz Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
417	000000000000	L.burgaz Oklağlı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
418	000000000000	L.burgaz Ovacık Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	130.000	0	1	0	0	0	0	HB
419	000000000000	L.burgaz Sarıcaali Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	210.000	0	1	0	0	0	0	HB
420	000000000000	L.burgaz Turgutbey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	280.000	0	1	0	0	0	0	HB
421	000000000000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	280.000	0	1	0	0	0	0	HB
422	000000000000	P.köy Hıdırcı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	115.000	0	1	0	0	0	0	HB
423	000000000000	P.köy İmampazarı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	160.000	0	1	0	0	0	0	HB
424	000000000000	P.köy Kumköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
425	000000000000	P.köy Kuştepe Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	290.000	0	1	0	0	0	0	HB
426	000000000000	P.hisar Akören Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
427	000000000000	P.hisar Çayırdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
428	000000000000	P.hisar Erenler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
429	000000000000	P.hisar Hacıfaklı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
430	000000000000	Vize Akıncılar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
431	000000000000	Vize Akıncılar Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
432	000000000000	Vize Aksicim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
433	000000000000	Vize Çövenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
434	000000000000	Vize Çövenli Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
435	000000000000	Vize Doğanca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
436	000000000000	Vize Düzova Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	230.000	0	1	0	0	0	0	HB
437	000000000000	Vize Evrenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
438	000000000000	Vize Hasbuğa Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
439	000000000000	Vize Kömürköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	320.000	0	1	0	0	0	0	HB
440	000000000000	Vize Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
441	000000000000	Vize Müsellim Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
442	000000000000	Vize Soğucak Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
443	000000000000	Vize Topçuköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB

Belediye Hizmetleri

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 904.803 liradır. 2013 yılı programı 536.614 liradır. 320.823 lira ödenek gönderilmiş ve 320.823 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 60 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				904.803	103.615	536.614	320.823	320.823	60		
444	000000000000	Demirköy Beton Parke Yol Yapımı	İB	2013	2013	264.574	0	0	0	0	100		BT
445	000000000000	Vize Kapalı Yüzme Havuzu Otel ve Sosyal Tesis İnşaatı	İB	2013	2014	1	0	1	0	0	0		İA
446	000000000000	Vize Kiyıköy Çok Amaçlı Salon İnşaatı	İB	2011	2013	640.228	103.615	536.613	320.823	320.823	60		DE

İl Özel İdaresi

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 904.803 liradır. 2013 yılı programı 536.614 liradır. 320.823 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 60 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İl Özel İdaresi				813.986	0	813.986	2.193	2.193	0		
447	000000000000	K.eli Şeker Depoları Yaşam Merkezi Bowling Salonu	GB	2013	2014	813.986	0	813.986	2.193	2.193	0		DE

Yerleşme Şehirleşme

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 23.610.000 liradır. 2013 yılı programı, gönderilen ödenek ve harcama 15.239.004 liradır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü				23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	100		
448	000000000000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2014	23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	100		DE

Çevre

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı ve 2013 yılı programı 600.000 liradır. Harcama yapılmamıştır. Projeye henüz başlanmamıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal 2013 yılı gerçekleşme (%)	Fiziki 2013 yılı gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				600.000	0	600.000	0	0	0	0	
449	2013K100050	EMEP (Avrupa'da Hava Kirlenmelerinin Uzun Menzilli Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı) Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi (Etüd Proje, Makine teçhizat alımı)	GB	2013	2013	600.000	0	600.000	0	0	0	0	HB

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 270.000 liradır. 2013 yılı programı 75.000 liradır. Harcama yapılmamıştır. Proje devam etmektedir.

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal 2013 yılı gerçekleşme (%)	Fiziki 2013 yılı gerçekleşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü				270.000	0	75.000	0	0	0	0	
450	2001F000080	Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi	GB	2013	2014	270.000	0	75.000	0	0	0	20	DE

Sosyal Güvenlik

Sosyal Güvenlik

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Sosyal Güvenlik Kapsamındaki Toplam Nüfus				305.523	299.924	298.986	318.303	297.992	301.043
Sigortalı	78.073	81.211	82.346	82.711	77.750	80.115	83.251	85.354	89.435
Aylık Alan	49.103	51.861	54.440	58.043	60.416	62.478	66.663	69.241	70.129
Bakmakla yükümlü tutulanlar				164.769	161.758	156.393	168.389	143.397	141.479
4/c (Emekli Sandığı)				58.202	45.927	47.924	51.448	52.015	52.716
Sigortalı	15.335	15.453	15.590	15.730	10.702	11.453	12.801	12.993	13.246
Aylık Alan	11.270	11.522	11.828	12.066	11.924	12.044	12.203	12.311	12.362
Bakmakla yükümlü tutulanlar				30.406	23.301	24.427	26.444	26.711	27.108
4/a (SSK)				153.165	157.262	153.827	170.219	151.150	155.684
Sigortalı	41.984	44.865	47.430	47.626	47.421	49.061	52.232	55.039	59.539
Aylık Alan	23.649	25.024	26.648	28.371	30.025	31.557	33.267	34.857	35.999
Bakmakla yükümlü tutulanlar				77.168	79.816	73.209	84.720	61.254	60.146
4/b (Bağ-Kur)				94.156	96.735	97.235	96.636	94.827	92.643
Sigortalı	20.754	20.893	19.326	19.355	19.627	19.601	18.218	17.322	16.650
Aylık Alan	14.184	15.315	15.964	17.606	18.467	18.877	21.193	22.073	21.768
Bakmakla yükümlü tutulanlar				57.195	58.641	58.757	57.225	55.432	54.225

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı (www.sgk.gov.tr)

İlimizde aktif sigortalı sayısı 89.435'dir. 70.129 kişi de Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık almaktadır. Bakmakla yükümlü tutulanlarla beraber sosyal güvenlik kapsamındaki toplam kişi sayısı 301.043'dür. Sosyal güvenlik kapsamındaki nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 88,23'dür. 81 il içerisinde 17. sırada bulunmaktadır. Türkiye ortalaması yüzde 82,70'dir.

İlimizde Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü, Babaeski, Lüleburgaz ve Vize ilçelerinde Sosyal Güvenlik Merkezi, Demirköy'de de irtibat bürosu bulunmaktadır.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Projelerin toplam tutarı 6.159.194 liradır. 2013 yılı programı 2.774.194 liradır. 774.194 lira ödenek gönderilmiş ve 774.194 lira harcanmıştır. Yüzde 28 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü						6.159.194	1.000.000	2.774.194	774.194	774.194	28		
451	2012K130050	B.eski Sosyal Güvenlik Merkezi Binası Yapımı (Proje + İnşaat)	SG	2012	2013	1.774.194	1.000.000	774.194	774.194	774.194	100	100	BT
452	000000000000	K.eli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	SG	2013	2013	4.385.000	0	2.000.000	0	0	0	0	DE



Babaeski Sosyal Güvenlik Merkezi Açılış Töreni 02.03.2013

Sosyal İçerme

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 8 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 658.208 liradır. 2013 yılı programı 521.208 liradır. 477.207 lira ödenek gönderilmiş ve 154.306 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 30 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 4 proje bitmiştir. 4 projeye hiç başlanmamıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü						658.208	137.000	521.208	477.207	154.306	30		
453	000000000000	K.eli Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	HB
454	000000000000	Koçgaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
455	000000000000	K.eli Kadın Konukevi Tefrişatı	GB	2012	2013	100.000	57.000	43.000	43.000	20.099	47	90	BT
456	000000000000	K.eli Kadın Konukevi Kamera Sistemi	GB	2013	2013	32.769	0	32.769	32.769	32.769	100	100	BT
457	000000000000	K.eli Yetiştirme Yurdu Spor Salonu Bakım ve Onarımı	GB	2012	2013	105.020	80.000	25.020	25.020	25.020	100	100	BT
458	000000000000	K.eli Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	76.418	0	76.418	76.418	76.418	100	100	BT
459	000000000000	K.eli Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Donanım Malzemesi Alımı	GB	2013	2014	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	HB
460	000000000000	Çocuk Evleri Tefrişat ve Giderleri (2 adet)	GB	2013	2013	44.000	0	44.000	0	0	0	0	HB



Çocuk Evleri



Çocuk Evleri

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2013 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 6.100.000 liradır. 2013 yılı programı 2.100.001 liradır. 2.083.408 lira ödenek gönderilmiş ve 1.983.408 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 94 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 devam etmektedir. 2 proje ihale aşamasındadır.

Babaeski ve Lüleburgaz Gençlik Merkezleri için yer tespiti yapılmıştır. İhaleleri Spor Genel Müdürlüğünce yapılacaktır.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü						6.100.000	0	2.100.001	2.083.408	1.983.408	94		
461	1990K170050	K.eli Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2012	2014	3.000.000	0	2.000.000	1.983.408	1.983.408	99	66	DE
462	000000000000	B.eski Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	600.000	0	100.000	100.000	0	0	0	İA
463	1990K170050	L.burgaz Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	2.500.000	0	1	0	0	0	0	İA



Kırklareli Gençlik Merkezi Açılışı 29.05.2013



Kırklareli Gençlik Merkezi Açılışı 29.05.2013



Kırklareli Gençlik Merkezi Maketi



Babaeski Gençlik Merkezi Maketi

KÖYDES Projesi


KÖYDES Projesi 2013 yılı ödeneği 4.792.700 liradır. 57'si ulaştırma, 34'ü içmesuyunda, 3'ü küçük sulamalarda, 3'ü de kanalizasyonda toplam 97 proje uygulanmaktadır. 48 ulaştırma, 19 içmesuyu, 3 küçük sulama projesi tamamlanmıştır.

1 sulama, 2 HİS göleti, 30,5 km ikinci kat asfalt kaplama, 36 köyde 28.514 m² parke taşı kaplaması, 4 menfez, 6 kuyu sondajı ve 13 içmesuyu çalışması yapılmıştır.

Kalan işlerde çalışmalar devam etmektedir.

KÖYDES 2013 Yılı Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		KÖYDES				4.792.700	0	4.792.700	4.792.700	3.810.336	80		
		Tarım				64.258	0	64.258	64.258	55.682	87		
		Yeraltı sulamaları				30.258	0	30.258	30.258	25.370	84		
1	0000000000.	Vize Müsellim Yeraltı Sulama Tesis Bağlantısı (110 hektar)	KP	2013	2013	30.258	0	30.258	30.258	25.370	84	100	BT
		Hayvan İçmesuyu Göletleri				34.000	0	34.000	34.000	30.312	89		
2	0000000000.	Koçgaz Tastepe Hayvan İçme Suyu Göleti	KP	2013	2013	17.000	0	17.000	17.000	15.156	89	100	BT
3	0000000000.	Koçgaz Elmacık Hayvan İçme Suyu Göleti	KP	2013	2013	17.000	0	17.000	17.000	15.156	89	100	BT
		Ulaştırma				3.066.803	0	3.066.803	3.066.803	2.558.716	83		
		2. Kat Asfalt Kaplama (44,5 km)				1.997.939	0	1.997.939	1.997.939	1.568.702	79		
4	0000000000.	Kızılıkdere - Deveçatağı Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	KP	2013	2013	343.961	0	343.961	343.961	320.698	93	100	BT
5	0000000000.	Yoğuntaş - Karahamza 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	KP	2013	2013	319.663	0	319.663	319.663	0	0		DE
6	0000000000.	B.eski Osmaniye Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2013	2013	132.000	0	132.000	132.000	125.798	95	100	BT
7	0000000000.	Ky.İlt. - Avcılar Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	KP	2013	2013	326.481	0	326.481	326.481	314.960	96		DE
8	0000000000.	Yukarıkanara - Malkoçlar Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2013	2013	232.000	0	232.000	232.000	212.666	92	100	BT
9	0000000000.	Ky. İlt. - Aşağıkanara Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2013	2013	145.879	0	145.879	145.879	137.460	94	100	BT
10	0000000000.	Devletlişçi - Kocatarla Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (0,5 km)	KP	2013	2013	26.121	0	26.121	26.121	23.099	88	100	BT
11	0000000000.	Dy İlt - Kırıkköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	KP	2013	2013	254.494	0	254.494	254.494	236.739	93	100	BT
12	0000000000.	Tren İstasyonu - Alacaoğlu Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2013	2013	217.340	0	217.340	217.340	197.282	91	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (45.550 m ²)				870.519	0	870.519	870.519	796.029	91		
13	0000000000.	K.eli Dereköy Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.000 m ²)	KP	2013	2013		0				0	0	HB
14	0000000000.	K.eli Erikler Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.588 m ²)	KP	2013	2013	30.000	0	30.000	30.000	22.420	75	100	BT
15	0000000000.	K.eli Paşayeri Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (2.010 m ²)	KP	2013	2013		0				0	0	HB
16	0000000000.	K.eli Şükrüpaşa Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.364 m ²)	KP	2013	2013	30.000	0	30.000	30.000	22.420	75	100	BT
17	0000000000.	K.eli Ünlü Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.481 m ²)	KP	2013	2013	30.000	0	30.000	30.000	20.060	67	100	BT
18	0000000000.	K.eli Yündolan Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.224 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	19.452	97	100	BT

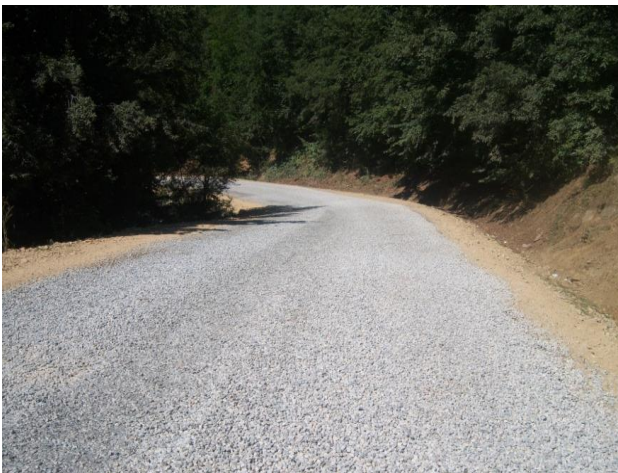

Boztaş - Yiğitbaşı 2. Kat Asfalt Kaplama



Vize Doğanca Parke Taşı Kaplaması

KÖYDES 2013 Yılı Yatırımları (Devam-1)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
19	0000000000.	B.eski Çavuşköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.995 m ²)	KP	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	42.424	85	100	BT
20	0000000000.	B.eski Taşagül Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.858 m ²)	KP	2013	2013	47.000	0	47.000	47.000	39.896	85	100	BT
21	0000000000.	B.eski Yeniköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.130 m ²)	KP	2013	2013	35.000	0	35.000	35.000	0	0		DE
22	0000000000.	B.eski Yenimahalle Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (788 m ²)	KP	2013	2013		0			0	0	0	HB
23	0000000000.	D.köy Beğendik Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.054 m ²)	KP	2013	2013	28.519	0	28.519	28.519	27.150	95	100	BT
24	0000000000.	Koçgaz Kocayazı Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.075 m ²)	KP	2013	2013	25.000	0	25.000	25.000	23.364	93	100	BT
25	0000000000.	P.köy Akarca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.297 m ²)	KP	2013	2013	23.920	0	23.920	23.920	22.957	96	100	BT
26	0000000000.	P.köy Hıdırca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (385 m ²)	KP	2013	2013	11.040	0	11.040	11.040	8.891	81	100	BT
27	0000000000.	P.köy Kuştepe Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.044 m ²)	KP	2013	2013	22.920	0	22.920	22.920	18.479	81	100	BT
28	0000000000.	P.köy Yeşilova Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (677 m ²)	KP	2013	2013	10.120	0	10.120	10.120	11.983	118	100	BT
29	0000000000.	P.hisar Evciler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.167 m ²)	KP	2013	2013	28.000	0	28.000	28.000	26.632	95		DE
30	0000000000.	P.hisar İslambeyli Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.406 m ²)	KP	2013	2013	37.000	0	37.000	37.000	32.086	87		DE
31	0000000000.	Vize Akıncılar Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (951 m ²)	KP	2013	2013	24.025	0	24.025	24.025	26.113	109	100	BT
32	0000000000.	Vize Akpınar Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.140 m ²)	KP	2013	2013	32.000	0	32.000	32.000	25.756	80	100	BT
33	0000000000.	Vize Aksicim Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.588 m ²)	KP	2013	2013	40.000	0	40.000	40.000	32.359	81	100	BT
34	0000000000.	Vize Aksicim Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (963 m ²)	KP	2013	2013	23.675	0	23.675	23.675	23.077	97	100	BT
35	0000000000.	Vize Balkaya Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.641 m ²)	KP	2013	2013	10.000	0	10.000	10.000	9.936	99	100	BT
36	0000000000.	Vize Çavuşköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (440 m ²)	KP	2013	2013	12.175	0	12.175	12.175	12.772	105	100	BT
37	0000000000.	Vize Develi Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (942 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.351	82	100	BT
38	0000000000.	Vize Doğanca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (942 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.351	82	100	BT
39	0000000000.	Vize Doğanca Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (800 m ²)	KP	2013	2013	24.025	0	24.025	24.025	18.024	75	100	BT
40	0000000000.	Vize Düzova Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.300 m ²)	KP	2013	2013	24.025	0	24.025	24.025	27.612	115	100	BT
41	0000000000.	Vize Evrencik Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.000 m ²)	KP	2013	2013		0			10.561	0	100	BT
42	0000000000.	Vize Evrenli Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (942 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.351	82	100	BT
43	0000000000.	Vize Evrenli Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (823 m ²)	KP	2013	2013	24.025	0	24.025	24.025	18.452	77	100	BT
44	0000000000.	Vize Hasbuğa Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (500 m ²)	KP	2013	2013		0			21.122	0	100	BT
45	0000000000.	Vize Kışlacık Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.000 m ²)	KP	2013	2013		0			24.544	0	100	BT
46	0000000000.	Vize Kızılağaç Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (942 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.351	82	100	BT
47	0000000000.	Vize Kömürköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (942 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.351	82	100	BT
48	0000000000.	Vize Küçükayla Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (942 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.351	82	100	BT
49	0000000000.	Vize Müsellim Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (974 m ²)	KP	2013	2013	24.025	0	24.025	24.025	25.327	105	100	BT



Kofçaz Beyci 1 Menfız İnşaatı



Lüleburgaz Akçaköy İçmesuyu Ayaklı Su Deposu İnşaatı

KÖYDES 2013 Yılı Yatırımları (Devam-2)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Turu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Gerçekleşme (%)	Fiziki İşleme (%)	Açıklama
50	0000000000	Vize Okçular Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (909 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.311	82	100	BT
51	0000000000	Vize Okçular Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.024 m ²)	KP	2013	2013	24.025	0	24.025	24.025	24.217	101	100	BT
52	0000000000	Vize Sofular Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (500 m ²)	KP	2013	2013		0			10.915	0	100	BT
53	0000000000	Vize Soğucak Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (942 m ²)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.351	82	100	BT
54	0000000000	Vize Topçuköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (860 m ²) Menfez İnşaatı (5 adet)	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.260	81	100	BT
						120.292	0	120.292	120.292	131.298	109		
55	0000000000	B.eski Yenimahalle Menfez İnşaatı	KP	2013	2013		0			29.028	0	0	HB
56	0000000000	P.hisar Akören Menfez İnşaatı	KP	2013	2013	13.292	0	13.292	13.292	12.433	94	100	BT
57	0000000000	P.hisar Evçiler Menfez İnşaatı	KP	2013	2013	55.000	0	55.000	55.000	46.055	84	100	BT
58	0000000000	Vize Düzova Menfez İnşaatı	KP	2013	2013	10.000	0	10.000	10.000	6.139	61	100	BT
59	0000000000	Vize Evrenli Menfez İnşaatı	KP	2013	2013	42.000	0	42.000	42.000	37.643	90	100	BT
		Diğerleri				59.353	0	59.353	59.353	62.687	106		
60	0000000000	Ky.İlt - Çayırdere Ky. Oto Korkuluk Yapım İş (930 m ³ taş duvar) Ortak alım	KP	2013	2013	59.353	0	59.353	59.353	62.687	106	100	BT
						18.700	0	18.700	18.700	0	0		
61	0000000000	Trafik İşaretleri	KP	2013	2013	18.700	0	18.700	18.700	0	0	0	HB
		DKH / Sosyal / İçmesuyu				1.353.639	0	1.353.639	1.353.639	1.162.531	86		
62	0000000000	K.eli Çeşmeköy İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	28.532	143	100	BT
63	0000000000	K.eli Çukurpınar İçmesuyu İsale Hattı	KP	2013	2013	125.000	0	125.000	125.000	116.230	93		DE
64	0000000000	K.eli Demircihalil İçmesuyu Depo İnşaatı	KP	2013	2013	91.777	0	91.777	91.777	88.513	96		DE
65	0000000000	K.eli Dolhan İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2013	2013	35.000	0	35.000	35.000	33.890	97	100	BT
66	0000000000	K.eli Kadıköy İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2013	2013	17.162	0	17.162	17.162	15.324	89	100	BT
67	0000000000	K.eli Karakoç İçmesuyu Depo İnşaatı	KP	2013	2013	43.100	0	43.100	43.100	38.341	89	100	BT
68	0000000000	K.eli Paşayeri İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	KP	2013	2013	34.337	0	34.337	34.337	29.099	85	100	BT
69	0000000000	K.eli Paşayeri İçmesuyu Motopomp Alımı	KP	2013	2013		0	0	0	0	0	0	HB
70	0000000000	B.eski Düşüncülü İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	42.073	84	100	BT
71	0000000000	B.eski Katranca İçmesuyu Su Deposu Bağlantısı	KP	2013	2013	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	HB
72	0000000000	B.eski Kuzuçardağı İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2013	2013	35.000	0	35.000	35.000	34.220	98		DE
73	0000000000	B.eski Mutlu İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	30.598	61	100	BT
74	0000000000	B.eski Mutlu İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	KP	2013	2013	54.000	0	54.000	54.000	34.220	63		DE
75	0000000000	B.eski Nadırlı İçmesuyu Şebeke Onarımı	KP	2013	2013	15.000	0	15.000	15.000	13.688	91		DE
76	0000000000	B.eski Sofuhalil İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2013	2013	25.000	0	25.000	25.000	23.600	94		DE
77	0000000000	B.eski Terzili İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2013	2013	40.000	0	40.000	40.000	38.248	96	100	BT
78	0000000000	B.eski Terzili İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	KP	2013	2013	45.000	0	45.000	45.000	34.220	76		DE
79	0000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Terfi Hattı Bağlantısı	KP	2013	2013	85.162	0	85.162	85.162	82.600	97	100	BT
80	0000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Asbest Boru Değişimi	KP	2013	2013		0			19.871	0		DE
81	0000000000	L.burgaz Çeşmekolu İçmesuyu Terfi Hattı Bağlantısı	KP	2013	2013	41.004	0	41.004	41.004	40.120	98	100	BT
82	0000000000	L.burgaz Çeşmekolu İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	KP	2013	2013		0			19.470	0	100	BT
83	0000000000	L.burgaz Karaağaç İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	KP	2013	2013		0			0	0	0	İA
84	0000000000	L.burgaz Turgutbey İçmesuyu Gömme Depo İnşaatı	KP	2013	2013	152.000	0	152.000	152.000	107.380	71	DE	İA
85	0000000000	L.burgaz Yenitaşı İçmesuyu Gömme Depo İnşaatı	KP	2013	2013	120.000	0	120.000	120.000	93.810	78		DE
86	0000000000	P.köy İmampazarı İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2013	2013	16.000	0	16.000	16.000	22.509	141	100	BT
87	0000000000	P.köy Yeşilpınar İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2013	2013	16.000	0	16.000	16.000	15.487	97	100	BT
88	0000000000	P.hisar Hacrafaklı İçmesuyu Depo Onarımı	KP	2013	2013	35.000	0	35.000	35.000	25.609	73	100	BT
89	0000000000	P.hisar Tozaklı İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2013	2013	41.355	0	41.355	41.355	36.556	88	100	BT
90	0000000000	P.hisar Tozaklı İçmesuyu Bağlantısı	KP	2013	2013		0			19.175	0	0	İA
91	0000000000	Vize Balkaya İçmesuyu İsale Hattı	KP	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	16.256	81		DE
92	0000000000	Vize Düzova İçmesuyu Kuyu Sondajı	KP	2013	2013	37.583	0	37.583	37.583	38.657	103	100	BT
93	0000000000	Vize Kışlacık İçmesuyu Tesisi Onarımı	KP	2013	2013	4.159	0	4.159	4.159	6.458	155	100	BT
94	0000000000	Vize Kızılağaç İçmesuyu Depo Bağlantısı	KP	2013	2013	5.000	0	5.000	5.000	12.889	258	100	BT
95	0000000000	Vize Müsellim İçmesuyu Pompa Alımı	KP	2013	2013		0			4.888	0	100	BT
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				308.000	0	308.000	308.000	33.407	11		
96	0000000000	D.köy Armutveren Kanalizasyon İnşaatı	KP	2013	2013	173.000	0	173.000	173.000	0	0	0	İA
97	0000000000	P.köy Kuştepe Kısmi Kanalizasyon İnşaatı	KP	2013	2013	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	İA
98	0000000000	P.hisar Cevizköy Kanalizasyon Sistemi Onarımı	KP	2013	2013	35.000	0	35.000	35.000	33.407	95		DE

KÖYDES Projesi kapsamında İlimize 2005 – 2013 yılları arasında toplam **42.278850** lira ödenek tahsis edilmiştir.

Köy yolu çalışmalarında

582 km asfalt kaplama (112,2 km.si 1. Kat, 469,6 km.si 2.kat)
 56,5 km stabilize kaplama
 6 km onarım
 3 köprü
 41 menfez
 385.288 m2 köyüçi yolları parke taşı düzenlemesi

yapılmıştır.

Köy içme suyu çalışmalarında

53 sondaj kuyusu açılmış, 140 proje ile de köylerimizin daha sağlıklı içmesuyuna kavuşması için boru değişimi, ıkmal onarım ve biriktirme içmesuyu deposu yapılmıştır.

Sulama çalışmalarında

4 yerüstü sulama, 15 yeraltı sulama, 10 sulama göleti bakım ve onarımı yapılarak 1.063 hektar alan sulamaya açılmış ve 53.676 metre su kanalı bakım ve onarımı yapılmıştır. Ayrıca, 7 hayvan içmesuyu göleti yapılmıştır.

Kanalizasyon çalışmalarında

29 köyün kanalizasyonu yapılmıştır.

KÖYDES Projesi Kapsamında Yapılan İşler

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Toplam
Sulama (Adet)		24	1			1	2		1	29
(Hektar)		674				129	150		110	1.063
HİS Göleti (Adet)		5							2	7
Onarım (Km)			6,0							6,0
Stabilize Kaplama (Km)	14,0	27,0		2,5	1,5	11,5				56,5
1. Kat Asfalt Kaplama (Km)		59,5	32,0		0,4	6,0	3,3	11,0		112,2
2. Kat asfalt Kaplama (Km)		58,5	96,0	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	30,5	469,6
Köyüçi Yolları Parke Taşı Kaplaması (m2)		23.204,0	239.170,0		4.134,0	50.574,0	20.040,0	19.652,0	28.514,0	385.288
Köprü (Adet)		2	1							3
Menfez (Adet)		14	3	2	1	2	8	7	4	41
Diğer		7					2	2	1	12
İçmesuyu (Adet)	2	53	23	7	4	15	13	10	13	140
Kuyu Sondajı (Adet)		24	12	4	4	1	1	1	6	53
Kanalizasyon (Adet)		29								29

Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları

0 Genel Durum

2013 yılında, ilimizde 26 belediyenin 25'i tarafından 154 proje uygulanmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 152.544.401 liradır. 2013 yılı programı 95.871.892 liradır. 55.683.610 lira harcama yapılmış ve yüzde 58 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

29 proje bitmiştir. 63 proje devam etmektedir. 60 projeye başlanmamıştır.

Belediyelerin 2013 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra no	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		154	152.544.401	4.333.212	95.871.892	69.819.301	55.683.610	60	0	2	63	29	58
1	Kırklareli	8	10.305.141	0	10.305.141	4.357.103	1.900.470	1	0	0	7	0	18
2	İnece	12	1.302.891	0	1.302.891	111.505	111.505	6	0	0	3	3	9
3	Kavaklı	1	150.000	32.569	100.000	40.171	0	0	0	0	1	0	0
4	Üsküp	2	788.648	0	497.844	497.844	355.711	0	0	0	2	0	71
5	Babaeski	9	16.720.487	0	16.225.488	5.136.917	5.126.198	1	0	0	2	6	32
6	Alpullu	7	122.000	0	122.000	76.292	72.612	3	0	0	0	4	60
7	Büyükmandıra	8	1.017.328	0	517.329	218.469	217.074	3	0	0	0	5	42
8	Karahallil	1	589.537	0	266.446	266.446	266.446	0	0	0	1	0	100
9	Sinanlı	14	837.576	0	837.576	592.606	570.218	10	0	0	2	2	68
10	Demirköy	4	431.050	0	431.050	381.483	368.568	0	0	0	4	0	86
11	İğneada	5	1.908.371	174.691	995.452	995.452	613.890	4	0	0	1	0	62
12	Kofçaz	2	3.000.000	50.000	407.500	407.500	293.056	0	0	0	2	0	72
13	Lüleburgaz	8	47.363.981	0	47.363.981	47.106.371	38.088.974	1	0	0	7	0	80
14	Ahmetbey	13	25.559.510	0	5.352.437	813.169	813.169	8	0	0	5	0	15
15	Büyükkarıştıran	9	3.778.381	0	3.778.381	2.994.536	2.905.578	2	0	0	4	3	77
16	Evrensekiz	5	7.600.000	2.593.293	2.050.000	2.050.000	702.954	2	0	0	3	0	34
17	Kırıkköy	4	14.327.926	381.740	323.000	50.277	50.277	2	0	0	1	1	16
18	Sakızköy	8	1.898.000	38.000	1.166.463	954.304	474.304	2	0	0	4	2	41
19	Pehlivanlı	6	2.700.000	205.000	350.005	321.641	321.641	4	0	2	0	0	92
20	Pınarhisar	13	9.476.500	696.250	1.443.500	866.250	850.000	3	0	0	9	1	59
21	Kaynarca	2	28.000	0	28.000	0	0	2	0	0	0	0	0
22	Yenice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Vize	4	1.140.000	0	820.002	761.269	761.269	2	0	0	1	1	93
24	Çakıllı	6	363.000	0	363.000	95.291	95.291	2	0	0	4	0	26
25	Kıyıköy	1	886.074	161.669	724.405	724.405	724.405	0	0	0	0	1	100
26	Sergen	2	250.000	0	100.001	0	0	2	0	0	0	0	0

1 Kırklareli Belediyesi

Kırklareli Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Kırklareli				10.305.141	0	10.305.141	4.357.103	1.900.470	18		
		Yol				2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	998.367	36		
1	000000000000	Yol Bakım Onarımı	BL	2013	2013	2.800.000	0	2.800.000	2.800.000	998.367	36		DE
		Kanalizasyon				2.375.000	0	2.375.000	0	0	0		
2	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	BL	2013	2013	2.375.000	0	2.375.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				5.130.141	0	5.130.141	1.557.103	902.103	18		
3	000000000000	Hizmet Tesisleri	BL	2013	2013	50.000	0	50.000	43.018	43.018	86		DE
4	000000000000	Hizmet Binası Onarımı	BL	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	45.672	91		DE
5	000000000000	Taşıt, İş Makinası Alımı	BL	2013	2013	1.050.000	0	1.050.000	21.313	21.313	2		DE
6	000000000000	Restorasyon ve Yenileme	BL	2013	2013	252.100	0	252.100	252.100	57.000	23		DE
7	000000000000	Gayrimenkul Alımı	BL	2013	2013	600.000	0	600.000	600.000	144.428	24		DE
8	000000000000	Mal ve Hizmet Alımları	BL	2013	2013	3.128.041	0	3.128.041	590.672	590.672	19		DE

2 İnece Belediyesi

İnece Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		İnece				1.302.891	0	1.302.891	111.505	111.505	9		
		Yol				106.517	0	106.517	0	0	0		
9	000000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması ve Bordür Düzenlenmesi (..... m ²)	BL	2013	2013	6.517	0	6.517	0	0	0	85	DE
10	000000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması (5000 m ²)	BL	2013	2013	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
		Su				25.000	0	25.000	13.258	13.258	53		
11	000000000000	İçmesuyu Projesi	BL	2013	2013	25.000	0	25.000	13.258	13.258	53	100	BT
		Kanalizasyon				35.000	0	35.000	3.247	3.247	9		
12	000000000000	Kanalizasyon Proje Çizimi	BL	2012	2013	25.000	0	25.000	3.247	3.247	13	100	BT
13	000000000000	Kanalizasyon Şebekesi	BL	2013	2013	10.000	0	10.000	0	0	0	90	DE
		Diğerleri				1.136.374	0	1.136.374	95.000	95.000	8		
14	000000000000	Mezarlık Düzenlemesi	BL	2013	2013	204.848	0	204.848	0	0	0	0	HB
15	000000000000	Dere Islahı	BL	2013	2013	504.400	0	504.400	0	0	0	0	HB
16	000000000000	Kentsel Dönüşüm Projesi (Ulukonak Mah.)	BL	2013	2013	180.000	0	180.000	0	0	0	50	DE
17	000000000000	İmar Planı Yapımı (Ulukonak Mah.)	BL	2013	2013	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
18	000000000000	Çatı Tamiratı Yapımı-Belediye Pasajı	BL	2013	2013	8.288	0	8.288	0	0	0	0	HB
19	000000000000	Bucak Binası Tadilatı ile Kültür Evine Dönüştürülmesi	BL	2013	2013	43.838	0	43.838	0	0	0	0	HB
20	000000000000	Belediye Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	BL	2013	2013	95.000	0	95.000	95.000	95.000	100	100	BT

3 Kavaklı Belediyesi

Kavaklı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Kavaklı				150.000	32.569	100.000	40.171	0	0		
		Yol				150.000	32.569	100.000	40.171	0	0		
21	000000000000	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2011	2014	150.000	32.569	100.000	40.171	0	0		DE

4 Üsküp Belediyesi

Üsküp Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Üsküp				788.648	0	497.844	497.844	355.711	71		
		Kanalizasyon				538.648	0	247.844	247.844	247.844	100		
22	000000000000.	Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2013	2013	538.648	0	247.844	247.844	247.844	100	87	DE
		Diğerleri				250.000	0	250.000	250.000	107.867	43		
23	000000000000.	Çevre Kirliliğinin Giderilmesi	BL	2013	2013	250.000	0	250.000	250.000	107.867	43	43	DE

5 Babaeski Belediyesi

Babaeski Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Babaeski				16.720.487	0	16.225.488	5.136.917	5.126.198	32		
		Yol				3.500.000	0	3.300.000	1.248.772	1.248.772	38		
24	000000000000.	Parke Taş Kaplama Yapımı	BL	2012	2013	400.000	0	400.000	242.594	242.594	61	100	BT
25	000000000000.	Yol Sathi Kaplama Yapılması	BL	2013	2013	1.000.000	0	800.000	0	0	0	0	HB
26	000000000000.	Asfalt Kaplama Yapılması	BL	2013	2013	2.000.000	0	2.000.000	949.729	949.729	47	100	BT
27	000000000000.	Bozulan Bordür ve Tretuarların Yenilenmesi	BL	2012	2013	100.000	0	100.000	56.449	56.449	56	100	BT
		Su				3.225.487	0	3.225.487	3.225.487	3.225.487	100		
28	000000000000.	İçme Suyu Depo ve Terfi Hattı Yapılması	BL	2012	2013	3.225.487	0	3.225.487	3.225.487	3.225.487	100	100	BT
		Kanalizasyon				9.295.000	0	9.000.001	0	0	0		
29	000000000000.	Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2008	2013	295.000	0	1	0	0	0		DE
30	000000000000.	Kanalizasyon Projesi ve Kanal Yapımı	BL	2013	2013	9.000.000	0	9.000.000	0	0	0		DE
		Diğerleri				700.000	0	700.000	662.658	651.939	93		
31	000000000000.	Taşıt Alımı	BL	2012	2013	600.000	0	600.000	600.000	589.281	98	100	BT
32	000000000000.	Halı Saha Zemininin Yenilenmesi	BL	2013	2013	100.000	0	100.000	62.658	62.658	63	100	BT

6 Alpullu Belediyesi

Alpullu Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Alpullu				122.000	0	122.000	76.292	72.612	60		
		Yol				55.000	0	55.000	55.000	54.310	99		
33	000000000000.	Yol Yapımı	BL	2013	2013	55.000	0	55.000	55.000	54.310	99	100	BT
		Su				10.000	0	10.000	10.000	7.010	70		
34	000000000000.	İçmesuyu Tesisi	BL	2013	2013	10.000	0	10.000	10.000	7.010	70	100	BT
		Kanalizasyon				7.000	0	7.000	5.286	5.286	76		
35	000000000000.	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	BL	2013	2013	7.000	0	7.000	5.286	5.286	76	100	BT
		Diğerleri				50.000	0	50.000	6.006	6.006	12		
36	000000000000.	Plan Proje Alımı ve Gideri (Kanalizasyon Projesi Hazırlanması)	BL	2013	2013	8.000	0	8.000	6.006	6.006	75	100	BT
37	000000000000.	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	BL	2013	2013	21.000	0	21.000	0	0	0	0	HB
38	000000000000.	Kamulaştırma	BL	2013	2013	4.000	0	4.000	0	0	0	0	HB
39	000000000000.	Gayrimenkul Büyük Onarım (İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat ve Diğer Giderler)	BL	2013	2013	17.000	0	17.000	0	0	0	0	HB

7 Büyükmandıra Belediyesi

Büyükmandıra Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Büyükmandıra				1.017.328	0	517.329	218.469	217.074	42		
		Yol				140.000	0	140.000	20.000	18.604	13		
40	000000000000	Yol Yapım Giderleri	BL	2013	2013	140.000	0	140.000	20.000	18.604	13	100	BT
		Kanalizasyon				500.000	0	1	0	0	0		
41	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	BL	2013	2013	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				377.328	0	377.328	198.469	198.470	53		
42	000000000000	Araç Alım Giderleri	BL	2013	2013	170.000	0	170.000	168.189	168.190	99	100	BT
43	000000000000	Bina Tadilat, Tamir ve Bakım Giderleri	BL	2013	2013	30.000	0	30.000	9.175	9.175	31	100	BT
44	000000000000	Çevre Düzenlemesi	BL	2013	2013	50.000	0	50.000	3.777	3.777	8	100	BT
45	000000000000	Kamulaştırma Giderleri	BL	2013	2013	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
46	000000000000	İmar Uygulamaları	BL	2013	2013	30.000	0	30.000	0	0	0	0	HB
47	000000000000	Büyükmandıra Çok Programlı Lise Basket Sahası Yenileme İşi	BL	2013	2013	17.328	0	17.328	17.328	17.328	100	100	BT

8 Karahalil Belediyesi

Karahalil Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Karahalil				589.537	0	266.446	266.446	266.446	100		
48	000000000000	Çok Amaçlı Kültürel ve Sosyal Hizmet Merkezi Yapım İşi	BL	2013	2013	589.537	0	266.446	266.446	266.446	100	51	DE

9 Sinanlı Belediyesi

Sinanlı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Sinanlı				837.576	0	837.576	592.606	570.218	68		
		Yol				187.394	0	187.394	182.394	182.394	97		
49	000000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması ve Bordür Düzenlenmesi (..... m ²)	BL	2013	2013	182.394	0	182.394	182.394	182.394	100	100	BT
50	000000000000	Stabilize Asfalt yol yapımı	BL	2013	2013	5.000	0	5.000	0	0	0	0	HB
		Su				355.182	0	355.182	350.182	350.182	99		
51	000000000000	İçmesuyu Islahı (Çayırdere Mevkii)	BL	2013	2013	5.000	0	5.000	0	0	0	0	HB
52	000000000000	İçmesuyu Şebeke İnşaatı	BL	2013	2013	350.182	0	350.182	350.182	350.182	100	100	BT
		Kanalizasyon				70.000	0	70.000	10.030	10.030	14		
53	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2013	2013	20.000	0	20.000	10.030	10.030	50		DE
54	000000000000	Atıksu Bertaraf Tesisi	BL	2013	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				225.000	0	225.000	50.000	27.612	12		
55	000000000000	Düğün Salonu İnşaatı	BL	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	27.612	55		DE
56	000000000000	Pazaryeri İnşaatı	BL	2013	2013	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
57	000000000000	Spor tesisleri inşaatı	BL	2013	2013	30.000	0	30.000	0	0	0	0	HB
58	000000000000	Mezarlık Düzenlemesi	BL	2013	2013	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
59	000000000000	Ağaçlandırma Alanları Düzenlemesi	BL	2013	2013	5.000	0	5.000	0	0	0	0	HB
60	000000000000	Taşıt Alımı	BL	2013	2013	30.000	0	30.000	0	0	0	0	HB
61	000000000000	Park ve Çocuk Parkı Yapımı	BL	2013	2013	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
62	000000000000	Dere Islahı (Bağdere)	BL	2013	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB

10 Demirköy Belediyesi

Demirköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Demirköy				431.050	0	431.050	381.483	368.568	86		
		Yol				350.000	0	350.000	328.049	328.049	94		
63	000000000000.	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2013	2013	350.000	0	350.000	328.049	328.049	94	75	DE
		Su				20.000	0	20.000	16.922	16.922	85		
64	000000000000.	Su Şebekesi Tamiri	BL	2013	2013	20.000	0	20.000	16.922	16.922	85		DE
		Kanalizasyon				38.500	0	38.500	13.962	6.367	17		
65	000000000000.	Kanalizasyon yapım ve onarımı	BL	2013	2013	38.500	0	38.500	13.962	6.367	17	3	DE
		Diğerleri				22.550	0	22.550	22.550	17.230	76		
66	000000000000.	Bina Küçük Onarımı	BL	2013	2013	22.550	0	22.550	22.550	17.230	76	60	DE

11 İğneada Belediyesi

İğneada Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		İğneada				1.908.371	174.691	995.452	995.452	613.890	62		
		Yol				288.053	17.053	271.000	271.000	0	0		
67	000000000000.	Parke Taşı Döşeme (Demirköy Caddesi)	BL	2013	2013	141.000	0	141.000	141.000	0	0	0	HB
68	000000000000.	Yol Yapımı ve Onarımı	BL	2012	2013	147.053	17.053	130.000	130.000	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				1.607.818	155.548	714.452	714.452	613.890	86		
69	000000000000.	Eysel Atıksu Paket Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2012	2013	770.000	155.548	614.452	614.452	613.890	100	81	DE
70	000000000000.	Kabı Atık nakil İstasyonu Yapımı	BL	2013	2014	837.818	0	100.000	100.000	0	0	0	HB
		Diğerleri				12.500	2.090	10.000	10.000	0	0		
71	000000000000.	Çevre Düzenlemesi	BL	2012	2013	12.500	2.090	10.000	10.000	0	0		YK

12 Kofçaz Belediyesi

Kofçaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
		Kofçaz				3.000.000	50.000	407.500	407.500	293.056	72		
		Kanalizasyon				2.000.000	50.000	107.500	107.500	89.955	84		
72	000000000000.	Kanalizasyon Yapımı	BL	2013	2014	2.000.000	50.000	107.500	107.500	89.955	84	19	DE
		Diğerleri				1.000.000	0	300.000	300.000	203.101	68		
73	000000000000.	Çevre Kirliliğinin Giderilmesi	BL	2013	2013	1.000.000	0	300.000	300.000	203.101	68	20	DE

13 Lüleburgaz Belediyesi

Lüleburgaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
Lüleburgaz						47.363.981	0	47.363.981	47.106.371	38.088.974	80		
		Yol				14.066.944	0	14.066.944	14.066.944	14.066.944	100		
74	000000000000	Yol Yapım Giderleri	BL	2013	2013	14.066.944	0	14.066.944	14.066.944	14.066.944	100		DE
		Su				750.000	0	750.000	750.000	483.583	64		
75	000000000000	İçmesuyu Tesisi Yapımı	BL	2013	2013	750.000	0	750.000	750.000	483.583	64		DE
		Kanalizasyon				1.557.610	0	1.557.610	1.300.000	611.020	39		
76	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapım Gid.	BL	2013	2013	1.557.610	0	1.557.610	1.300.000	611.020	39		DE
		Diğerleri				30.989.427	0	30.989.427	30.989.427	22.927.427	74		
77	000000000000	Diğer Giderler (Park, alan, meydan dz., ıslah çalışmaları)	BL	2013	2013	2.250.000	0	2.250.000	2.250.000	614.913	27		DE
78	000000000000	Hizmet Tesisi	BL	2013	2013	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	0	0	0	HB
79	000000000000	Hizmet Binası (Bakım onarım, restorasyon)	BL	2013	2013	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	882.771	42		DE
80	000000000000	Eski Eser Alım ve Onarımları	BL	2013	2013	2.627.364	0	2.627.364	2.627.364	2.627.364	100		DE
81	000000000000	Sosyal Tesisler	BL	2013	2013	22.887.063	0	22.887.063	22.887.063	18.802.379	82		DE

14 Ahmetbey Belediyesi

Ahmetbey Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
Ahmetbey						25.559.510	0	5.352.437	813.169	813.169	15		
		Yol				6.202.700	0	1.481.075	709.135	709.135	48		
82	000000000000	Stabilize Yol Yapımı	BL	2013	2013	351.000	0	70.200	55.000	55.000	78		DE
83	000000000000	Çevre Yolunun Açılması	BL	2013	2013	1.938.740	0	387.748	0	0	0	0	HB
84	000000000000	Asfalt Kaplama Yapılması	BL	2013	2017	1.028.960	0	205.792	0	0	0	0	HB
85	000000000000	Sathi Kaplama Yapımı	BL	2013	2017	816.000	0	163.200	0	0	0	0	HB
86	000000000000	Tretuar Düzenlemesi	BL	2013	2013	2.068.000	0	654.135	654.135	654.135	100		DE
		Kanalizasyon				10.269.010	0	2.053.802	26.534	26.534	1		
87	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2013	2017	9.795.010	0	1.959.002	26.534	26.534	1		DE
88	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2013	2017	474.000	0	94.800	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				9.087.800	0	1.817.560	77.500	77.500	4		
89	000000000000	Spor Kompleksi İnşaatı	BL	2013	2017	700.000	0	140.000	0	0	0	0	HB
90	000000000000	Park Yapımı	BL	2013	2017	4.639.050	0	927.810	66.392	66.392	7		DE
91	000000000000	Dere Islahı (Soğucak Deresi)	BL	2013	2017	1.110.000	0	222.000	11.108	11.108	5		DE
92	000000000000	18. Madde Uygulamaları	BL	2013	2013	50.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
93	000000000000	Kamulaştırma	BL	2013	2017	1.687.500	0	337.500	0	0	0	0	HB
94	000000000000	Mezbaha Yapılması	BL	2013	2017	901.250	0	180.250	0	0	0	0	HB

15 Büyükkarıştıran Belediyesi

Büyükkarıştıran Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Büyükkarıştıran						3.778.381	0	3.778.381	2.994.536	2.905.578	77		
		Su				20.000	0	20.000	20.000	15.378	77		
95	000000000000.	İçmesuyu Arıtma+Şebekesi Yapımı	BL	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	15.378	77	90	DE
		Yol				1.834.988	0	1.834.988	1.834.988	1.834.988	100		
96	000000000000.	Yol Yapımı	BL	2013	2013	1.834.988	0	1.834.988	1.834.988	1.834.988	100	100	BT
		Kanalizasyon				450.735	0	450.735	150.735	66.399	15		
97	000000000000.	Kanalizasyon Şebekesi İnşaatları (İlave+Yeni)	BL	2013	2013	100.000	0	100.000	100.000	15.664	16	20	DE
98	000000000000.	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2010	2014	300.000	0	300.000	0	0	0	0	HB
99	000000000000.	Katı Atık Bertaraf Tesisi	BL	2013	2013	50.735	0	50.735	50.735	50.735	100	100	BT
		Diğerleri				1.472.658	0	1.472.658	988.813	988.813	67		
100	000000000000.	Diğer Taşınmaz Bakım Onarım	BL	2013	2013	345.000	0	345.000	269.821	269.821	78	75	DE
101	000000000000.	Spor Tesisleri Yapımı	BL	2013	2013	300.000	0	300.000	41.334	41.334	14	20	DE
102	000000000000.	Park Yapımı ve İhtiyaçları	BL	2013	2013	677.658	0	677.658	677.658	677.658	100	100	BT
103	000000000000.	Kamulaştırma	BL	2013	2013	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB

16 Evrensekiz Belediyesi

Evrensekiz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Evrensekiz						7.600.000	2.593.293	2.050.000	2.050.000	702.954	34		
		Yol				1.800.000	0	1.100.000	1.100.000	691.468	63		
104	000000000000.	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2013	2015	1.800.000	0	1.100.000	1.100.000	691.468	63		DE
		Kanalizasyon				4.300.000	2.593.293	550.000	550.000	11.486	2		
105	000000000000.	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2013	2014	800.000	0	400.000	400.000	1.350	0		DE
106	000000000000.	Kanalizasyon ve İçme suyu Yapım ve Onarımı	BL	2012	2014	3.500.000	2.593.293	150.000	150.000	10.136	7		DE
		Diğerleri				1.500.000	0	400.000	400.000	0	0		
107	000000000000.	Küçük Sanayi Sitesi Yapımı	BL	2013	2015	500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	HB
108	000000000000.	Kapalı Spor Salonu Yapılması	BL	2013	2015	1.000.000	0	150.000	150.000	0	0	0	HB

17 Kırıkköy Belediyesi

Kırıkköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Kırıkköy						14.327.926	381.740	323.000	50.277	50.277	16		
		Yol				95.000	22.000	73.000	50.277	50.277	69		
109	000000000000.	Yol Yapım Giderleri	BL	2013	2013	95.000	22.000	73.000	50.277	50.277	69	100	BT
		Kanalizasyon				14.032.926	359.740	50.000	0	0	0		
110	000000000000.	Kanalizasyon Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2013	2017	14.032.926	359.740	50.000	0	0	0		DE
		Diğerleri				200.000	0	200.000	0	0	0		
111	000000000000.	Orman Arazisi Kamulaştırma	BL	2013	2013	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
112	000000000000.	Diğer Taşit Alımları	BL	2013	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB

18 Sakızköy Belediyesi

Sakızköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Sakızköy				1.898.000	38.000	1.166.463	954.304	474.304	41		
		Yol				200.000	25.000	175.000	169.425	169.425	97		
113	000000000000	Yol Yapımı	BL	2010	2013	200.000	25.000	175.000	169.425	169.425	97	85	BT
		Su				848.000	8.000	501.463	501.463	291.463	58		
114	000000000000	Su Deposu Yapımı	BL	2010	2014	428.000	8.000	210.000	210.000	0	0	20	DE
115	000000000000	İçmesuyu Şebekesi Yapımı	BL	2010	2013	420.000	0	291.463	291.463	291.463	100	90	DE
		Kanalizasyon				300.000	0	250.000	250.000	0	0		
116	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2010	2013	300.000	0	250.000	250.000	0	0	0	HB
		Diğerleri				550.000	5.000	240.000	33.416	13.416	6		
117	000000000000	Kamulaştırma	BL	2010	2013	100.000	0	30.000	12.000	12.000	40	90	BT
118	000000000000	Harita ve Plan Çalışmaları	BL	2010	2014	50.000	5.000	20.000	1.416	1.416	7	60	DE
119	000000000000	Park ve Bahçe Çalışmaları	BL	2011	2013	100.000	0	40.000	20.000	0	0	50	DE
120	000000000000	Çok Amaçlı Kültür Evi Yapımı	BL	2011	2013	300.000	0	150.000	0	0	0	0	HB

19 Pehlivan köy Belediyesi

Pehlivan köy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Pehlivan köy				2.700.000	205.000	350.005	321.641	321.641	92		
		Yol				800.000	175.000	350.000	321.641	321.641	92		
121	000000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması (..... m ²)	BL	2010	2014	800.000	175.000	350.000	321.641	321.641	92	40	YK
		Su				200.000	0	1	0	0	0		
122	000000000000	Su İshale Hattının Yenilenmesi	BL	2010	2013	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				700.000	0	2	0	0	0		
123	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2010	2013	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
124	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Yapımı	BL	2010	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				1.000.000	30.000	2	0	0	0		
125	000000000000	Spor ve Mesire Alanı Düzenlenmesi (Akasyalık)	BL	2010	2013	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
126	000000000000	Panayır Alanı Düzenlenmesi	BL	2010	2014	500.000	30.000	1	0	0	0	6	YK

20 Pınarhisar Belediyesi

Pınarhisar Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Pınarhisar				9.476.500	696.250	1.443.500	866.250	850.000	59		
		Yol				575.000	18.750	181.250	131.250	125.000	69		
127	000000000000	Döner Kavşak Yapılması (Çimento Fabrikası Önü)	BL	2013	2013	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
128	000000000000	Döner Kavşak Yapılması (Dikilitaş)	BL	2013	2013	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
129	000000000000	Salih Bilinmez Caddesi Tretuvar Düzenlenmesi	BL	2013	2014	200.000	0	50.000	50.000	50.000	100	25	DE
130	000000000000	Vize Yolu Tretuvar Yapılması	BL	2013	2014	100.000	0	25.000	25.000	25.000	100	25	DE
131	000000000000	Kırklareli Caddesi Tretuvar Düzenlenmesi	BL	2013	2013	100.000	0	25.000	25.000	25.000	100	25	DE
132	000000000000	Lüleburgaz Caddesi Tretuvar Yapılması	BL	2013	2014	100.000	0	25.000	25.000	25.000	100	15	DE
133	000000000000	Meydan Düzenlemesi (Dere Mah. İzzet Ağa Çeşme Meydanı)	BL	2013	2013	25.000	18.750	6.250	6.250	0	0	75	DE
		Kanalizasyon				7.751.500	0	1.150.000	645.000	645.000	56		
134	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2013	2015	5.174.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
135	000000000000	Atıksu Kollektör Hattı Yapılması	BL	2013	2015	2.577.500	0	650.000	645.000	645.000	99	25	DE
		Diğerleri				1.150.000	677.500	112.250	90.000	80.000	71		
136	000000000000	Yüzme Havuzu Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2013	200.000	170.000	30.000	10.000	10.000	33	90	DE
137	000000000000	Halı Saha Tesisi Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2013	150.000	127.500	22.250	20.000	10.000	45	92	DE
138	000000000000	Garaj Otopark Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2014	300.000	30.000	10.000	10.000	10.000	100	13	DE
139	000000000000	Bahçe Düzenlemesi	BL	2013	2014	500.000	350.000	50.000	50.000	50.000	100	80	BT

21 Kaynarca Belediyesi

Kaynarca Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Kaynarca				28.000	0	28.000	0	0	0		
		Yol				6.000	0	6.000	0	0	0		
140	000000000000.	Yeni İmar Yolları Kamulaştırma	BL	2013	2013	6.000	0	6.000	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				22.000	0	22.000	0	0	0		
141	000000000000.	İstanbul Caddesi Kanalizasyon Yapımı	BL	2013	2013	22.000	0	22.000	0	0	0	0	HB

22 Yenice Belediyesi

Yenice Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Yenice				0	0	0	0	0	0		

23 Vize Belediyesi

Vize Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Vize				1.140.000	0	820.002	761.269	761.269	93		
		Yol				820.000	0	820.000	761.269	761.269	93		
142	000000000000.	Asfalt sathi kaplam yapılması	BL	2013	2013	400.000	0	400.000	359.846	359.846	90	100	BT
143	000000000000.	Asfalt, Hazır Beton, Tuvanlen Malzeme, Parke Taş Alım Giderleri	BL	2013	2013	420.000	0	420.000	401.423	401.423	96	85	DE
		Kanalizasyon				0	0	1	0	0	0		
144	000000000000.	Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2013	2014		0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				320.000	0	1	0	0	0		
145	000000000000.	Halıkazır Harita Yapımı	BL	2013	2013	320.000	0	1	0	0	0	0	HB

24 Çakıllı Belediyesi

Çakıllı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Çakıllı				363.000	0	363.000	95.291	95.291	26		
		Yol				60.000	0	60.000	36.566	36.566	61		
146	000000000000.	Yol Yapım Giderleri	BL	2013	2013	40.000	0	40.000	18.467	18.467	46	10	DE
147	000000000000.	Yol Bakım Onarım Giderleri	BL	2013	2013	20.000	0	20.000	18.099	18.099	90	90	DE
		Su				70.000	0	70.000	0	0	0		
148	000000000000.	İçmesuyu Yapım Giderleri	BL	2013	2013	70.000	0	70.000	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				96.000	0	96.000	51.426	51.426	54		
149	000000000000.	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	BL	2013	2013	96.000	0	96.000	51.426	51.426	54	50	DE
		Diğerleri				137.000	0	137.000	7.299	7.299	5		
150	000000000000.	Harita yapım ve Alım Gideri	BL	2013	2013	10.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
151	000000000000.	Diğer Bakım Onarım Giderleri	BL	2013	2013	127.000	0	127.000	7.299	7.299	6	10	DE

25 Kırıkköy Belediyesi

Kırıkköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Kırıkköy						886.074	161.669	724.405	724.405	724.405	100		
Diğerleri						886.074	161.669	724.405	724.405	724.405	100		
152	000000000000.	Çok Amaçlı Sosyal Tesis	BL	2012	2013	886.074	161.669	724.405	724.405	724.405	100	100	BT

26 Sergen Belediyesi

Sergen Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Sergen						250.000	0	100.001	0	0	0		
Yol						250.000	0	100.001	0	0	0		
153	000000000000.	Yol Yapım Çalışmaları	BL	2013	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
154	000000000000.	Yol Düzenleme Çalışmaları	BL	2013	2013	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB

Ekler

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
Toplam						1.920.969.323	296.802.060	334.625.872	245.781.389	213.471.558	64		
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü						347.247.368	165.808.390	36.813.857	35.095.974	35.095.974	95		
Ulaştırma						347.247.368	165.808.390	36.813.857	35.095.974	35.095.974	95		
						236.229.000	135.644.307	5.567.050	4.749.043	4.749.043	85		
1	1991E040090	Otoyol Ayrımı-K.eli-Dereköy-Aziye-Bulgaristan Hudut Yolu (1A, BY 63 km.)	GB	1995	2016	129.737.000	107.065.000	598.000	0	0	0	100	BT
2	1993E040860	Babaeski-Trakya Otoyolu Arası Bölünmüş Yolu (14 km)	GB	2003	2016	25.869.000	10.500.000	200.000	0	0	0	100	BT
3	2011E040690	Yenice - Demirköy Yolu İyileştirmesi (1A, 22 km)	GB	2011	2016	52.500.000	15.797.307	4.749.043	4.749.043	4.749.043	100	88	DE
4	1986E040360	Lüleburgaz Çevre Yolu (BY 10 km)	GB	2010	2016	17.208.000	7.000	2.000	0	0	0	0	HB
		Üsküpdere Grubu Köprüleri											
5	2003E040260	Üsküpdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (25 m)	GB	2009	2013	1.200.000	821.000	2.000	0	0	0	0	HB
		Babaeski Grubu Köprüleri											
6	2003E040260	Müsellim Köprüsü (Babaeski - Lüleburgaz yolunda) (25 m)	GB	2009	2016	1.400.000	1.164.000	2.000	0	0	0		DE
		Soğucak Grubu Köprüleri											
7	2003E040260	Soğucak (Sulca) Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (22 m)	GB	2010	2013	600.000	107.000	2.000	0	0	0	0	HB
8	2003E040260	Poyralidere Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (33 m)	GB	2010	2013	900.000	181.000	2.000	0	0	0	0	HB
		Kırklareli Grubu Köprüleri											
9	2003E040260	Ürünli Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (11 m)	GB	2012	2016	300.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
10	2003E040260	Saksığandere Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (2x30 m)	GB	2012	2016	1.550.000	0	1	0	0	0	0	HB
11	2003E040260	İncece Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (108 m)	GB	2012	2016	2.800.000	0	1	0	0	0	0	HB
12	2003E040260	Kurtidere (Çayırder) Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (32 m)	GB	2012	2016	830.000	0	1	0	0	0	0	HB
13	2003E040260	Manastırdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (20 m)	GB	2012	2016	520.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğer Köprüler											
14	2000E040020	Alpullu (Sinanlı) Köprüsü (125 m)	GB	2010	2014	300.000	2.000	1	0	0	0	0	İA
		Köprü Onarımları											
15	2001E040110	Asker Köprüsü (İğneada - Poyralı yolunda)	GB	2012	2013	215.000	0	1	0	0	0	0	HB
16	2001E040110	Poyralı Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda)	GB	2012	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
						111.018.368	30.164.083	31.246.807	30.346.931	30.346.931	97		
Bölünmüş Yollar (50,5 km)						99.018.368	30.164.083	19.246.807	19.246.807	19.246.807	100		
17	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz İlçe Hd.-Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu (17,5 km)	GB	2009	2013	22.200.000	20.738.287	1.460.000	1.460.000	1.460.000	100	100	BT
18	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz - Babaeski - Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu Üstyapı İşleri (28,5 km)	GB	2013	2014	25.000.000	0	11.190.599	11.190.599	11.190.599	100		DE
19	000000000000	Kırklareli - Kofçaz Bölünmüş Yolu (7 km)	GB	2011	2013	16.867.385	9.425.796	3.606.208	3.606.208	3.606.208	100	100	BT
20	000000000000	020-02 Devlet Yolu Kırklareli - Edirne Bölünmüş Yolu (26 / 47 km)	GB	2013	2016	34.950.983	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000	100		DE
		Diğerleri				12.000.000	0	12.000.000	11.100.124	11.100.124	93		
21	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2013	2013	12.000.000	0	12.000.000	11.100.124	11.100.124	93		DE
		DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				256.554.928	11.609.443	44.110.682	44.110.675	43.740.079	99		
		Tarım				219.885.936	11.609.443	27.301.297	27.301.290	26.931.195	99		
		Kırklareli Projesi				44.000.000	0	2	0	0	0		
22	1984A010180	K.eli Kızıcıkdere Sulaması (14.220 dekar)	GB	2013	2014	42.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
23	1984A010180	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı	GB	2013	2014	2.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
		Poyralı Projesi				42.687.260	8.557.625	19.530.369	19.530.369	19.521.821	100		
24	2010A010140	Çayırder Barajı	GB	2010	2015	26.845.444	8.557.625	8.461.173	8.461.173	8.452.625	100	57	DE
25	2010A010140	Çayırder Barajı Sulaması (25.830 dekar)	GB	2012	2015	15.841.816	0	11.069.196	11.069.196	11.069.196	100	72	DE
		Alçak Baraj (Göletler)				11.000.000	0	299.926	299.925	299.925	100		
26	000000000000	P.hisar Kurudere Göleti ve Sulaması (3.420 dekar)	GB	2013	2015	10.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
27	000000000000	Vize Sergen Göleti ve Sulaması İkmali	GB	2011	2014	1.000.000	0	299.925	299.925	299.925	100	100	BT
		Taşkın Koruma				62.075.695	1.353.690	997.316	997.312	818.588	82		
28	1977A010320	K.eli İncece (Yeniabağlık Deresi) Taşkın Koruması	GB	2012	2015	1.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
29	1977A010320	L.burgaz Evrensekiz (Kavak Dere) Taşkın Koruması	GB	2011	2013	1.026.695	731.022	295.673	295.673	192.534	65	100	BT
30	1977A010320	L.burgaz Çengelli (Arzılı Dere) Taşkın Koruması	GB	2010	2013	1.049.000	622.668	426.332	426.332	350.747	82	100	BT
31	1977A010320	L.burgaz Umurca (Kavak Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2014	3.000.000	0	275.307	275.307	275.307	100	10	DE

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-1)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
32	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2014	11.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
33	1977A010320	K.eli 1. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2015	20.000.000	0	1	0	0	0	0	İA
34	1977A010320	K.eli 2. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2015	25.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları						30.396.299	0	3.000.000	3.000.000	2.999.995	100		
35	2000A010060	Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları	GB	2012	2014	30.396.299	0	3.000.000	3.000.000	2.999.995	100	10	DE
Diğerleri						29.726.682	1.698.128	3.473.684	3.473.684	3.290.866	95		
36	00000000000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	1984	2016	14.187.500	1.355.301	117.236	117.236	117.236	100	10	DE
37	00000000000	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2002	2014	13.439.182	342.827	1.880.548	1.880.548	1.775.042	94	16	DE
38	00000000000	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2013	2013	2.100.000	0	1.475.900	1.475.900	1.398.588	95	67	DE
DKH / Sosyal / Kanalizasyon						36.668.992	0	16.809.385	16.809.385	16.808.884	100		
Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi						36.668.992	0	16.809.385	16.809.385	16.808.884	100		
39	2012K050150	K.eli ve Vize Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2014	15.443.000	0	14.947.636	14.947.636	14.947.135	100	100	BT
40	2012K050150	K.eli ve Vize Atıksu Arıtma Tesisi Karayolları Kesişimi İmalatları	GB	2013	2014	5.992	0	5.992	5.992	5.992	100	100	BT
41	2012K050150	Babaeski, Pınarhisar ve Malkara Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2014	21.220.000	0	1.855.757	1.855.757	1.855.757	100	15	DE
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						91.853.202	2.900.233	27.776.456	13.757.196	13.757.197	50		
DKH / İktisadi / Harita Tapu Kadastro						815.600	113.280	591.820	171.477	171.477	29		
42	00000000000	Kırklareli Harita Yapımı	İB	2013	2013	78.750	0	78.750	18.585	18.585	24	100	BT
43	00000000000	K.eli Kavaklı Harita Yapımı	İB	2013	2014	114.000	0	57.000			0		DE
44	00000000000	Koçgaz Harita Yapımı	İB	2013	2013	36.000	0	36.000	25.488	25.488	71	60	DE
45	00000000000	L.burgaz Ahmetbey Harita Yapımı	İB	2013	2014	62.000	0	31.000	0	0	0		DE
46	00000000000	Pınarhisar Harita Yapımı	İB	2012	2013	100.000	0	100.000	0	0	0	0	İA
47	00000000000	Vize Harita Yapımı	İB	2012	2013	320.000	113.280	206.720	113.280	113.280	55	100	BT
48	00000000000	Vize Çakıllı Harita Yapımı	İB	2013	2014	45.000	0	22.500			0		DE
49	00000000000	Vize Kiyıköy Harita Yapımı	İB	2013	2013	59.850	0	59.850	14.124	14.124	24	100	BT
DKH / Sosyal / İçmesuyu						9.253.491	2.683.338	4.091.720	2.095.732	2.095.732	51		
50	00000000000	K.eli Üsküp İçmesuyu	İB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	İA
51	00000000000	Babaeski İçmesuyu Terfi Hattı Yapımı	İB	2011	2013	5.000.000	2.050.596	2.572.050	1.434.515	1.434.515	56	100	BT
52	00000000000	B.eski Sinanlı İçmesuyu (SUKAP)	İB	2012	2013	2.372.432	351.807	470.995	457.758	457.758	97	100	BT
53	00000000000	L.burgaz Sakızı İçmesuyu (SUKAP)	İB	2012	2013	1.624.458	280.935	792.074	203.459	203.459	26		DE
54	00000000000	İçmesuyu Projesi (3 adet)	İB	2012	2013	256.600	0	256.600	0	0	0		DE
DKH / Sosyal / Kanalizasyon						80.879.308	0	22.556.302	11.169.164	11.169.165	50		
55	00000000000	K.eli İnece Atıksu Arıtma İnşaatı	İB	2013	2014	4.000.000	0	2.394.504	1.344.425	1.344.425	56		DE
56	00000000000	K.eli Kavaklı Kanalizasyonu	İB	2012	2013	7.962.400	0	1	0	0	0	0	HB
57	00000000000	B.eski Kanalizasyonu	İB	2013	2014	21.000.000	0	8.679.355	3.489.638	3.489.638	40		DE
58	00000000000	B.eski Büyükmandıra Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2014	2.491.000	0	2.491.000	879.000	879.000	35		DE
59	00000000000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyonu	İB	2012	2013	9.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
60	00000000000	L.burgaz Büyükkarıştıran Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2012	2013	2.491.391	0	2.491.391	879.967	879.967	35		DE
61	00000000000	L.burgaz Evrensekiz Kanalizasyonu (SUKAP)	İB	2012	2014	6.000.000	0	2.056.393	2.008.523	2.008.523	98		DE
62	00000000000	P.hisar Kanalizasyonu	İB	2012	2014	12.500.000	0	1.871.094	833.192	833.192	45		DE
63	00000000000	Vize Kanalizasyonu	İB	2012	2014	10.000.000	0	2.532.599	1.734.420	1.734.420	68		DE
64	00000000000	Vize Kiyıköy Kanalizasyonu (SUKAP)	İB	2012	2013	4.994.554	0	1	0	0	0	0	HB
65	00000000000	Kanalizasyon Projesi (2 ad)	İB	2010	2013	39.963	0	39.963	0	0	0		DE
DKH / Sosyal / Belediye Hizmetleri						904.803	103.615	536.614	320.823	320.823	60		
66	00000000000	Demirköy Beton Parke Yol Yapımı	İB	2013	2013	264.574	0	0	0	0	0	100	BT
67	00000000000	Vize Kapalı Yüzme Havuzu Otel ve Sosyal Tesis İnşaatı	İB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	İA
68	00000000000	Vize Kiyıköy Çok Amaçlı Salon İnşaatı	İB	2011	2013	640.228	103.615	536.613	320.823	320.823	60		DE
İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü						513.456.963	19.056.000	5.524.001	5.524.000	4.885.937	88		
Tarım						33.990.963	19.056.000	5.524.000	5.524.000	4.885.937	88		
69	1995A040170	D.köy Beğendik Balıkçı Barınağı İnşaatı	GB	1995	2014	33.690.963	19.056.000	5.224.000	5.224.000	4.629.142	89	95	DE
70	1995A040170	Vize Kiyıköy Balıkçı Barınağı Çekme Yeri ve Rıhtım Tesis İnşaatı	GB	2013	2013	300.000	0	300.000	300.000	256.795	86	100	BT
Ulaştırma						479.466.000	0	1	0	0	0		
71	2007E010140	Halkalı Kapıkule Bulgaristan Hüdudu Demiryolu İnşaatı (60/230 km)	GB	2007	2016	479.466.000	0	1	0	0	0	0	HB

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-2)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki gerçek leşme (%)	Ağırlık Malar
		İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü				7.052.750	0	7.052.750	6.461.261	6.461.261	92		
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				3.562.750	0	3.562.750	3.337.403	3.337.403	94		
		Tarım				3.562.750	0	3.562.750	3.337.403	3.337.403	94		
		Orman Kadastro				100.000	0	100.000	21.470	21.470	21		
72	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2013	2013	100.000	0	100.000	21.470	21.470	21	90	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				588.500	0	588.500	448.187	448.187	76		
73	2013A050170	Aplikasyon	DS	2013	2013	23.500	0	23.500	0	0	0	100	BT
74	2013A050170	Yeni Yol	DS	2013	2013	65.000	0	65.000	30.142	30.142	46	90	BT
75	2013A050170	B.Onarım	DS	2013	2013	56.000	0	56.000	31.105	31.105	56	100	BT
76	2013A050170	Üst Yapı	DS	2013	2013	114.000	0	114.000	109.000	109.000	96	100	BT
77	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2013	2013	200.000	0	200.000	172.940	172.940	86	100	BT
78	2013A050170	Planlama, Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2013	2013	130.000	0	130.000	105.000	105.000	81	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				2.800.250	0	2.800.250	2.800.250	2.800.250	100		
79	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2013	2013	2.800.250	0	2.800.250	2.800.250	2.800.250	100	100	BT
		Diğerleri				74.000	0	74.000	67.496	67.496	91		
80	2013A050110	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	DS	2013	2013	70.000	0	70.000	67.496	67.496	96	100	BT
81	2013A050140	ORKÖY	ÖB	2013	2013	4.000	0	4.000	0	0	0	100	BT
		Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü				1.568.500	0	1.568.500	1.390.889	1.390.889	89		
		Tarım				1.568.500	0	1.568.500	1.390.889	1.390.889	89		
		Orman Kadastro				55.000	0	55.000	22.319	22.319	41		
82	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2013	2013	55.000	0	55.000	22.319	22.319	41	100	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				1.004.500	0	1.004.500	954.341	954.341	95		
83	2013A050170	Aplikasyon	DS	2013	2013	15.500	0	15.500	0	0	0	100	BT
84	2013A050170	B.Onarım	DS	2013	2013	79.000	0	79.000	74.047	74.047	94	100	BT
85	2013A050170	Üst Yapı	DS	2013	2013	376.000	0	376.000	370.585	370.585	99	100	BT
86	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2013	2013	234.000	0	234.000	227.709	227.709	97	100	BT
87	2013A050170	Planlama, Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2013	2013	300.000	0	300.000	282.000	282.000	94	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				60.000	0	60.000	33.000	33.000	55		
88	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2013	2013	60.000	0	60.000	33.000	33.000	55	100	BT
		Diğerleri				449.000	0	449.000	381.229	381.229	85		
89	2011A050180	Orman Amenejman Projesi	DS	2013	2013	446.000	0	446.000	381.229	381.229	85	100	BT
90	2013A050140	ORKÖY	ÖB	2013	2013	3.000	0	3.000	0	0	0	100	BT
		Vize Orman İşletme Müdürlüğü				808.000	0	808.000	688.469	688.469	85		
		Tarım				808.000	0	808.000	688.469	688.469	85		
		Orman Kadastro				11.000	0	11.000	0	0	0		
91	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2013	2013	11.000	0	11.000	0	0	0	50	DE
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				510.500	0	510.500	430.375	430.375	84		
92	2013A050170	Aplikasyon	DS	2011	2013	19.500	0	19.500	0	0	0	100	BT
93	2013A050170	Yeni Yol	DS	2013	2013	130.000	0	130.000	122.719	122.719	94	100	BT
94	2013A050170	B.Onarım	DS	2013	2013	36.000	0	36.000	28.471	28.471	79	100	BT
95	2013A050170	Üst Yapı	DS	2013	2013	210.000	0	210.000	175.900	175.900	84	100	BT
96	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2013	2013	115.000	0	115.000	103.285	103.285	90	100	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				209.500	0	209.500	205.000	205.000	98		
97	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2013	2013	209.500	0	209.500	205.000	205.000	98	100	BT
		Diğerleri				77.000	0	77.000	53.094	53.094	69		
98	2013A050110	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	DS	2013	2013	39.000	0	39.000	35.000	35.000	90	100	BT
99	2011A050180	Orman Amenejman Projesi (Büro)	DS	2013	2013	35.000	0	35.000	18.094	18.094	52	100	BT
100	2013A050140	ORKÖY	ÖB	2013	2013	3.000	0	3.000	0	0	0	100	BT
		Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü				1.113.500	0	1.113.500	1.044.500	1.044.500	94		
		Tarım				1.113.500	0	1.113.500	1.044.500	1.044.500	94		
101	2013A050180	Fidan Üretimi	DS	2013	2013	1.113.500	0	1.113.500	1.044.500	1.044.500	94	95	BT
		Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü				457.000	0	262.000	150.006	150.006	57		
		Turizm				187.000	0	187.000	150.006	150.006	80		
102	2001F000080	Milli Park Projesi (etüd, proje, uygulama)	GB	2013	2013	155.000	0	155.000	119.127	119.127	77	100	BT
103	2013F000080	K.eli Orman ve Su İşleri Şb. Md.lüğü Hiz. Bin. Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	32.000	0	32.000	30.879	30.879	96	100	BT

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-3)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		DKH / Sosyal / Çevre				270.000	0	75.000	0	0	0		
104	2001F000080	Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi	GB	2013	2014	270.000	0	75.000	0	0	0	20	DE
		TCDD 1. Bölge Müdürlüğü				34.333.569	18.192.325	14.572.370	7.560.289	7.560.289	52		
		İmalat				346.750	0	346.750	0	0	0		
105	2008C280020	Alpulu Depo Şefliği Akaryakıt Tesisi Kurulması (1 adet)	KT	2012	2013	346.750	0	346.750	0	0	0	0	İA
		Ulaştırma / Demiryolu				33.986.819	18.192.325	14.225.620	7.560.289	7.560.289	53		
106	2013E010050	1.Bölge Müdürlüğü mintikasında 33 adet Gar ve İstasyon ile 9 adet trafo merkezinde kameralı güvenlik sistemi kurulması (Kırklareli 2 Adet)	KT	2011	2014	4.031.567	2.720.567	1.311.000	1.031.000	1.031.000	79	95	BT
107	2013E010010	Sirkeci -Demirköprü (Hudut) Hattı, Çerkezköy - Seyitler -Pehlivan köy Arası 218 Km Yol Yenilemesi Ve Altyapı İyileştirilmesi Tamamlama İşleri	KT	2011	2013	11.445.578	7.945.578	3.000.000	2.899.448	2.899.448	97	100	BT
108	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğüne 60 Adet 60 E1 Profilindeki Raylara Uygun Basit Makas Temini ve Montajı (Edirne 23, Kırklareli 20, Tekirdağ 17)	KT	2011	2014	8.360.050	6.760.050	1.600.000	501.929	501.929	31	90	DE
109	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğü mintikasında 37 adet hemzemin geçitte kaplama yapılması (İstanbul-Uzunköprü hattı 15 adet H.Paşa-(Eskişehir) Ankara hattı 17 adet Arifiye-Adapazarı hattı 1 adet Pehlivan köy - Kapıkule hattı 4 adet)	KT	2012	2014	1.842.710	0	1.842.705	0	0	0	0	HB
110	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğü mintikasında 20 Adet 60 E1'lik Makas Temini ve Montajı (Edirne 4 Adet, Kırklareli 14 Adet, Tekirdağ 2 Adet)	KT	2012	2013	2.566.000	0	2.566.000	2.476.871	2.476.871	97	100	BT
111	2013E010010	1.Bölge Müdürlüğü mintikasında 15107 m istasyon yolu yenilemesi İstanbul-Demirköprü Hattı 1.825 m, Mandıra-Kırklareli Hattı 1.556 m, Pehlivan köy-Kapıkule Hattı 11.726 m (Kırklareli 3381 Mt. Edirne 11726 Mt.dir.)	KT	2012	2014	1.200.000	0	1.200.000	330.947	330.947	28	30	DE
112	2012E010040	Hemzemin Geçitlerin Kontrollü Hale Getirilmesi ve Kamera Sistemi Kurulması	KT	2012	2013	935.000	766.130	1	0	0	0	100	BT
113	2013E010040	1. Bölge Müdürlüğü mintikasında 22 adet S49 makas temini ve montajı (İstanbul - Demirköprü hattı 5 adet Pehlivan köy - Kapıkule hattı 17 adet)	KT	2013	2014	194.876	0	194.876	0	0	0		DE
114	2013E010010	İstanbul - Demirköprü Hattı Muratlı - Alpulu Arası Km:181+200 - 228+100 Arasında 6.000 m Panel Tipi İhata Yapılması	KT	2013	2014	525.000	0	525.000	177.625	177.625	34		DE
115	2013E010010	İstanbul - Demirköprü Hattı Muratlı - Alpulu Arası Km:132+200 - 281+100 ve P.köy Kapıkule Hattı km 0+500 - 67+500 Arası Altyapı İşlerinin Projelendirilmesi	KT	2013	2014	491.180	0	491.180	0	0	0	0	İA
116	2013E010010	İstanbul - Demirköprü Hattı Çerkezköy - Halkalı İstasyonları Arası Km:38 - 56, 74 - 96, 105 - 111 Arası Altyapı İşlerinin Projelendirilmesi	KT	2013	2014	300.000	0	300.000	0	0	0	0	İA
117	2013E010040	Bozüyük, Bilecik, Çerkezköy, Lüleburgaz, Edirne'ye sinyalizasyon ve elektrifikasyon malzemeleri için 500 m2 kapalı depo yapılması	KT	2013	2013	536.348	0	536.348	1.245	1.245	0		DE
118	2013E010040	Çerkezköy Kapıkule arasında bulunan yerel kumanda masalarının yenilenmesi	KT	2013	2013	270.000	0	270.000	0	0	0	5	DE
119	2013E010040	Edirne Kapıkule Pehlivan köy ve Uzunköprü Santrallerine 48 V 30 Ah 1 er adet redresör alımı	KT	2013	2013	6.500	0	6.500	6.500	6.500	100	100	BT
120	2013E010040	Pehlivan köy-Pityon hattının PRI olarak çalıştırılması için 2 adet PRI kartı alınması ve bağlantının sağlanması	KT	2013	2013	20.000	0	20.000	12.850	12.850	64	100	BT
121	2013E010040	Kırklareli İli Sınırları İçerisinde Yeralan Hizmetevlerine Doğal Gaz Bağlanması ve Sıhhi Tesisatlarının Yenilenmesi	KT	2013	2014	120.000	0	120.000	118.269	118.269	99	98	DE
122	2013E010030	Pehlivan köy istasyon binası restorasyonu ve çevre düzenlemesi ile saha aydınlatması	KT	2013	2014	1.142.010	0	242.010	3.605	3.605	1	10	DE
		MTA Marmara Bölge Müdürlüğü				9.072.000	0	1.423.410	43.000	43.000	3		
		Madencilik				9.072.000	0	1.423.410	43.000	43.000	3		
123	2013B400140	Tekirdağ (Malkara)-Edirne (İpsala) Oligosen Havzası Kömür Aramaları	GB	2012	2013	1.000.000	0	250.000	0	0	0	100	BT
124	2013B400140	Trakya Jeotermal Enerji Aramaları	GB	2013	2013	2.992.000	0	997.333	43.000	43.000	4	100	BT
125	2013B400160	İstranca Masifinin Tektono-Stratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan'daki İstiflerle Korelasyonu	GB	2013	2013	477.000	0	119.250	0	0	0	100	BT
126	00000000000	Maden Ön Etütleri	GB	2013	2013	4.603.000	0	56.827	0	0	0	100	BT
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				84.442.883	55.342.000	28.258.883	28.258.883	23.983.958	85		
		Eğitim / Yüksek Öğretim				75.213.060	48.612.000	25.759.060	25.759.060	21.484.135	83		
127	2013H030270	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2013	2013	100.000	0	100.000	100.000	59.401	59	50	DE

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-4)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
128	2012H032330	Muhtelif İşler (B. onr., Mak. tec. Bil. don. vb.)	ÖB	2013	2013	3.039.000	0	3.000.000	3.000.000	1.197.804	40	85	DE
129	2009H031670	Kampüs Altyapısı (Kanalizasyon, elektrik, su, çevre düzenlemesi, gaz, yol, ısı merkezi, artıma, trafo, telefon)	ÖB	2009	2015	15.000.000	11.697.000	3.000.000	3.000.000	1.067.870	36	95	DE
130	2009H031680	Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı (17.800 m2 dersane, 14.000 m2 yemekhane, 6.000 m2 Vize MYO)	ÖB	2009	2015	56.074.060	36.915.000	19.159.060	19.159.060	19.159.060	100	97	DE
131	2013H040060	K.eli Gar Binası Restorasyonu	ÖB	2013	2014	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	HB
Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor						9.229.823	6.730.000	2.499.823	2.499.823	2.499.823	100		
132	2009H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı (Spor Salonu, Futbol Sahası (suni çim), Basketbol ve Voleybol Sahası (2 adet), Tenis Kortu (2 adet))	ÖB	2009	2014	9.229.823	6.730.000	2.499.823	2.499.823	2.499.823	100	80	DE
YURT-KUR Yurt Müdürlüğü						31.000.000	0	3.100.000	0	0	0		
Eğitim / Yüksek Öğretim						31.000.000	0	3.100.000	0	0	0		
133	2005H032940	B.eski Yurt İnşaatı (300 kişilik)	ÖB	2012	2014	14.000.000	0	1.400.000	0	0	0	0	HB
134	2005H032940	L.burgaz Yurt İnşaatı (400 kişilik)	ÖB	2011	2014	17.000.000	0	1.700.000	0	0	0	0	HB
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü						1.409.561	0	509.561	134.525	134.525	26		
Eğitim / Kültür						1.409.561	0	509.561	134.525	134.525	26		
135	000000000000	K.eli Eski Evkaf Dairesi Restorasyonu	ÖB	2012	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
136	1995H040360	L.burgaz Kadı Ali Camii Restorasyonu	ÖB	2013	2014	1.000.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
137	1995H040360	P.hisar Hundi Hatun Camii Restorasyonu	ÖB	2013	2013	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
138	1995H040360	Tarihi Yapılar Kurşun Bakım ve Onarımı	ÖB	2013	2013	259.560	0	259.560	134.525	134.525	52	52	DE
Kadastro Müdürlüğü						2.034.906	936.888	1.098.018	746.595	746.595	68		
DKH / İktisadi / Harita Tapu Kadastro						2.034.906	936.888	1.098.018	746.595	746.595	68		
139	000000000000	Babaeski Kadastro Yenileme Çalışması	DG	2012	2013	854.543	258.675	595.868	371.068	371.068	62	95	DE
140	000000000000	Lüleburgaz Kadastro Yenileme Çalışması	DG	2011	2013	621.353	434.330	187.023	60.400	60.400	32	95	DE
141	000000000000	Sayısal Harita Yapımı (11 adet)	GB	2012	2013	559.010	243.883	315.127	315.127	315.127	100	100	BT
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü						28.965.000	981.472	27.965.000	27.965.000	9.184.067	33		
Madencilik						28.965.000	981.472	27.965.000	27.965.000	9.184.067	33		
142	2013B000010	Jeoloji (Sondaj öncesi arama yatırımları sismik çalışması)	KT	2013	2013	718.000	0	718.000	718.000	50.387	7	7	DE
143	2013B040020	Sondaj (Petrol ve Doğalgaz arama)	KT	2013	2013	13.209.000	0	13.209.000	13.209.000	1.363.235	10	10	DE
144	2013B040040	KTH (Petrol ve doğalgaz kuyularını alma çalışmaları)	KT	2013	2013	1.310.000	0	1.310.000	1.310.000	465.032	35	35	DE
145	2013B040060	Muhtelif İşler (İdame ve Yenileme Yatırımları)	KT	2013	2013	9.628.000	0	9.628.000	9.628.000	5.522.242	57	57	DE
146	2010B040050	İnşaat İşleri (Bekar pansiyonu ve güvenlik binası inşaatı)	KT	2012	2013	4.100.000	981.472	3.100.000	3.100.000	1.783.171	58	70	DE
TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü						52.200.000	0	100.348	100.348	23.348	23		
Enerji						52.200.000	0	100.348	100.348	23.348	23		
147	2012D030340	Babaeski TM Tevsiat (154 kV 1 Adet Fider İlavesi)	KT	2012	2014	500.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
148	2013D030350	Babaeski - Edirne EİH Yenilemesi (Toprak teli fiber optikli)	KT	2013	2016	10.000.000	0	23.348	23.348	23.348	100	0	İA
149	2012D031340	Demirköy TM	KT	2012	2015	2.500.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
150	2009D030670	B.kanşiran TM Fider İlavesi (154 kV 1 fider)	KT	2011	2014	500.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
151	2013D090050	Hamitabat DGKÇS - Delta DGKÇS EİH Yenilemesi	KT	2013	2016	2.300.000	0	5.000	5.000	0	0	0	İA
152	2013D030150	Hamitabat 380 kV Havza TM	KT	2013	2015	32.500.000	0	52.000	52.000	0	0	0	İA
153	2013D030360	Kıyıköy TM Tevsiat	KT	2013	2015	1.200.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
154	2013D090040	(Hamitabat - Alibeyköy) Brş N - Hamitabat 380 TM	KT	2013	2015	1.200.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
155	2013D090050	Traçim - Demirköy EİH	KT	2013	2014	1.300.000	0	8.000	8.000	0	0	0	İA
156	2013D090050	Traçim TM Tevsiat	KT	2013	2014	200.000	0	2.000	2.000	0	0	0	İA
EÜAŞ Genel Müdürlüğü						132.091.950	737.950	22.390.000	450	450	0		
Enerji						132.091.950	737.950	22.390.000	450	450	0		
157	2009D070570	Gaz ve Buhar Türbin Generatörlerin İkaz ve İkaz Kontrol Sistemlerinin Yenilenmesi	KT	2009	2014	9.000.000	0	4.000.000	0	0	0	0	HB
158	2010D070290	Buhar Türbinleri 6 Kv Az Yağlı Kesicilerinin Vakumlu Tip Kesicilere Dönüştürülmesi (24 Ad. 800 Amper, 6 Ad. 1250 Amper Kesici)	KT	2010	2013	500.000	396.000	100.000	0	0	0	100	BT
159	2010D070520	A-B Gaz Türbinleri İçin Fogging (Sisleme) Sistem Kurulması	KT	2010	2013	700.000	0	560.000	450	450	0	70	DE
160	2010D070530	Su Artırma 1. Ünitesinin Kapasitesinin 35 m3 /h Artırılması	KT	2010	2013	600.000	0	480.000	0	0	0	100	BT
161	2010D070540	Gaz Türbinleri Start Ekipmanlarının Yenilenmesi	KT	2010	2013	8.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	HB
162	2012D010090	Yanma Odası, Yakıcı ve Kontrol Sistemlerinin Değişimi	KT	2012	2014	55.000.000	0	5.500.000	0	0	0	0	HB

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-5)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
163	2012D071100	Endüstriyel Atık Su Arıtma Tesisi	KT	2012	2014	597.000	277.000	320.000	0	0	0	100	BT
164	2012D071110	Biyolojik Arıtma Tesisi	KT	2012	2014	144.950	64.950	80.000	0	0	0	100	BT
165	2013D010020	C1 ve C2 Gaz Tribünlerinin Modele Upgrade Edilmesi	KT	2013	2015	52.750.000	0	5.300.000	0	0	0	0	HB
166	2013D070290	Lojman Tesisatlarının Yenilenmesi	KT	2013	2014	1.500.000	0	750.000	0	0	0	0	HB
167	2013D070700	Yıl İçinde Yapılması Zorunlu Olabilecek İşler	KT	2013	2013	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	DE
168	2013D070890	380 kV (10 ad) ve 154 kV (3 ad) Yüksek Gerilim Kesicilerinin Yenilenmesi	KT	2013	2013	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	HB
169	2013D080060	Yıl İçinde Alınması Zorunlu Makine Tesisat	KT	2013	2013	300.000	0	300.000	0	0	0	0	DE
Alpulu Şeker Fabrikası Müdürlüğü						3.836.000	9.000	180.002	0	0	0		
İmalat						3.836.000	9.000	180.002	0	0	0		
170	2008C010040	Hacimsel Debi Ölçüm vb. Komple	ÖK	2012	2013	25.000	9.000	1	0	0	0	0	DE
171	2013C010070	2, 3 ve 4 nolu Melas Tankı Emniyet Duvarı Yapılması	ÖK	2013	2013	180.000	0	180.000	0	0	0	0	HB
172	2013C010080	Atıksu Arıtma Tesisi	ÖK	2007	2013	3.631.000	0	1	0	0	0	0	HB
BOTAŞ Şube Müdürlüğü						1.090.000	739.000	350.001	188.000	182.510	52		
Ulaştırma						1.090.000	739.000	350.001	188.000	182.510	52		
173	2007E050060	K.eli CS-1 Kompresör İstasyonu Yangın Alarm Sistemlerinin Revizyonu	KT	2011	2013	740.000	739.000	1	0	0	0	100	BT
174	2013E050010	Sekiz Evler Banyo WC'lerin Yenilenmesi	KT	2013	2013	25.000	0	25.000	25.000	23.900	96	100	BT
175	2013E050010	İdari Bina Zemininde Çöken Kısımların Tadilatının Yapılması	KT	2013	2013	13.000	0	13.000	13.000	10.660	82	100	BT
176	2013E050010	Pig Kovanı Bağlantı Hattı Yapılması	KT	2013	2013	150.000	0	150.000	150.000	147.950	99	100	BT
177	2013E050010	Ambar ve Mekanik Atölye Dış Cephelerinin Revizyonu	KT	2013	2013	162.000	0	162.000	0	0	0	0	HB
Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü						6.159.194	1.000.000	2.774.194	774.194	774.194	28		
DKH / Sosyal / Sosyal Güvenlik						6.159.194	1.000.000	2.774.194	774.194	774.194	28		
178	2012K130050	B.eski Sosyal Güvenlik Merkezi Binası Yapımı (Proje + İnşaat)	SG	2012	2013	1.774.194	1.000.000	774.194	774.194	774.194	100	100	BT
179	000000000000	K.eli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	SG	2013	2013	4.385.000	0	2.000.000	0	0	0	0	DE
İl Özel İdaresi						42.244.568	679.882	23.663.402	12.459.202	8.587.024	36		
Tarım						4.095.000	0	120.163	70.150	70.131	58		
Tarım / Sulama						3.200.000	0	50.013	0	0	0		
Sulama Göleti Bakım ve Onarımları (14 adet)						3.200.000	0	50.013	0	0	0		
180	000000000000	K.eli Çukurpınar Sulama	Öİ	2013	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
181	000000000000	B.eski Çavuşköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
182	000000000000	B.eski Çengerli Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
183	000000000000	B.eski Ertuğrul Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
184	000000000000	B.eski Karacaoğlan Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
185	000000000000	B.eski Terzili Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
186	000000000000	B.eski Terzili Göletten Sulama	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
187	000000000000	L.burgaz Sakızköy Göletten Sulama	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
188	000000000000	L.burgaz Sakızköy Tirtandere Gölet Dolu Savak Onarım	Öİ	2013	2013	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
189	000000000000	L.burgaz Celaliye Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
190	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
191	000000000000	L.burgaz Karaağaç Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
192	000000000000	P.hisar Yeniceköy Göletten Sulama	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
193	000000000000	P.hisar Ataköy Sulama Kanalı (Çayırılar Bölgesi)	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
Tarım / Hayvancılık						895.000	0	70.150	70.150	70.131	100		
Hayvan İçmesuyu Göletleri (25 adet)						895.000	0	70.150	70.150	70.131	100		
194	000000000000	K.eli Beypınar HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
195	000000000000	K.eli Çukurpınar HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
196	000000000000	K.eli Dokuzhöyük HİS Göleti	Öİ	2013	2013	30.000	0	12.893	12.893	12.893	100	100	BT
197	000000000000	K.eli Erikler HİS Göleti	Öİ	2013	2013	50.000	0	1	1	0	0	0	HB
198	000000000000	K.eli Geçitağzı HİS Göleti	Öİ	2013	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
199	000000000000	K.eli Kadıköy HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
200	000000000000	K.eli Karahamza HİS Göleti	Öİ	2013	2013	40.000	0	6.086	6.086	6.086	100	100	BT
201	000000000000	K.eli Karakoç HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
202	000000000000	D.köy İçneada HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-6)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki gerçek leşme (%)	Ağırlık Malar
203	000000000000	Koçgaz HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	14.254	14.254	14.254	100	100	BT
204	000000000000	Koçgaz Ahmetler HİS Göleti	Öİ	2012	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
205	000000000000	Koçgaz Devletliagaç HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
206	000000000000	Koçgaz Karaabalar HİS Göleti	Öİ	2013	2013	25.000	0	1	1	0	0	0	HB
207	000000000000	Koçgaz Kocayazı HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
208	000000000000	Koçgaz Kula HİS Göleti	Öİ	2012	2013	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
209	000000000000	Koçgaz Malkoçlar HİS Göleti	Öİ	2013	2013	40.000	0	3.564	3.564	3.564	100	100	BT
210	000000000000	Koçgaz Terzidere HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
211	000000000000	Koçgaz Topçular HİS Göleti	Öİ	2010	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
212	000000000000	L.burgaz Celaliye HİS Göleti	Öİ	2013	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
213	000000000000	L.burgaz Müsellim HİS Göleti	Öİ	2010	2013	30.000	0	3.804	3.804	3.804	100	100	BT
214	000000000000	P.hisar Ataköy HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
215	000000000000	Vize Doğanca HİS Göleti	Öİ	2012	2013	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
216	000000000000	Vize Evrencik HİS Göleti	Öİ	2012	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
217	000000000000	Vize Kömürköy HİS Göleti	Öİ	2010	2013	50.000	0	29.530	29.530	29.530	100	100	BT
218	000000000000	Vize Sofular HİS Göleti	Öİ	2013	2013	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
Ulaştırma						12.143.713	0	9.522.127	9.518.342	7.233.854	76		
Köy Yolları Yapımı						12.143.713	0	9.522.127	9.518.342	7.233.854	76		
Stabilize Kaplama (28 km)						2.321.553	0	1.030.002	1.030.000	0	0		
Özel idare (9 km)						1.291.552	0	1	0	0	0		
219	000000000000	Aksicim - T.daş İl Hd. (Saray) Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (9 km)	Öİ	2013	2013	1.291.552	0	1	0	0	0	100	BT
Afet işleri (13 km)						1.030.000	0	1.030.000	1.030.000	0	0		
220	000000000000	Dy. İlt.-Ovacık Köy yolu Stabilize Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	HB
221	000000000000	Sinanlı-Oklağı Köy yolu Stabilize Kaplama (8 km)	GB	2013	2013	630.000	0	630.000	630.000	0	0	0	HB
TPAO (6 km)						1	0	1	0	0	0		
222	000000000000	Düğünbaşı - Alacaoğlu Köy yolu Stabilize kaplama (6 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
1. Kat Asfalt Kaplama (57,6 km)						1.791.558	0	500.007	500.000	500.000	100		
Özel idare (14 km)						1.291.553	0	2	0	0	0		
223	000000000000	Kuştepe - İmampazarı Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (5 km)	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
224	000000000000	Aksicim - T.daş İl Hd. (Saray) Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (9 km)	Öİ	2013	2013	1.291.552	0	1	0	0	0	100	BT
Afet işleri (22 km)						500.000	0	500.000	500.000	500.000	100		
225	000000000000	Dy. İlt. -Çiftlikköy Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (4 km)	GB	2013	2013	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
226	000000000000	Karamusul-Kayabeyli Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (2 km)	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
227	000000000000	Kayabeyli-Tren İstasyonu (Seyitler) Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (3 km)	GB	2013	2013	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
228	000000000000	Dy. İlt. (Eskitaşı)-Celaliye Köy yolu 1. Kat asfalt kaplama (6 km)	GB	2013	2013	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
229	000000000000	Eskibedir - Yenibedir Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
230	000000000000	Eskibedir - Lüleburgaz Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
TPAO (21,6 km)						5	0	5	0	0	0		
231	000000000000	İly. İlt. (Kofçaz) - Ky. İlt. (Erikler) Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (8 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
232	000000000000	Kumrular - Hamitabat Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (5 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
233	000000000000	Düğünbaşı - Alacaoğlu Köy yolu 1. kat asfalt kaplama (6 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
234	000000000000	Ky. İlt. (Cevizköy) - TPAO Atıksu depo yolu 1. Kat asfalt kaplama (1,6 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
235	000000000000	Ky. İlt. - TPAO Sondaj park 1. Kat asfalt kaplama (1 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
2. Kat Asfalt Kaplama (109 km)						2.925.007	0	2.925.007	2.925.002	2.925.000	100		
Afet işleri (73 km)						2.925.002	0	2.925.002	2.925.002	2.925.000	100		
236	000000000000	B.mandır - T.daş İl Hd. (Karakavak) Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	GB	2013	2013	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
237	000000000000	B.mandır - Katranca Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
238	000000000000	Kuleli-Ağayeri Köy yolu 2. Kat asfalt kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
239	000000000000	Ağayeri-Yeşilova Köy yolu 2. Kat asfalt kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
240	000000000000	İly. İlt. (Tozaklı) - Ertuğrul Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	GB	2013	2013	315.000	0	315.000	315.000	315.000	100	100	BT
241	000000000000	Lüleburgaz - Eskibedir Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	1	0	1	1	0	0	100	BT

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-7)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçeğe leşme (%)	Fiziki gerçeğe leşme (%)	Ağırlık Malar
242	000000000000	Eskibedir - Ovacık Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
243	000000000000	Eskibedir - Yenibedir Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	1	0	1	1	0	0	100	BT
244	000000000000	Karamusul - Çiftlikköy Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
245	000000000000	Tren İst. - Dügüncübaşı Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	225.000	0	225.000	225.000	225.000	100	100	BT
246	000000000000	Tren İst. - Alacaoğlu Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
247	000000000000	Ovacık - Kayabeyli Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
248	000000000000	Dy. İlt. - Karamusul Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
249	000000000000	Ertuğrul - Karaağaç Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
250	000000000000	Kuştepe-Hıdırca Köyü 2. Kat asfalt kaplama (5 km)	GB	2013	2013	225.000	0	225.000	225.000	225.000	100	100	BT
251	000000000000	İmampazarı - Kumköy Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	GB	2013	2013	45.000	0	45.000	45.000	45.000	100	100	BT
252	000000000000	Poyralı - İly. İlt. (Tozaklı) Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	GB	2013	2013	225.000	0	225.000	225.000	225.000	100	100	BT
253	000000000000	Akincılar - T.dağ İl Hd. (Kadıköy) Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	GB	2013	2013	135.000	0	135.000	135.000	135.000	100	100	BT
254	000000000000	Müsellim - Hasbuğa Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	GB	2013	2013	180.000	0	180.000	180.000	180.000	100	100	BT
		TPAO (36 km)				5	0	5	0	0	0		
255	000000000000	İnece - Kavaklı Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
256	000000000000	Dy. İlt. - Dügüncülü Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
257	000000000000	Tastepe - Yukarıkanara Köyü 2. Kat asfalt kaplama (10 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
258	000000000000	Dügüncübaşı - T.dağ İl Hd. (Avlıobası) Köyü 2. Kat asfalt kaplama (4 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
259	000000000000	Pazarlı - Çavuşköy - Develi - Vize Köyü 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	DG	2013	2013	1	0	1	0	0	0	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (12.722 m²)				435.941	0	435.941	432.170	52.170	12		
		Afet işleri (10.622 m²)				380.000	0	380.000	380.000	0	0		
260	000000000000	Vize Akincılar Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (3.042 m²)	GB	2013	2013	110.000	0	110.000	110.000	0	0	100	BT
261	000000000000	Vize Çövenli Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (2.833 m²)	GB	2013	2013	110.000	0	110.000	110.000	0	0	100	BT
262	000000000000	Vize Müsellim Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (3.592 m²)	GB	2013	2013	110.000	0	110.000	110.000	0	0	100	BT
263	000000000000	Vize Topçuköy Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.155 m²)	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	0	0	100	BT
		İller Bankası (2.100 m²)				55.941	0	55.941	52.170	52.170	93		
264	000000000000	B.eski Minnetler Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (2.100 m²)	İB	2013	2013	55.941	0	55.941	52.170	52.170	93	100	BT
		Menfez Yapımı (10 adet)				578.484	0	540.000	540.000	0	0		
		Özel İdare (1 adet)				38.484	0	0	0	0	0		
265	000000000000	Vize Okçular Köyiçi Menfez Yapımı	Öİ	2013	2013	38.484	0	0	0	0	0	100	BT
		Afet işleri (9 adet)				540.000	0	540.000	540.000	0	0		
266	000000000000	L.burgaz Ayvalı Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
267	000000000000	L.burgaz Dügüncübaşı Menfez Yapımı (2 adet)	GB	2013	2013	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	HB
268	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
269	000000000000	L.burgaz Ovacık Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	0	HB
270	000000000000	L.burgaz Tatarköy Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
271	000000000000	Vize Akincılar Menfez Yapımı	GB	2013	2013	60.000	0	60.000	60.000	0	0	100	BT
272	000000000000	Vize Müsellim Menfez Yapımı (2 adet)	GB	2013	2013	120.000	0	120.000	120.000	0	0	0	HB
		Diğerleri				4.091.170	0	4.091.170	4.091.170	3.756.684	92		
273	000000000000	Köy Yolları Yapım Projesi	Öİ	2013	2013	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
274	000000000000	Köy Yolları Bakım ve Onarımları	Öİ	2013	2013	1.519.954	0	1.519.954	1.519.954	1.519.954	100		DE
275	000000000000	Akaryakıt Alımları	Öİ	2013	2013	1.596.216	0	1.596.216	1.596.216	1.596.216	100		DE
276	000000000000	Akaryakıt Alımları (Afet işleri)	GB	2013	2013	725.000	0	725.000	725.000	390.514	54		DE
		Turizm				4.040.000	0	2.740.000	1.506.350	6.350	0		
277	000000000000	Keii Vali Faik İlköğretim Okulu Restorasyonu	Öİ	2013	2014	3.000.000	0	1.700.000	1.500.000	0	0		DE
278	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Köyü İlkokulu Restorasyonu	Öİ	2013	2013	40.000	0	40.000	6.350	6.350	16		DE
279	000000000000	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Yolları	Öİ	2013	2013	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	HB
		Eğitim				7.270.000	83.611	7.186.389	142.998	142.998	2		
		Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim				6.000.000	0	6.000.000	8.260	8.260	0		
280	000000000000	L.burgaz Kız Meslek Lisesi (24 derslik)	DG	2013	2013	6.000.000	0	6.000.000	8.260	8.260	0	0	İA

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-8)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	Parasal 2013 yılı harcamaları (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Eğitim / Yüksek Öğretim				100.000	0	100.000	0	0	0		
281	000000000000	Kırklareli Üniversitesi Laboratuvarı Bakım ve Onarımı	DG	2013	2013	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				1.170.000	83.611	1.086.389	134.738	134.738	12		
282	000000000000	K.eli Sporcu Evi Onarımı	GB	2013	2013	200.000	83.611	116.389	113.794	113.794	98	100	BT
283	000000000000	K.eli Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası	GB	2013	2014	950.000	0	950.000	944	944	0	0	İA
284	000000000000	D.köy İğneada Futbol Sahası Soyunma Odası Yapımı	Öİ	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
		DKH / İktisadi / Genel İdare				1.506.361	266.361	1.240.000	255.400	190.749	15		
285	000000000000	K.eli 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	GB	2012	2013	750.000	0	750.000	0	0	0	0	HB
286	000000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2012	2013	566.361	266.361	300.000	65.400	31.760	11	100	BT
287	000000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2013	2013	150.000	0	150.000	150.000	118.989	79		DE
288	000000000000	Taşıt Alımı	Öİ	2012	2013	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
		DKH / Sosyal / Kırsal Alan Planlaması				12.375.508	329.910	2.040.737	963.769	940.749	46		
		İçmesuyu (19 adet)				2.746.282	329.910	1.865.681	818.768	795.749	43		
289	000000000000	K.eli Dolhan İçmesuyu Su Deposu ve ENH	Öİ	2012	2013	33.311	0	25.000	25.000	25.000	100	100	BT
290	000000000000	K.eli Paşayeri İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2013	32.000	0	1	0	0	0	0	HB
291	000000000000	B.eski Karamesutlu İçmesuyu Ayaklı Depo İnşaatı ve Terfi İsale Hattı Bağlantısı	Öİ	2012	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
292	000000000000	B.eski Kumrular İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2013	14.318	0	1	0	0	0	0	HB
293	000000000000	B.eski Terzili İçmesuyu Kuyu Sondajı + Bağlantı + Depo Onarımı	Öİ	2013	2013	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
294	000000000000	D.köy Sivrilere İçmesuyu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
295	000000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2012	2013	40.000	0	40.000	0	0	0		DE
296	000000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Su Deposu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
297	000000000000	L.burgaz Çeşmekolu İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
298	000000000000	L.burgaz Turgutbey İçmesuyu Gömme Depo İnşaatı	Öİ	2012	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
299	000000000000	L.burgaz Turgutbey İçmesuyu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
300	000000000000	Vize Balkaya İçmesuyu Trfi Hattı Boru Yenilemesi	Öİ	2013	2013	16.068	0	1	0	0	0	0	HB
301	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuyu İnşaatları Malzeme Alımı	Öİ	2012	2013	82.129	16.744	65.385	65.385	58.661	90		DE
302	2012K050260	B.eski Cebesoy Kışlası Askeri İçmesuyu Kuyu Sondajı	GB	2012	2013	275.000	63.576	211.424	211.424	200.000	95	100	BT
303	2012K050260	B.eski Özden Kışlası Askeri İçmesuyu İnşaatı	GB	2012	2013	294.590	249.590	45.000	45.000	40.129	89	100	BT
304	2013K050270	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.N.Kemal ERSUN Kışlası)	GB	2013	2013	617.934	0	617.934	102.883	102.883	17		DE
305	2013K050270	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.Muhittin ÖNÜR Kışlası)	GB	2013	2013	376.000	0	376.000	226.698	226.698	60		DE
306	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (DORA Kışlası)	GB	2013	2013	421.656	0	421.656	114.598	114.598	27		DE
307	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.p.Tug.K.lığı (PAMİR, DORA ve YAZICI Kışlası)	GB	2013	2013	63.272	0	63.272	27.780	27.780	44		DE
		Kanalizasyon (60 adet)				9.629.226	0	175.056	145.001	145.000	83		
308	000000000000	K.eli Bayramdere Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	260.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
309	000000000000	K.eli Çeşmeköy Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2013	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
310	000000000000	K.eli Çukurpınar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	190.000	0	1	0	0	0	0	HB
311	000000000000	K.eli Dokuzhöyük Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	260.000	0	1	0	0	0	0	HB
312	000000000000	K.eli Dolhan Kanalizasyonu Arıtması	Öİ	2013	2013	30.000	0	30.000	25.000	25.000	83	100	BT
313	000000000000	K.eli Eriklice Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	140.000	0	1	0	0	0	0	HB
314	000000000000	K.eli Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	190.000	0	1	0	0	0	0	HB
315	000000000000	K.eli Karahamza Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	210.000	0	1	0	0	0	0	HB
316	000000000000	K.eli Kavakdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
317	000000000000	K.eli Kayalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
318	000000000000	B.eski Çiğdemli Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	135.000	0	1	1	0	0	0	HB
319	000000000000	B.eski Eriklyurdu Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
320	000000000000	B.eski Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	160.000	0	1	0	0	0	0	HB
321	000000000000	B.eski Karabayır Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
322	000000000000	B.eski Kumrular Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
323	000000000000	B.eski Nadırlı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
324	000000000000	B.eski Pancarköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	65.000	0	1	0	0	0	0	HB
325	000000000000	B.eski Taşagöl Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	14.218	0	1	0	0	0	0	HB

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-9)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
326	00000000000	B.eski Terzili Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
327	00000000000	D.köy Balaban Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
328	00000000000	D.köy Sivriiler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
329	00000000000	Koçgaz Kocayazı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	170.000	0	1	0	0	0	0	HB
330	00000000000	L.burgaz Akçaköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
331	00000000000	L.burgaz Ayvalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	220.000	0	1	0	0	0	0	HB
332	00000000000	L.burgaz Celaliye Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
333	00000000000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	140.000	0	1	0	0	0	0	HB
334	00000000000	L.burgaz Çeşmekolu Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	230.000	0	1	0	0	0	0	HB
335	00000000000	L.burgaz Çiftlikköy Kanalizasyonu (Artma)	Öİ	2013	2013	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
336	00000000000	L.burgaz Ertuğrul Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	260.000	0	1	0	0	0	0	HB
337	00000000000	L.burgaz Eskitaşı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
338	00000000000	L.burgaz Hamzabey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	225.000	0	1	0	0	0	0	HB
339	00000000000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	130.000	0	1	0	0	0	0	HB
340	00000000000	L.burgaz Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
341	00000000000	L.burgaz Oklağlı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
342	00000000000	L.burgaz Ovacık Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	130.000	0	1	0	0	0	0	HB
343	00000000000	L.burgaz Sarıcaali Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	210.000	0	1	0	0	0	0	HB
344	00000000000	L.burgaz Turgutbey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	280.000	0	1	0	0	0	0	HB
345	00000000000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	280.000	0	1	0	0	0	0	HB
346	00000000000	P.köy Hıdırca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	115.000	0	1	0	0	0	0	HB
347	00000000000	P.köy İmampazarı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	160.000	0	1	0	0	0	0	HB
348	00000000000	P.köy Kumköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
349	00000000000	P.köy Kuştepe Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	290.000	0	1	0	0	0	0	HB
350	00000000000	P.hisar Akören Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
351	00000000000	P.hisar Çayırdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
352	00000000000	P.hisar Erenler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
353	00000000000	P.hisar Hacıfaklı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
354	00000000000	Vize Akıncılar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
355	00000000000	Vize Akıncılar Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
356	00000000000	Vize Aksicim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
357	00000000000	Vize Çövenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
358	00000000000	Vize Çövenli Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
359	00000000000	Vize Doğanca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	350.000	0	1	0	0	0	0	HB
360	00000000000	Vize Düzova Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	230.000	0	1	0	0	0	0	HB
361	00000000000	Vize Evrenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
362	00000000000	Vize Hasbuğa Kanalizasyonu	Öİ	2012	2013	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
363	00000000000	Vize Kömürköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	320.000	0	1	0	0	0	0	HB
364	00000000000	Vize Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
365	00000000000	Vize Müsellim Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
366	00000000000	Vize Soğucak Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
367	00000000000	Vize Topçuköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2013	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
DKH / Sosyal / Belediye Hizmetleri						813.986	0	813.986	2.193	2.193	0		
368	00000000000	K.eli Şeker Depoları Yaşam Merkezi Bowling Salonu	GB	2013	2014	813.986	0	813.986	2.193	2.193	0		DE
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü						877.757	0	877.757	856.828	822.861	94		
Tarım						840.257	0	840.257	819.328	789.504	94		
Bitkisel Üretim						597.825	0	597.825	588.419	573.978	96		
369	2009A020050	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi	GB	2013	2013	9.500	0	9.500	9.500	9.381	99	100	BT
370	2010A020040	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2013	2013	222.000	0	222.000	212.594	202.107	91	100	BT
371	2010A020060	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	39.152	0	39.152	39.152	35.941	92	100	BT
372	2012A020050	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	4.074	0	4.074	4.074	3.969	97	100	BT
373	2012A020060	Tarımsal Yayım Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi	GB	2013	2013	21.200	0	21.200	21.200	20.939	99	100	BT
374	2012A020110	Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	25.000	0	25.000	25.000	24.891	100	100	BT
375	00000000000	İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2013	2013	5.000	0	5.000	5.000	4.878	98	100	BT
376	00000000000	Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi	GB	2013	2013	2.400	0	2.400	2.400	2.399	100	100	BT
377	00000000000	Mera Hizmetleri	GB	2013	2013	269.499	0	269.499	269.499	269.473	100	100	BT

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-10)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Hayvancılık				236.432	0	236.432	224.909	209.638	89		
378	2003A030020	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2013	2013	159.000	0	159.000	147.477	138.366	87	100	BT
379	2010A030010	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	69.432	0	69.432	69.432	63.484	91	100	BT
380	2013A030010	Hayvancılık Kooperatiflerinin Desteklenmesi Projesi	GB	2013	2013	8.000	0	8.000	8.000	7.788	97	100	BT
		Su Ürünleri				6.000	0	6.000	6.000	5.888	98		
381	1985A040220	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2013	2013	3.000	0	3.000	3.000	2.896	97	100	BT
382	2010A040050	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2013	2013	3.000	0	3.000	3.000	2.992	100	100	BT
		İmalat				37.500	0	37.500	37.500	33.357	89		
383	2009C010050	Gıda Güvenliği ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi	GB	2013	2013	37.500	0	37.500	37.500	33.357	89	100	BT
		Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü				690.178	315.528	215.650	215.650	215.650	100		
		Tarım				690.178	315.528	215.650	215.650	215.650	100		
		Araştırma Projeleri				690.178	315.528	215.650	215.650	215.650	100		
		Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri				100.500	100.500	0	0	0	0		
384	000000000000	Farklı Eğim Derecelerindeki Kor. ve Otlatılan Mera Baz. Is. Met. Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkileri	GB	2008	2013	100.500	100.500	0	0	0	0	100	BT
		Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri				430.928	112.928	185.500	185.500	185.500	100		
385	000000000000	Trakya Yöresinde Ayçiçeği Yetiştir. Bor Elementinin Verim Üzerine Etkileri	GB	2012	2014	146.428	112.928	18.500	18.500	18.500	100	67	DE
386	000000000000	Kuru Koş. Ayçiçeğinin Azotlu Güb. Ön. İn. Olarak Kul. Param. Ve Azotun Su Kul. Ran. Üz. Et. Ar.	GB	2013	2015	110.000	0	50.000	50.000	50.000	100	33	DE
387	000000000000	Trakya Yör. Tar. Top. Bit. Bes. Mad. Ve Pot. Toksit El. Kap. Bel., Veri Tab. Ol. ve Har.	GB	2013	2014	174.500	0	117.000	117.000	117.000	100	50	DE
		Tarım Ekonomisi Araştırma Projeleri				57.000	32.550	17.450	17.450	17.450	100		
388	000000000000	Trakya Böl. Buğday, Ayçiçeği, Mısır ve Çeltik Ür. Yap. Tarım İst. Yap. Öz. Ekonomik An. Ve Etkinliklerinin Bel.	GB	2011	2013	36.000	25.550	10.450	10.450	10.450	100	100	BT
389	000000000000	K.eli, Edirne, T.dağ ve Ç.kale Ürt. İyi Tarım Uyg. Yak. Ve Uyg. Ekonomik Analizi	GB	2012	2014	21.000	7.000	7.000	7.000	7.000	100	67	DE
		Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Projeleri				101.750	69.550	12.700	12.700	12.700	100		
390	000000000000	İkinci Ür. Ayçiçeği ve İkinci Ür. Silajlık Mısır Üretiminde Uy. Far. Toprak İş. ve Ek. Yön. Tek. ve Ek. Yön. Arş.	GB	2008	2013	63.550	63.550	0	0	0	0	100	BT
391	000000000000	K.eli Tarım Mekan. Düz. ve Tarım Kavn. İş Kaz. Belirlenmesi	GB	2012	2013	4.250	3.000	1.250	1.250	1.250	100	100	BT
392	000000000000	Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti ve Sonuçları (Kırklareli İli Örneği)	GB	2012	2013	4.250	3.000	1.250	1.250	1.250	100	100	BT
393	000000000000	Min. Top.İşl. Yön. Mera Top. Yap. Nem Dep. ve Ver. Olan Et. Bel.	GB	2013	2016	29.700	0	10.200	10.200	10.200	100	25	DE
		TMO Şube Müdürlüğü				4.320.000	1.531.000	2.746.000	0	0	0		
		Tarım				4.320.000	1.531.000	2.746.000	0	0	0		
394	2011A020090	B.eski Depolama Tesisleri (10.000 ton YD)	KT	2011	2013	3.950.000	1.531.000	2.376.000	0	0	0		DE
395	000000000000	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	KT	2013	2013	370.000	0	370.000	0	0	0	0	HB
		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				1.140.000	87.867	1.007.713	407.713	354.290	35		
		Konut				40.000	0	36.580	36.580	36.580	100		
396	2013G000140	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojmanları Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	40.000	0	36.580	36.580	36.580	100	100	BT
		DKH / İktisadi / Genel İdare				200.000	0	159.000	159.000	159.000	100		
397	2013G000140	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Misafirhanesinin Ofise Dönüştürülmesi	GB	2013	2013	200.000	0	159.000	159.000	159.000	100	100	BT
		DKH / İktisadi / Harita Tapu Kadastro				300.000	87.867	212.133	212.133	158.710	75		
398	2011G000300	Kırklareli Kıyı Alanlarına İlişkin Sayısal Halihazır Harita Alımı	Öİ	2011	2013	300.000	87.867	212.133	212.133	158.710	75	100	BT
		DKH / Sosyal / Çevre				600.000	0	600.000	0	0	0		
399	2013K100050	EMEP (Avrupa'da Hava Kirlenmelerinin Uzun Menzilli Taşınımının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi İşbirliği Programı) Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonlarının Yenilenmesi Projesi (Etüd Proje, Makine teçhizat alımı)	GB	2013	2013	600.000	0	600.000	0	0	0	0	HB
		Valilik				8.190.000	168.065	821.935	21.935	0	0		
		DKH / İktisadi / Genel İdare				8.190.000	168.065	821.935	21.935	0	0		
400	1985K010190	Lüleburgaz Hükümet Konağı İnşaatı	GB	2013	2016	8.000.000	0	800.000	0	0	0	0	HB
401	000000000000	Kırklareli Hükümet Konağı Doğal Gaz Dönüşümü ve Mantolaması	GB	2011	2013	190.000	168.065	21.935	21.935	0	0	100	BT

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-11)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki gerçek leşme (%)	Ağırlık Malar
		Cumhuriyet Başsavcılığı				9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	100		
		DKH / İktisadi / Adalet Hizmetleri				9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	100		
402	1983K150320	K.eli Açık Ceza İnfaz Kurumu (Etüd - Proje - İnşaat)	GB	2010	2014	9.239.000	0	9.239.000	9.239.000	9.239.000	100	100	BT
		İl Emniyet Müdürlüğü				3.112.454	0	3.112.454	872.657	860.786	28		
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				3.112.454	0	3.112.454	872.657	860.786	28		
403	2012K020030	K.eli Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası (Etüd - Proje)	GB	2012	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
404	2012K020030	Koçgaz İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası (Etüd - Proje)	GB	2012	2013	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
405	000000000000	Makine Teçhizat Alımı	GB	2013	2013	50.000	0	50.000	50.000	38.129	76		DE
406	000000000000	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımları	GB	2012	2013	2.962.454	0	2.962.454	822.657	822.657	28		DE
		İl Millî Eğitim Müdürlüğü				53.512.188	3.612.552	27.855.789	17.734.771	15.467.670	56		
		Eğitim				53.512.188	3.612.552	27.855.789	17.734.771	15.467.670	56		
		Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				35.303.216	1.194.589	19.214.780	12.142.461	9.875.360	51		
		Anaokulu İnşaatları (8 drs)				3.367.863	789.963	1.657.987	1.657.987	1.520.136	92		
407	000000000000	B.eski Gazi Kemal Mah. (Ayçiçeği) Anaokulu İnş. (4 drs)	GB	2011	2013	1.480.486	242.246	895.878	895.878	840.146	94	100	BT
408	000000000000	P.hisar Dere Mah. (Yıldız) Anaokulu İnş. (4 drs)	GB	2010	2013	1.887.377	547.717	762.109	762.109	679.990	89	100	BT
		İlkokul İnşaatları (40 drs)				7.000.000	0	925.000	745.000	7.670	1		
409	000000000000	K.eli Kavaklı Atatürk İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2014	1.500.000	0	175.000	175.000	7.670	4		DE
410	000000000000	L.burgaz İstiklal Mah. İlkokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2014	4.000.000	0	500.000	320.000	0	0	0	HB
411	000000000000	Vize Devlet Mah. İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2014	1.500.000	0	250.000	250.000	0	0	0	HB
		Ortaokul İnşaatları (48 drs)				8.894.540	2.950	2.756.318	2.756.318	1.547.548	56		
412	000000000000	K.eli Karacaibrahim Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2014	2.000.000	0	437.500	437.500	7.198	2		DE
413	000000000000	D.köy Fatih Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2012	2013	2.894.540	2.950	2.218.818	2.218.818	1.524.100	69		DE
414	000000000000	L.burgaz Zafer Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2014	4.000.000	0	100.000	100.000	16.250	16	0	İA
		Lise İnşaatları (16 drs)				4.100.002	392.590	3.707.412	2.315.940	2.315.940	62		
415	1994H010080	Pınarhisar Anadolu Lisesi İnşaatı (16 Drs, 5.691 m ²)	GB	2011	2014	4.100.002	392.590	3.707.412	2.315.940	2.315.940	62	85	DE
		Yurt ve Pansiyon İnşaatları				8.000.000	9.086	6.743.812	1.242.965	1.242.965	18		
416	1997H010270	B.eski Öğrenci Pansiyonu İnşaatı (200 öğr.)	GB	2012	2014	4.000.000	4.366	3.371.899	1.179.395	1.179.395	35	30	DE
417	1997H010270	L.burgaz R. Yaman Fen Lisesi Öğrenci Pansiyon İnşaatı (200 öğr.)	GB	2012	2014	4.000.000	4.720	3.371.913	63.570	63.570	2	20	DE
		Diğerleri				3.940.811	0	3.424.251	3.424.251	3.241.101	95		
418	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2010	2013	3.940.811	0	3.424.251	3.424.251	3.241.101	95		DE
		Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim				18.208.972	2.417.963	8.641.009	5.592.310	5.592.310	65		
		Lise İnşaatları (28 drs)				17.410.963	2.417.963	7.843.000	4.794.301	4.794.301	61		
419	1983H020010	K.eli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (12 Drs, 60 yt. uyg. oteli (9.400 m ²))	GB	2010	2014	9.410.963	2.417.963	6.993.000	4.787.457	4.787.457	68	95	DE
420	1991H020610	K.eli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (16 Drs)	GB	2013	2015	8.000.000	0	850.000	6.844	6.844	1	0	İA
		Diğerleri				798.009	0	798.009	798.009	798.009	100		
421	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2010	2013	798.009	0	798.009	798.009	798.009	100		DE
		İl Sağlık Müdürlüğü				147.964.380	8.127.340	15.430.422	10.747.976	9.968.559	65		
		Sağlık				147.964.380	8.127.340	15.430.422	10.747.976	9.968.559	65		
		Devlet Hastanesi İnşaatları				133.987.806	7.647.894	13.608.108	10.108.106	9.678.689	71		
422	1991I000030	Kırklareli Devlet Hastanesi İnşaatı (250 Yt, 40.279 m ²)	GB	2012	2015	45.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	İA
423	1991I000040	Babaeski Devlet Hastanesi İnşaatı (100 Yt, 16.547 m ²)	GB	2005	2015	16.756.000	7.647.894	9.108.106	9.108.106	9.108.106	100	100	BT
424	000000000000	Lüleburgaz Devlet Hastanesi İnşaatı (300 Yt)	GB	2010	2015	58.500.000	0	1	0	0	0	0	İA
425	000000000000	Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Ek Bina İnşaatı	GB	2013	2013	2.031.806	0	1.000.000	1.000.000	570.583	57	10	DE
426	1991I000040	Pınarhisar Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 5.000 m ²)	GB	2011	2015	5.850.000	0	500.000	0	0	0	0	İA
427	000000000000	Vize Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt)	GB	2010	2015	5.850.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatları				3.500.001	0	1.000.001	0	0	0		
428	2005I001400	K.eli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (20 ünit, 3.147 m ²)	GB	2009	2014	3.500.000	0	1.000.000	0	0	0	0	İA
429	2005I001400	L.burgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (50 ünit, m ²)	GB	2014	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğer İnşaatlar				9.250.001	0	350.002	350.000	0	0		
430	000000000000	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İl Sağlık Md, VSD, AÇSAP, 112 ASHİ, 112 KKM)	GB	2013	2014	8.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
431	2006I001500	D.köy Sağlık Birimleri İnşaatı (3-4 hekimlik TSM, ASM, 112 ASH)	GB	2012	2014	600.000	0	200.000	200.000	0	0	0	HB

Kuruluşlara Göre Kırklareli İli 2013 Yılı Yatırımları (Devam-12)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2013 yılı programı (TL)	2013 yılında gönderilen ödenek (TL)	2013 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki gerçek leşme (%)	Ağırlık Malar
432	000000000000	L.burgaz Sağlık Kompleksi İnşaatı (İlçe Sağlık Md, TSM, 112 ASHİ)	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
433	000000000000	B.eski Pancarköy Sağlık Evi İnşaatı	GB	2012	2014	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	HB
		Diğerleri				1.226.572	479.446	472.311	289.870	289.870	61		
434	000000000000	Tıbbi Cihaz Alımı	GB	2012	2013	169.055	94.052	75.003	74.080	74.080	99		DE
435	000000000000	Devlet Hastaneleri Büyük Onarımı	GB	2013	2013	128.764	0	128.764	67.691	67.691	53		DE
436	000000000000	L.burgaz Devlet Hastanesi Büyük Onarımı	GB	2013	2013	33.040	0	33.040	33.040	33.040	100		DE
437	000000000000	Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2012	2013	814.953	385.394	154.744	36.609	36.609	24		DE
438	000000000000	İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2013	2013	80.760	0	80.760	78.450	78.450	97		DE
		Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü				658.208	137.000	521.208	477.207	154.306	30		
		DKH / Sosyal / Sosyal İçerme				658.208	137.000	521.208	477.207	154.306	30		
439	000000000000	K.eli Bakım ve Sosyal Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	HB
440	000000000000	Koçgaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
441	000000000000	K.eli Kadın Konukevi Tefrişatı	GB	2012	2013	100.000	57.000	43.000	43.000	20.099	47	90	BT
442	000000000000	K.eli Kadın Konukevi Kamera Sistemi	GB	2013	2013	32.769	0	32.769	32.769	32.769	100	100	BT
443	000000000000	K.eli Yetiştirme Yurdu Spor Salonu Bakım ve Onarımı	GB	2012	2013	105.020	80.000	25.020	25.020	25.020	100	100	BT
444	000000000000	K.eli Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2013	76.418	0	76.418	76.418	76.418	100	100	BT
445	000000000000	K.eli Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdu Donanım Malzemesi Alımı	GB	2013	2014	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	HB
446	000000000000	Çocuk Evleri Tefrişat ve Giderleri (2 adet)	GB	2013	2013	44.000	0	44.000	0	0	0	0	HB
		Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü				23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	100		
		DKH / Sosyal / Yerleşme Şehirleşme				23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	100		
447	000000000000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2014	23.610.000	4.830.125	15.239.004	15.239.004	15.239.004	100	85	DE
		Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü				15.766.315	0	8.871.001	6.364.050	5.630.254	63		
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				9.666.315	0	6.771.000	4.280.642	3.646.846	54		
448	1990H050050	K.eli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	GB	2012	2014	5.500.000	0	3.000.000	2.000.172	2.000.172	67	40	DE
449	1990H050050	K.eli Sentetik Atletizm Pisti Yapımı	GB	2012	2014	2.200.000	0	2.000.000	935.470	935.470	47	55	DE
450	000000000000	B.eski Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı	DG	2013	2013	400.000	0	400.000	400.000	0	0	100	BT
451	000000000000	L.burgaz Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması	ÖB	2012	2013	1.166.315	0	971.000	545.000	545.000	56	100	BT
452	000000000000	P.hisar Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapılması	DG	2013	2013	400.000	0	400.000	400.000	166.204	42	100	BT
		DKH / Sosyal / Sosyal İçerme				6.100.000	0	2.100.001	2.083.408	1.983.408	94		
453	1990K170050	K.eli Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2012	2014	3.000.000	0	2.000.000	1.983.408	1.983.408	99	66	DE
454	000000000000	B.eski Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	600.000	0	100.000	100.000	0	0	0	İA
455	1990K170050	L.burgaz Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	2.500.000	0	1	0	0	0	0	İA
		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				3.775.001	0	275.004	275.000	208.764	76		
		Turizm				2.000.000	0	1	0	0	0		
456	000000000000	Dupnisa Mağarası Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatması	GB	2010	2013	2.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Eğitim / Kültür				1.775.001	0	275.003	275.000	208.764	76		
457	000000000000	Kırklareli Evi Bakım ve Onarımı Teshir ve Tanzimi	GB	2013	2013	1.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
458	000000000000	Vize Anfi Tiyatro Çevre Düzenlemesi	GB	2013	2013	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
459	000000000000	Kırklareli Höyüğü Kazı Çalışmaları	Öİ	2013	2013	20.000	0	20.000	20.000	8.967	45	100	BT
			GB			95.000	0	95.000	95.000	71.120	75		
460	2013H040250	D.köy Fatih Dökümhanesi Kazı Çalışmaları	GB	2013	2015	160.000	0	160.000	160.000	128.677	80	100	BT
461	000000000000	Vize Kazı Çalışmaları	Öİ	2013	2013	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Defterdarlık				2.612.000	0	488.000	0	0	0		
		DKH / İktisadi / Genel İdare				2.612.000	0	488.000	0	0	0		
462	2000K010650	B.eski Vergi Dairesi İnşaatı Proje Yapımı	GB	2013	2013	112.000	0	88.000	0	0	0		DE
463	2000K010650	B.eski Vergi Dairesi İnşaatı	GB	2012	2016	2.500.000	0	400.000	0	0	0	0	HB

