

**Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu
2015 Yılı 1. Dönem Toplantısı**

**Kirklareli İli
2014 Yılı Yatırımları
Dönem Değerlendirme
Raporu**

Kirklareli, 16 Ocak 2015

**Kirklareli İl Koordinasyon Kurulu
2015 Yılı 1. Dönem Toplantısı
16 Ocak 2015**

**Kirklareli İli
2014 Yılı Yatırımları
Dönem Değerlendirme
Raporu**

Kırlareli İl Koordinasyon Kurulu

2015 Yılı 1. Dönem Toplantısı

Gündem

- 1 Açılış
- 2 Vali Sayın Esengül CİVELEK'İN Açış Konuşması
- 3 Kuruluşların 2014 Yılı Yatırımları Hakkında Bilgi Vermesi ve Bunlarla İlgili Soruları Cevaplamaları
- 4 Dilek ve Temenniler
- 5 Kapanış

Görüşme Sırası

- 1 Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü
- 2 DSİ 11. Bölge Müdürlüğü
- 3 İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü
- 4 İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü
- 5 İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü
 - 6 Kırlareli Orman İşletme Müdürlüğü
 - 7 Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü
 - 8 Vize Orman İşletme Müdürlüğü
 - 9 Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü
- 10 İstanbul Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü
 - 11 Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü
- 12 TCDD 1. Bölge Müdürlüğü
- 13 MTA Marmara Bölge Müdürlüğü
- 14 Kırlareli Üniversitesi Rektörlüğü
- 15 YURT-KUR Yurt Müdürlüğü
- 16 Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü
- 17 Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü
 - 18 Kadastro Müdürlüğü
- 19 TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü
- 20 TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü
- 21 Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü
- 22 Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü
- 23 İl Özel İdaresi
- 24 İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
- 25 Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Md.lüğü
- 26 TMO Şube Müdürlüğü
- 27 Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
- 28 İl Milli Eğitim Müdürlüğü
- 29 İl Sağlık Müdürlüğü
- 30 Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
- 31 Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü
- 32 Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
- 33 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
- 34 Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

İçindekiler

Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme	3
1 Genel Durum	3
2 Sektörlere Göre Değerlendirme	4
3 İlçelere Göre Değerlendirme	5
4 Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme	6
5 Kuruluşlara Göre Değerlendirme	7
6 Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme	8
İkinci Bölüm: Kuruluşlara Göre Yatırım Projelerinin Durumu	11
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	11
DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	12
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	13
İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	14
İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	15
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü	16
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	17
MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	18
Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	19
YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	19
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	20
Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	20
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	21
TEİAŞ 20. İletim Tes. ve İşlt. Grup Md.lüğü	21
Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	22
Sosyal Güvenlik İl Md.lüğü	23
İl Özel İdaresi	23
İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	36
Atatürk Top. Su ve Tar. M. A. İst. Md.lüğü	37
TMO Şube Müdürlüğü	38
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	39
Valilik	39
İl Jandarma Komutanlığı	40
İl Emniyet Müdürlüğü	40
İl Milli Eğitim Müdürlüğü	41
İl Sağlık Müdürlüğü	44
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	45
Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	46
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	46
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	47
Defterdarlık	47
Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	48
Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları	49
0 Genel Durum	49
1 Kırklareli Belediyesi	50
2 İnece Belediyesi	50
3 Kavaklı Belediyesi	50
4 Üsküp Belediyesi	51
5 Babaeski Belediyesi	51
6 Alpullu Belediyesi	51
7 Büyükmandıra Belediyesi	52
8 Karahalil Belediyesi	52
9 Demirköy Belediyesi	52
10 İğneada Belediyesi	53
11 Kofçaz Belediyesi	53
12 Lüleburgaz Belediyesi	53
13 Ahmetbey Belediyesi	54
14 Büyükkarıştıran Belediyesi	54
15 Evrensekiz Belediyesi	55
16 Pehlivan köy Belediyesi	55
17 Pınarhisar Belediyesi	56
18 Kaynarca Belediyesi	56
19 Vize Belediyesi	56
20 Çakıllı Belediyesi	57
21 Kıyıköy Belediyesi	57

**Kirklareli İli
2014 Yılı Yatırımları
Dönem Değerlendirme
Raporu**


Birinci Bölüm: Genel Değerlendirme

Genel Durum


2014 yılında, İlimizde 35 kamu kurum ve kuruluşunca 456 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 2.338.098.871 liradır. 2014 yılı programı 615.990.184 liradır. Bu ödeneğin 313.049.530 lirası gönderilmiş, 284.153.852 lira harcama yapılmıştır. Yılı ödeneğine göre yüzde 46, gönderilen ödenek miktarına göre yüzde 91 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

190 proje (% 42) tamamlanmış olup, 97 proje (% 21) devam etmektedir. 18 proje (% 4) ihale aşamasında olup, 150 projeye (% 33) başlanmamıştır.

2014 Yılı Yatırımları Program, Ödenek ve Harcama Durumu

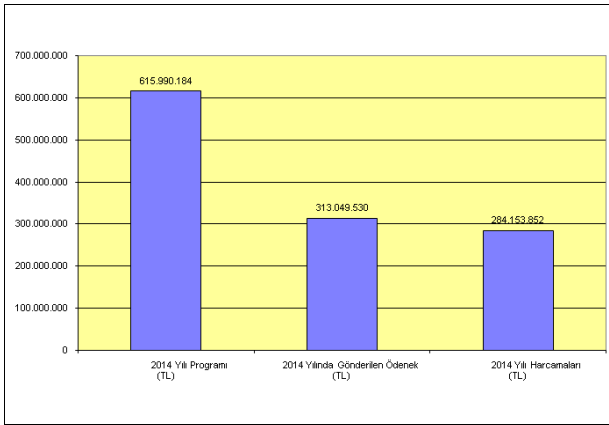

2014 Yılı Yatırımları Fiziki Gerçekleşme Durumu

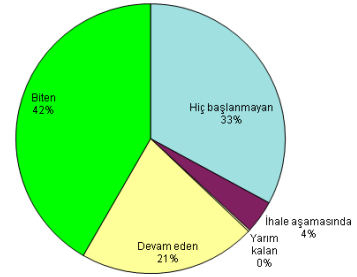

Sektörlere Göre Değerlendirme


Proje tutarına göre; 1.000.620.822 lira ile ulaştırma başta yer almaktadır. Bunu 315.623.914 lira ile madencilik, 270.583.406 lira ile eğitim izlemektedir. 200.000 lira ile en az proje tutarına sahip sektör konuttur.

Yapılan harcama miktarına göre; 78.844.609 lira ile diğer kamu hizmetleri / sosyal başta yer almaktadır. Bunu 65.229.375 lira ile madencilik, 49.883.780 lira ile ulaştırma izlemektedir. Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 86 gerçekleşme ile tarım başta yer almaktadır. Bunu yüzde 85 ile diğer kamu hizmetleri / sosyal ve yüzde 74 ile ulaştırma izlemektedir.


2014 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektörler	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada olan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	456	2.338.098.871	428.977.305	615.990.184	313.049.530	284.153.852	150	18	1	97	190	46
1	Tarım	126	256.666.552	60.692.474	33.698.077	33.690.928	29.146.882	36	0	0	18	72	86
2	Madencilik	9	315.623.914	0	315.623.914	65.229.375	65.229.375	1	0	0	0	8	21
3	İmalat	4	3.698.547	0	67.548	67.537	37.537	1	0	0	1	2	56
4	Enerji	11	76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	0	8	0	2	1	55
5	Ulaştırma	80	1.000.620.822	196.361.097	66.981.264	64.153.946	49.883.780	13	6	0	13	48	74
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	11	7.367.000	6.350	4.060.651	2.860.650	1.388.185	1	0	0	2	8	34
8	Konut	2	200.000	0	200.000	187.320	87.320	0	0	0	1	1	44
9	Eğitim	44	270.583.406	95.673.593	63.638.134	42.571.147	40.679.180	12	0	1	14	17	64
10	Sağlık	18	157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	6	1	0	8	3	52
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	151	249.961.098	56.348.687	104.345.251	86.676.548	82.975.722	80	3	0	38	30	80
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	24	25.708.653	2.216.943	11.242.211	6.409.041	4.131.113	4	1	0	9	10	37
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	127	224.252.445	54.131.744	93.103.040	80.267.507	78.844.609	76	2	0	29	20	85

2014 Yılı Yatırımlarının Sektörlere Göre Gerçekleşme Durumu

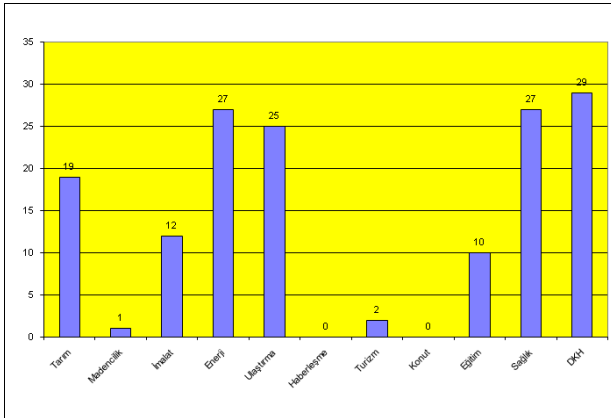

2014 Yılı Yatırım Harcamalarının Sektörlere Göre Dağılımı

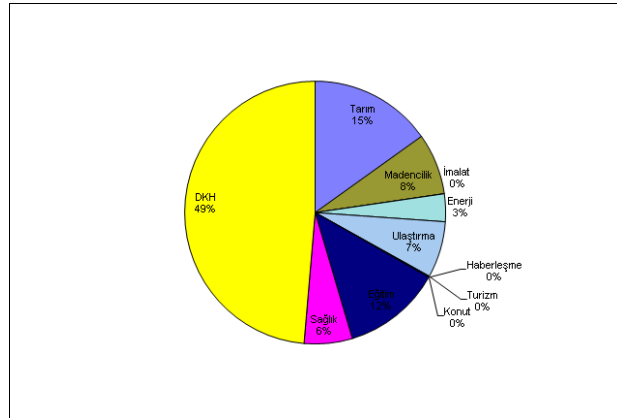

İlçelere Göre Değerlendirme

Proje tutarına göre; 1.215.434.133 lira ile çoklu ilçeler başta yer almaktadır. Bunu 535.333.197 lira ile Merkez ilçe, 192.840.368 lira ile Lüleburgaz ilçesi izlemektedir. En az proje tutarına sahip ilçe 893.910 lira ile Kofçaz ilçesidir.


Yapılan harcama miktarına göre; 127.880.337 lira ile çoklu ilçeler başta yer almaktadır. Bunu 68.125.354 lira ile Merkez ilçe, 52.790.802 lira ile Babaeski izlemektedir.

Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 93 gerçekleşme ile Babaeski ilçesi başta yer almaktadır. Bunu yüzde 79 ile Pehlivan köyü, yüzde 66'lık gerçekleşme oranıyla Kofçaz izlemektedir.


2014 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	İlçe adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler	İhale aşamasında projeler	Yarım kalan projeler	Devam eden projeler	Biten projeler	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		456	2.338.098.871	428.977.305	615.990.184	313.049.530	284.153.852	150	18	1	97	190	46
1	Merkez	105	535.333.197	245.713.769	105.221.402	84.154.263	68.125.354	32	0	1	36	36	65
2	Babaeski	46	180.652.184	71.607.533	56.850.523	53.866.229	52.790.802	22	3	0	10	11	93
3	Demirköy	32	48.926.664	25.212.192	8.655.130	6.642.338	4.377.747	7	1	0	3	21	51
4	Kofçaz	17	893.910	25.488	223.746	163.231	148.129	10	0	0	1	6	66
5	Lüleburgaz	65	192.840.368	8.275.834	32.498.267	20.448.012	17.343.513	32	2	0	12	19	53
6	Pehlivan köyü	7	1.672.053	0	854.197	686.132	674.383	2	0	0	1	4	79
7	Pınarhisar	24	89.955.181	31.921.168	11.653.924	7.884.640	7.322.131	16	2	0	3	3	63
8	Vize	46	72.391.181	2.398.223	12.561.421	5.521.590	5.491.456	22	4	0	3	17	44
9	Çoklu İlçeler	114	1.215.434.133	43.823.098	387.471.573	133.683.094	127.880.337	7	6	0	28	73	33

2014 Yılı Yatırımlarının İlçelere Göre Gerçekleşme Durumu

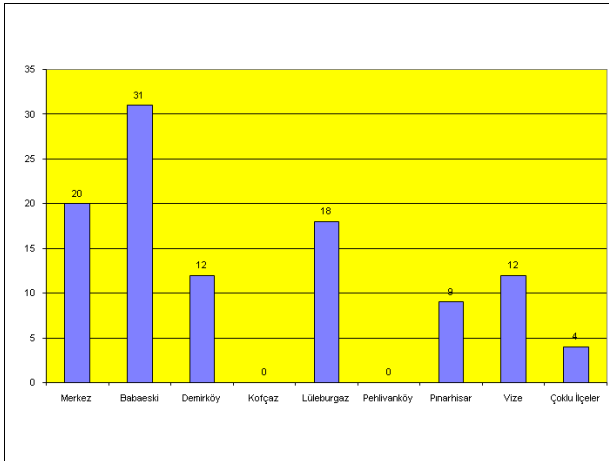

2014 Yılı Yatırım Harcamalarının ilçelere Göre Dağılımı

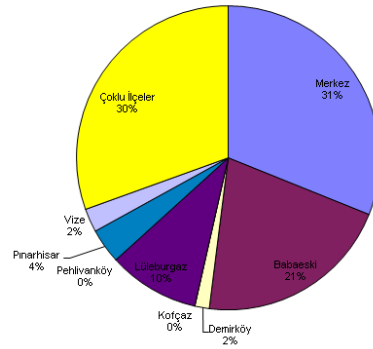

Bütçe Türlerine Göre Değerlendirme

Proje tutarına göre; 1.571.242.692 lira genel bütçe başta yer almaktadır. Bunu 392.205.364 lira ile KİT'ler, 176.662.141 lira ile özel bütçe izlemektedir. En az proje tutarına sahip bütçe türü 3.631.000 lira ile özelleştirme kapsamına alınan KİT'lerdir.


Yapılan harcama miktarına göre; 115.682.904 lira ile Genel bütçe başta yer almaktadır. Bunu 77.131.636 lira ile KİT'ler, 39.751.877 lira ile İller Bankası izlemektedir.

Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 100 ile sosyal güvenlik kurumları başta yer almaktadır. Bunu yüzde 89 ile döner sermaye, yüzde 81 ile İller Bankası izlemektedir.


2014 Yılı Yatırımlarının Bütçe Türlerine Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Bütçe türü	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	456	2.338.098.871	428.977.305	615.990.184	313.049.530	284.153.852	150	18	1	97	190	46
1	Genel bütçe	180	1.571.242.692	309.010.601	154.264.595	137.899.185	115.682.904	51	3	1	62	63	75
2	Özel bütçe	22	176.662.141	79.460.483	34.426.388	25.175.656	24.959.378	7	0	0	4	11	73
3	KİT	37	392.205.364	4.133.343	336.500.387	81.231.981	77.131.636	0	12	0	6	19	23
4	Özelleştirme kapsamına alınan KİT	1	3.631.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
5	İller Bankası	26	102.712.406	12.165.966	49.339.906	39.751.879	39.751.877	3	3	0	11	9	81
6	Döner sermaye	24	3.730.416	0	3.731.407	3.731.407	3.303.811	3	0	0	0	21	89
7	Sosyal güvenlik kurumları	1	6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	1	0	100
8	İl Özel İdaresi	146	34.156.507	605.050	15.840.161	12.105.466	10.376.900	85	0	0	10	51	66
9	Kalkınma Ajansı	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Diğerleri	19	47.058.345	21.201.862	19.587.339	10.853.956	10.647.346	0	0	0	3	16	54

2014 Yılı Yatırımlarının Bütçelere Göre Gerçekleşme Durumu

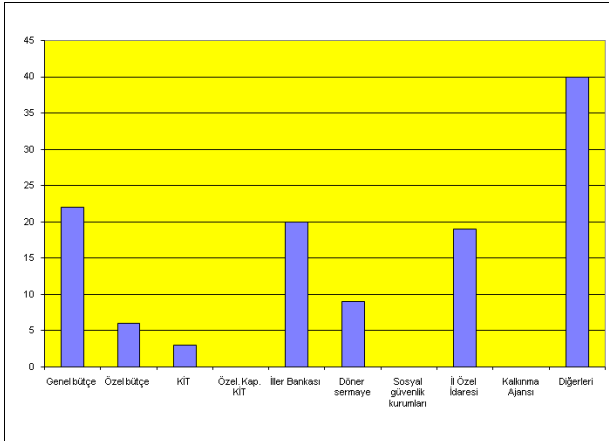

2014 Yılı Yatırım Harcamalarının Bütçelere Göre Dağılımı

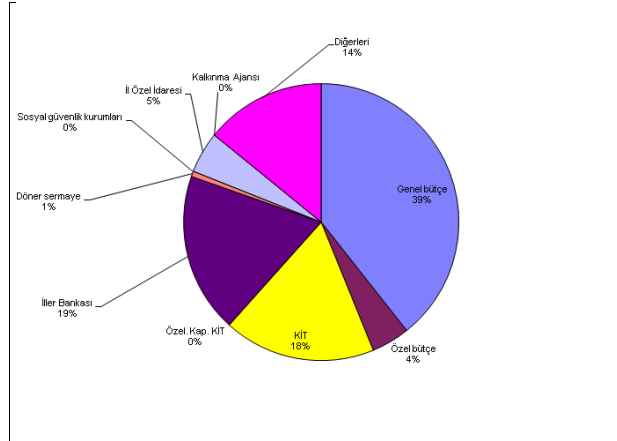

Kuruluşlara Göre Değerlendirme

Proje tutarına göre; 513.156.963 lira ile İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 500.549.910 lira ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, 313.997.000 lira ile TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü izlemektedir.

Yapılan harcama miktarına göre; 64.370.252 lira ile TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü başta yer almaktadır. Bunu 43.345.081 lira DSİ 11.Bölge Müdürlüğü, 41.572.421 lira ile Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü izlemektedir.

Parasal gerçekleşme miktarına göre; yüzde 100 gerçekleşme ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü ve Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü izlemektedir. Bunu yüzde 99 ile Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü izlemektedir.

2014 Yılı Yatırımlarının Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		456	2.338.098.871	428.977.305	615.990.184	313.049.530	284.153.852	150	18	1	97	190	46
1	Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü	25	500.549.910	195.368.240	53.651.137	52.911.128	41.572.421	12	1	0	6	6	77
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	19	264.218.519	51.748.046	45.746.539	45.746.133	43.345.081	3	0	0	13	3	95
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	26	102.712.406	12.165.966	49.339.906	39.751.879	39.751.877	3	3	0	11	9	81
4	İstanbul Ulaştırma, Den. ve Hab. Bölge Müdürlüğü	2	513.156.963	23.685.142	1.250.001	1.250.000	0	1	0	0	0	1	0
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	34	6.775.211	0	6.776.202	6.776.202	6.132.328	5	0	0	0	29	90
5	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	12	3.583.005	0	3.583.005	3.583.005	3.352.363	1	0	0	0	11	94
6	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	11	1.588.383	0	1.589.374	1.589.374	1.377.529	1	0	0	0	10	87
7	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	9	493.389	0	493.389	493.389	463.259	3	0	0	0	6	94
8	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	2	1.110.434	0	1.110.434	1.110.434	939.177	0	0	0	0	2	85
9	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	10	1.521.069	0	1.521.069	1.521.069	1.505.635	0	0	0	0	10	99
10	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	20	7.284.364	602.343	4.498.753	4.455.095	1.801.750	0	5	0	4	11	40
11	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	4	1.626.914	0	1.626.914	859.123	859.123	1	0	0	0	3	53
12	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	6	140.885.028	79.325.958	27.657.276	21.925.795	21.925.795	1	0	0	3	2	79
13	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0
14	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	4	1.732.318	134.525	624.317	205.066	205.066	2	0	0	1	1	33
15	Kırklareli Kadastro Müdürlüğü	2	1.475.896	1.124.473	2	0	0	0	0	0	0	2	0
16	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	313.997.000	0	313.997.000	64.370.252	64.370.252	0	0	0	0	5	21
17	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	11	76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	0	8	0	2	1	55
18	Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	1	3.631.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
19	Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü	1	6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	1	0	100
20	İl Özel İdaresi	171	43.492.473	1.495.303	20.723.220	16.988.518	13.198.553	89	0	0	18	64	64
21	İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	16	914.358	0	914.358	907.616	895.520	2	0	0	0	14	98
22	Atatürk TSTMA İstasyonu Müdürlüğü	15	1.691.584	531.178	757.661	757.657	757.657	0	0	0	7	8	100
23	TMO Şube Müdürlüğü	2	4.424.000	1.531.000	2.785.634	2.785.634	2.548.634	0	0	0	0	2	91
24	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	4	271.771	0	271.771	202.640	202.640	0	0	0	0	4	75
25	Valilik	3	11.318.362	0	3.720.283	2.115.705	2.115.705	0	0	0	2	1	57
26	İl Jandarma Komutanlığı	2	550.000	0	550.000	550.000	227.072	0	0	0	2	0	41
27	İl Emniyet Müdürlüğü	4	3.665.067	694.875	2.970.192	713.301	713.301	2	0	0	2	0	24
28	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	18	76.419.399	13.275.468	26.236.280	14.420.027	13.213.215	6	0	0	6	6	50
29	İl Sağlık Müdürlüğü	18	157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	6	1	0	8	3	52
30	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	14	260.694	0	260.694	260.684	155.036	10	0	0	2	2	59
31	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	0	0	0	1	0	72
32	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	8	24.925.000	4.919.050	5.125.099	5.125.098	3.862.024	0	0	1	6	1	75
33	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	5	3.933.533	0	933.535	933.533	469.000	2	0	0	1	2	50
34	Defterdarlık	2	2.588.500	11.505	576.995	372.260	67.260	1	0	0	1	0	12
35	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	1	2.900.000	0	700.000	0	0	1	0	0	0	0	0

Sektör ve Kuruluşlara Göre Değerlendirme

2014 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Sektör ve Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada olan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	456	2.338.098.871	428.977.305	615.990.184	313.049.530	284.153.852	150	18	1	97	190	46
1	Tarım	126	256.666.552	60.692.474	33.698.077	33.690.928	29.146.882	36	0	0	18	72	86
	Sulama	32	208.204.475	34.945.154	21.238.234	21.237.821	18.836.772	14	0	0	11	7	89
	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	16	204.709.445	34.945.154	20.938.196	20.937.791	18.536.742	3	0	0	11	2	89
	İl Özel İdaresi	16	3.495.030	0	300.038	300.030	300.030	11	0	0	0	5	100
	Bitkisel Üretim	26	6.723.894	2.062.178	4.151.605	4.147.105	3.907.473	2	0	0	7	17	94
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	9	608.310	0	608.310	603.814	601.182	2	0	0	0	7	99
	Atatürk TSKM İstasyonu Müdürlüğü	15	1.691.584	531.178	757.661	757.657	757.657	0	0	0	7	8	100
	TMO Şube Müdürlüğü	2	4.424.000	1.531.000	2.785.634	2.785.634	2.548.634	0	0	0	0	2	91
	Hayvancılık	31	1.262.009	0	272.036	270.206	260.715	15	0	0	0	16	96
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	3	258.501	0	258.501	256.671	247.207	0	0	0	0	3	96
	İl Özel İdaresi	28	1.003.508	0	13.535	13.535	13.508	15	0	0	0	13	100
	Ormancılık	34	6.775.211	0	6.776.202	6.776.202	6.132.328	5	0	0	0	29	90
	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	12	3.583.005	0	3.583.005	3.583.005	3.352.363	1	0	0	0	11	94
	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	11	1.588.383	0	1.589.374	1.589.374	1.377.529	1	0	0	0	10	87
	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	9	493.389	0	493.389	493.389	463.259	3	0	0	0	6	94
	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	2	1.110.434	0	1.110.434	1.110.434	939.177	0	0	0	0	2	85
	Su Ürünleri	3	33.700.963	23.685.142	1.260.000	1.259.594	9.594	0	0	0	0	3	1
	İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	1	33.690.963	23.685.142	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	1	0
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	10.000	0	10.000	9.594	9.594	0	0	0	0	2	96
2	Madencilik	9	315.623.914	0	315.623.914	65.229.375	65.229.375	1	0	0	0	8	21
	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	4	1.626.914	0	1.626.914	859.123	859.123	1	0	0	0	3	53
	TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü	5	313.997.000	0	313.997.000	64.370.252	64.370.252	0	0	0	0	5	21
3	İmalat	4	3.698.547	0	67.548	67.537	37.537	1	0	0	1	2	56
	Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü	1	3.631.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü	2	37.547	0	37.547	37.537	37.537	0	0	0	0	2	100
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	1	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	1	0	0
4	Enerji	11	76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	0	8	0	2	1	55
	TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü	11	76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	0	8	0	2	1	55
5	Ulaştırma	80	1.000.620.822	196.361.097	66.981.264	64.153.946	49.883.780	13	6	0	13	48	74
	Demiryolu Ulaştırması	20	486.720.364	602.343	4.468.754	4.425.095	1.801.750	1	5	0	3	11	40
	İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü	1	479.466.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	19	7.254.364	602.343	4.468.753	4.425.095	1.801.750	0	5	0	3	11	40
	Karayolu Ulaştırması	60	513.900.458	195.758.754	62.512.510	59.728.851	48.082.030	12	1	0	10	37	77
	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	25	500.549.910	195.368.240	53.651.137	52.911.128	41.572.421	12	1	0	6	6	77
	İl Özel İdaresi	35	13.350.548	390.514	8.861.373	6.817.723	6.509.609	0	0	0	4	31	73
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2014 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu (Devam-1)

Sıra No	Sektör ve Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
7	Turizm	11	7.367.000	6.350	4.060.651	2.860.650	1.388.185	1	0	0	2	8	34
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	1	2.000.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	7	1.327.000	0	1.327.000	1.327.000	1.312.042	0	0	0	0	7	99
	İl Özel İdaresi	3	4.040.000	6.350	2.733.650	1.533.650	76.143	0	0	0	2	1	3
8	Konut	2	200.000	0	200.000	187.320	87.320	0	0	0	1	1	44
	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	1	100.000	0	100.000	87.320	87.320	0	0	0	0	1	87
	İl Jandarma Komutanlığı	1	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	1	0	0
9	Eğitim	44	270.583.406	95.673.593	63.638.134	42.571.147	40.679.180	12	0	1	14	17	64
	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim	13	42.380.096	5.786.283	16.086.162	12.610.860	12.348.360	4	0	0	4	5	77
	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	12	42.280.096	5.786.283	15.986.162	12.510.860	12.248.360	4	0	0	4	4	77
	İl Özel İdaresi	1	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	1	100
	Mesleki ve Teknik Eğitim	6	34.139.303	7.489.185	10.250.118	1.909.167	964.855	2	0	0	2	2	9
	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	6	34.139.303	7.489.185	10.250.118	1.909.167	964.855	2	0	0	2	2	9
	Yüksek Öğretim	7	155.805.205	70.096.135	27.907.276	20.881.689	20.881.689	2	0	0	2	3	75
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	4	124.655.205	70.096.135	24.657.276	20.731.689	20.731.689	0	0	0	2	2	84
	YURT-KUR Yurt Müdürlüğü	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0
	İl Özel İdaresi	1	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	1	100
	Kültür	11	9.043.751	134.525	2.935.751	1.516.499	1.051.966	4	0	0	2	5	36
	Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü	4	1.732.318	134.525	624.317	205.066	205.066	2	0	0	1	1	33
	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	4	1.933.533	0	933.534	933.533	469.000	1	0	0	1	2	50
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	1	5.000.000	0	1.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0
	İl Özel İdaresi	2	377.900	0	377.900	377.900	377.900	0	0	0	0	2	100
	Beden Eğitimi ve Spor	7	29.215.051	12.167.465	6.458.827	5.652.932	5.432.310	0	0	1	4	2	84
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	4	15.625.000	2.935.642	2.160.771	2.160.770	2.110.216	0	0	1	2	1	98
	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	1	11.229.823	9.229.823	2.000.000	1.194.106	1.194.106	0	0	0	1	0	60
	İl Özel İdaresi	2	2.360.228	2.000	2.298.056	2.298.056	2.127.988	0	0	0	1	1	93
10	Sağlık	18	157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	6	1	0	8	3	52
	İl Sağlık Müdürlüğü	18	157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	6	1	0	8	3	52
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	151	249.961.098	56.348.687	104.345.251	86.676.548	82.975.722	80	3	0	38	30	80
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	24	25.708.653	2.216.943	11.242.211	6.409.041	4.131.113	4	1	0	9	10	37
	Genel İdare	12	19.720.910	309.626	7.613.205	5.047.441	2.992.441	2	0	0	5	5	39
	Valilik	3	11.318.362	0	3.720.283	2.115.705	2.115.705	0	0	0	2	1	57
	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	3	171.771	0	171.771	115.320	115.320	0	0	0	0	3	67
	Defterdarlık	2	2.588.500	11.505	576.995	372.260	67.260	1	0	0	1	0	12
	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü	1	2.900.000	0	700.000	0	0	1	0	0	0	0	0
	İl Özel İdaresi	3	2.742.277	298.121	2.444.156	2.444.156	694.156	0	0	0	2	1	28
	Güvenlik Hizmetleri	5	4.115.067	694.875	3.420.192	1.163.301	940.373	2	0	0	3	0	27
	İl Jandarma Komutanlığı	1	450.000	0	450.000	450.000	227.072	0	0	0	1	0	50
	İl Emniyet Müdürlüğü	4	3.665.067	694.875	2.970.192	713.301	713.301	2	0	0	2	0	24
	Harita Tapu Kadastro	7	1.872.676	1.212.442	208.814	198.299	198.299	0	1	0	1	5	95
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	5	396.780	87.969	208.812	198.299	198.299	0	1	0	1	3	95
	Kadastro Müdürlüğü	2	1.475.896	1.124.473	2	0	0	0	0	0	0	2	0

2014 Yılı Yatırımlarının Sektör ve Kuruluşlara Göre Gerçekleşme Durumu (Devam-2)

Sıra No	Sektör ve Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada olan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	127	224.252.445	54.131.744	93.103.040	80.267.507	78.844.609	76	2	0	29	20	85
	İçmesuyu	6	11.936.899	484.394	10.975.701	8.947.877	8.947.877	0	0	0	4	2	82
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	6	11.936.899	484.394	10.975.701	8.947.877	8.947.877	0	0	0	4	2	82
	Kanalizasyon	16	144.707.717	27.972.057	60.158.231	53.571.822	53.571.817	3	2	0	7	4	89
	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	3	59.509.074	16.802.892	24.808.343	24.808.342	24.808.339	0	0	0	2	1	100
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	13	85.198.643	11.169.165	35.349.888	28.763.480	28.763.478	3	2	0	5	3	81
	Kırsal Alan Planlaması	77	12.946.156	499.739	826.382	826.319	722.070	63	0	0	7	7	87
	İl Özel İdaresi	77	12.946.156	499.739	826.382	826.319	722.070	63	0	0	7	7	87
	Belediye Hizmetleri	3	7.751.462	723.017	5.078.304	3.631.880	3.631.880	0	0	0	2	1	72
	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	2	5.180.084	424.438	2.805.505	1.842.223	1.842.223	0	0	0	1	1	66
	İl Özel İdaresi	1	2.571.378	298.579	2.272.799	1.789.657	1.789.657	0	0	0	1	0	79
	Yerleşme Şehirleşme	1	30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	0	0	0	1	0	72
	Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	1	30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	0	0	0	1	0	72
	Çevre	3	194.069	0	194.069	194.069	193.593	0	0	0	0	3	100
	Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü	3	194.069	0	194.069	194.069	193.593	0	0	0	0	3	100
	Sosyal Güvenlik	1	6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	1	0	100
	Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü	1	6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	1	0	100
	Afetler	1	252.643	0	252.643	244.804	244.804	0	0	0	0	1	97
	İl Özel İdaresi	1	252.643	0	252.643	244.804	244.804	0	0	0	0	1	97
	Sosyal İçerme	19	9.663.499	1.983.408	3.317.710	3.317.700	1.999.532	10	0	0	7	2	60
	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü	14	260.694	0	260.694	260.684	155.036	10	0	0	2	2	59
	Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü	4	9.300.000	1.983.408	2.964.328	2.964.328	1.751.808	0	0	0	4	0	59
	İl Özel İdaresi	1	102.805	0	92.688	92.688	92.688	0	0	0	1	0	100

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 25 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 500.549.910 liradır. 2014 yılı programı 53.651.137 liradır. 52.911.128 lira ödenek gönderilmiş ve 41.572.421 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 77 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 6 proje bitmiştir. 6 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır. 12 projeye başlanmamıştır.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		25	500.549.910	195.368.240	53.651.137	52.911.128	41.572.421	12	1	0	6	6	77
	Ulaştırma Karayolları	25	500.549.910	195.368.240	53.651.137	52.911.128	41.572.421	12	1	0	6	6	77

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü						500.549.910	195.368.240	53.651.137	52.911.128	41.572.421	77		
Ulaştırma						500.549.910	195.368.240	53.651.137	52.911.128	41.572.421	77		
						390.502.000	145.957.350	6.853.565	6.113.559	6.113.559	89		
1	2013E040770	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu	GB	2013	2017	166.407.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
2	1991E040090	Otoyol Ayrımı-K.eli-Dereköy-Aziye-Bulgaristan Hudut Yolu (1A, BY 63 km.)	GB	1995	2017	117.521.000	112.299.000	298.000	298.000	298.000	100	100	BT
3	1993E040860	Babaeski-Trakya Otoyolu Arası Bölünmüş Yolu (14 km)	GB	2003	2016	25.869.000	10.500.000	200.000	0	0	0	100	BT
4	2011E040690	Yenice - Demirköy Yolu İyileştirmesi (1A, 22 km)	GB	2011	2016	55.650.000	20.546.350	5.815.559	5.815.559	5.815.559	100	89	DE
5	000000000000	Vize - Ahmetbey Yolu İyileştirmesi (22 km)	GB	2013	2014						0		DE
6	000000000000	Ahmetbey - D 100 Ayrımı Yolu İyileştirmesi (50 km)	GB	2013	2014						0		DE
7	1986E040360	Lüleburgaz Çevre Yolu (BY 10 km) Üsküpdere Grubu Köprüleri	GB	2010	2017	14.240.000	9.000	2.000	0	0	0	0	HB
8	2003E040260	Üsküpdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (25 m) Babaeski Grubu Köprüleri	GB	2009	2017	1.200.000	872.000	2.000	0	0	0	0	HB
9	2003E040260	Müsellim Köprüsü (Babaeski - Lüleburgaz yolunda) (25 m) Soğucak Grubu Köprüleri	GB	2009	2017	1.400.000	1.236.000	2.000	0	0	0		DE
10	2003E040260	Soğucak (Suluca) Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (22 m)	GB	2010	2017	600.000	193.000	2.000	0	0	0	0	HB
11	2003E040260	Poyralıdere Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda) (33 m) Kırklareli Grubu Köprüleri	GB	2010	2017	900.000	300.000	2.000	0	0	0	0	HB
12	2003E040260	Ürünli Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (11 m)	GB	2012	2017	300.000	0	10.000	0	0	0	0	HB
13	2003E040260	Sakşagandere Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (2x30 m)	GB	2012	2017	1.550.000	0	1	0	0	0	0	HB
14	2003E040260	İnce Köprüsü (Kırklareli - Edirne yolunda) (108 m)	GB	2012	2017	2.800.000	0	1	0	0	0	0	HB
15	2003E040260	Kurtdere (Çayırder) Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (32 m)	GB	2012	2017	830.000	0	1	0	0	0	0	HB
16	2003E040260	Manastırdere Köprüsü (Kırklareli - Pınarhisar yolunda) (20 m) Diğer Köprüler	GB	2014	2016	520.000	0	1	0	0	0	0	HB
17	2000E040020	Alpullu (Sinanlı) Köprüsü (125 m) Köprü Onarımları	GB	2014	2017	200.000	2.000	20.000	0	0	0	0	İA
18	2001E040110	Asker Köprüsü (İğneada - Poyralı yolunda)	GB	2012	2014	215.000	0	1	0	0	0	0	HB
19	2001E040110	Poyralı Köprüsü (Pınarhisar - Vize yolunda)	GB	2012	2014	300.000	0	1	0	0	0	0	HB

Bütçe türü: GB (Genel bütçe), ÖB (Özel bütçe), KT (KİT), ÖK (Özelleştirme İdaresi kapsamına alınanlar), İB (İller Bankası), DS (Döner sermaye), SG (Sosyal güvenlik kurumları), Öİ (İl Özel İdaresi), BL (Belediyeler), KA (Kalkınma Ajansı).

Açıklamalar: BT (Bitti), DE (Devam ediyor), YK (Yarım kaldı), İA (İhale aşamasında), HB (Hiç başlamadı).

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
						110.047.910	49.410.890	46.797.572	46.797.569	35.458.862	76		
		Bölünmüş Yollar (50,5 km)				99.018.368	49.410.890	35.768.030	35.768.028	24.429.321	68		
20	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz İlçe Hd.-Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu (17,5 km)	GB	2009	2014	22.200.000	22.198.287	1	0	0	0	100	BT
21	000000000000	D 100 Devlet Yolu L.burgaz - Babaeski - Edirne İl Hd. Bölünmüş Yolu Üstü yapı İşleri (28,5 km)	GB	2013	2014	25.000.000	11.190.599	13.764.343	13.764.343	13.764.343	100		DE
22	000000000000	Kırklareli - Kofçaz Bölünmüş Yolu (7 km)	GB	2011	2014	16.867.385	13.032.004	1	0	0	0	100	BT
23	000000000000	020-02 Devlet Yolu Kırklareli - Edirne Bölünmüş Yolu (26 / 47 km)	GB	2013	2016	34.950.983	2.990.000	22.003.685	22.003.685	10.664.978	48	13	DE
		Diğerleri				11.029.542	0	11.029.542	11.029.541	11.029.541	100		
24	000000000000	Otoyollar ve Otoyolu Bağlantı Yolları Üzerindeki Köprü, Viyadük ve Tünellerin Depreme Karşı Güçlendirilmesi	GB	2014	2017	1	0	1	0	0	0	100	BT
25	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2014	2014	11.029.541	0	11.029.541	11.029.541	11.029.541	100	100	BT

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 19 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 264.218.519 liradır. 2014 yılı programı 45.746.539 liradır. 45.746.133 lira gönderilmiş ve 43.345.081 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 95 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 3 proje bitmiştir. 13 proje devam etmektedir. 3 projeye hiç başlanmamıştır.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	Hiç başlanmayan projeler (TL)	İhale aşamasında kalan projeler (TL)	Yarım kalan projeler (TL)	Devam eden projeler (TL)	Biten projeler (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	19	264.218.519	51.748.046	45.746.539	45.746.133	43.345.081	3	0	0	13	95
1	Tarım / Sulama	16	204.709.445	34.945.154	20.938.196	20.937.791	18.536.742	3	0	0	11	89
2	DKH Sosyal / Kanalizasyon	3	59.509.074	16.802.892	24.808.343	24.808.342	24.808.339	0	0	0	2	100

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				264.218.519	51.748.046	45.746.539	45.746.133	43.345.081	95		
		Tarım				204.709.445	34.945.154	20.938.196	20.937.791	18.536.742	89		
		Kırklareli Projesi				27.775.370	0	3.368.000	3.368.000	3.367.991	100		
26	1984A010180	K.eli Kızılıçıkdere Sulaması (14.220 dekar)	GB	2013	2014	27.079.164	0	2.937.650	2.937.650	2.937.650	100	20	DE
27	1984A010180	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı	GB	2013	2014	696.206	0	430.350	430.350	430.341	100	54	DE
		Poyralı Projesi				56.005.177	28.079.446	4.726.002	4.726.000	4.725.993	100		
28	2010A010140	Çayırdere Barajı	GB	2010	2015	31.709.981	17.010.250	1	0	0	0	57	DE
29	2010A010140	Çayırdere Barajı Sulaması (25.830 dekar)	GB	2012	2015	15.795.196	11.069.196	4.726.000	4.726.000	4.725.993	100	100	BT
30	2010A010140	Çayırdere Barajı Sulaması 2. Kısım İnşaatı	GB	2014	2014	8.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Alçak Baraj (Göletler)				1	0	1	0	0	0		
31	000000000000	P.hisar Kurudere Göleti ve Sulaması (3.420 dekar)	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Taşkın Koruma				52.792.296	275.307	3.635.281	3.634.879	3.634.872	100		
32	1977A010320	K.eli İnce (Yeniabağlık Deresi) Taşkın Koruması	GB	2012	2015	1.940.680	0	235.000	235.000	235.000	100	10	DE
33	1977A010320	L.burgaz Umurca (Kavak Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2014	2.831.000	275.307	574.879	574.879	574.873	100	32	DE
34	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2014	7.582.918	0	1	0	0	0	1	DE

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
35	1977A010320	K.eli 1. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2015	16.744.060	0	1.075.400	1.075.000	1.075.000	100	1	DE
36	1977A010320	K.eli 2. Grup Taşkın Koruması	GB	2013	2015	8.693.638	0	1.750.000	1.750.000	1.749.999	100		DE
37	1977A010320	K.eli 3. Grup Taşkın Koruması	GB	2014	2015	15.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları						26.396.568	2.999.995	4.579.189	4.579.189	4.578.541	100		
38	2000A010060	Doğal Afetler ve Taşkın Hasarları	GB	2012	2014	26.396.568	2.999.995	4.579.189	4.579.189	4.578.541	100	22	DE
Diğerleri						41.740.033	3.590.406	4.629.723	4.629.723	2.229.345	48		
39	00000000000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	1984	2016	16.985.375	1.472.537	2.500.000	2.500.000	100.317	4	10	DE
40	1985A010020	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2002	2014	24.143.363	2.117.869	1.591.554	1.591.554	1.591.046	100	16	DE
41	1987A010510	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2014	2014	611.295	0	538.169	538.169	537.982	100	88	BT
DKH / Sosyal / Kanalizasyon						59.509.074	16.802.892	24.808.343	24.808.342	24.808.339	100		
Ergene Havzası Arıtma Sistemi Projesi						59.509.074	16.802.892	24.808.343	24.808.342	24.808.339	100		
42	2012K050150	K.eli ve Vize Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2014	18.989.074	14.947.135	4.041.939	4.041.939	4.041.937	100	100	BT
43	2012K050150	Babaeski, Pınarhisar ve Malkara Atıksu Arıtma Tesisi	GB	2013	2014	25.520.000	1.855.757	20.766.403	20.766.403	20.766.402	100	40	DE
44	2012K050150	Çorlu Atıksu Kollektör Hattı Ana Toplayıcısı	GB	2013	2014	15.000.000	0	1	0	0	0	22	DE

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 26 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 102.712.406 liradır. 2014 yılı programı 49.339.906 liradır. 39.751.879 lira ödenek gönderilmiş ve tamamı harcanmıştır. Yüzde 81 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 9 proje bitmiştir. 11 proje devam etmektedir. 3 proje ihale aşamasındadır.

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler	İhale aşamasında kalan projeler	Yarım kalan projeler	Devam eden projeler	Biten projeler	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		26	102.712.406	12.165.966	49.339.906	39.751.879	39.751.877	3	3	0	11	9	81
1	DKH İktisadi / Harita, Tapu ve Kadastro	5	396.780	87.969	208.812	198.299	198.299	0	1	0	1	3	95
2	DKH Sosyal / İçmesuyu	6	11.936.899	484.394	10.975.701	8.947.877	8.947.877	0	0	0	4	2	82
3	DKH Sosyal / Kanalizasyon	13	85.198.643	11.169.165	35.349.888	28.763.480	28.763.478	3	2	0	5	3	81
4	DKH Sosyal / Belediye Hizmetleri	2	5.180.084	424.438	2.805.505	1.842.223	1.842.223	0	0	0	1	1	66

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklama
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						102.712.406	12.165.966	49.339.906	39.751.879	39.751.877	81		
DKH / İktisadi / Harita Tapu Kadastro						396.780	87.969	208.812	198.299	198.299	95		
45	00000000000	K.eli Kavaklı Harita Yapımı	İB	2013	2014	134.520	0	134.520	134.520	134.520	100	100	BT
46	00000000000	Koçgaz Harita Yapımı	İB	2013	2014	36.000	25.488	10.512	0	0	0	60	DE
47	00000000000	L.burgaz Ahmetbey Harita Yapımı	İB	2013	2014	73.160	43.896	29.264	29.264	29.264	100	100	BT
48	00000000000	Pınarhisar Harita Yapımı	İB	2012	2014	100.000	0	1	0	0	0	0	İA
49	00000000000	Vize Çakıllı Harita Yapımı	İB	2013	2014	53.100	18.585	34.515	34.515	34.515	100	100	BT
DKH / Sosyal / İçmesuyu						11.936.899	484.394	10.975.701	8.947.877	8.947.877	82		
50	00000000000	K.eli İnce İçmesuyu	İB	2014	2015	900.000	0	529.767	529.767	529.767	100		DE
51	00000000000	K.eli Üsküp İçmesuyu	İB	2013	2014	3.407.841	0	3.407.841	1.623.203	1.623.203	48		DE
52	00000000000	B.eski İçmesuyu Şebeke İnşaatı	İB	2014	2015	5.733.772	0	6.248.606	6.248.606	6.248.606	100		DE
53	00000000000	L.burgaz Sakızköy İçmesuyu (SUKAP)	İB	2012	2014	1.624.458	484.394	518.659	275.473	275.473	53		DE

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
54	000000000000	P.köy İçmesuyu İnşaatı	İB	2014	2014	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
55	000000000000	P.köy İçme ve Kullanma Suyu Kuyu Sondajı	İB	2014	2014	70.828	0	70.828	70.828	70.828	100	100	BT
DKH / Sosyal / Kanalizasyon						85.198.643	11.169.165	35.349.888	28.763.480	28.763.478	81		
56	000000000000	K.eli İnece Atıksu Arıtma İnşaatı	İB	2013	2014	4.163.431	1.344.425	2.819.006	2.481.305	2.481.305	88		DE
57	000000000000	K.eli Kavaklı Kanalizasyonu	İB	2012	2014	7.962.400	0	1	0	0	0	0	HB
58	000000000000	B.eski Kanalizasyonu	İB	2013	2014	21.000.000	3.489.638	17.009.782	17.009.782	17.009.782	100		DE
59	000000000000	B.eski Alpullu Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2014	1	0	1	1	0	0	0	İA
60	000000000000	B.eski Büyükmandıra Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2013	2014	4.379.000	879.000	3.500.000	2.344.458	2.344.458	67		DE
61	000000000000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyonu	İB	2012	2014	9.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
62	000000000000	L.burgaz Büyükkarıştıran Kanalizasyonu ve Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2012	2014	4.415.857	879.967	3.535.890	2.344.459	2.344.459	66		DE
63	000000000000	L.burgaz Evrensekiz Kanalizasyonu (SUKAP)	İB	2012	2014	6.000.000	2.008.523	1.245.051	1.245.051	1.245.051	100	100	BT
64	000000000000	P.köy Kanalizasyon İnşaatı	İB	2014	2014	383.399	0	383.399	215.336	215.336	56	100	BT
65	000000000000	P.hisar Kanalizasyonu	İB	2012	2014	12.500.000	833.192	4.321.936	1.641.349	1.641.349	38	100	BT
66	000000000000	P.hisar Kaynarca Atıksu Arıtma İnşaatı	İB	2013	2014	1	0	1	1	0	0	0	İA
67	000000000000	Vize Kanalizasyonu	İB	2012	2014	10.000.000	1.734.420	2.534.819	1.481.738	1.481.738	58		DE
68	000000000000	Vize Kiyıköy Kanalizasyonu (SUKAP)	İB	2012	2014	4.994.554	0	1	0	0	0	0	HB
DKH / Sosyal / Belediye Hizmetleri						5.180.084	424.438	2.805.505	1.842.223	1.842.223	66		
69	000000000000	Vize Kapalı Yüzme Havuzu Otel ve Sosyal Tesis İnşaatı	İB	2013	2015	4.539.856	0	2.589.715	1.626.433	1.626.433	63		DE
70	000000000000	Vize Kiyıköy Çok Amaçlı Salon İnşaatı	İB	2011	2014	640.228	424.438	215.790	215.790	215.790	100	100	BT

İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü

İstanbul Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 513.156.963 liradır. 2014 yılı programı ve gönderilen ödenek 1.250.000 liradır. 2014 yılında harcama yapılmamıştır.

İstanbul UDH Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal leşme (%)
Toplam		2	513.156.963	23.685.142	1.250.001	1.250.000	0	1	0	0	0	1	0
1	Tarım / Su ürünleri	1	33.690.963	23.685.142	1.250.000	1.250.000	0	0	0	0	0	1	0
2	Ulaştırma / Demiryolu	1	479.466.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
İstanbul Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bölge Müdürlüğü Tarım						513.156.963	23.685.142	1.250.001	1.250.000	0	0		
						33.690.963	23.685.142	1.250.000	1.250.000	0	0		
71	1995A040170	D.köy Beğendik Balıkçı Barınağı İnşaatı	GB	1995	2014	33.690.963	23.685.142	1.250.000	1.250.000	0	0	100	BT
Ulaştırma						479.466.000	0	1	0	0	0		
72	2007E010140	Halkalı Kapıkule Yeni Demiryolu İnşaatı (60/230 km)	GB	2007	2016	479.466.000	0	1	0	0	0	0	HB

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 34 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 6.775.211 liradır. 2014 yılı programı 6.776.202 liradır. Bu ödeneğin tamamı gönderilmiş ve 6.132.328 lirası harcanmıştır. Yüzde 90 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 29 proje bitmiştir. 5 projeye başlanmamıştır.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	34	6.775.211	0	6.776.202	6.776.202	6.132.328	5	0	0	0	29	90
1	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	12	3.583.005	0	3.583.005	3.583.005	3.352.363	1	0	0	0	11	94
2	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	11	1.588.383	0	1.589.374	1.589.374	1.377.529	1	0	0	0	10	87
3	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	9	493.389	0	493.389	493.389	463.259	3	0	0	0	6	94
4	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	2	1.110.434	0	1.110.434	1.110.434	939.177	0	0	0	0	2	85

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü				6.775.211	0	6.776.202	6.776.202	6.132.328	90		
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				3.583.005	0	3.583.005	3.583.005	3.352.363	94		
		Tarım				3.583.005	0	3.583.005	3.583.005	3.352.363	94		
		Orman Kadastro				87.175	0	87.175	87.175	73.200	84		
73	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2014	2014	87.175	0	87.175	87.175	73.200	84	84	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				2.177.876	0	2.177.876	2.177.876	2.063.841	95		
74	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2014	2014	2.177.876	0	2.177.876	2.177.876	2.063.841	95	95	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				585.300	0	585.300	585.300	533.032	91		
75	2013A050170	Planlama	DS	2014	2014	26.000	0	26.000	26.000	25.900	100	100	BT
76	2013A050170	Aplikasyon	DS	2014	2014	6.200	0	6.200	6.200	2.873	46	46	BT
77	2013A050170	Yeni Yol	DS	2014	2014	99.800	0	99.800	99.800	99.749	100	100	BT
78	2013A050170	B.Onarım	DS	2014	2014	64.000	0	64.000	64.000	62.984	98	98	BT
79	2013A050170	Üst Yapı	DS	2014	2014	126.000	0	126.000	126.000	125.527	100	100	BT
80	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2014	2014	165.000	0	165.000	165.000	156.213	95	95	BT
81	2013A050170	Orman Koruma, Tesisler ve Makine Teçhizat	DS	2014	2014	98.300	0	98.300	98.300	59.786	61	61	BT
		Diğerleri				732.654	0	732.654	732.654	682.290	93		
82	2013A050110	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	ÖB	2014	2014	190.000	0	190.000	190.000	184.636	97	97	BT
83	2013A050110	Orman Amenejman Projesi (Arazi)	DS	2014	2014	497.654	0	497.654	497.654	497.654	100	100	BT
84	2013A050140	ORKÖY	ÖB	2014	2014	45.000	0	45.000	45.000	0	0	0	HB
		Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü				1.588.383	0	1.589.374	1.589.374	1.377.529	87		
		Tarım				1.588.383	0	1.589.374	1.589.374	1.377.529	87		
		Orman Kadastro				66.990	0	66.990	66.990	56.270	84		
85	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2014	2014	66.990	0	66.990	66.990	56.270	84	84	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				335.865	0	335.865	335.865	335.865	100		
86	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2014	2014	335.865	0	335.865	335.865	335.865	100	100	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				990.528	0	991.519	991.519	804.111	81		
87	2013A050170	Aplikasyon	DS	2014	2014	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0	HB
88	2013A050170	Yeni Yol	DS	2014	2014	89.000	0	89.000	89.000	88.858	100	100	BT
89	2013A050170	B.Onarım	DS	2014	2014	83.000	0	83.991	83.991	83.991	100	100	BT
90	2013A050170	Üst Yapı	DS	2014	2014	341.589	0	341.589	341.589	341.589	100	100	BT
91	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2014	2014	435.939	0	435.939	435.939	251.723	58	58	BT
92	2013A050170	Planlama, Tesisler ve Makine Teçhizat Alımı	DS	2014	2014	39.000	0	39.000	39.000	37.950	97	97	BT

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Diğerleri				195.000	0	195.000	195.000	181.283	93		
93	2011A050180	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	DS	2014	2014	80.000	0	80.000	80.000	77.223	97	97	BT
94	2013A050140	Orman Amenejman Projesi (Büro)	DS	2014	2014	40.000	0	40.000	40.000	32.554	81	81	BT
95	2013A050140	Muhtelif İşler	ÖB	2014	2014	75.000	0	75.000	75.000	71.506	95	95	BT
		Vize Orman İşletme Müdürlüğü				493.389	0	493.389	493.389	463.259	94		
		Tarım				493.389	0	493.389	493.389	463.259	94		
		Orman Kadastro				20.210	0	20.210	20.210	16.730	83		
96	2013A050100	Orman Kadastro	ÖB	2014	2014	20.210	0	20.210	20.210	16.730	83	83	BT
		Ağaçlandırma ve Toprak Koruma Projesi				26.469	0	26.469	26.469	26.469	100		
97	2013A050120	Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi	ÖB	2014	2014	26.469	0	26.469	26.469	26.469	100	100	BT
		Orman Koruma ve İşletmecilik Projesi				426.500	0	426.500	426.500	420.060	98		
98	2013A050170	Aplikasyon	DS	2014	2014	800	0	800	800	0	0	0	HB
99	2013A050170	Yeni Yol	DS	2014	2014	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
100	2013A050170	B.Onarım	DS	2014	2014	48.000	0	48.000	48.000	47.361	99	99	BT
101	2013A050170	Üst Yapı	DS	2014	2014	180.000	0	180.000	180.000	178.200	99	99	BT
102	2013A050170	Sanat Yapısı	DS	2014	2014	185.000	0	185.000	185.000	184.499	100	100	BT
103	2013A050170	Orman Koruma	DS	2014	2014	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0	HB
		Diğerleri				20.210	0	20.210	20.210	0	0		
104	2013A050120	Orman Koruma ve Yangınla Mücadele Projesi	ÖB	2014	2014	20.210	0	20.210	20.210	0	0	0	HB
		Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü				1.110.434	0	1.110.434	1.110.434	939.177	85		
		Tarım				1.110.434	0	1.110.434	1.110.434	939.177	85		
105	2014A050120	Fidan Üretimi	DS	2014	2014	1.017.500	0	1.017.500	1.017.500	846.243	83	83	BT
106	2014A050120	Makine Teçhizat ve Ekipman Alımları	DS	2014	2014	92.934	0	92.934	92.934	92.934	100	100	BT

Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü'nün 2014 yılında 10 proje uygulaması gerçekleştirilmiştir. Bu projelerin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 1.521.069 liradır. Bu ödeneğin tamamı gönderilmiş ve 1.505.635 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 99 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

İstanbul Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	10	1.521.069	0	1.521.069	1.521.069	1.505.635	0	0	0	0	10	99
1	Turizm	7	1.327.000	0	1.327.000	1.327.000	1.312.042	0	0	0	0	7	99
2	DKH Sosyal / Çevre	3	194.069	0	194.069	194.069	193.593	0	0	0	0	3	100

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü				1.521.069	0	1.521.069	1.521.069	1.505.635	99		
		Turizm				1.327.000	0	1.327.000	1.327.000	1.312.042	99		
107	2001F000080	İğneada Longoz Ormanları Milli Park Projesi (etüd, proje, uygulama)	GB	2014	2014	52.000	0	52.000	52.000	37.042	71	100	BT
108	2001F000080	İğneada Longoz Ormanları Milli Park Projesi (alan düzenlemesi, piknik ünitesi)	GB	2014	2014	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
109	2001F000080	İğneada Longoz Ormanları Milli Park Projesi (yardımcı bina ve tesisler, kamelya yapımı)	GB	2014	2014	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT

Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
110	2001F000080	İğneada Longoz Ormanları Milli Park Projesi (çevre düzenlemesi ve altyapı)	GB	2014	2014	750.000	0	750.000	750.000	750.000	100	100	BT
111	000000000000	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkının İzlenmesi ve Tanıtımı Projesi (etüd, proje)	GB	2014	2015	115.000	0	115.000	115.000	115.000	100	100	BT
112	000000000000	Yıldız Dağlarının Keşfedilmesi Projesi (etüd, proje)	GB	2014	2015	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
113	000000000000	Tabiat Parkı Projesi (plan proje yapımı)	GB	2014	2015	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	BT
DKH / Sosyal / Çevre						194.069	0	194.069	194.069	193.593	100		
114	000000000000	Biyoçekekçilik ile Mücadele Projesi	GB	2014	2014	5.000	0	5.000	5.000	4.524	90	100	BT
115	000000000000	Biyoçekekçilik ile Mücadele Projesi	GB	2014	2014	48.000	0	48.000	48.000	48.000	100	100	BT
116	2001F000080	Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi	GB	2013	2014	141.069	0	141.069	141.069	141.069	100	100	BT

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 20 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 7.284.364 lira, 2014 yılı programı 4.498.753 liradır. Bu ödeneğin 4.455.095 lirası gönderilmiş 1.801.750 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 40 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 11 proje tamamlanmış 4 Proje devam etmekte ve 5 proje ihale aşamasındadır.

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		20	7.284.364	602.343	4.498.753	4.455.095	1.801.750	0	5	0	4	11	40
1	İmalat	1	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	1	0	0
2	Ulaştırma / Demiryolu	19	7.254.364	602.343	4.468.753	4.425.095	1.801.750	0	5	0	3	11	40

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
TCDD 1. Bölge Müdürlüğü						7.284.364	602.343	4.498.753	4.455.095	1.801.750	40		
İmalat						30.000	0	30.000	30.000	0	0		
117	2014C280050	Alpullu Depo Şefliği Paratoner sisteminin, yangın algılama ve ihbar sistemlerinin kurulması ve elektrik tesisatının fenni hale getirilmesi işi	KT	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	0	0	10	DE
Ulaştırma / Demiryolu						7.254.364	602.343	4.468.753	4.425.095	1.801.750	40		
118	2014E010010	1.Bölge Müdürlüğü mntıkasında 60 adet 60 E1'lik Makas ferş edilmesi (İstanbul - Demirköprü)	KT	2012	2014	544.000	311.256	232.744	232.744	167.828	72	100	BT
119	2014E010010	İstanbul - Demirköprü hattı Muratlı - Alpullu arası Km:181+200 -228+100 arasında 6000 m. panel tipi ihata yapılması	KT	2013	2014	525.000	177.625	347.375	347.375	257.450	74	100	BT
120	2014E010010	İstanbul - Demirköprü Hattı Km.132+200-281+100 ve Pehlivan köyü - Kapıkule Hattı Km. 0+500-67+500 arası alt yapı işlerinin projelendirilmesi	KT	2013	2014	82.034	0	82.034	82.034	82.031	100	100	BT
121	2014E010060	1. Bölge Müdürlüğü Mntıkasında 37 Adet Hemzemin Geçitte Kaplama Yapılması (İstanbul - Uzun köprü hattı 15 adet)	KT	2013	2014	276.500	0	276.500	276.500	92.364	33	100	BT
122	2014E010040	Çerkezköy - Kapıkule arasında bulunan yerel kumanda masalarının yenilenmesi	KT	2013	2014	108.000	0	108.000	108.000	104.020	96	100	BT
123	2014E010040	Arifiye - Bilecik - Bozüyük - Çerkezköy - Lüleburgaz ve Edirne'ye 200 adet makas ısıtıcılarının alınması	KT	2014	2014	40.000	0	40.000	11.600	11.600	29	100	BT
124	2014E010040	Pehlivan köyü - Hudut (Pityon) sinyalizasyon sistemleri için yedek malzeme alımı	KT	2014	2014	250.000	0	250.000	250.000	139.831	56	100	BT
125	2014E010040	Bilecik, Arifiye, Derince, Pendik, Halkalı ve Çerkezköy katener otolarının iş sağlığı ve güvenliği risk analizi raporuna göre bakım ve revizyonu	KT	2013	2014	75.650	30.281	75.600	75.600	38.977	52	100	BT

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
126	2014E010040	Pehlivan köy cer postasının Çerezek köy skada sistemine bağlanması	KT	2014	2014	22.500	0	22.500	22.500	20.500	91	100	BT
127	2014E010040	Halkalı - kapıkule arasının Elektrifikasyonu kapsamında Velimeşe, Ballıhoca, Mandıra ve Edirne Trafo Merkezlerine beton ihata yapılması ve zemininin betonlanması	KT	2014	2014	125.000	0	125.000	109.742	0	0	0	İA
128	2014E010040	Halkalı, Haydarpaşa, Sirkeci, Erenköy, Pendik, Derince, İzmit, Köseköy, Çerkezköy, Pehlivan köy, Edirne santralleri için AASTRA Marka telefon santral kartları alımı	KT	2014	2014	9.000	0	9.000	9.000	8.250	92	100	BT
129	2014E010040	Muratlı - Kapıkule-Hudut hat kesimine Fiber Optik kablo döşenmesi ile transmisyon ve telefon sistemleri kurulması	KT	2014	2014	2.800.000	0	600.000	600.000	0	0	0	İA
130	2014E010050	Tesisler Müdürlüğüne bağlı Şefiklerin iş sağlığı ve güvenliği risk analizi raporuna göre inşaat revize ve tadilatının yapılması	KT	2014	2014	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	İA
131	2014E010050	Çerkezköy, Lüleburgaz ve Edirne'ye tesislere ait sinyalizasyon ve elektrifikasyon malzemelerinin korunması amacıyla 3 adet 500 m2 lik kapalı depo yapılması	KT	2014	2014	102.000	0	102.000	102.000	0	0	0	İA
132	2014E010050	Elektrifikasyon ve Sinyalizasyon Şefikleri ile Marmaray işyerlerine iş güvenliği koruyucu malzemeleri alımı	KT	2014	2014	20.000	0	20.000	20.000	0	0	0	İA
133	2014E010050	Halkalı - Kapıkule arası Kabakça, Velimeşe, Ballıhoca, Mandıra ve Edirne 5 adet Trafo Merkezi ile 15 adet Cer Posta binalarının revizyonu	KT	2014	2014	20.000	0	20.000	20.000	9.000	45	100	BT
134	2014E010004	Pehlivan köy İstasyon binası restorasyonu ve çevre düzenlemesi ile saha aydınlatması	KT	2013	2014	1.511.180	56.180	1.455.000	1.455.000	811.359	56	95	DE
135	2014E010050	Köseköy Lojistik, Bilecik, Çukurhisar, Yayla, Sapanca, B.Derbent, Köseköy, Kırkikievler, İzmit, Arifiye, Çerkezköy, Alpullu, Kapıkule, Ayrılıkçeşme-Kazlıçeşme Marmaray Hattı İstasyon, Trafo - Jeneratör Merkezleri, muhtelif tren depoları ve lojistik sahalarına kamera sistemi kurulumu.	KT	2014	2014	600.000	0	600.000	600.000	8.540	1	7	DE
136	2014E010050	Kavaklı İstasyonu RRR Projeleri ve Seyitler İstasyonu Röleve Projelerinin Hazırlanması	KT	2013	2014	118.500	27.000	78.000	78.000	50.000	64	70	DE

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.626.914 liradır. 2014 yılı programı 1.626.914 liradır. 859.123 lira ödenek gönderilmiş ve bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Yüzde 53 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 3 proje bitmiştir. 1 projeye hiç başlanmamıştır.

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		4	1.626.914	0	1.626.914	859.123	859.123	1	0	0	0	3	53
1	Madencilik	4	1.626.914	0	1.626.914	859.123	859.123	1	0	0	0	3	53

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlık Malar
		MTA Marmara Bölge Müdürlüğü				1.626.914	0	1.626.914	859.123	859.123	53		
		Madencilik				1.626.914	0	1.626.914	859.123	859.123	53		
137	2013B400140	Trakya Jeotermal Enerji Aramaları	GB	2014	2014	1.456.500	0	1.456.500	849.271	849.271	58	100	BT
138	000000000000	Türkiye'deki Oligosen Yaşlı Omurgalı Fosil Yataklarının Araştırılması	GB	2014	2014	28.167	0	28.167	4.779	4.779	17	100	BT
139	000000000000	Türkiye'de Demir, Krom, Nikel Platin Grubu Elementleri Ruhsat Etüdü	GB	2014	2014	32.790	0	32.790	5.073	5.073	15	100	BT
140	000000000000	Maden Ön Etütleri	GB	2014	2014	109.457	0	109.457	0	0	0	0	HB

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü'nün 2014 yılında 6 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 140.885.028 liradır. 2014 yılı programı 27.657.276 liradır. 21.925.795 lira ödenek gönderilmiş ve tamamı harcanmıştır. Yüzde 79 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 3 proje devam etmektedir. 1 projeye başlanmamıştır.

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	6	140.885.028	79.325.958	27.657.276	21.925.795	21.925.795	1	0	0	3	2	79
1	Eğitim / Yüksek Öğretim	4	124.655.205	70.096.135	24.657.276	20.731.689	20.731.689	0	0	0	2	2	84
2	Eğitim / Kültür	1	5.000.000	0	1.000.000	0	0	1	0	0	0	0	0
3	Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor	1	11.229.823	9.229.823	2.000.000	1.194.106	1.194.106	0	0	0	1	0	60

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				140.885.028	79.325.958	27.657.276	21.925.795	21.925.795	79		
		Eğitim / Yüksek Öğretim				124.655.205	70.096.135	24.657.276	20.731.689	20.731.689	84		
141	2013H030270	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2013	2014	459.401	59.401	400.000	244.449	244.449	61	100	BT
142	2012H032330	Muhtelif İşler (B. onr., Mak. tec. Bil. don. vb.)	ÖB	2013	2014	5.195.804	1.197.804	4.657.276	4.657.276	4.657.276	100	100	BT
143	2009H031670	Kampüs Altyapısı (Kanalizasyon, elektrik, su, çevre düzenlemesi, gaz, yol, ısı merkezi, artıma, trafo, telefon)	ÖB	2009	2015	25.000.000	12.764.870	4.000.000	1.667.282	1.667.282	42		DE
144	2009H031680	Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı (17.800 m2 dersane, 14.000 m2 yemekhane, 6.000 m2 Vize MYO)	ÖB	2009	2015	94.000.000	56.074.060	15.600.000	14.162.682	14.162.682	91	97	DE
		Eğitim / Kültür				5.000.000	0	1.000.000	0	0	0		
145	2013H040060	K.eli Gar Binası Restorasyonu	ÖB	2013	2014	5.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	HB
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				11.229.823	9.229.823	2.000.000	1.194.106	1.194.106	60		
146	2009H050120	Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yapımı (Spor Salonu, Futbol Sahası (suni çim), Basketbol ve Voleybol Sahası (2 adet), Tenis Kortu (2 adet))	ÖB	2009	2014	11.229.823	9.229.823	2.000.000	1.194.106	1.194.106	60	90	DE

YURT-KUR Yurt Müdürlüğü

YURT-KUR Yurt Müdürlüğü'nün 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 31.000.000 liradır. 2014 yılı programı 3.100.000 lira, gönderilen ve harcanan ödenek yoktur. 2 projeye de henüz başlanmamıştır.

Arsalarla ilgili çalışmalar sürdürülmektedir.

YURT-KUR Yurt Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0
	Eğitim / Yüksek Öğretim	2	31.000.000	0	3.100.000	0	0	2	0	0	0	0	0

YURT-KUR Yurt Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
YURT-KUR Yurt Müdürlüğü						31.000.000	0	3.100.000	0	0	0	0	
Eğitim / Yüksek Öğretim						31.000.000	0	3.100.000	0	0	0	0	
147	2005H032940	B.eski Yurt İnşaatı (300 kişilik)	ÖB	2012	2014	14.000.000	0	1.400.000	0	0	0	0	HB
148	2005H032940	L.burgaz Yurt İnşaatı (400 kişilik)	ÖB	2011	2014	17.000.000	0	1.700.000	0	0	0	0	HB

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.732.318 liradır. 2014 yılı programı 624.317 liradır. 205.066 lira gönderilmiş ve tamamı harcanmıştır. Yüzde 33 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir. 2 projeye başlanmamıştır.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		4	1.732.318	134.525	624.317	205.066	205.066	2	0	0	1	1	33
1	Eğitim / Kültür	4	1.732.318	134.525	624.317	205.066	205.066	2	0	0	1	1	33

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü						1.732.318	134.525	624.317	205.066	205.066	205.066	205.066	205.066	33		
Eğitim / Kültür						1.732.318	134.525	624.317	205.066	205.066	205.066	205.066	205.066	33		
149	000000000000	K.eli Eski Evkaf Dairesi Restorasyonu	ÖB	2012	2015	316.203	0	242.727	73.476	73.476	30	30	DE			
150	1995H040360	L.burgaz Kadı Ali Camii Restorasyonu	ÖB	2013	2014	1.000.000	0	100.000	0	0	0	0	HB			
151	1995H040360	P.hisar Hundi Hatun Camii Restorasyonu	ÖB	2013	2014	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB			
152	1995H040360	Tarihi Yapılar Kurşun Bakım ve Onarımı	ÖB	2013	2014	266.115	134.525	131.590	131.590	131.590	100	100	BT			

Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü

Kadastro Müdürlüğü'nün 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.475.896 liradır. Projeler tamamlanmıştır.

Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		2	1.475.896	1.124.473	2	0	0	0	0	0	0	2	0
1	DKH İktisadi / Harita, Tapu ve Kadastro	2	1.475.896	1.124.473	2	0	0	0	0	0	0	2	0

Kadastro Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
Kadastro Müdürlüğü						1.475.896	1.124.473	2	0	0	0	0	
DKH / İktisadi / Harita Tapu Kadastro						1.475.896	1.124.473	2	0	0	0	0	
153	000000000000	Babaeski Kadastro Yenileme Çalışması	DG	2012	2014	854.543	629.743	1	0	0	0	100	BT
154	000000000000	Lüleburgaz Kadastro Yenileme Çalışması	DG	2011	2014	621.353	494.730	1	0	0	0	100	BT

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü'nün 2014 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 313.997.000 liradır. 2014 yılı ödeneği 64.370.252 lira olup, bu miktar harcama yapılmıştır. Yüzde 21 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 5 proje tamamlanmıştır.

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		5	313.997.000	0	313.997.000	64.370.252	64.370.252	0	0	0	0	5	21
1	Madencilik	5	313.997.000	0	313.997.000	64.370.252	64.370.252	0	0	0	0	5	21

TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü						313.997.000	0	313.997.000	64.370.252	64.370.252	21		
Madencilik						313.997.000	0	313.997.000	64.370.252	64.370.252	21		
155	2013B000010	Jeoloji (Sondaj öncesi arama)	KT	2014	2014	9.531.000	0	9.531.000	2.544.414	2.544.414	27	100	BT
156	2013B040020	Sondaj	KT	2014	2014	237.379.000	0	237.379.000	55.483.638	55.483.638	23	100	BT
157	2013B040040	Üretim (Petrol ve doğal gaz sahaları geliştirme yatırımları)	KT	2014	2014	4.250.000	0	4.250.000	755.041	755.041	18	100	BT
158	2013B040060	Kuyu Tamamlama	KT	2014	2014	55.638.000	0	55.638.000	4.104.195	4.104.195	7	100	BT
159	2010B040050	İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı	KT	2014	2014	7.199.000	0	7.199.000	1.482.964	1.482.964	21	100	BT

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü'nün 2014 yılında 11 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 76.000.000 liradır. 2014 yılı programı 15.221.000 liradır. Bu ödeneğin 9.621.000 lirası gönderilmiş ve 8.411.000 lirası harcama yapılmıştır. Yüzde 55 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje devam etmektedir. 1 proje bitmiştir. 8 proje ihale aşamasındadır.

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grubu Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		11	76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	0	8	0	2	1	55
Enerji		11	76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	0	8	0	2	1	55

TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
TEİAŞ 20. İletim Tesis ve İşletme Grup Müdürlüğü Enerji						76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	55		
						76.000.000	2.000.000	15.221.000	9.621.000	8.411.000	55		
160	2013D031360	Hamitabat - K.eli DGKÇS EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2013	2016	9.500.000	0	2.000	0	0	0	0	İA
161	2012D030340	Babaeski TM Tevsiat (154 kV 1 Adet Fider İlavesi)	KT	2012	2016	5.000.000	0	2.000	0	0	0	0	İA
162	2013D030350	Babaeski - Edirne EİH Yenilemesi (Toprak teli fiber optikli)	KT	2013	2015	11.000.000	2.000.000	6.569.000	6.569.000	6.569.000	100	90	DE
163	2012D031340	Demirköy TM	KT	2012	2016	4.000.000	0	672.000	0	0	0	0	İA
164	2009D030670	B.karşıran TM Fider İlavesi (154 kV 1 fider)	KT	2011	2016	1.000.000	0	250.000	0	0	0	0	İA
165	2013D031360	Hamitabat DGKÇS - Delta DGKÇS EİH Yenilemesi (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2013	2016	6.000.000	0	1.600.000	1.600.000	390.000	24		DE
166	2013D030150	Vize 380 kV Havza TM	KT	2013	2017	32.500.000	0	4.070.000	0	0	0	0	İA
167	2013D030360	Kıyıköy TM Tevsiat	KT	2013	2015	1.500.000	0	1.452.000	1.452.000	1.452.000	100	100	BT
168	2013D090040	(Hamitabat - Alibeyköy) Brş N - Vize 380 Havza TM (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2013	2016	2.000.000	0	502.000	0	0	0	0	İA
169	2014D030450	Traçim - Demirköy EİH (Toprak Teli Fiber Optikli)	KT	2014	2016	3.000.000	0	2.000	0	0	0	0	İA
170	2014D030460	Traçim TM Tevsiat	KT	2014	2016	500.000	0	100.000	0	0	0	0	İA

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü'nün 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 3.631.000 liradır. Projeye başlanmamıştır.

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçek leşme (%)
Toplam		1	3.631.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
1	İmalat	1	3.631.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0

Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
Alpullu Şeker Fabrikası Müdürlüğü						3.631.000	0	1	0	0	0		
İmalat						3.631.000	0	1	0	0	0		
171	2013C010080	Atıksu Arıtma Tesisi	ÖK	2007	2014	3.631.000	0	1	0	0	0	0	HB

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nün 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 6.700.000 liradır. 2.300.000 lira harcama yapılmıştır. Proje devam etmektedir.

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		1	6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	1	0	100
1	DKH Sosyal / Sosyal Güvenlik	1	6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	0	0	0	1	0	100

Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü				6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100		
		DKH / Sosyal / Sosyal Güvenlik				6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100		
172	000000000000.	K.eli Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	SG	2013	2015	6.700.000	2.400.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100		DE

İl Özel İdaresi

Genel Durum

İl Özel İdaresince diğer kuruluşlar dışında 2014 yılında KÖYDES dahil toplam 224 proje uygulanması bulunmaktadır. Bu projelerin toplam tutarı 46.858.203 liradır. 15.780.368 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 66 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 111 proje tamamlanmıştır. 23 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır. 89 projeye başlanamamıştır.

İl Özel İdaresi 2014 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	İl Özel İdaresi (KÖYDES dahil)	224	46.858.203	1.495.303	24.088.950	20.354.248	15.780.368	89	1	0	23	111	66
	İl Özel İdaresi (KÖYDES hariç)	171	43.492.473	1.495.303	20.723.220	16.988.518	13.198.553	89	0	0	18	64	64
1	Tarım / Sulama	16	3.495.030	0	300.038	300.030	300.030	11	0	0	0	5	100
2	Tarım / Hayvancılık	28	1.003.508	0	13.535	13.535	13.508	15	0	0	0	13	100
3	Ulaştırma	35	13.350.548	390.514	8.861.373	6.817.723	6.509.609	0	0	0	4	31	73
4	Turizm	3	4.040.000	6.350	2.733.650	1.533.650	76.143	0	0	0	2	1	3
5	Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim	1	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	1	100
6	Eğitim / Yüksek Öğretim	1	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0	1	100
7	Eğitim / Kültür	2	377.900	0	377.900	377.900	377.900	0	0	0	0	2	100
8	Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor	2	2.360.228	2.000	2.298.056	2.298.056	2.127.988	0	0	0	1	1	93
9	DKH / Genel İdare	3	2.742.277	298.121	2.444.156	2.444.156	694.156	0	0	0	2	1	28
10	DKHS / Kırsal Alan Planlaması	77	12.946.156	499.739	826.382	826.319	722.070	63	0	0	7	7	87
11	DKHS / Belediye Hizmetleri	1	2.571.378	298.579	2.272.799	1.789.657	1.789.657	0	0	0	1	0	79
12	DKHS / Afetler	1	252.643	0	252.643	244.804	244.804	0	0	0	0	1	97
13	Dkhs / Sosyal İçerme	1	102.805	0	92.688	92.688	92.688	0	0	0	1	0	100
	KÖYDES	53	3.365.730	0	3.365.730	3.365.730	2.581.815	0	1	0	5	47	77

Tarım / Sulama

İl Özel İdaresi Tarım / Sulama Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Tarım				4.498.538	0	313.573	313.565	313.538	100		
		Tarım / Sulama				3.495.030	0	300.038	300.030	300.030	100		
		Sulama Göleti Bakım ve Onarımları (14 adet)				3.495.030	0	300.038	300.030	300.030	100		
173	000000000000	K.eli Çukurpınar YÜS Sulama Tesisi Onarımı	Öİ	2013	2014	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
174	000000000000	B.eski Çavuşköy Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2014	440.000	0	1	0	0	0	0	HB
175	000000000000	B.eski Çengerli Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2014	380.000	0	1	0	0	0	0	HB
176	000000000000	B.eski Ertuğrul Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2014	270.000	0	1	0	0	0	0	HB
177	000000000000	B.eski Karacaoğlan Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2014	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
178	000000000000	B.eski Terzili Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2014	375.000	0	1	0	0	0	0	HB
179	000000000000	B.eski Terzili Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama	Öİ	2013	2014	77.930	0	77.930	77.930	77.930	100	100	BT
180	000000000000	L.burgaz Celaliye Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2014	330.000	0	0	0	0	0	0	HB
181	000000000000	L.burgaz Çesmekolu Göletten Sulama Kapalı Sistem Sulama Tesisi Tamamlama	Öİ	2013	2014	59.404	0	59.404	59.404	59.404	100	100	BT
182	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2014	2014	57.404	0	57.404	57.404	57.404	100	100	BT
183	000000000000	L.burgaz Karaağaç Göletten Sulama Kapalı Sistem	Öİ	2013	2014	275.000	0	0	0	0	0	0	HB
184	000000000000	L.burgaz Sakızköy Tırtandere Göleti Dolusavak Onarımı	Öİ	2013	2014	82.058	0	82.058	82.058	82.058	100	100	BT
185	000000000000	L.burgaz Sakızköy Tırtandere Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2014	330.000	0	0	0	0	0	0	HB
186	000000000000	L.burgaz Tatarköy Sulama Göleti Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2014	2014	23.234	0	23.234	23.234	23.234	100	100	BT
187	000000000000	P.hisar Ataköy Sulama Kanalı (Çayırılar Bölgesi)	Öİ	2013	2014	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
188	000000000000	P.hisar Yeniceköy Göletten Kapalı Sistem Sulama Tesisi	Öİ	2013	2014	300.000	0	1	0	0	0	0	HB

Tarım / Hayvancılık

İl Özel İdaresinin 2014 yılında 28 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.003.508 liradır. 13.508 lira harcama yapılmıştır. 13 proje bitmiştir. 15 projeye başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Tarım / Hayvancılık Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Tarım / Hayvancılık				1.003.508	0	13.535	13.535	13.508	100		
		Hayvan İçmesuyu Göletleri (27 adet)				990.000	0	27	27	0	0		
189	000000000000	K.eli Üsküp HİS Göleti	Öİ	2014	2014	50.000	0	1	1	0	0	100	BT
190	000000000000	K.eli Bayramdere HİS Göleti	Öİ	2014	2014	50.000	0	1	1	0	0	0	HB
191	000000000000	K.eli Beypınar HİS Göleti	Öİ	2012	2014	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
192	000000000000	K.eli Çukurpınar HİS Göleti	Öİ	2012	2014	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
193	000000000000	K.eli Dokuzhöyük HİS Göleti	Öİ	2012	2014	40.000	0	1	1	0	0	100	BT
194	000000000000	K.eli Erikler HİS Göleti	Öİ	2013	2014	50.000	0	1	1	0	0	100	BT
195	000000000000	K.eli Geçitağzı HİS Göleti	Öİ	2013	2014	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
196	000000000000	K.eli Kadıköy HİS Göleti	Öİ	2013	2014	35.000	0	1	1	0	0	100	BT
197	000000000000	K.eli Karahamza HİS Göleti	Öİ	2014	2014	40.000	0	1	1	0	0	100	BT
198	000000000000	K.eli Karakoç HİS Göleti	Öİ	2012	2014	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
199	000000000000	D.köy İğneada HİS Göleti	Öİ	2012	2014	40.000	0	1	1	0	0	100	BT
200	000000000000	Koçaz Merkez HİS Göleti	Öİ	2014	2014	30.000	0	1	1	0	0	100	BT
201	000000000000	Koçaz Ahmetler HİS Göleti	Öİ	2012	2014	35.000	0	1	1	0	0	0	HB

İl Özel İdaresi Tarım / Hayvancılık Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Turu	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
202	000000000000	Koçaz Devletiağaç HİS Göleti	Öİ	2012	2014	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
203	000000000000	Koçaz Karaabalar HİS Göleti	Öİ	2013	2014	25.000	0	1	1	0	0	0	HB
204	000000000000	Koçaz Kocayazı HİS Göleti	Öİ	2012	2014	40.000	0	1	1	0	0	100	BT
205	000000000000	Koçaz Kula HİS Göleti	Öİ	2012	2014	40.000	0	1	1	0	0	0	HB
206	000000000000	Koçaz Malkoçlar HİS Göleti	Öİ	2014	2014	40.000	0	1	1	0	0	100	BT
207	000000000000	Koçaz Terzidere HİS Göleti	Öİ	2013	2014	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
208	000000000000	Koçaz Topçular HİS Göleti	Öİ	2010	2014	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
209	000000000000	L.burgaz Celaliye HİS Göleti	Öİ	2013	2014	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
210	000000000000	L.burgaz Müsellim HİS Göleti	Öİ	2014	2014	30.000	0	1	1	0	0	100	BT
211	000000000000	P.hisar Ataköy HİS Göleti	Öİ	2012	2014	30.000	0	1	1	0	0	0	HB
212	000000000000	Vize Doğanca HİS Göleti	Öİ	2012	2014	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
213	000000000000	Vize Evrencik HİS Göleti	Öİ	2012	2014	35.000	0	1	1	0	0	100	BT
214	000000000000	Vize Kömürköy HİS Göleti	Öİ	2014	2014	35.000	0	1	1	0	0	100	BT
215	000000000000	Vize Sofular HİS Göleti	Öİ	2013	2014	35.000	0	1	1	0	0	0	HB
		Diğerleri				13.508	0	13.508	13.508	13.508	100		
216	000000000000	HİS Göleti Uyarı Levhaları	Öİ	2014	2014	13.508	0	13.508	13.508	13.508	100	100	BT

Ulaştırma

Köy yollarında 2014 yılında İl Özel İdaresi ve KÖYDES Projesinden; 17 km birinci kat asfalt kaplama, 144,5 km ikinci kat asfalt kaplama, 9.509 m2 parke taşı kaplaması, 4 menfez yapılmıştır.

Köy yolu Çalışmaları

Ö: İl Özel İdaresi (Afet, TPAO vb. dahil), K: KÖYDES Projesi

		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Harcamalar		9.971.269	2.191.378	2.842.953	5.004.699	7.591.147	6.858.386	10.235.428	8.387.563
	Ö	1.010.000	379.586	1.683.640	1.530.575	3.274.314	5.149.861	7.233.854	6.509.609
	K	8.961.269	1.811.792	1.159.313	3.474.124	4.316.833	1.708.525	3.001.574	1.877.954
Köy yolu onarımı (km)		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	.
	K	6,0	.	.	.	.	.	.	.
Köy yolu stabilize kaplama (km)		67,0	25,5	50,5	23,5	0,0	7,0	15,0	0,0
	Ö	67,0	23,0	49,0	12,0	.	7,0	15,0	.
	K	.	2,5	1,5	11,5	.	.	.	.
Köy yolu birinci kat asfalt kaplama (km)		48,5	16,0	9,4	22,0	4,0	33,0	57,6	17,0
	Ö	16,5	16,0	9,0	16,0	1,0	22,0	57,6	17,0
	K	32,0	.	0,4	6,0	3,0	11,0	.	.
Köy yolu ikinci kat asfalt kaplama (km)		132,5	80,5	77,0	88,8	182,0	81,3	153,5	144,5
	Ö	36,5	18,0	36,0	18,0	84,0	69,0	109,0	106,5
	K	96,0	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	44,5	38,0
Köy yolu parke taşı kaplaması (m ²)		239.170	0	4.134	50.574	27.227	27.896	58.969	9.509
	Ö	.	.	.	.	7.187	8.244	12.722	.
	K	239.170	.	4.134	50.574	20.040	19.652	46.247	9.509
Köprü		1	0	0	0	0	0	0	0
	Ö	.	.	.	.	.	.	.	.
	K	1	.	.	.	.	.	.	.
Menfez		3	2	1	2	8	7	10	4
	Ö	.	.	.	.	.	.	5	1
	K	3	2	1	2	8	7	5	3

İl Özel İdaresi

17 km birinci kat asfalt kaplama, 106,5 km ikinci kat asfalt kaplama programa ile 1 menfez yapılmıştır.

İl Özel İdaresi Ulaştırma Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekteleşme (%)	Fiziki gerçekteleşme (%)	Açıklamalar
		Ulaştırma				13.350.548	390.514	8.861.373	6.817.723	6.509.609	73		
		Köy Yolları Yapımı				13.350.548	390.514	8.861.373	6.817.723	6.509.609	73		
		1. Kat Asfalt Kaplama (17 km)				2.198.073	0	1.077.056	1.077.056	980.121	91		
		TPAO (17 km)				2.198.073	0	1.077.056	1.077.056	980.121	91		
217	000000000000	Asilbeyli - Köy yolu İlt. (B.dere) köy yolu 1. kat asfalt kaplama (9 km)	DG	2014	2014	1.163.686	0	570.206	570.206	518.887	91	100	BT
218	000000000000	Umurca - Köy yolu İlt. köy yolu 1. kat asfalt kaplama (5 km)	DG	2014	2014	646.492	0	316.781	316.781	288.271	91	100	BT
219	000000000000	Hamitabat Üretim Sahası köy yolu 1. kat asfalt kaplama (3 km)	DG	2014	2014	387.895	0	190.069	190.069	172.963	91	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (106,5 km)				5.295.285	0	2.317.641	2.317.641	2.107.006	91		
		İl Özel İdaresi (40,5 km)				2.013.701	0	881.397	881.397	802.071	91		
220	000000000000	Koyunbaba - İncece Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	Öİ	2014	2014	348.047	0	152.340	152.340	138.630	91	100	BT
221	000000000000	Çeşmeköy - Karahamza Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	Öİ	2014	2014	149.163	0	65.289	65.289	59.413	91	100	BT
222	000000000000	Babaeski - Kadıköy - Terzili - Demirkapı Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (14 km)	Öİ	2014	2014	696.094	0	304.680	304.680	277.259	91	100	BT
223	000000000000	Demirkapı - Karahallil Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	Öİ	2014	2014	248.605	0	108.814	108.814	99.021	91	100	BT
224	000000000000	Dy. İlt. - Ky. İlt. (Avcılar Sapağı) Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	Öİ	2014	2014	99.442	0	43.526	43.526	39.608	91	100	BT
225	000000000000	Ky. İlt. - Kocatarla - Devletli ağaç (Edirne İl Hd.) Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (5,5 km)	Öİ	2014	2014	273.466	0	119.696	119.696	108.923	91	100	BT
226	000000000000	Cevizköy - Doğanca Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	Öİ	2014	2014	198.884	0	87.052	87.052	79.217	91	100	BT
		İl Özel İdaresi Aşılama (10 km)				497.208	0	217.628	217.628	195.994	90		
227	000000000000	Ky.İlt.-Gökyaka Köy yolu Aşılama (2. Kat Asfalt Kaplama 2,5 km)	Öİ	2014	2014	124.302	0	54.407	54.407	48.982	90	100	BT
228	000000000000	Sivrilir Köy İç Yolları Aşılama (2. Kat Asfalt Kaplama 1 Km.)	Öİ	2014	2014	49.721	0	21.763	21.763	19.603	90	100	BT
229	000000000000	Dy.İlt.-Yenitaşı Köy yolu Aşılama (2. Kat Asfalt Kaplama 1 km)	Öİ	2014	2014	49.721	0	21.763	21.763	19.603	90	100	BT
230	000000000000	Paşayeri-Dy.İlt.(İncece) Köy yolu Aşılama (2. Kat Asfalt Kap. 0,5 Km.)	Öİ	2014	2014	24.860	0	10.881	10.881	9.809	90	100	BT
231	000000000000	Koyunbaba-İly.İlt. (Kayalı) Köy yolu Aşılama (2. Kat Asf. Kap. 2,5 km)	Öİ	2014	2014	124.302	0	54.407	54.407	48.982	90	100	BT
232	000000000000	Yenimahalle-Karahallil Köy yolu Aşılama (2. Kat Asfalt Kaplama 0,5 km)	Öİ	2014	2014	24.860	0	10.881	10.881	9.809	90	100	BT
233	000000000000	Ky.İlt.-Kocayazı Köy yolu Aşılama (2. Kat Asfalt Kaplama 0,5 km)	Öİ	2014	2014	24.860	0	10.881	10.881	9.809	90	100	BT
234	000000000000	Devletli ağaç Köy İç Yolları Aşılama (2. Kat Asfalt Kaplama 1,5 Km.)	Öİ	2014	2014	74.582	0	32.645	32.645	29.397	90	100	BT
		TPAO (56 km)				2.784.376	0	1.218.616	1.218.616	1.108.941	91		
235	000000000000	Üsküp - Çukurpınar Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (9 km)	DG	2014	2014	447.489	0	195.866	195.866	178.238	91	100	BT
236	000000000000	Dy. İlt. - Çağalayık Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (1 km)	DG	2014	2014	49.721	0	21.763	21.763	19.804	91	100	BT
237	000000000000	Karahamza - Çayırılı Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	DG	2014	2014	149.163	0	65.289	65.289	59.413	91	100	BT
238	000000000000	Balaban - Sarpdere Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	DG	2014	2014	298.326	0	130.577	130.577	118.825	91	100	BT
239	000000000000	Evrensekiz - Dy. İlt. Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	DG	2014	2014	198.884	0	87.052	87.052	79.217	91	100	BT
240	000000000000	Eskibedir - Ovacık Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	DG	2014	2014	149.163	0	65.283	65.283	59.408	91	100	BT
241	000000000000	Kırıkköy - Ayvalı Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	DG	2014	2014	298.326	0	130.577	130.577	118.825	91	100	BT
242	000000000000	Eskibedir - Lüleburgaz Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	DG	2014	2014	198.884	0	87.052	87.052	79.217	91	100	BT
243	000000000000	Dy. İlt. - Doğanca Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (6 km)	DG	2014	2014	298.326	0	130.547	130.547	118.798	91	100	BT
244	000000000000	Çeşmeköy - Eriklyurdu Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	DG	2014	2014	348.047	0	152.305	152.305	138.598	91	100	BT
245	000000000000	Yenice - Serken Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	DG	2014	2014	348.047	0	152.305	152.305	138.598	91	100	BT
		Menfez Yapımı (1 adet)				20.001	0	20.001	20.000	20.000	100		
246	000000000000	Vize Evrenli Menfez İnşaatı	Öİ	2014	2014	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
247	000000000000	Muhtelif Köy Yolları Büz İmalatı (300 m)	Öİ	2014	2014	1	0	1	0	0	0	100	BT

İl Özel İdaresi Ulaştırma Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Diğerleri				5.837.189	390.514	5.446.675	3.403.026	3.402.482	62		
248	000000000000	Doğal Afetler	Öİ	2013	2014	933.440	0	933.440	316.815	316.815	34		DE
249	000000000000	Afet İşleri Akaryakıt Alımları	GB	2013	2014	974.999	390.514	584.485	584.485	583.941	100		DE
250	000000000000	Akaryakıt Alımları	Öİ	2014	2014	1.928.750	0	1.928.750	1.928.750	1.928.750	100		DE
251	000000000000	Araç ve İş Makinesi Alımı	Öİ	2014	2014	2.000.000	0	2.000.000	572.976	572.976	29		DE

KÖYDES Projesi

38 km ikinci kat asfalt kaplama, 9.509 m² köyü yolları parke kaplama ile 3 menfez yapılmıştır.

KÖYDES Projesi Ulaştırma Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Ulaştırma				1.954.965	0	1.954.965	1.954.965	1.877.954	96		
		2. Kat Asfalt Kaplama (38 km)				1.644.642	0	1.644.642	1.644.642	1.560.214	95		
1	000000000000	Kızılcıkdere - Ky.İlt (Bayramdere) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2014	2014	182.802	0	182.802	182.802	171.207	94	100	BT
2	000000000000	İly.İlt. - Erikler Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	KP	2014	2014	257.443	0	257.443	257.443	240.640	93	100	BT
3	000000000000	İly.İlt - Karakoç - Ahmetçe Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2014	2014	145.026	0	145.026	145.026	135.446	93	100	BT
4	000000000000	Balaban-Sarpdere Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	KP	2014	2014	376.444	0	376.444	376.444	372.302	99	100	BT
5	000000000000	Beyci - Tatlıpınar Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2014	2014	91.854	0	91.854	91.854	85.161	93	100	BT
6	000000000000	Devletiağaç - Kocatarla Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2014	2014	91.073	0	91.073	91.073	84.890	93	100	BT
7	000000000000	Ahmetbey - Emirali - Sakızköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (10 km)	KP	2014	2014	500.000	0	500.000	500.000	470.568	94	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (9.509 m²)				226.323	0	226.323	226.323	225.369	100		
8	000000000000	K.eli Dolhan Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (2.030 m ²)	KP	2014	2014		0			45.566	###	100	BT
9	000000000000	B.eski Oruçlu Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.011 m ²)	KP	2014	2014	35.000	0	35.000	35.000	23.482	67	100	BT
10	000000000000	P.hisar Akören Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (481 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	12.399	83	100	BT
11	000000000000	P.hisar Ataköy Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (484 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	10.918	73	100	BT
12	000000000000	P.hisar Cevizköy Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (474 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	10.419	69	100	BT
13	000000000000	P.hisar Çayırdere Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (460 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.162	74	100	BT
14	000000000000	P.hisar Erenler Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (488 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.478	77	100	BT
15	000000000000	P.hisar Evçiler Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (455 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	13.690	91	100	BT
16	000000000000	P.hisar Hacıfaklı Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (345 m ²)	KP	2014	2014	12.323	0	12.323	12.323	12.656	103	100	BT
17	000000000000	P.hisar İslambeyli Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (420 m ²)	KP	2014	2014	14.000	0	14.000	14.000	10.185	73	100	BT
18	000000000000	P.hisar Kurudere Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (940 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	9.849	66	100	BT
19	000000000000	P.hisar Osmanlık Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (505 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	8.895	59	100	BT
20	000000000000	P.hisar Poyralı Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.157	74	100	BT
21	000000000000	P.hisar Sütlüce Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (447 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	21.514	143	100	BT
22	000000000000	P.hisar Tozaklı Köyü Köyü Parke Taşı Kaplaması (484 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.999	80	100	BT
		Menfez İnşaatı (3 adet)				84.000	0	84.000	84.000	92.371	110		
23	000000000000	B.eski Erikler Baks Menfez İnşaatı	KP	2014	2014		0			23.341	###		DE
24	000000000000	Koçgaz Tastepe Menfez İnşaatı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	20.060	67	100	BT
25	000000000000	L.burgaz Alacaoğlu Menfez İnşaatı	KP	2014	2014	54.000	0	54.000	54.000	48.970	91	100	BT

Turizm

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 4.040.000 liradır. 2014 yılı programı 2.733.650 liradır. 76.143 lira harcama yapılmış, yüzde 3 parasal gerçekleştirme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir.

İl Özel İdaresi Turizm Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Açıklama
		Turizm				4.040.000	6.350	2.733.650	1.533.650	76.143	3		
252	000000000000.	K.eli Vali Faik Üstün İlköğretim Okulu Restorasyonu	Öİ	2013	2014	3.000.000	0	1.700.000	1.500.000	42.493	2		DE
253	000000000000.	L.burgaz Ertuğrul Köyü İlkokulu Restorasyonu	Öİ	2013	2014	40.000	6.350	33.650	33.650	33.650	100	100	BT
254	000000000000.	İğneada Longoz Ormanları Millî Parkı Yolları	Öİ	2013	2014	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0		DE

Eğitim / İlköğretim ve Genel Orta Öğretim

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 100.000 liradır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış, yüzde 100 parasal gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi Eğitim / İlköğretim ve Genel Orta Öğretim Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Açıklama
		Eğitim				2.988.128	2.000	2.925.956	2.925.956	2.755.888	94		
		Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				100.000	0	100.000	100.000	100.000	100		
255	000000000000.	K.eli Prefabrik Çok Amaçlı Eğitim Binası (..... derslik)	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT

Eğitim / Yüksek Öğretim

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 150.000 liradır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış, yüzde 100 parasal gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi Eğitim / Yüksek Öğretim Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Açıklama
		Eğitim / Yüksek Öğretim				150.000	0	150.000	150.000	150.000	100		
256	000000000000.	Kırklareli Üniversitesi Laboratuvarı Bakım ve Onarımı	DG	2013	2014	150.000	0	150.000	150.000	150.000	100	100	BT

Eğitim / Kültür

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 377.900 liradır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış, yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje de bitmiştir.

İl Özel İdaresi Eğitim / Kültür Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Eğitim / Kültür				377.900	0	377.900	377.900	377.900	100		
257	000000000000	Gültaş Özbay Evi Restorasyonu	Öİ	2013	2014	244.000	0	244.000	244.000	244.000	100	100	BT
258	000000000000	Vize Kıyıköy Eski PTT Binası Restorasyonu	Öİ	2013	2014	133.900	0	133.900	133.900	133.900	100	100	BT

Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 2.360.228 liradır. 2014 yılı programı 2.298.056 liradır. 2.127.988 lira harcama yapılmış, yüzde 93 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 1 proje devam etmektedir.

İl Özel İdaresi Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				2.360.228	2.000	2.298.056	2.298.056	2.127.988	93		
259	000000000000	K.eli Tellakzade Sentetik Yüzeyli Futbol Sahası Yapımı	GB	2013	2014	1.249.056	1.000	1.248.056	1.248.056	1.246.448	100	100	BT
260	000000000000	K.eli Tellakzade Açık ve Kapalı Tenis Kortları, Açık Halı Saha ve Portatif Tribün Yapımı	Öİ	2014	2014	1.111.172	1.000	1.050.000	1.050.000	881.540	84	60	DE

DKH İktisadi / Genel İdare

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 2.742.277 liradır. 2014 yılı programı 2.444.156 liradır. 694.156 lira harcama yapılmış, yüzde 28 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir.

İl Özel İdaresi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		DKH / İktisadi / Genel İdare				2.742.277	298.121	2.444.156	2.444.156	694.156	28		
261	000000000000	K.eli 112 Acil Çağrı Merkezi Binası Yapımı	GB	2012	2014	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	0	0		DE
262	000000000000	Özel İdare Mülkiyetindeki Taşınmazların Büyük Onarımları	Öİ	2012	2014	892.277	298.121	594.156	594.156	594.156	100		DE
263	000000000000	İç Kontrol Risk İştahı Belirleme Projesi	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT

DKH Sosyal / Kırsal Alan Planlaması

Köy içmesularında 2014 yılında İl Özel İdaresi ve KÖYDES Projesinden;

24 içmesuyu çalışması tamamlanmıştır.
9 içmesuyu çalışması devam etmektedir.

Köy kanalizasyonlarında 2014 yılında İl Özel İdaresi ve KÖYDES Projesinden;

5 kanalizasyon çalışması tamamlanmıştır.
3 köyde çalışmalar devam etmektedir.

İl Özel İdaresi

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 77 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 12.946.156 liradır. 2014 yılı programı 826.382 liradır. 722.070 lira harcama yapılmış, yüzde 87 parasal gerçekleştirme sağlanmıştır. 7 proje bitmiştir. 7 proje devam etmektedir. 63 projeye başlanmamıştır.

İl Özel İdaresi Kırsal Alan Planlaması Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Açıklamalar
DKH / Sosyal / Kırsal Alan Planlaması						12.946.156	499.739	826.382	826.319	722.070	87		
İçmesuyu (13 adet)						2.308.127	499.739	742.517	742.507	638.262	86		
264	000000000000	K.eli Çukurpınar İçmesuyu Depo Onarımı	Öİ	2014	2014	17.762	0	17.762	17.762	17.762	100	100	BT
265	000000000000	K.eli Değirmencik İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2014	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
266	000000000000	B.eksi Kumrular İçmesuyu Ayaklı Depo Onarımı	Öİ	2013	2014	20.000	0	1	0	0	0	0	HB
267	000000000000	B.eksi Taşağıl İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2014	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
268	000000000000	D.köy Boztaş İçmesuyu İsale Hattı Boru Değişimi	GB	2014	2014	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
269	000000000000	L.burgaz Ayvalı İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2014	2014	67.614	0	67.614	67.614	67.614	100	100	BT
270	000000000000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2012	2014	40.000	0	1	0	0	0		DE
271	000000000000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2014	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
272	000000000000	Vize Pazarlı İçmesuyu Gömme Depo Onarımı	Öİ	2014	2014	35.000	0	1	0	0	0	0	HB
273	2013K050270	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.N.Kemal ERSUN Kışlası)	GB	2013	2014	617.934	102.883	93.818	93.818	93.818	100		DE
274	2013K050270	K.eli 55'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Org.Muhittin ÖNÜR Kışlası)	GB	2013	2014	381.114	226.698	154.416	154.416	154.416	100		DE
275	000000000000	Babaeski Cebesoy Kışlası İçmesuyu İsale Hattı Enerji Hidrofor Binası	GB	2014	2014	258.661	0	258.661	258.661	154.416	60		DE
276	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.P.Tug.K.lığı (Dora Kışlası)	GB	2013	2014	421.656	114.598	1	0	0	0		DE
277	2013K050270	L.burgaz 65'inci Mknz.p.Tug.K.lığı (Pamir, Dora ve Yazıcı Kışlası)	GB	2013	2014	63.272	27.780	1	0	0	0		DE
278	000000000000	Vize Düzova İçmesuyu Motopomp Alımı	GB	2014	2014	6.962	0	6.962	6.962	6.962	100	100	BT
279	000000000000	Vize Düzova İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	GB	2014	2014	34.853	0	34.853	34.853	34.853	100	100	BT
280	000000000000	Vize Kışlası İçmesuyu Onarımı	GB	2014	2014	109.878	27.780	1	0	0	0		DE
281	000000000000	Vize Topçuköy İçmesuyu İsale Hattı	GB	2014	2014	9.458	0	9.458	9.458	9.458	100	100	BT
282	000000000000	Muhtelif Köy İçmesuları Boru Alımı	GB	2014	2014	98.963	0	98.963	98.963	98.963	100	100	BT
Kanalizasyon (57 adet)						10.554.221	0	57	4	0	0		
283	000000000000	K.eli Bayramdere Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	290.000	0	1	0	0	0	0	HB
284	000000000000	K.eli Çeşmeköy Kanalizasyonu Fosseptik + Arıtma	Öİ	2013	2014	55.000	0	1	0	0	0	0	HB
285	000000000000	K.eli Çukurpınar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	215.000	0	1	0	0	0	0	HB
286	000000000000	K.eli Dokuzhöyük Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	290.000	0	1	0	0	0	0	HB
287	000000000000	K.eli Dolhan Kanalizasyonu Doğal Arıtma	Öİ	2014	2014	75.000	0	1	0	0	0	0	HB
288	000000000000	K.eli Eriklice Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	160.000	0	1	0	0	0	0	HB

İl Özel İdaresi Kırsal Alan Planlaması Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
289	000000000000	K.eli Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	210.000	0	1	0	0	0	0	HB
290	000000000000	K.eli Karahamza Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	235.000	0	1	0	0	0	0	HB
291	000000000000	K.eli Kavakdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
292	000000000000	K.eli Kayalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
293	000000000000	B.eksi Ağayeri Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2014	75.000	0	1	1	0	0	0	HB
294	000000000000	B.eksi Çavuşköy Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2014	55.000	0	1	1	0	0	0	HB
295	000000000000	B.eksi Çiğdemli Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2012	2014	150.000	0	1	1	0	0	0	HB
296	000000000000	B.eksi Kadıköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	175.000	0	1	0	0	0	0	HB
297	000000000000	B.eksi Karabayır Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	120.000	0	1	0	0	0	0	HB
298	000000000000	B.eksi Minnetler Kanalizasyonu Fosseptik + Doğal Arıtma	Öİ	2014	2014	75.000	0	1	1	0	0	0	HB
299	000000000000	B.eksi Nadrılı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	385.000	0	1	0	0	0	0	HB
300	000000000000	B.eksi Pancarköy Kanalizasyonu Onarımı	Öİ	2012	2014	70.000	0	1	0	0	0	0	HB
301	000000000000	B.eksi Taşağıl Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	14.218	0	1	0	0	0	0	HB
302	000000000000	B.eksi Terzili Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
303	000000000000	D.köy Balaban Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	220.000	0	1	0	0	0	0	HB
304	000000000000	D.köy Sivrilir Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
305	000000000000	Koçgaz Kocayazı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	120.000	0	1	0	0	0	0	HB
306	000000000000	L.burgaz Akçaköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
307	000000000000	L.burgaz Ayvalı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
308	000000000000	L.burgaz Celaliye Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
309	000000000000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	155.000	0	1	0	0	0	0	HB
310	000000000000	L.burgaz Çeşmekolu Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
311	000000000000	L.burgaz Çiftlikköy Kanalizasyonu	Öİ	2014	2014	150.000	0	1	0	0	0	0	HB
312	000000000000	L.burgaz Ertuğrul Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	285.000	0	1	0	0	0	0	HB
313	000000000000	L.burgaz Eskitaşlı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	80.000	0	1	0	0	0	0	HB
314	000000000000	L.burgaz Hamzabey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
315	000000000000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	145.000	0	1	0	0	0	0	HB
316	000000000000	L.burgaz Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	165.000	0	1	0	0	0	0	HB
317	000000000000	L.burgaz Oklağı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
318	000000000000	L.burgaz Ovacık Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	145.000	0	1	0	0	0	0	HB
319	000000000000	L.burgaz Sarıcaali Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
320	000000000000	L.burgaz Turgutbey Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	310.000	0	1	0	0	0	0	HB
321	000000000000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	310.000	0	1	0	0	0	0	HB
322	000000000000	P.köy İmampazarı Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	180.000	0	1	0	0	0	0	HB
323	000000000000	P.köy Kumköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
324	000000000000	P.hisar Akören Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	125.000	0	1	0	0	0	0	HB
325	000000000000	P.hisar Çayırdere Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
326	000000000000	P.hisar Erenler Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
327	000000000000	P.hisar Hacıfaklı Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
328	000000000000	Vize Akıncılar Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	330.000	0	1	0	0	0	0	HB
329	000000000000	Vize Akıncılar Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
330	000000000000	Vize Çövenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
331	000000000000	Vize Çövenli Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
332	000000000000	Vize Doğanca Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	385.000	0	1	0	0	0	0	HB
333	000000000000	Vize Evrenli Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	440.000	0	1	0	0	0	0	HB
334	000000000000	Vize Hasbuğa Kanalizasyonu	Öİ	2012	2014	110.000	0	1	0	0	0	0	HB
335	000000000000	Vize Kömürköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	360.000	0	1	0	0	0	0	HB
336	000000000000	Vize Müsellim Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	250.000	0	1	0	0	0	0	HB
337	000000000000	Vize Müsellim Yağmur Suyu Onarımı	GB	2013	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
338	000000000000	Vize Soğucak Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	370.000	0	1	0	0	0	0	HB
339	000000000000	Vize Topçuköy Kanalizasyonu	Öİ	2013	2014	275.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				83.808	0	83.808	83.808	83.808	100		
340	000000000000	Çöp Konteyniri Alımı	Öİ	2014	2014	83.808	0	83.808	83.808	83.808	100	100	BT

KÖYDES Projesi

KÖYDES Projesinden 2014 yılında 28 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 1.410.765 liradır. 23 proje tamamlanmıştır. 4 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır.

KÖYDES Projesi 2014 Yılı Kırsal Alan Planlaması Yatırımları

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal İşleme (%)	Fiziki İşleme (%)	Açıklama
		DKH / Sosyal				1.410.765	0	1.410.765	1.410.765	703.861	50		
		DKH / Sosyal / İçmesuyu				807.774	0	807.774	807.774	470.856	58		
26	0000000000.	K.eli Asilbeyli Köyü gömme su depo onarımı	KP	2014	2014	33.260	0	33.260	33.260	27.612	83	100	BT
27	0000000000.	K.eli Dolhan Köyü içme suyu bakım onarım	KP	2014	2014	150.000	0	150.000	150.000	0	0	100	BT
28	0000000000.	K.eli Kayalı Grubu İçme Suyu Motopomp Alımı	KP	2014	2014		0			11.800	0	100	BT
29	0000000000.	K.eli Üsküpdere-Karıncak (Grup) Köyleri gömme su depo onarımı	KP	2014	2014	43.740	0	43.740	43.740	35.282	81	100	BT
30	0000000000.	B.eski Dügüncülü Köyü İçme Suyu Sondaj Açılması	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	39.294	131	100	BT
31	0000000000.	B.eski Karabayır Köyü Gömme Su Depo Onarımı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	29.697	99	100	BT
32	0000000000.	B.eski Karamesutlu Köyü Ayaklı Su Depo İnşaatı	KP	2014	2014	260.000	0	260.000	260.000	0	0		DE
33	0000000000.	B.eski Kuleli Köyü Gömme Su Depo Onarımı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	29.697	99	100	BT
34	0000000000.	B.eski Kumrular Köyü Ayaklı Su Depo Onarımı	KP	2014	2014		0			28.314	0	100	BT
35	0000000000.	B.eski Yeniköy Köyü Gömme Su Depo Onarımı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	29.697	99	100	BT
36	0000000000.	Koçgaz Ahmetler Köyü İçme Suyu İkmal Onarımı	KP	2014	2014	52.000	0	52.000	52.000	45.000	87	100	BT
37	0000000000.	Koçgaz Terzidere Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	25.000	0	25.000	25.000	15.458	62	100	BT
38	0000000000.	Koçgaz Yukankanara Köyü İçme Suyu Terfi Hattı	KP	2014	2014	18.651	0	18.651	18.651	19.706	106	100	BT
39	0000000000.	L.burgaz Ceylanköy Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	31.770	0	31.770	31.770	51.920	163	100	BT
40	0000000000.	L.burgaz Karamusul Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	31.770	0	31.770	31.770	27.730	87	100	BT
41	0000000000.	L.burgaz Umurca Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	16.583	0	16.583	16.583	14.750	89	100	BT
42	0000000000.	P.hisar Akören Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	10.000	0	10.000	10.000	21.633	216	100	BT
43	0000000000.	P.hisar Evciler Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	5.000	0	5.000	5.000	21.633	433	100	BT
44	0000000000.	P.hisar İslambeyli Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014		0			0	0		DE
45	0000000000.	P.hisar Poyralı Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	10.000	0	10.000	10.000	21.633	216	100	BT
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				602.991	0	602.991	602.991	233.005	39		
46	0000000000.	K.eli Davutlu Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014		0			24.839	0	100	BT
47	0000000000.	B.eski Eriklyurdu Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	82.331	0	82.331	82.331	82.331	100	100	BT
48	0000000000.	L.burgaz Davutlu Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014		0			0	0	100	BT
49	0000000000.	P.köy Hıdırcı Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	106.041	0	106.041	106.041	84.159	79	100	BT
50	0000000000.	P.köy Kuştepe Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014		0			32.837	0	100	BT
51	0000000000.	P.köy Kuştepe Kanalizasyonu Çürütme Tip Fosseptik Çukuru Yapımı	KP	2014	2014		0			8.839	0	0	İA
52	0000000000.	Vize Aksicim Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	170.000	0	170.000	170.000	0	0		DE
53	0000000000.	Vize Düzova Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	244.619	0	244.619	244.619	0	0		DE

DKH Sosyal / Belediye Hizmetleri

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 2.571.378 liradır. 2014 yılı programı 2.272.799 liradır. 1.789.657 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 79 parasal gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

İl Özel İdaresi Belediye Hizmetleri Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Ağırlık Malar
DKH / Sosyal / Belediye Hizmetleri						2.571.378	298.579	2.272.799	1.789.657	1.789.657	79		
341	000000000000.	K.eli Şeker Depoları Yaşam Merkezi (Anfi tiyatro, kongre merkezi, bowling salonu)	GB	2013	2014	2.571.378	298.579	2.272.799	1.789.657	1.789.657	79		DE

DKH Sosyal / Afetler

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 252.643 liradır. 244.804 lira harcanmış, yüzde 97 parasal gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje devam tamamlanmıştır.

İl Özel İdaresi DKH Sosyal / Afetler Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Ağırlık Malar
DKH / Sosyal / Afetler						252.643	0	252.643	244.804	244.804	97		
342	000000000000.	Arama Kurtarma Malzemesi Alımı	GB	2014	2014	252.643	0	252.643	244.804	244.804	97	100	BT

DKH Sosyal / Sosyal İçerme

İl Özel İdaresi'nin 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 102.805 liradır. 2014 yılı programı 92.688 liradır. Bu ödeneğin tamamı harcanmış yüzde 100 parasal gerçekleştirme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

İl Özel İdaresi DKH Sosyal / Sosyal İçerme Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleştirme (%)	Fiziki gerçekleştirme (%)	Ağırlık Malar
DKH / Sosyal / Sosyal İçerme						102.805	0	92.688	92.688	92.688	100		
343	000000000000.	Basamak Taksi Yollarda	GB	2014	2015	102.805	0	92.688	92.688	92.688	100		DE

KÖYDES Projesi

KÖYDES Projesi kapsamında İlimize 2005 – 2014 yılları arasında toplam **45.625.880** lira ödenek tahsis edilmiştir.

Köy yolu çalışmalarında

633,8 km asfalt kaplama (112,2 km.si 1. Kat, 521,6 km.si 2.kat), 56,5 km stabilize kaplama, 6 km onarım, 3 köprü, 45 menfez, 412.530 m2 köyüçi yolları parke taşı düzenlemesi yapılmıştır.

Köy içme suyu çalışmalarında

54 sondaj kuyusu açılmış, 175 proje ile de köylerimizin daha sağlıklı içmesuyuna kavuşması için boru değişimi, ikmal onarım ve biriktirme içmesuyu deposu yapılmıştır.

Sulama çalışmalarında

4 yerüstü sulama, 15 yeraltı sulama, 10 sulama göleti bakım ve onarımı yapılarak 1.063 hektar alan sulamaya açılmış ve 53.676 metre su kanalı bakım ve onarımı yapılmıştır. Ayrıca, 7 hayvan içmesuyu göleti yapılmıştır.

Kanalizasyon çalışmalarında

38 köyün kanalizasyonu yapılmıştır.

KÖYDES Projesi Kapsamında Yapılan İşler

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Toplam
Sulama (Adet)		24	1			1	2		1		29
(Hektar)		674				129	150		110		1.063
HİS Göleti (Adet)		5							2		7
Onarım (Km)			6,0								6,0
Stabilize Kaplama (Km)	14,0	27,0		2,5	1,5	11,5					56,5
1. Kat Asfalt Kaplama (Km)		59,5	32,0		0,4	6,0	3,3	11,0			112,2
2. Kat asfalt Kaplama (Km)		58,5	96,0	62,5	41,0	70,8	98,0	12,3	44,5	38,0	521,6
Köyüçi Yolları Parke Taşı Kaplaması (m2)		23.204	239.170		4.134	50.574	20.040	19.652	46.247	9.509	412.530
Köprü (Adet)		2	1								3
Menfez (Adet)		14	3	2	1	2	8	7	5	3	45
Diğer		7					2	2	1		12
İçmesuyu (Adet)	2	53	23	7	4	15	13	11	28	19	175
Kuyu Sondajı (Adet)		24	12	4	4	1	1	1	6	1	54
Kanalizasyon (Adet)		29							4	5	38

KÖYDES Projesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı gerçek harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		KÖYDES				3.365.730	0	3.365.730	3.365.730	2.581.815	77		
		Ulaştırma				1.954.965	0	1.954.965	1.954.965	1.877.954	96		
		2. Kat Asfalt Kaplama (38 km)				1.644.642	0	1.644.642	1.644.642	1.560.214	95		
1	0000000000	Kızılıkdere - Ky.İlt (Bayramdere) Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (5 km)	KP	2014	2014	182.802	0	182.802	182.802	171.207	94	100	BT
2	0000000000	İly.İlt. - Erikler Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (7 km)	KP	2014	2014	257.443	0	257.443	257.443	240.640	93	100	BT
3	0000000000	İly.İlt - Karakoç - Ahmetçe Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2014	2014	145.026	0	145.026	145.026	135.446	93	100	BT
4	0000000000	Balaban-Sarpdere Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (8 km)	KP	2014	2014	376.444	0	376.444	376.444	372.302	99	100	BT
5	0000000000	Beyci - Tatlıpınar Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2014	2014	91.854	0	91.854	91.854	85.161	93	100	BT

KÖYDES Projesi Yatırımları (Devam-1)

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
6	0000000000.	Devletlağaç - Kocatarla Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2014	2014	91.073	0	91.073	91.073	84.890	93	100	BT
7	0000000000.	Ahmetbey - Emirali - Sakızköy Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (10 km)	KP	2014	2014	500.000	0	500.000	500.000	470.568	94	100	BT
		Parke Taşı Kaplaması (9.509 m²)				226.323	0	226.323	226.323	225.369	100		
8	0000000000.	K.eli Dolhan Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (2.030 m ²)	KP	2014	2014		0			45.566	0	100	BT
9	0000000000.	B.eski Oruçlu Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (1.011 m ²)	KP	2014	2014	35.000	0	35.000	35.000	23.482	67	100	BT
10	0000000000.	P.hisar Akören Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (481 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	12.399	83	100	BT
11	0000000000.	P.hisar Ataköy Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (484 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	10.918	73	100	BT
12	0000000000.	P.hisar Cevizköy Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (474 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	10.419	69	100	BT
13	0000000000.	P.hisar Çayırdere Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (460 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.162	74	100	BT
14	0000000000.	P.hisar Erenler Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (488 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.478	77	100	BT
15	0000000000.	P.hisar Evçiler Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (455 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	13.690	91	100	BT
16	0000000000.	P.hisar Hacıfaklı Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (345 m ²)	KP	2014	2014	12.323	0	12.323	12.323	12.656	103	100	BT
17	0000000000.	P.hisar İslambeyli Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (420 m ²)	KP	2014	2014	14.000	0	14.000	14.000	10.185	73	100	BT
18	0000000000.	P.hisar Kurudere Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (940 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	9.849	66	100	BT
19	0000000000.	P.hisar Osmancık Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (505 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	8.895	59	100	BT
20	0000000000.	P.hisar Poyralı Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (485 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.157	74	100	BT
21	0000000000.	P.hisar Sütlüce Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (447 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	21.514	143	100	BT
22	0000000000.	P.hisar Tozaklı Köyü Köyiçi Parke Taşı Kaplaması (484 m ²)	KP	2014	2014	15.000	0	15.000	15.000	11.999	80	100	BT
		Menfez İnşaatı (3 adet)				84.000	0	84.000	84.000	92.371	110		
23	0000000000.	B.eski Erikler Baks Menfez İnşaatı	KP	2014	2014		0			23.341	0		DE
24	0000000000.	Koçgaz Tastepe Menfez İnşaatı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	20.060	67	100	BT
25	0000000000.	L.burgaz Alacaoğlu Menfez İnşaatı	KP	2014	2014	54.000	0	54.000	54.000	48.970	91	100	BT
		DKH / Sosyal				1.410.765	0	1.410.765	1.410.765	703.861	50		
		DKH / Sosyal / İçmesuyu				807.774	0	807.774	807.774	470.856	58		
26	0000000000.	K.eli Asilbeyli Köyü gömme su depo onarımı	KP	2014	2014	33.260	0	33.260	33.260	27.612	83	100	BT
27	0000000000.	K.eli Dolhan Köyü içme suyu bakım onarım	KP	2014	2014	150.000	0	150.000	150.000	0	0	100	BT
28	0000000000.	K.eli Kayalı Grubu İçme Suyu Motopomp Alımı	KP	2014	2014		0			11.800	0	100	BT
29	0000000000.	K.eli Üsküpdere-Karınca (Grup) Köyleri gömme su depo onarımı	KP	2014	2014	43.740	0	43.740	43.740	35.282	81	100	BT
30	0000000000.	B.eski Dügüncülü Köyü İçme Suyu Sondaj Açılması	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	39.294	131	100	BT
31	0000000000.	B.eski Karabayır Köyü Gömme Su Depo Onarımı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	29.697	99	100	BT
32	0000000000.	B.eski Karamesutlu Köyü Ayaklı Su Depo İnşaatı	KP	2014	2014	260.000	0	260.000	260.000	0	0		DE
33	0000000000.	B.eski Kuleli Köyü Gömme Su Depo Onarımı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	29.697	99	100	BT
34	0000000000.	B.eski Kumrular Köyü Ayaklı Su Depo Onarımı	KP	2014	2014		0			28.314	0	100	BT
35	0000000000.	B.eski Yeniköy Köyü Gömme Su Depo Onarımı	KP	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	29.697	99	100	BT
36	0000000000.	Koçgaz Ahmetler Köyü İçme Suyu İkmal Onarımı	KP	2014	2014	52.000	0	52.000	52.000	45.000	87	100	BT
37	0000000000.	Koçgaz Terzidere Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	25.000	0	25.000	25.000	15.458	62	100	BT
38	0000000000.	Koçgaz Yukankanara Köyü İçme Suyu Terfi Hattı	KP	2014	2014	18.651	0	18.651	18.651	19.706	106	100	BT
39	0000000000.	L.burgaz Ceylanköy Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	31.770	0	31.770	31.770	51.920	163	100	BT
40	0000000000.	L.burgaz Karamusul Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	31.770	0	31.770	31.770	27.730	87	100	BT
41	0000000000.	L.burgaz Umurca Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	16.583	0	16.583	16.583	14.750	89	100	BT
42	0000000000.	P.hisar Akören Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	10.000	0	10.000	10.000	21.633	216	100	BT
43	0000000000.	P.hisar Evçiler Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	5.000	0	5.000	5.000	21.633	433	100	BT
44	0000000000.	P.hisar İslambeyli Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014		0			0	0		DE
45	0000000000.	P.hisar Poyralı Köyü İçme Suyu Depo Onarımı	KP	2014	2014	10.000	0	10.000	10.000	21.633	216	100	BT

KÖYDES Projesi Yatırımları (Devam-2)

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		DKH / Sosyal / Kanalizasyon				602.991	0	602.991	602.991	233.005	39		
46	0000000000	K.eli Davutlu Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014		0			24.839	0	100	BT
47	0000000000	B.eski Eriklyurdu Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	82.331	0	82.331	82.331	82.331	100	100	BT
48	0000000000	L.burgaz Davutlu Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014		0			0	0	100	BT
49	0000000000	P.köy Hıdırca Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	106.041	0	106.041	106.041	84.159	79	100	BT
50	0000000000	P.köy Kuştepe Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014		0			32.837	0	100	BT
51	0000000000	P.köy Kuştepe Kanalizasyonu Çürütme Tip Fosseptik Çukuru Yapımı	KP	2014	2014		0			8.839	0	0	İA
52	0000000000	Vize Aksicim Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	170.000	0	170.000	170.000	0	0		DE
53	0000000000	Vize Düzova Kanalizasyon İnşaatı	KP	2014	2014	244.619	0	244.619	244.619	0	0		DE

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nün 2014 yılında 16 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 914.358 liradır. 907.616 lira ödenek gönderilmiş ve 895.520 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 98 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 14 proje bitmiştir. 2 adet projeye başlanmamıştır.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler	İhale aşamasında kalan projeler	Yarım kalan projeler	Devam eden projeler	Biten projeler	Parasal leşme (%)
	Toplam	16	914.358	0	914.358	907.616	895.520	2	0	0	0	14	98
1	Tarım / Bitkisel Üretim	9	608.310	0	608.310	603.814	601.182	2	0	0	0	7	99
2	Tarım / Hayvancılık	3	258.501	0	258.501	256.671	247.207	0	0	0	0	3	96
3	Tarım / Su Ürünleri	2	10.000	0	10.000	9.594	9.594	0	0	0	0	2	96
4	İmalat	2	37.547	0	37.547	37.537	37.537	0	0	0	0	2	100

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü				914.358	0	914.358	907.616	895.520	98		
		Tarım				876.811	0	876.811	870.079	857.983	98		
		Bitkisel Üretim				608.310	0	608.310	603.814	601.182	99		
344	2009A020050	Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projesi	GB	2014	2014	16.500	0	16.500	16.199	16.199	98	100	BT
345	2010A020040	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2014	2014	218.200	0	218.200	217.539	214.907	98	100	BT
346	2010A020060	Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi	GB	2014	2014	36.000	0	36.000	35.780	35.780	99	100	BT
347	2012A020050	Türkiye Tarım Havzaları Geliştirme Projesi	GB	2014	2014		0				0	0	HB
348	2012A020060	Tarımsal Yayımlar Hizmetlerinin Desteklenmesi Projesi	GB	2014	2014	21.500	0	21.500	19.067	19.067	89	100	BT
349	2012A020110	Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2014	2014	30.000	0	30.000	29.984	29.984	100	100	BT
350	00000000000	İdari Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2014	2014	5.000	0	5.000	4.135	4.135	83	100	BT
351	00000000000	Nitrat Direktifinin Uygulanması Projesi	GB	2014	2014		0				0	0	HB
352	00000000000	Mera Hizmetleri	GB	2014	2014	281.110	0	281.110	281.110	281.110	100	100	BT
		Hayvancılık				258.501	0	258.501	256.671	247.207	96		
353	2003A030020	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2014	2014	150.385	0	150.385	150.385	147.643	98	100	BT
354	2010A030010	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	GB	2014	2014	104.116	0	104.116	104.116	97.394	94	100	BT
355	2013A030010	Hayvancılık Kooperatiflerinin Desteklenmesi Projesi	GB	2014	2014	4.000	0	4.000	2.170	2.170	54	100	BT

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Su Ürünleri				10.000	0	10.000	9.594	9.594	96		
356	1985A040220	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2014	2014	3.000	0	3.000	2.690	2.690	90	100	BT
357	2010A040050	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2014	2014	7.000	0	7.000	6.904	6.904	99	100	BT
		İmalat				37.547	0	37.547	37.537	37.537	100		
358	2009C010050	Gıda Hizmetleri	GB	2014	2014	30.547	0	30.547	30.547	30.547	100	100	BT
359	00000000000	Gıda Denetim Hizmetleri	GB	2014	2014	7.000	0	7.000	6.990	6.990	100	100	BT

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü'nün 2014 yılında 15 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 1.691.584 liradır. 2014 yılı programı 757.661 liradır. 757.657 lira ödenek gönderilmiş ve tamamı harcamıştır. Yüzde 100 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 8 proje bitmiştir. 7 proje devam etmektedir.

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	15	1.691.584	531.178	757.661	757.657	757.657	0	0	0	7	8	100
	Tarım / Bitkisel Üretim	15	1.691.584	531.178	757.661	757.657	757.657	0	0	0	7	8	100

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Tarım				1.691.584	531.178	757.661	757.657	757.657	100		
		Araştırma Projeleri (15 adet)				1.691.584	531.178	757.661	757.657	757.657	100		
		Tarımsal Meteoroloji ve İklim Değişikliği Araştırma Projeleri				566.000	100.500	295.500	295.500	295.500	100		
360	00000000000	Farklı Eğim Derecelerindeki Kor. ve Otlatılan Mera Baz. Is. Met. Bitki Örtüsü ve Su Erozyonuna Etkileri	GB	2008	2014	100.500	100.500	0	0	0	0	100	BT
361	00000000000	Ayçiçeği Bit. Aqua Crop Mod. İklim Değ. Olan Hassasiyetinin Analizi	GB	2014	2017	242.000	0	158.000	158.000	158.000	100	25	DE
362	00000000000	Trakya Böl. Yet. Buğday Çeş. Albedo Değ. Analizi ve Met. Kıs. Kat. Testi	GB	2014	2017	223.500	0	137.500	137.500	137.500	100	25	DE
		Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri				579.428	298.428	154.500	154.500	154.500	100		
363	00000000000	Çok Sayıda Bitki Besin El. Tek Bir Ekstraksiyonla Bel. Yön. Trakya Yör. Buğday Bit. İle Test EdilmesiTrakya Yör. Ayçiçeği Yetiş. Bor İht. Dur. Bel. ve Verim Üzerine Etkileri	GB	2014	2017	148.500	0	52.000	52.000	52.000	100	19	DE
364	00000000000	Trakya Yör. Ayçiçeği Yetiş. Bor İht. Dur. Bel. ve Verim Üzerine Etkileri	GB	2012	2014	146.428	131.428	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
365	00000000000	Kuru Koş. Ayçiçeğinin Azotlu Güb. Ön. İn. Olarak Kul. Param. ve Azotun Su Kul. Ran. Üz. Et. Ar.	GB	2013	2015	110.000	50.000	30.000	30.000	30.000	100	67	DE
366	00000000000	Trakya Yör. Tarım Top. Bitki Besin Mad. ve Pot. Toksit El. Kap. Bel., Veri Tab. Ol. ve Haritalanması	GB	2013	2014	174.500	117.000	57.500	57.500	57.500	100	100	BT

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma İstasyonu Müdürlüğü Yatırımları (Devam)

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırma Projeleri				387.406	0	294.657	294.657	294.657	100		
367	000000000000	Trakya Böl. Ayçiçeği Tarımında Kul. İmizdazolin Gr. Olan İmazamox Herbisit'inin Kal. Düz. Uy. Ort. Ve İlgili Gıda Ür. İzlenmesi ve Değerlendirilmesi	GB	2014	2016	193.056	0	157.507	157.507	157.507	100	18	DE
368	000000000000	Farklı Tuzluluk Düz. Sulama Sul. Serada yet. Bazı Bit. Verim - Kalite Par. Ve Toprak Profili Tuz. Etkisi	GB	2014	2017	194.350	0	137.150	137.150	137.150	100	25	DE
		Tarım Ekonomisi Araştırma Projeleri				57.000	50.000	7.001	7.000	7.000	100		
369	000000000000	Trakya Böl. Faal. Göş. Tarım İşl. Yapısal Öz. Etkinliklerinin Belirlenmesi	GB	2011	2014	36.000	36.000	1	0	0	0	100	BT
370	000000000000	K.eli, Edirne, T.dağ ve Ç.kale Ürt. İyi Tarım Uyg. Yak. Ve Uyg. Ekonomik Analizi	GB	2012	2014	21.000	14.000	7.000	7.000	7.000	100	100	BT
		Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Projeleri				101.750	82.250	6.003	6.000	6.000	100		
371	000000000000	İkinci Ür. Ayçiçeği ve İkinci Ür. Silajlık Mısır Üretiminde Uy. Far. Toprak İş. ve Ekim Yön. Tek. ve Ek. Yönden Arş.	GB	2008	2014	63.550	63.550	1	0	0	0	100	BT
372	000000000000	K.eli Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Saptanması	GB	2012	2014	4.250	4.250	1	0	0	0	100	BT
373	000000000000	Tarımsal Kaynaklı İş Kazalarının Tespiti ve Sonuçları (Kırklareli İli Örneği)	GB	2012	2014	4.250	4.250	1	0	0	0	100	BT
374	000000000000	Minimum Toprak İşl. Yön. Mera Top. Yap. Nem Dep. ve Verime Olan Et. Belirlenmesi	GB	2013	2016	29.700	10.200	6.000	6.000	6.000	100	50	DE

TMO Şube Müdürlüğü

TMO Şube Müdürlüğü'nün 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 4.424.000 liradır. 2014 yılı programı 2.785.634 liradır. 2.548.634 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 91 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Projeler tamamlanmıştır.

TMO Şube Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler (TL)	İhale aşamasında kalan projeler (TL)	Yarım kalan projeler (TL)	Devam eden projeler (TL)	Biten projeler (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	2	4.424.000	1.531.000	2.785.634	2.785.634	2.548.634	0	0	0	0	2	91
	Tarım / Bitkisel Üretim	2	4.424.000	1.531.000	2.785.634	2.785.634	2.548.634	0	0	0	0	2	91

TMO Şube Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklama
		TMO Şube Müdürlüğü				4.424.000	1.531.000	2.785.634	2.785.634	2.548.634	91		
		Tarım				4.424.000	1.531.000	2.785.634	2.785.634	2.548.634	91		
375	2011A020090	B.eski Depolama Tesisleri (10.000 ton YD)	KT	2011	2014	3.950.000	1.531.000	2.311.634	2.311.634	2.311.634	100	100	BT
376	000000000000	Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	KT	2013	2014	474.000	0	474.000	474.000	237.000	50	100	BT

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 2014 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 271.771 liradır. 202.640 lirası harcanarak % 75 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		4	271.771	0	271.771	202.640	202.640	0	0	0	0	4	75
1	Konut	1	100.000	0	100.000	87.320	87.320	0	0	0	0	1	87
2	DKH İktisadi / Genel İdare	3	171.771	0	171.771	115.320	115.320	0	0	0	0	3	67

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü				271.771	0	271.771	202.640	202.640	75		
		Konut				100.000	0	100.000	87.320	87.320	87		
377	2014G000370	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Lojmanları Bakım ve Onarımı	GB	2014	2014	100.000	0	100.000	87.320	87.320	87	100	BT
		DKH / İktisadi / Genel İdare				171.771	0	171.771	115.320	115.320	67		
378	2014K090080	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	GB	2014	2014	80.000	0	80.000	62.957	62.957	79	100	BT
379	2014K090080	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı (Trafo Kurulumu)	GB	2014	2014	80.000	0	80.000	40.592	40.592	51	100	BT
380	2014K090080	Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı (Kazan Dairesi Isı Yalıtımı)	GB	2014	2014	11.771	0	11.771	11.771	11.771	100	100	BT

Valilik

Valiliğin 2014 yılında 3 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 11.318.362 liradır. 2014 yılı programı 3.720.283 liradır. 2.115.705 lira ödenek gönderilmiş ve tamamı harcanmıştır. Yüzde 57 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir.

Valilik Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		3	11.318.362	0	3.720.283	2.115.705	2.115.705	0	0	0	2	1	57
1	DKH İktisadi / Genel İdare	3	11.318.362	0	3.720.283	2.115.705	2.115.705	0	0	0	2	1	57

Valilik Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Valilik				11.318.362	0	3.720.283	2.115.705	2.115.705	57		
		DKH / İktisadi / Genel İdare				11.318.362	0	3.720.283	2.115.705	2.115.705	57		
381	000000000000	İl Göç İdaresi Müdürlüğü Hizmet Binası Bakım ve Onarımı	GB	2014	2014	150.862	0	150.862	146.583	146.583	97	100	BT
382	000000000000	P.köy Kabul ve Barınma Merkezi Kanalizasyon ve Elektrik İşleri	GB	2014	2015	429.500	0	69.421	69.421	69.421	100		DE
383	1985K010190	Lüleburgaz Hükümet Konağı İnşaatı	GB	2013	2016	10.738.000	0	3.500.000	1.899.701	1.899.701	54		DE

İl Jandarma Komutanlığı

İl Jandarma Komutanlığı'nın 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 550.000 lira olup, 227.072 harcama gerçekleştirilerek projenin parasal gerçekleşme oranı % 41'dir. Projeler devam etmektedir.

İl Jandarma Komutanlığı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	2	550.000	0	550.000	550.000	227.072	0	0	0	2	0	41
1	Konut	1	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	0	1	0	0
2	DKH İktisadi / Güvenlik Hizmetleri	1	450.000	0	450.000	450.000	227.072	0	0	0	1	0	50

İl Jandarma Komutanlığı Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İl Jandarma Komutanlığı				550.000	0	550.000	550.000	227.072	41		
		Konut				100.000	0	100.000	100.000	0	0		
384	000000000000	Jandarma Lojmanlarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	0	0		DE
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				450.000	0	450.000	450.000	227.072	50		
385	000000000000	Jandarma Hizmet Binalarının Isı Yalıtımının Yapılması ve Engellilere Uygun Hale Getirilmesi	GB	2014	2014	450.000	0	450.000	450.000	227.072	50		DE

İl Emniyet Müdürlüğü

İl Emniyet Müdürlüğü'nün 2014 yılında 4 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 3.665.067 liradır. 2014 yılı programı 2.970.192 liradır. 713.301 lira ödenek gönderilmiş ve bu ödeneğin tamamı harcanmıştır. Yüzde 24 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje devam etmektedir. 2 projeye başlanmamıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	4	3.665.067	694.875	2.970.192	713.301	713.301	2	0	0	2	0	24
1	DKH İktisadi / Güvenlik Hizmetleri	4	3.665.067	694.875	2.970.192	713.301	713.301	2	0	0	2	0	24

İl Emniyet Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İl Emniyet Müdürlüğü				3.665.067	694.875	2.970.192	713.301	713.301	24		
		DKH / İktisadi / Güvenlik Hizmetleri				3.665.067	694.875	2.970.192	713.301	713.301	24		
386	2012K020030	K.eli Polis Merkezi Amirliği Hizmet Binası (Etüd - Proje)	GB	2012	2014	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
387	2012K020030	Koçgaz İlçe Emniyet Amirliği Hizmet Binası (Etüd - Proje)	GB	2012	2014	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
388	000000000000	Makine Teçhizat Alımı	GB	2013	2014	88.129	38.129	50.000	50.000	50.000	100		DE
389	000000000000	Hizmet Binaları Bakım ve Onarımları	GB	2012	2014	3.476.938	656.746	2.820.192	663.301	663.301	24		DE

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2014 yılında 18 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 76.419.399 liradır. 2014 yılı programı 26.236.280 liradır. 14.420.027 lira ödenek gönderilmiş ve 13.213.215 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 50 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 6 proje bitmiştir. 6 proje devam etmektedir. 6 projeye başlanmamıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		18	76.419.399	13.275.468	26.236.280	14.420.027	13.213.215	6	0	0	6	6	50
1	Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim	12	42.280.096	5.786.283	15.986.162	12.510.860	12.248.360	4	0	0	4	4	77
2	Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim	6	34.139.303	7.489.185	10.250.118	1.909.167	964.855	2	0	0	2	2	9

İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2014 yılında 12 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 42.280.096 liradır. 2014 yılı programı 15.986.162 liradır. 12.510.860 lira ödenek gönderilmiş ve 12.248.360 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 77 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 4 proje bitmiştir. 4 proje devam etmektedir. 4 projeye başlanmamıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık
		Eğitim / İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				42.280.096	5.786.283	15.986.162	12.510.860	12.248.360	77		
		İlkokul İnşaatları (40 drs)				8.500.000	15.930	2.674.119	886.640	886.640	33		
390	000000000000	K.eli Kavaklı Atatürk İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2015	2.500.000	7.670	1.904.119	866.372	866.372	45		DE
391	000000000000	L.burgaz Gündoğdu (İstiklal) Mah. İlkokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2015	3.500.000	8.260	420.000	17.720	17.720	4	0	HB
392	000000000000	Vize Devlet Mah. İlkokulu İnş. (12 drs)	GB	2013	2015	2.500.000	0	350.000	2.548	2.548	1	0	HB
		Ortaokul İnşaatları (48 drs)				10.183.994	1.550.498	2.445.304	1.547.721	1.547.721	63		
393	000000000000	K.eli Karacaibrahim Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2015	3.500.000	7.198	530.302	14.564	14.564	3		DE
394	000000000000	D.köy Fatih Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2012	2014	3.183.994	1.527.050	1.656.944	1.516.157	1.516.157	92	69	DE
395	000000000000	L.burgaz Zafer Mah. Ortaokulu İnş. (16 drs)	GB	2013	2015	3.500.000	16.250	258.058	17.000	17.000	7	0	HB
		Lise İnşaatları (16 drs)				4.100.002	2.708.530	1.391.472	954.789	954.789	69		
396	1994H010080	Pınarhisar Anadolu Lisesi İnşaatı (16 Drs, 5.691 m ²)	GB	2011	2014	4.100.002	2.708.530	1.391.472	954.789	954.789	69	100	BT
		Yurt ve Pansiyon İnşaatları				17.000.000	1.511.325	6.979.167	6.625.610	6.363.110	91		
397	000000000000	K.eli TOBB Lisesi Öğrenci Pansiyonu İnşaatı (200 öğr.)	DG	2014	2015	4.500.000	0	1.299.925	1.299.925	1.299.925	100	30	DE
398	1997H010270	B.eski Öğrenci Pansiyonu İnşaatı (200 öğr.)	GB	2012	2015	4.000.000	1.183.761	2.367.674	2.367.674	2.367.674	100	100	BT
399	1997H010270	L.burgaz R. Yaman Fen Lisesi Öğrenci Pansiyon İnşaatı (200 öğr.)	GB	2012	2014	4.000.000	327.564	3.049.068	2.695.511	2.695.511	88	100	BT
400	000000000000	P.hisar Öğrenci Pansiyon İnşaatı (200 öğr.)	GB	2014	2015	4.500.000	0	262.500	262.500	0	0	0	HB
		Diğerleri				2.496.100	0	2.496.100	2.496.100	2.496.100	100		
401	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2014	2014	2.496.100	0	2.496.100	2.496.100	2.496.100	100	100	BT

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bakım ve Onarımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Ağırlık Malar
		Eğitim / Genel ve Orta Öğretim				2.491.100	0	2.496.100	2.496.100	2.496.100	100		
		İlkokul Bakım ve Onarımları				1.348.100	0	1.348.100	1.348.100	1.348.100	100		
1	000000000000	K.eli Merkez Kırkşehitler İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
2	000000000000	K.eli Merkez Kocahıdır İlkokulu Bakım ve Onarımı (Doğal Gaz Dönüşümü)	Öİ	2014	2014	38.100	0	38.100	38.100	38.100	100	100	BT
3	000000000000	K.eli Merkez Mustafa Dalcı İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
4	000000000000	K.eli Merkez Vali Faik Üstün İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
5	000000000000	K.eli Merkez İnce İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
6	000000000000	K.eli Merkez Üsküp Atatürk İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
7	000000000000	Babaeski Cumhuriyet İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
8	000000000000	Babaeski Fatih İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
9	000000000000	Babaeski Gaziosmanpaşa İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	BT
10	000000000000	Babaeski Plevne İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	75.000	0	75.000	75.000	75.000	100	100	BT
11	000000000000	Lüleburgaz Cumhuriyet İlk/Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
12	000000000000	L.Burgaz Durak İlk/Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	85.000	0	85.000	85.000	85.000	100	100	BT
13	000000000000	L.burgaz Gazi Mustafa Kemal İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
14	000000000000	L.burgaz İstiklal İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
15	000000000000	L.burgaz Kocasinan İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
16	000000000000	L.burgaz Ramazan Yaman İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	75.000	0	75.000	75.000	75.000	100	100	BT
17	000000000000	L.burgaz Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	70.000		70.000	70.000	70.000	100	100	BT
18	000000000000	L.Burgaz Şaban Ögünç İlkokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
		Ortaokul Bakım ve Onarımları				940.000	0	940.000	940.000	940.000	100		
19	000000000000	K.eli Merkez Ahmet Mithat Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
20	000000000000	K.eli Merkez Cumhuriyet Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
21	000000000000	K.eli İnce Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
22	000000000000	K.eli Kavaklı Şehit Varol Çalışkan Ortaokulu Bakım ve onarımı	Öİ	2014	2014	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
23	000000000000	K.eli Üsküp Atatürk Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
24	000000000000	Babaeski Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
25	000000000000	Babaeski Atatürk Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
26	000000000000	Babaeski Alpulu Şeker Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
27	000000000000	Lüleburgaz Hürriyet Ortaokulu Bakım Ve Onarımı	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
28	000000000000	Lüleburgaz Ortaokulu Bakım ve onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
29	000000000000	Lüleburgaz TEK Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
30	000000000000	Koçgaz Atatürk Ortaokulu Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
		Genel Lise Bakım ve Onarımları				96.000	0	96.000	96.000	96.000	100		
31	000000000000	K.eli Atatürk Anadolu Lisesi ve Pansiyonu Bakım ve Onarımı (Mantolama)	Öİ	2014	2014	96.000	0	96.000	96.000	96.000	100	100	BT
		Diğer Bakım ve Onarımlar				107.000	0	112.000	112.000	112.000	100		
32	000000000000	K.eli Eğitim Uygulama ve İş Eğitim Merkezi Doğal Gaz Dönüşümü	Öİ	2014	2014	45.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
33	000000000000	P.hisar Halk Eğitim Merkezi Bakım ve Onarımı (Mantolama)	Öİ	2014	2014	62.000	0	62.000	62.000	62.000	100	100	BT

Mesleki ve Teknik Eğitim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2014 yılında mesleki ve teknik alanında 6 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 34.139.303 liradır. 2014 yılı programı 10.250.118 liradır. 1.909.167 lira ödenek gönderilmiş ve 964.855 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 9 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir. 2 projeye başlanmamıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Eğitim / Mesleki ve Teknik Eğitim						34.139.303	7.489.185	10.250.118	1.909.167	964.855	9		
Lise İnşaatları (76 derslik)						33.410.963	7.489.185	9.521.778	1.180.827	236.515	2		
402	1983H020010	K.eli Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi (12 Drs, 60 yt. uyg. oteli (9.400 m2))	GB	2010	2014	9.410.963	7.474.081	1.936.882	193.004	193.004	10	100	BT
403	1991H020610	K.eli Anadolu Sağlık Meslek Lisesi (16 Drs)	GB	2013	2015	8.000.000	6.844	1.243.156	612.500	18.188	1		DE
404	000000000000	B.eski İmam Hatip Lisesi (16 Drs)	GB	2014	2015	6.500.000	0	227.500	227.500	0	0	0	HB
405	000000000000	L.burgaz TPAO Kız Meslek Lisesi (24 derslik)	DG	2013	2014	6.000.000	8.260	5.991.740	25.323	25.323	0		DE
406	000000000000	L.burgaz Mesleki Eğitim Merkezi İnşaatı (8 Drs)	GB	2014	2015	3.500.000	0	122.500	122.500	0	0	0	HB
Diğerleri						728.340	0	728.340	728.340	728.340	100		
407	000000000000	Bakım ve Onarımlar	GB	2014	2014	728.340	0	728.340	728.340	728.340	100	100	BT

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Bakım ve Onarımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
Eğitim / Mesleki ve Teknik						728.340	0	728.340	728.340	728.340	100		
Mesleki ve Teknik Lise Bakım ve Onarımları						728.340	0	728.340	728.340	728.340	100		
1	000000000000	K.eli Endüstri Meslek Lisesi Sentetik Çim Saha Yapımı	Öİ	2014	2014	83.000	0	83.000	83.000	83.000	100	100	BT
2	000000000000	K.eli Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Pansiyonu Çatı Onarımı	Öİ	2014	2014	84.450	0	84.450	84.450	84.450	100	100	BT
3	000000000000	K.eli Sağlık Meslek Lisesi Bakım ve Onarımı (mantolama ve Doğal Gaza Dönüşüm)	Öİ	2014	2014	91.125	0	91.125	91.125	91.125	100	100	BT
4	000000000000	K.eli Kız Meslek Lisesi Bakım ve Onarımı (Mantolama ve Onarım)	Öİ	2014	2014	105.125	0	105.125	105.125	105.125	100	100	BT
5	000000000000	B.eski Endüstri Meslek Lisesi Bakım ve Onarımı (Mantolama)	Öİ	2014	2014	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
6	000000000000	L.burgaz Ticaret Meslek Lisesi Bakım ve Onarımı (Mantolama)	Öİ	2014	2014	108.780	0	108.780	108.780	108.780	100	100	BT
7	000000000000	L.burgaz İmam Hatip Lisesi Bakım ve Onarımı (Mantolama)	Öİ	2014	2014	65.860	0	65.860	65.860	65.860	100	100	BT
8	000000000000	P.köy Çok Programlı Lisesi Çatı ve Genel Onarımı	Öİ	2014	2014	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	BT
9	000000000000	P.hisar METEM Atölye Bakım ve Onarımı	Öİ	2014	2014	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	BT

İl Sağlık Müdürlüğü

İl Sağlık Müdürlüğü'nün 2014 yılında 18 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 157.377.532 liradır. 2014 yılı programı 12.154.345 liradır. 7.991.079 lira ödenek gönderilmiş ve 6.314.871 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 52 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 3 proje bitmiştir. 8 proje devam etmektedir. 1 proje ihale aşamasındadır. 6 projeye başlanmamıştır.

İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje Sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler (TL)	İhale aşamasında kalan projeler (TL)	Yarım kalan projeler (TL)	Devam eden projeler (TL)	Biten projeler (TL)	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		18	157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	6	1	0	8	3	52
1	Sağlık	18	157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	6	1	0	8	3	52

İl Sağlık Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		İl Sağlık Müdürlüğü				157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	52		
		Sağlık				157.377.532	17.895.104	12.154.345	7.991.079	6.314.871	52		
		Devlet Hastanesi İnşaatları				141.826.960	17.326.960	5.800.003	2.300.000	1.302.860	22		
408	1991I000030	Kırklareli Devlet Hastanesi İnşaatı (250 Yt, 40.279 m ²)	GB	2014	2016	52.000.000	0	3.000.000	0	0	0	21	DE
409	1991I000040	Babaeski Devlet Hastanesi İnşaatı (100 Yt, 16.547 m ²)	GB	2005	2015	16.756.000	16.756.000	1	0	0	0	100	BT
410	000000000000	Lüleburgaz Devlet Hastanesi İnşaatı (300 Yt)	GB	2014	2016	58.500.000	0	1	0	0	0	0	İA
411	000000000000	Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Ek Bina İnşaatı	GB	2013	2014	2.870.960	570.960	2.300.000	2.300.000	1.302.860	57	100	BT
412	1991I000040	Pınarhisar Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt, 5.000 m ²)	GB	2014	2016	5.850.000	0	500.000	0	0	0	29	DE
413	000000000000	Vize Devlet Hastanesi İnşaatı (30 Yt)	GB	2014	2016	5.850.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatları				4.753.743	0	4.753.743	4.381.325	4.381.325	92		
414	2005I001400	K.eli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (20 ünit, 3.147 m ²)	GB	2014	2015	4.753.742	0	4.753.742	4.381.325	4.381.325	92	100	BT
415	2005I001400	L.burgaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi İnşaatı (50 ünit, m ²)	GB	2014	2016	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğer İnşaatlar				9.150.001	0	800.001	600.000	0	0		
416	000000000000	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İl Sağlık Md, VSD, AÇSAP, 112 ASHİ, 112 KKM)	GB	2014	2015	8.500.000	0	150.000	150.000	0	0	0	HB
417	2006I001500	D.köy Sağlık Birimleri İnşaatı (3-4 hekimlik TSM, ASM, 112 ASH)	GB	2014	2015	500.000	0	500.000	300.000	0	0	0	HB
418	000000000000	L.burgaz Sağlık Kompleksi İnşaatı (İlçe Sağlık Md, TSM, 112 ASHİ)	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
419	000000000000	B.eski Pancarköy Sağlık Evi İnşaatı	GB	2012	2014	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	HB
		Diğerleri				1.646.828	568.144	800.598	709.754	630.686	79		
420	000000000000	Devlet Hastaneleri Büyük Onarımı	GB	2013	2014	138.487	67.691	70.796	70.796	64.958	92		DE
421	000000000000	Sağlık Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2012	2014	814.953	422.003	114.864	49.560	49.560	43		DE
422	000000000000	Acil Yardım UMKE Haberleşme Sistemlerinin İyileştirilmesi	GB	2014	2014	281.314	0	281.314	258.084	258.084	92		DE
423	000000000000	112 Acil Yardım İstasyonları Bakım ve Onarımları	GB	2014	2014	50.000	0	50.000	50.000	0	0		DE
424	000000000000	İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Bağlı Kuruluşları Büyük Onarımları	GB	2013	2014	80.760	78.450	2.310	0	0	0		DE
425	000000000000	UMKE Haberleşme Sistemlerinin İyileştirilmesi	GB	2014	2014	281.314	0	281.314	281.314	258.084	92		DE

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nün 2014 yılında 14 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı ve 2014 yılı programı 260.694 liradır. 260.694 lira ödenek gönderilmiş ve 155.036 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 59 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 proje bitmiştir. 2 proje devam etmektedir. 10 projeye başlanmamıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		14	260.694	0	260.694	260.684	155.036	10	0	0	2	2	59
1	DKH Sosyal / Sosyal İçerme	14	260.694	0	260.694	260.684	155.036	10	0	0	2	2	59

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Tutarı	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü						260.694	0	260.694	260.684	155.036	59		
DKH / Sosyal / Sosyal İçerme						260.694	0	260.694	260.684	155.036	59		
426	000000000000	Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası İnşaatı	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
427	000000000000	Mülga Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binasının Bir Kısımının Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binasına Dönüştürülmesi	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
428	000000000000	Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası Tefrişatı	GB	2014	2014	75.000	0	75.000	75.000	13.412	18		DE
429	000000000000	L.burgaz Sosyal Hizmet Merkezi'nin Alması ve Tefrişatı	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
430	000000000000	K.eli Huzurevi Doğal Gaz Dönüşümü	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
431	000000000000	K.eli Huzurevi Engelli Erişilebilirliğinin Sağlanması	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
432	000000000000	Mülga Çocuk Yuvası ve Kız Yetiştirme Yurdunun Huzurevine Dönüştürülmesi	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
433	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı Proje Temini İş	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
434	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı	GB	2013	2015	1	0	1	0	0	0	0	HB
435	000000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Dış Cephe İzolasyon Kaplaması	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
436	000000000000	L.burgaz R.Yaman Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Kamera Sistemi Kurulması	GB	2014	2014	1	0	1	0	0	0	0	HB
437	000000000000	Mülga Yetiştirme Yurdu Müdürlüğü Hizmet Binasının Bir Kısımının Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Hizmet Binasına Dönüştürülmesi	GB	2014	2014	119.674	0	119.674	119.674	99.533	83	100	BT
438	000000000000	Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Hizmet Binası Depreme Dayanıklılık Tespiti	GB	2014	2014	35.656	0	35.656	35.656	35.341	99	100	BT
439	000000000000	K.eli Kadın Konuk Evi Tefrişatı	GB	2014	2014	30.354	0	30.354	30.354	6.750	22		DE

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nün 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 30.100.000 liradır. 2014 yılı programı 10.000.000 liradır. 7.233.036 ödenek gönderilmiş ve tamamı harcanmıştır. yüzde 72 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. Proje devam etmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		1	30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	0	0	0	1	0	72
1	DKH Sosyal / Yerleşme Şehirleşme	1	30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	0	0	0	1	0	72

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü				30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	72		
		DKH / Sosyal / Yerleşme Şehirleşme				30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	72		
440	000000000000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2014	30.100.000	20.069.129	10.000.000	7.233.036	7.233.036	72	85	DE

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2014 yılında 8 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 24.925.000 liradır. 2014 yılı programı 5.125.099 liradır. Bu ödeneğin tamamı gönderilmiş ve 3.862.024 lira harcama yapılmıştır. Yüzde 75 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje bitmiştir. 7 proje devam etmektedir.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamada kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		8	24.925.000	4.919.050	5.125.099	5.125.098	3.862.024	0	0	1	6	1	75
1	Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor	4	15.625.000	2.935.642	2.160.771	2.160.770	2.110.216	0	0	1	2	1	98
2	DKH Sosyal / Sosyal İçerme	4	9.300.000	1.983.408	2.964.328	2.964.328	1.751.808	0	0	0	4	0	59

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü				24.925.000	4.919.050	5.125.099	5.125.098	3.862.024	75		
		Eğitim / Beden Eğitimi ve Spor				15.625.000	2.935.642	2.160.771	2.160.770	2.110.216	98		
441	000000000000	K.eli Atatürk Stadı Protokol ve Seyirci Yeri Düzenlemesi	GB	2014	2015	7.000.000	0	500.000	500.000	450.446	90	20	DE
442	1990H050050	K.eli Kapalı Yüzme Havuzu İnşaatı	GB	2012	2014	5.500.000	2.000.172	850.770	850.770	850.770	100	55	DE
443	1990H050050	K.eli Sentetik Atletizm Pisti Yapımı	GB	2012	2014	2.050.000	935.470	1	0	0	0	55	YK
444	000000000000	B.eski Spor Salonu Bakım ve Onarımı	GB	2013	2014	1.075.000	0	810.000	810.000	809.000	100	100	BT
		DKH / Sosyal / Sosyal İçerme				9.300.000	1.983.408	2.964.328	2.964.328	1.751.808	59		
445	1990K170050	K.eli Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2012	2014	2.750.000	1.983.408	264.328	264.328	264.328	100	95	DE
446	000000000000	B.eski Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	900.000	0	900.000	900.000	680.610	76	95	DE
447	1990K170050	L.burgaz Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2013	2014	2.650.000	0	1.500.000	1.500.000	806.870	54	55	DE
448	000000000000	P.hisar Gençlik Merkezi İnşaatı	GB	2014	2015	3.000.000	0	300.000	300.000	0	0		DE

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün 2014 yılında 5 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 3.933.533 liradır. 933.533 lira gönderilmiş ve 469.000 lira harcanmıştır. Yüzde 50 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 2 projenin 2014 yılı çalışmaları tamamlanmıştır. 1 proje çalışmaları devam etmektedir. 2 projeye başlanamamıştır.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		5	3.933.533	0	933.535	933.533	469.000	2	0	0	1	2	50
1	Turizm	1	2.000.000	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
2	Eğitim / Kültür	4	1.933.533	0	933.534	933.533	469.000	1	0	0	1	2	50

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				3.933.533	0	933.535	933.533	469.000	50		
		Turizm				2.000.000	0	1	0	0	0		
449	000000000000	Dupnisa Mağarası Çevre Düzenlemesi ve Aydınlatması	GB	2014	2014	2.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Eğitim / Kültür				1.933.533	0	933.534	933.533	469.000	50		
450	000000000000	Kırklareli Evi Bakım ve Onarımı Teşhir ve Tanzimi	GB	2014	2014	1.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
451	000000000000	Vize Anfi Tiyatro Çevre Düzenlemesi	GB	2014	2014	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
452	000000000000	Kırklareli Höyüğü Kazı Çalışmaları	GB	2014	2014	254.000	0	254.000	254.000	254.000	100	100	BT
453	2013H040250	D.köy Fatih Dökümanesi Kazı Çalışmaları ve Ören Yeri Düzenlemesi	GB	2014	2014	669.533	0	669.533	669.533	205.000	31		DE

Defterdarlık

Defterdarlığın 2014 yılında 2 proje uygulaması mevcuttur. Bu projelerin toplam tutarı 2.588.500 liradır. 2014 yılı programı 576.995 liradır. 372.260 lira ödenek gönderilmiş ve 67.260 lira harcanmıştır. Yüzde 12 parasal gerçekleşme sağlanmıştır. 1 proje devam etmektedir. 1 projeye başlanmamıştır.

Defterdarlık Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan projeler sayısı	İhale aşamasında kalan projeler sayısı	Yarım kalan projeler sayısı	Devam eden projeler sayısı	Biten projeler sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		2	2.588.500	11.505	576.995	372.260	67.260	1	0	0	1	0	12
1	DKH Sosyal / Genel İdare	2	2.588.500	11.505	576.995	372.260	67.260	1	0	0	1	0	12

Defterdarlık Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Defterdarlık				2.588.500	11.505	576.995	372.260	67.260	12		
		DKH / İktisadi / Genel İdare				2.588.500	11.505	576.995	372.260	67.260	12		
454	2000K010650	B.eksi Vergi Dairesi İnşaatı Proje Yapımı	GB	2013	2014	88.500	11.505	76.995	67.260	67.260	87	89	DE
455	2000K010650	B.eksi Vergi Dairesi İnşaatı	GB	2012	2016	2.500.000	0	500.000	305.000	0	0	0	HB

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü'nün 2014 yılında 1 proje uygulaması mevcuttur. Bu projenin toplam tutarı 2.900.000 liradır. 2014 yılı programı 700.000 liradır. Projeye henüz başlanmamıştır.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Kuruluş adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşamasında kalan proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
	Toplam	1	2.900.000	0	700.000	0	0	1	0	0	0	0	0
1	DKH Sosyal / Genel İdare	1	2.900.000	0	700.000	0	0	1	0	0	0	0	0

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Yatırımları

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü				2.900.000	0	700.000	0	0	0	0	
		DKH / İktisadi / Genel İdare				2.900.000	0	700.000	0	0	0	0	
456	2012K160150	Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Hizmet Binası (Etüd, Proje ve İnşaat)	GB	2014	2017	2.900.000	0	700.000	0	0	0	0	HB

Üçüncü Bölüm: Belediye Yatırımları

0 Genel Durum

2014 yılında, ilimizde 21 belediye tarafından 107 proje uygulanmıştır. Bu projelerin toplam tutarı 135.439.851 lira, 2014 yılı programı 91.877.672.099 liradır. Yıl sonu itibariyle 56.067.493 lira harcama yapılmış ve yüzde 61 parasal gerçekleşme sağlanmıştır.

27 proje bitmiştir. 42 proje devam etmektedir. 36 projeye başlanmamıştır.

Belediyelerin 2014 Yılı Yatırımları Gerçekleşme Durumu

Sıra No	Belediye adı	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Hiç başlanmayan proje sayısı	İhale aşama sında proje sayısı	Yarım kalan proje sayısı	Devam eden proje sayısı	Biten proje sayısı	Parasal gerçekleşme (%)
Toplam		107	135.439.851	6.305.371	91.877.672	58.045.232	56.067.493	36	0	2	42	27	61
1	Kırklareli	1	1.000.000	0	511.000	300.000	295.930	0	0	0	1	0	58
2	İnece	7	710.290	135.192	575.073	0	0	5	0	0	2	0	0
3	Kavaklı	1	150.000	32.569	100.000	0	0	0	0	0	1	0	0
4	Üsküp	1	302.000	159.527	142.132	142.132	142.132	0	0	0	0	1	100
5	Babaeski	3	33.856.000	0	33.856.000	25.500.000	25.242.236	0	0	0	1	2	75
6	Alpullu	6	69.000	0	69.000	11.000	5.731	4	0	0	2	0	8
7	Büyükmandıra	6	438.402	0	438.402	438.402	434.947	0	0	0	0	6	99
8	Karahalil	2	640.357	266.446	373.911	373.911	373.911	0	0	0	0	2	100
9	Demirköy	4	255.000	0	255.000	161.545	150.305	0	0	0	0	4	59
10	İğneada	2	885.864	0	352.432	352.432	0	2	0	0	0	0	0
11	Kofçaz	2	3.000.000	50.000	407.500	407.500	293.056	0	0	0	2	0	72
12	Lüleburgaz	8	26.420.000	0	26.420.000	16.470.000	15.358.937	1	0	0	7	0	58
13	Ahmetbey	13	25.569.510	1.171.814	5.862.549	1.466.247	1.451.185	5	0	0	4	4	25
14	Büyükkarıştıran	9	9.765.000	0	9.715.000	8.880.000	8.821.958	3	0	0	2	4	91
15	Evrensekiz	7	7.560.000	2.890.050	4.657.650	1.660.214	1.652.465	3	0	0	1	3	35
16	Pehlivan köyü	6	2.700.000	556.641	250.005	0	0	4	0	2	0	0	0
17	Pınarhisar	13	9.479.000	901.250	2.266.250	1.716.250	1.681.662	2	0	0	10	1	74
18	Kaynarca	2	28.000	0	28.000	0	0	2	0	0	0	0	0
19	Vize	6	5.162.268	0	5.162.268	0	0	4	0	0	2	0	0
20	Çakıllı	6	2.323.160	141.882	425.500	155.599	153.038	0	0	0	6	0	36
21	Kıyıköy	2	5.126.000	0	10.000	10.000	10.000	1	0	0	1	0	100

1 Kırklareli Belediyesi

Kırklareli Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Kırklareli				1.000.000	0	511.000	300.000	295.930	58		
		Yol				1.000.000	0	511.000	300.000	295.930	58		
1	000000000000.	Muhtelif Cadde ve Sokakların Parke taş Yapım İşİ	BL	2014	2014	1.000.000		511.000	300.000	295.930	58		DE

2 İnece Belediyesi

İnece Belediyesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		İnece				710.290	135.192	575.073	0	0	0		
		Yol				149.592	5.192	144.375	0	0	0		
2	000000000000.	Bordür ve Kilit parke Taş Döşeme	BL	2012	2014	6.517	5.192	1.300	0	0	0	85	DE
3	000000000000.	Yol Parke Taşı Kaplaması (5000 m ²)	BL	2014	2014	143.075	0	143.075	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				560.698	130.000	430.698	0	0	0		
4	000000000000.	Mezarlık Düzenlemesi	BL	2014	2014	204.848	0	204.848	0	0	0	0	HB
5	000000000000.	Kentsel Dönüşüm Projesi (Ulukonak Mah.)	BL	2013	2014	180.000	130.000	50.000	0	0	0	70	DE
6	000000000000.	İmar Planı Yapımı (Ulukonak Mah.)	BL	2014	2014	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
7	000000000000.	Çatı Tamirâtı Yapımı-Belediye Pasajı	BL	2014	2014	28.393	0	28.393	0	0	0	0	HB
8	000000000000.	Bucak Binası Tadilatı ile Kültür Evine Dönüştürülmesi	BL	2014	2014	47.457	0	47.457	0	0	0	0	HB

3 Kavaklı Belediyesi

Kavaklı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Kavaklı				150.000	32.569	100.000	0	0	0		
		Yol				150.000	32.569	100.000	0	0	0		
9	000000000000.	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2011	2014	150.000	32.569	100.000		0	0		DE

4 Üsküp Belediyesi

Üsküp Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Üsküp				302.000	159.527	142.132	142.132	142.132	100		
		Diğerleri				302.000	159.527	142.132	142.132	142.132	100		
10	000000000000	Çevre Kirliliğinin Giderilmesi	BL	2013	2014	302.000	159.527	142.132	142.132	142.132	100	100	BT

5 Babaeski Belediyesi

Babaeski Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Babaeski				33.856.000	0	33.856.000	25.500.000	25.242.236	75		
		Yol				2.000.000	0	2.000.000	1.250.000	1.218.932	61		
11	000000000000	Bozulan Yolların Bakım Onarımı	BL	2014	2014	2.000.000	0	2.000.000	1.250.000	1.218.932	61	80	BT
		Su				10.856.000	0	10.856.000	6.250.000	6.248.604	58		
12	000000000000	İçme Suyu Şebeke İnşaatı	BL	2013	2014	10.856.000	0	10.856.000	6.250.000	6.248.604	58	80	DE
		Kanalizasyon				21.000.000	0	21.000.000	18.000.000	17.774.700	85		
13	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı Yapım İş	BL	2013	2014	21.000.000	0	21.000.000	18.000.000	17.774.700	85	100	BT

6 Alpullu Belediyesi

Alpullu Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Alpullu				69.000	0	69.000	11.000	5.731	8		
		Yol				15.000	0	15.000	1.000	307	2		
14	000000000000	Yol Yapımı	BL	2014	2014	15.000	0	15.000	1.000	307	2		DE
		Su				10.000	0	10.000	10.000	5.424	54		
15	000000000000	İçmesuyu Tesisi	BL	2014	2014	10.000	0	10.000	10.000	5.424	54		DE
		Kanalizasyon				5.000	0	5.000	0	0	0		
16	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapımı	BL	2014	2014	5.000	0	5.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				39.000	0	39.000	0	0	0		
17	000000000000	Plan Proje Alımı ve Gideri (Kanalizasyon Projesi Hazırlanması)	BL	2014	2014	6.000	0	6.000	0	0	0	0	HB
18	000000000000	Kamulaştırma	BL	2014	2014	4.000	0	4.000	0	0	0	0	HB
19	000000000000	Gayrimenkul Büyük Onarım (İnşaat, Elektrik, Sıhhi Tesisat ve Diğer Giderler)	BL	2013	2014	29.000	0	29.000	0	0	0	0	HB

7 Büyükmandıra Belediyesi

Büyükmandıra Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Büyükmandıra				438.402	0	438.402	438.402	434.947	99		
		Yol				80.000	0	80.000	80.000	76.918	96		
20	000000000000	Çevre Düzenlemesi	BL	2014	2014	80.000	0	80.000	80.000	76.918	96	100	BT
		Diğerleri				358.402	0	358.402	358.402	358.029	100		
21	000000000000	Halı Saha yapımı	BL	2014	2014	130.993	0	130.993	130.993	130.993	100	100	BT
22	000000000000	Kafeterya Yapımı	BL	2014	2014	7.627	0	7.627	7.627	7.627	100	100	BT
23	000000000000	Araç alımı	BL	2014	2014	201.000	0	201.000	201.000	200.627	100	100	BT
24	000000000000	Halı sahaya elektrik tesisatı yapımı	BL	2014	2014	10.089	0	10.089	10.089	10.089	100	100	BT
25	000000000000	İçmesuyu kuyusuna dalgıç pompa alımı	BL	2014	2014	8.693	0	8.693	8.693	8.693	100	100	BT

8 Karahalil Belediyesi

Karahalil Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Karahalil				640.357	266.446	373.911	373.911	373.911	100		
		Yol				116.437	0	116.437	116.437	116.437	100		
26	000000000000	Kilit Parke Taşı ve Bordür Yapım İşİ	BL	2014	2014	116.437	0	116.437	116.437	116.437	100	100	BT
		Diğerleri				523.920	266.446	257.474	257.474	257.474	100		
27	000000000000	Çok Amaçlı Kültürel ve Sosyal Hizmet Merkezi Yapım İşİ	BL	2014	2014	523.920	266.446	257.474	257.474	257.474	100	100	BT

9 Demirköy Belediyesi

Demirköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Ağırlık Malar
		Demirköy				255.000	0	255.000	161.545	150.305	59		
		Yol				185.000	0	185.000	110.000	108.834	59		
28	000000000000	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2014	2014	185.000	0	185.000	110.000	108.834	59	100	BT
		Su				5.000	0	5.000	5.000	4.040	81		
29	000000000000	Su Şebekesi Tamiri	BL	2014	2014	5.000	0	5.000	5.000	4.040	81	100	BT
		Kanalizasyon				45.000	0	45.000	26.545	26.545	59		
30	000000000000	Kanalizasyon yapım ve onarımı	BL	2014	2014	45.000	0	45.000	26.545	26.545	59	100	BT
		Diğerleri				20.000	0	20.000	20.000	10.886	54		
31	000000000000	Bina Küçük Onarımı	BL	2014	2014	20.000	0	20.000	20.000	10.886	54	100	BT

10 İğneada Belediyesi

İğneada Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		İğneada				885.864	0	352.432	352.432	0	0		
		Yol				141.000	0	141.000	141.000	0	0		
32	000000000000	Parke Taşı Döşeme (Demirköy Caddesi)	BL	2013	2014	141.000	0	141.000	141.000	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				744.864	0	211.432	211.432	0	0		
33	000000000000	Katı Atık nakil İstasyonu Yapımı	BL	2013	2014	744.864	0	211.432	211.432	0	0	0	HB

11 Kofçaz Belediyesi

Kofçaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Kofçaz				3.000.000	50.000	407.500	407.500	293.056	72		
		Kanalizasyon				2.000.000	50.000	107.500	107.500	89.955	84		
34	000000000000	Kanalizasyon Yapımı	BL	2013	2014	2.000.000	50.000	107.500	107.500	89.955	84	19	DE
		Diğerleri				1.000.000	0	300.000	300.000	203.101	68		
35	000000000000	Çevre Kirliliğinin Giderilmesi	BL	2013	2014	1.000.000	0	300.000	300.000	203.101	68	20	DE

12 Lüleburgaz Belediyesi

Lüleburgaz Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklama
		Lüleburgaz				26.420.000	0	26.420.000	16.470.000	15.358.937	58		
		Yol				11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	10.086.097	92		
36	000000000000	Yol Yapım Giderleri	BL	2014	2014	11.000.000	0	11.000.000	11.000.000	10.086.097	92		DE
		Su				420.000	0	420.000	420.000	406.121	97		
37	000000000000	İçmesuyu Tesisi Yapımı	BL	2014	2014	420.000	0	420.000	420.000	406.121	97		DE
		Kanalizasyon				1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.363.445	97		
38	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapım Gid.	BL	2014	2014	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.363.445	97		DE
		Diğerleri				13.600.000	0	13.600.000	3.650.000	3.503.274	26		
39	000000000000	Diğer Giderler (Park, alan, meydan dz., ıslah çalışmaları)	BL	2014	2014	3.000.000	0	3.000.000	750.000	741.155	25		DE
40	000000000000	Hizmet Tesisi	BL	2014	2014	4.500.000	0	4.500.000	0	0	0	0	HB
41	000000000000	Hizmet Binası (Bakım onarım, restorasyon)	BL	2014	2014	750.000	0	750.000	50.000	11.800	2		DE
42	000000000000	Eski Eser Alım ve Onarımları	BL	2014	2014	350.000	0	350.000	350.000	343.139	98		DE
43	000000000000	Sosyal Tesisler	BL	2014	2014	5.000.000	0	5.000.000	2.500.000	2.407.180	48		DE

13 Ahmetbey Belediyesi

Ahmetbey Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Ahmetbey				25.569.510	1.171.814	5.862.549	1.466.247	1.451.185	25		
		Yol				6.202.700	709.135	1.931.740	1.175.000	1.169.516	61		
44	000000000000	Stabilize Yol Yapımı	BL	2014	2014	351.000	55.000	125.000	125.000	123.752	99	100	BT
45	000000000000	Çevre Yolunun Açılması	BL	2014	2014	1.938.740	0	387.748	0	0	0	20	DE
46	000000000000	Asfalt Kaplama Yapılması	BL	2013	2017	1.028.960	0	205.792	0	0	0	0	HB
47	000000000000	Sathi Kaplama Yapımı	BL	2013	2017	816.000	0	163.200	0	0	0	0	HB
48	000000000000	Tretuar Düzenlemesi	BL	2014	2014	2.068.000	654.135	1.050.000	1.050.000	1.045.764	100	75	BT
		Kanalizasyon				10.269.010	396.287	2.063.249	139.247	138.902	7		
49	000000000000	Kanalizasyon İnşaatı	BL	2013	2017	9.795.010	26.534	1.959.002	35.000	34.655	2		DE
50	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2013	2017	474.000	369.753	104.247	104.247	104.247	100	100	BT
		Diğerleri				9.097.800	66.392	1.867.560	152.000	142.767	8		
51	000000000000	Spor Kompleksi İnşaatı	BL	2013	2017	700.000	0	140.000	0	0	0	0	HB
52	000000000000	Park Yapımı	BL	2013	2017	4.639.050	66.392	927.810	80.000	75.080	8		DE
53	000000000000	Dere Islahı (Soğucuk Deresi)	BL	2013	2017	1.110.000	0	222.000	12.000	11.108	5		DE
54	000000000000	18. Madde Uygulamaları	BL	2013	2014	60.000	0	60.000	60.000	56.579	94	100	BT
55	000000000000	Kamulaştırma	BL	2013	2017	1.687.500	0	337.500	0	0	0	0	HB
56	000000000000	Mezbaha Yapılması	BL	2013	2017	901.250	0	180.250	0	0	0	0	HB

14 Büyükkarıştıran Belediyesi

Büyükkarıştıran Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Büyükkarıştıran				9.765.000	0	9.715.000	8.880.000	8.821.958	91		
		Su				30.000	0	30.000	30.000	24.699	82		
57	000000000000	İçmesuyu Arıtma+Şebekesi Yapımı	BL	2014	2014	30.000	0	30.000	30.000	24.699	82	65	DE
		Yol				700.000	0	650.000	650.000	614.680	95		
58	000000000000	Yol Yapımı	BL	2014	2014	700.000	0	650.000	650.000	614.680	95	100	BT
		Kanalizasyon				615.000	0	615.000	80.000	76.388	12		
59	000000000000	Kanalizasyon Şebekesi İnşaatları (İlave+Yeni)	BL	2014	2014	100.000	0	100.000	80.000	76.388	76	75	DE
60	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2014	2014	500.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
61	000000000000	Katı Atık Bertaraf Tesisi	BL	2014	2014	15.000	0	15.000	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				8.420.000	0	8.420.000	8.120.000	8.106.191	96		
62	000000000000	Diğer Taşınmaz Bakım Onarım	BL	2014	2014	5.500.000	0	5.500.000	5.300.000	5.295.065	96	100	BT
63	000000000000	Spor Tesisleri Yapımı	BL	2014	2014	2.700.000	0	2.700.000	2.700.000	2.696.844	100	100	BT
64	000000000000	Park Yapımı ve İhtiyaçları	BL	2014	2014	120.000	0	120.000	120.000	114.282	95	100	BT
65	000000000000	Kamulaştırma	BL	2014	2014	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB

15 Evrensekiz Belediyesi

Evrensekiz Belediyesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Evrensekiz				7.560.000	2.890.050	4.657.650	1.660.214	1.652.465	35		
		Yol				1.800.000	691.000	1.109.000	775.000	772.519	70		
66	000000000000	Yol Yapım ve Onarımı	BL	2013	2015	1.800.000	691.000	1.109.000	775.000	772.519	70	100	BT
		Kanalizasyon				3.910.000	2.199.050	1.698.650	715.000	709.732	42		
67	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi Yapımı	BL	2013	2014	800.000	1.350	798.650	65.000	65.000	8		DE
68	000000000000	Kanalizasyon ve İçme suyu Yapım ve Onarımı	BL	2012	2014	3.110.000	2.197.700	900.000	650.000	644.732	72	100	BT
		Diğerleri				1.850.000	0	1.850.000	170.214	170.214	9		
69	000000000000	Küçük Sanayi Sitesi Yapımı	BL	2013	2015	500.000	0	500.000	0	0	0	0	HB
70	000000000000	Yağmur suyu kollektör hattı yapılması	BL	2014	2014	250.000	0	250.000	170.214	170.214	68	100	BT
71	000000000000	Belediye İmar Planı Revizyonu Yapılması	BL	2014	2014	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
72	000000000000	Kapalı Spor Salonu Yapılması	BL	2013	2015	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	0	HB

16 Pehlivan köy Belediyesi

Pehlivan köy Belediyesi Yatırımları

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Ağırlıkla Malar
		Pehlivan köy				2.700.000	556.641	250.005	0	0	0		
		Yol				800.000	526.641	250.000	0	0	0		
73	000000000000	Yol Parke Taşı Kaplaması (..... m ²)	BL	2010	2014	800.000	526.641	250.000	0	0	0	40	YK
		Su				200.000	0	1	0	0	0		
74	000000000000	Su İshale Hattının Yenilenmesi	BL	2010	2014	200.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				700.000	0	2	0	0	0		
75	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2010	2014	400.000	0	1	0	0	0	0	HB
76	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi ve Kollektör Hattı Yapımı	BL	2010	2014	300.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				1.000.000	30.000	2	0	0	0		
77	000000000000	Spor ve Mesire Alanı Düzenlenmesi (Akasyalık)	BL	2010	2014	500.000	0	1	0	0	0	0	HB
78	000000000000	Panayır Alanı Düzenlenmesi	BL	2010	2014	500.000	30.000	1	0	0	0	6	YK

17 Pınarhisar Belediyesi

Pınarhisar Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Pınarhisar				9.479.000	901.250	2.266.250	1.716.250	1.681.662	74		
		Yol				575.000	143.750	181.250	131.250	125.000	69		
79	000000000000	Döner Kavşak Yapılması (Çimento Fabrikası Önü)	BL	2013	2015	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
80	000000000000	Döner Kavşak Yapılması (Dikilitaş)	BL	2013	2015	25.000	0	25.000	0	0	0	0	HB
81	000000000000	Salih Bilinmez Caddesi Tretuvar Düzenlenmesi	BL	2013	2016	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000	100	28	DE
82	000000000000	Vize Yolu Tretuvar Yapılması	BL	2013	2015	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	30	DE
83	000000000000	Kırklareli Caddesi Tretuvar Düzenlenmesi	BL	2013	2015	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	30	DE
84	000000000000	Lüleburgaz Caddesi Tretuvar Yapılması	BL	2013	2015	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	30	DE
85	000000000000	Meydan Düzenlemesi (Dere Mah. İzzet Ağa Çeşme Meydanı) Kanalizasyon	BL	2013	2015	25.000	18.750	6.250	6.250	0	0	75	DE
						7.751.500	0	2.000.000	1.500.000	1.494.162	75		
86	000000000000	Atıksu Arıtma Tesisi	BL	2013	2015	5.174.000		500.000	0	0	0		DE
87	000000000000	Atıksu Kolektör Hattı Yapılması	BL	2013	2015	2.577.500	0	1.500.000	1.500.000	1.494.162	100	28	DE
		Diğerleri				1.152.500	757.500	85.000	85.000	62.500	74		
88	000000000000	Yüzme Havuzu Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2014	200.000	180.000	10.000	10.000	10.000	100	95	DE
89	000000000000	Halı Saha Tesisi Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2014	152.500	137.500	15.000	15.000	12.500	83	100	BT
90	000000000000	Garaj Otopark Yapılması (Dere Mah.)	BL	2013	2014	300.000	40.000	10.000	10.000	0	0	13	DE
91	000000000000	Bahçe Düzenlemesi	BL	2013	2014	500.000	400.000	50.000	50.000	40.000	80	82	DE

18 Kaynarca Belediyesi

Kaynarca Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Kaynarca				28.000	0	28.000	0	0	0		
		Yol				6.000	0	6.000	0	0	0		
92	000000000000	Yeni İmar Yolları Kamulaştırma	BL	2014	2014	6.000	0	6.000	0	0	0	0	HB
		Kanalizasyon				22.000	0	22.000	0	0	0		
93	000000000000	İstanbul Caddesi Kanalizasyon Yapımı	BL	2014	2014	22.000	0	22.000	0	0	0	0	HB

19 Vize Belediyesi

Vize Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasalleşme (%)	Fizikileşme (%)	Açıklamalar
		Vize				5.162.268	0	5.162.268	0	0	0		
		Yol				872.268	0	872.268	0	0	0		
94	000000000000	Asfalt sathi kaplama yapılması	BL	2014	2014	359.846	0	359.846	0	0	0	0	HB
95	000000000000	Taş Tozu, Mıcır ve Tuvanlen Malzeme Alımı	BL	2014	2014	127.398		127.398	0	0	0	0	HB
96	000000000000	Mekanik malzeme Alım İşİ	BL	2014	2014	123.050		123.050	0	0	0	0	HB
97	000000000000	Kilitli Peton Parke Taşı ve Belediye Bordürü Alım İşİ	BL	2014	2014	142.780		142.780	0	0	0	0	HB
98	000000000000	Asfalt binderi mal alımı	BL	2014	2014	119.194	0	119.194	0	0	0		DE
		Diğerleri				4.290.000	0	4.290.000	0	0	0		
99	000000000000	Otel ve Kültür Merkezi yapım İşİ	BL	2014	2014	4.290.000	0	4.290.000	0	0	0		DE

20 Çakıllı Belediyesi

Çakıllı Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Çakıllı				2.323.160	141.882	425.500	155.599	153.038	36		
		Yol				238.160	0	108.000	104.000	102.607	95		
100	000000000000	Yol Yapım Giderleri	BL	2014	2014	183.160	0	55.000	53.000	52.550	96		DE
101	000000000000	Yol Bakım Onarım Giderleri	BL	2014	2014	55.000		53.000	51.000	50.057	94		DE
		Su				385.000	15.143	70.000	1.000	696	1		
102	000000000000	İçmesuyu Yapım Giderleri	BL	2013	2014	385.000	15.143	70.000	1.000	696	1		DE
		Kanalizasyon				1.490.000	126.739	200.000	42.000	41.373	21		
103	000000000000	Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri	BL	2014	2014	1.490.000	126.739	200.000	42.000	41.373	21		DE
		Diğerleri				210.000	0	47.500	8.599	8.362	18		
104	000000000000	Harita yapım ve Alım Gideri	BL	2014	2014	35.000	0	7.500	7.500	7.263	97		DE
105	000000000000	Diğer Taşınmaz Bakım Onarım Giderleri	BL	2014	2014	175.000	0	40.000	1.099	1.099	3	10	DE

21 Kırıkköy Belediyesi

Kırıkköy Belediyesi Yatırımları

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe Türü	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2014 yılı programı (TL)	2014 yılında gönderilen ödenek (TL)	2014 yılı harcamaları (TL)	Parasal gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Kırıkköy				5.126.000	0	10.000	10.000	10.000	100		
		Kanalizasyon				5.000.000	0	0	0	0	0		
106	000000000000	Kanalizasyon Uygulama Projesi	BL	2014	2014	5.000.000	0	0	0	0	0	0	HB
		Diğerleri				126.000	0	10.000	10.000	10.000	100		
107	000000000000	Akıllı su sayacı alımı	BL	2014	2014	126.000	0	10.000	10.000	10.000	100		DE

