

kırklareli

2022 kamu yatırımları



Tarım	7
Madencilik	13
İmalat	16
Enerji	17
Ulaştırma – Haberleşme	19
Turizm	31
Konut	32
Eğitim	33
Sağlık	39
DKH İktisadi	42
DKH Sosyal	44

Giriş

Kamu Yatırımlarıyla İlgili Göstergeler

Cari fiyatlarla, TL

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Nüfus (1)	346.973	351.684	356.050	360.860	361.836	361.737	366.363	
GSYH (TL) (1)	11.083.451.614	12.427.991.841	14.232.767.046	17.670.867.404	20.676.382.163	24.590.518.279		
GSYH (Zincirleme Hacim) (TL) (1)	7.289.054.743	7.638.055.182	7.908.220.014	8.330.971.313	8.563.902.168	8.939.301.308		
GSYH Zincirleme hacimdeki değişim (Büyüme) (yüzde) (1)	6,79	4,79	3,54	5,35	2,80	4,38		
Kişi başına GSYH (dolar)	11.837	11.774	11.026	10.456	10.076	9.655		
Kamu yatırımları (TL)	337.192.257	302.895.315	395.160.059	357.673.589	569.857.849	697.717.357	1.141.609.992	1.463.539.747
Kamu yatırımlarının GSYH oranı (yüzde)	3,04	2,44	2,78	2,02	2,76	2,84		
Kişi başına kamu yatırımları (TL)	972	861	1.110	991	1.575	1.929	3.116	
Bütçe kamu giderleri (TL) (2)	862.612.000	956.452.000	1.051.216.000	1.302.243.000	1.727.618.000	2.187.175.000	2.590.494.000	
Bütçe kamu giderlerinin GSYH oranı (yüzde)	7,78	7,70	7,39	7,37	8,36	8,89		
Kişi başına bütçe kamu giderleri (TL)	2.486	2.720	2.952	3.609	4.775	6.046	7.071	
Bütçe sermaye giderleri (TL) (2)	84.882.000	58.413.000	72.550.000	71.375.000	50.248.000	82.933.000	118.384.000	
Sermaye giderlerinin kamu giderlerine oranı (yüzde)	9,84	6,11	6,90	5,48	2,91	3,79	4,57	
Kişi başına bütçe sermaye giderleri (TL) (2)	245	166	204	198	139	229	323	

Kaynak: 1. TÜİK

2. Hazine ve Maliye Bakanlığı

GSYH, Kamu Yatırımları, Bütçe Sermaye Giderleri ve Büyüme İlişkisi

Grafik, gerçek değerlerin standart sapmaları hesaplanarak oluşturulmuştur.

Proje sayısı: 532, Proje tutarı: 9.761.045.864, Önceki yıllar harcaması: 2.971.743.780, 2022 yılı harcaması: **1.463.539.747**

Yatırımların Sektörlere Göre Dağılımı

Sıra no	Sektör	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	532	9.761.045.864	2.971.743.780	1.874.137.853	1.542.349.406	1.463.539.747	78
1	Tarım	82	1.143.013.064	69.217.142	41.023.862	35.474.778	13.649.737	33
2	Madencilik	7	269.710.200	2.124.000	264.557.202	238.206.200	238.206.200	90
3	İmalat	2	80.296	0	80.296	61.586	61.586	77
4	Enerji	13	228.821.000	19.909.710	65.373.944	65.373.820	47.452.820	73
5	Ulaştırma	171	5.315.886.522	2.609.308.480	953.098.803	803.079.365	802.937.216	84
6	Haberleşme	0	0	0	0	0	0	0
7	Turizm	2	1.100.000	0	1.100.000	761.293	761.293	69
8	Konut	1	1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100
9	Eğitim	49	525.934.444	65.440.639	207.382.712	96.468.359	61.002.730	29
10	Sağlık	18	1.416.535.075	31.214.680	29.509.730	29.509.718	29.392.045	100
	Diğer Kamu Hizmetleri / Toplam	187	858.215.263	173.029.129	311.761.304	273.164.288	269.826.121	87
11	Diğer Kamu Hizmetleri / İktisadi	10	28.263.505	16.282.600	11.980.905	11.218.428	10.938.999	91
12	Diğer Kamu Hizmetleri / Sosyal	177	829.951.758	156.746.529	299.780.399	261.945.860	258.887.122	86

Yatırımların İlçelere Göre Dağılımı

Sıra no	İlçe	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	532	9.761.045.864	2.971.743.780	1.874.137.853	1.542.349.406	1.463.539.747	78
1	Merkez	106	2.649.986.692	432.918.965	283.646.435	245.911.815	239.124.437	84
2	Babaeski	71	199.556.249	28.001.846	37.610.610	26.895.940	25.382.996	67
3	Demirköy	33	167.859.527	18.917.867	104.046.475	100.381.355	100.381.355	96
4	Kofçaz	23	29.258.663	6.120.907	6.892.260	6.426.092	5.528.016	80
5	Lüleburgaz	93	687.837.474	34.657.422	155.249.983	88.301.900	69.922.999	45
6	Pehlivan köy	14	2.368.993	282.896	1.910.003	1.184.905	1.184.905	62
7	Pınarhisar	34	184.111.086	18.671.966	104.229.397	86.723.796	74.723.796	72
8	Vize	52	138.461.251	19.512.705	82.828.637	73.086.167	72.671.167	88
9	Çoklu İlçeler	106	5.701.605.928	2.412.659.206	1.097.724.052	913.437.436	874.620.076	80

Yatırımların Kuruluşlara Göre Dağılımı

Sıra no	İlçe	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	532	9.761.045.864	2.971.743.780	1.874.137.853	1.542.349.406	1.463.539.747	78
1	Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü	6	1.487.872.905	456.500.338	381.637.562	381.637.561	381.637.561	100
2	DSİ 11. Bölge Müdürlüğü	22	1.130.156.661	68.737.142	30.068.068	30.068.053	8.243.012	27
3	İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü	17	230.314.665	50.005.419	170.338.292	145.202.567	145.202.567	85
4	Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü	1	704.861	0	100.000	0	0	0
	İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü	17	6.517.000	0	6.517.000	2.406.529	2.406.529	37
5	Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü	4	1.592.000	0	1.592.000	762.529	762.529	48
6	Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü	3	864.000	0	864.000	95.000	95.000	11
7	Vize Orman İşletme Müdürlüğü	2	1.364.000	0	1.364.000	525.000	525.000	38
8	Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü	8	2.697.000	0	2.697.000	1.024.000	1.024.000	38
9	Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü	2	1.100.000	0	1.100.000	761.293	761.293	69
10	TCDD 1. Bölge Müdürlüğü	11	3.799.807.272	2.152.494.733	543.744.399	400.284.262	400.284.262	74
11	MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	2	13.856.200	0	10.903.201	5.099.200	5.099.200	47
12	Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü	3	7.636.314	4.929.292	2.707.021	1.715.854	1.715.854	63
13	TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü	13	228.821.000	19.909.710	65.373.944	65.373.820	47.452.820	73
14	TP Trakya Bölge Müdürlüğü	4	253.654.000	0	253.654.000	233.107.000	233.107.000	92
15	Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü	10	74.460.000	18.780.529	38.200.000	14.804.660	14.804.659	39
16	İl Özel İdaresi	214	42.842.565	14.262.698	25.578.857	17.237.545	16.672.888	65
17	Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü	7	34.616.915	0	1.798.887	1.118.652	213.452	12
18	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü	1	400.000	0	400.000	400.000	399.587	100
19	Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	13	92.184.526	20.806.196	52.718.802	6.133.812	6.133.811	12
20	Valilik	7	27.272.658	16.992.854	10.279.804	10.119.501	9.840.485	96
21	İl Emniyet Müdürlüğü	2	1.450.847	0	1.450.847	948.927	948.927	65
22	İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	6	13.285.637	93.692	6.685.637	5.623.495	5.454.218	82
23	İl Millî Eğitim Müdürlüğü	13	344.739.553	14.732.531	109.616.338	67.230.850	31.934.500	29
24	İl Sağlık Müdürlüğü	18	1.416.535.075	31.214.680	29.509.730	29.509.718	29.392.045	100
25	Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü	6	520.000.000	101.803.966	100.209.003	100.209.000	98.477.970	98
26	İl Tarım ve Orman Müdürlüğü	18	2.285.238	0	2.285.238	1.602.882	1.602.882	70
27	Atatürk TSTMA Enstitüsü Müdürlüğü	14	2.644.750	480.000	1.374.001	1.030.501	1.030.501	75
28	KÖYDES	105	27.887.222	0	27.887.222	20.723.724	20.723.724	74

Proje Tutarı En Yüksek Beş Proje

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	Para sal. Fiziki			Açıklamalar
										2022 yılı harcamaları (TL)	gerçekleşme (%)	gerçekleşme (%)	
1	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	3.771.639.041	2.152.400.024	540.000.000	396.948.222	396.948.222	74	67	DE
2	2018I00-145138	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)	GB	2018	2025	1.125.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
3	2013E04-1777	Kıralı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2025	1.015.000.000	218.034.344	161.358.000	161.358.000	161.358.000	100	66	DE
4	2016E04-2634	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2024	328.682.794	235.561.344	93.121.450	93.121.450	93.121.450	100	95	DE
5	2021B00-160841	TP Sondaj Yatırımları	KT	2022	2022	147.170.000	0	147.170.000	138.865.000	138.865.000	94	94	DE

En Çok Harcama Yapılan Beş Proje

														Para	Fiziki	
Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	2022 yılı gerçekleşme (%)	2022 yılı fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar			
1	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	3.771.639.041	2.152.400.024	540.000.000	396.948.222	396.948.222	74	67	DE			
2	2013E04-1777	Kıralı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2025	1.015.000.000	218.034.344	161.358.000	161.358.000	161.358.000	100	66	DE			
3	2016E04-2634	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2024	328.682.794	235.561.344	93.121.450	93.121.450	93.121.450	100	95	DE			
4	2021B00-160841	TP Sondaj Yatırımları	KT	2022	2022	147.170.000	0	147.170.000	138.865.000	138.865.000	94	94	DE			
5	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2022	140.000.000	101.803.966	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	95	DE			

Proje sayısı: 82, Proje tutarı: 1.143.013.064, Önceki yıllar harcaması: 69.217.142, 2022 yılı harcaması: **13.649.737**

tarım

Sulama

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

- **Su Depolama Tesisleri:** Eriklice Göleti, Kadıköy Göleti, Sivrilere Göleti, Kofaz 2 Göleti, Ahmetbey Göleti Yükseltmesi, Yenice Barajı
- **Sulama Tesisleri:** Eriklice, Kızılcıkdere, Kadıköy, Sivrilere, Kofaz 2, Ahmetbey, Yenice
- Taşkın Koruma Tesisleri

Bitkisel Üretim

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Bitkisel üretimi geliştirme projeleri

Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

- Araştırma projeleri (14 adet)

DSİ 11. Bölge Müdürlüğü

- Arazi Toplulaştırma TİGH Projeleri

İl Özel İdaresi

- **Bitkisel üretimi geliştirme projeleri:** Seracılık, Lavanta, Aronia, Salep

Hayvancılık

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Hayvancılığı geliştirme projeleri

İl Özel İdaresi

- HİS göletleri: Çayırılı, Çeşmeköy, Kocayazı, Çeşmekolu
- Hayvancılığı geliştirme projeleri: Arıcılık

Ormancılık

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü

- Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi
- Endüstriyel Plantasyon
- Ormancılık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı
- Orman Koruma ve Yangınla Mücadele
- Orman Amenejman ve Orman Köyleri Etüdü
- Fidan Üretimi

Su Ürünleri

Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü

- İğneada Balıkçı Barınağı Etüd Proje İşleri

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Su ürünlerini geliştirme projeleri

Kofçaz 2 Göleti ve Sulaması

İlçesi: Kofçaz, Karakteristiği: Depolama (860.000 m3), Sulama (2.170 dekar), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2022, Proje tutarı: 25.316.404, Harcama: 8.222.831

Lüleburgaz Ahmetbey Göleti Yükseltmesi ve Sulaması

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: Depolama (12.500.000 m3), Sulama (12.200.000 dekar), İçmesuyu (10.340.000 m3), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2023, Proje tutarı: 103.217.344, Harcama: 9.557.994

Pınarhisar Yenice Barajı ve Sulaması

İlçesi: Pınarhisar, Karakteristiği: Depolama (3.800.000 m3), Sulama (14.070 dekar), Başlama ve bitiş tarihi: 2016 – 2023, Proje tutarı: 63.027.223, Harcama: 12.519.538
Sulama hattının toplam uzunluğu 38 500 metredir.



Pınarhisar Yenice Barajı



Kofçaz 2 Göleti



Ahmetbey Göleti

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
						1.143.013.064	69.217.142	41.023.862	35.474.778	13.649.737	33		
						750.308.869	56.884.650	21.118.066	21.068.053	2.687.187	13		
						750.258.869	56.884.650	21.068.066	21.068.053	2.687.187	13		
						131.129.845	16.102.244	2	0	0	0		
1	1984A01-94	K.eli Kızılçıkdere Sulaması İkmalî (14.220 dekar)	GB	2016	2025	130.000.000	15.595.029	1	0	0	0	44	İA
2	1984A01-94	Kayalıköy Barajı Sulaması Kanalet Deplasmanı İlavesi	GB	2013	2022	1.129.845	507.215	1	0	0	0		DE
						496.560.971	33.232.061	17.000.004	17.000.000	2.101.924	12		
3	0000000-000	K.eli Eriklice Göleti	GB	2022	2026	90.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
4	0000000-000	K.eli Eriklice Göleti Sulaması	GB	2022	2024	134.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
5	1977A010320	K.eli Kadıköy Göleti ve Sulaması (1.930.000 m3, 4.180 dekar)	GB	2016	2024	45.000.000	4.105.921	1	0	0	0	41	İA
6	1977A010320	D.köy Sivrilir Göleti ve Sulaması (390.000 m3, 1.260 dekar)	GB	2016	2024	36.000.000	927.701	1	0	0	0	19	İA
7	1977A010320	Koçgaz 2 Göleti ve Sulaması (860.000 m3, 2.170 dekar)	GB	2016	2023	25.316.404	6.120.907	3.000.000	3.000.000	2.101.924	70	66	DE
8	1977A010320	L.burgaz Ahmetbey Göleti Yükseltmesi ve Sulaması (12.520.000 m3, 12.200 dekar)	GB	2016	2024	103.217.344	9.557.994	2.000.000	2.000.000	0	0	27	DE
9	2016A01-149838	P.hisar Yenice Barajı ve Sulaması (3.800.000 m3, 14.070 dekar)	GB	2016	2023	63.027.223	12.519.538	12.000.000	12.000.000	0	0	55	DE
						118.500.000	7.550.345	7	0	0	0		
10	0000000-000	K.eli Bağlıca Deresi Taşkın Koruması 1. Kısım	GB	2022	2024	20.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
11	1977A010320	K.eli Dolhan Taşkın Koruması	GB	2021	2023	8.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
12	1977A010320	K.eli Dokuzhöyük ve B.eski Karahalil (Teke Dere) Taşkın Koruması	GB	2012	2023	33.000.000	7.550.345	1	0	0	0	80	İA
13	0000000-000	B.eski Pekmezdere Taşkın Koruması 1. Kısım	GB	2022	2024	20.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
14	1977A010320	B.eski Yenimahalle Taşkın Koruması	GB	2021	2023	7.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
15	1977A010320	Lüleburgaz 1. Kısım Taşkın Koruması	GB	2016	2024	25.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
16	0000000-000	P.hisar Çayırdere Taşkın Koruması	GB	2022	2023	5.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
						4.068.053	0	4.068.053	4.068.053	585.263	14		
17	0000000-000	Kamulaştırma Çalışmaları	GB	2021	2022	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	41.310	3		DE
18	1985A010020	Etüd, Plan, Planlama, Jeoteknik Hiz.ve YAS	GB	2021	2022	1.077.406	0	1.077.406	1.077.406	208.938	19		DE
19	1987A010510	İşletme ve Onarım Hizmetleri	GB	2021	2022	1.790.647	0	1.790.647	1.790.647	335.015	19		DE
						50.000	0	50.000	0	0	0		
						50.000	0	50.000	0	0	0		
20	0000000-000	L.burgaz Çeşmekolu Kapalı Sistem Sulama Tesisi Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	100	BT
						384.759.734	12.332.492	12.591.195	11.555.373	8.111.198	64		
						1.952.342	0	1.952.342	1.310.023	1.310.023	67		
21	0000000-000	İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü Projesi	GB	2022	2022	76.998		76.998	51.359	51.359	67	67	DE
22	0000000-000	Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi	GB	2022	2022	4.000		4.000	1.953	1.953	49	49	DE
23	0000000-000	Kırsal Kalkınma Desteklerinin İzlenmesi	GB	2022	2022	1.501		1.501	1.501	1.501	100	100	DE
24	0000000-000	Bitki Sağlığı Uygulama Kontrol Projesi	GB	2022	2022	104.795		104.795	49.477	49.477	47	47	DE
25	0000000-000	Tarımsal Yayım Hizmetleri Projesi	GB	2022	2022	20.721		20.721	6.141	6.141	30	30	DE
26	0000000-000	Çayır, Mera Islahı ve Amenejman Projesi	GB	2022	2022	380.000		380.000	0	0	0		DE
27	0000000-000	Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi	GB	2022	2022	44.137		44.137	32.539	32.539	74	74	DE
28	0000000-000	Arazi Kullanım Planlaması Projesi	GB	2022	2022	5.479		5.479	5.477	5.477	100	100	DE
29	0000000-000	Yerli Hibrit Çeşitlerinin Kullanılması	GB	2022	2022	45.000		45.000	0	0	0	0	HB
30	0000000-000	Arazi Dağıtım Projesi	GB	2022	2022	8.592		8.592	0	0	0	0	HB
31	0000000-000	Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi	GB	2022	2022	1.261.119		1.261.119	1.161.575	1.161.575	92	92	DE
						2.644.750	480.000	1.374.001	1.030.501	1.030.501	75		
						2.644.750	480.000	1.374.001	1.030.501	1.030.501	75		
						480.000	340.000	80.001	60.000	60.000	75		
32	2012A02-1505	Trakya Yör. Yapay Sin. Ağ. İle Kur. Tah. ve Coğ. Bil. Sis. İle Haritalanması	GB	2020	2022	20.000	20.000	1	0	0	0	99	DE
33	2012A02-1505	Trakya Böl. Palmer Kuraklık Şiddet İndisinin Buğday Bitkisi İçin Yeniden Modellenmesi	GB	2021	2024	80.000	50.000	10.000	7.500	7.500	75	44	DE
34	2012A02-1505	Çeltik Tar. Kaynaklı Sera Gazlarının Hesaplanmasında ve Çevresel Faktörlerle İlişkisi	GB	2021	2023	280.000	200.000	40.000	30.000	30.000	75	58	DE
35	2012A02-1505	Trakya Yöresinde FAO-SHARP Aracı İle İklim Değişikliği Dayanıklılığının Değerlendirilmesi	GB	2021	2022	100.000	70.000	30.000	22.500	22.500	75	88	DE

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		Bitki Besleme ve Toprak Araştırma Projeleri				637.250	40.000	223.750	167.813	167.813	75		
36	2012A02-1505	Yavaş Salımlı Azotlu Gübreler ve Azaltılmış Dozlarının Mısır Bitkisi Verim ve Kalitesine Etkileri	GB	2021	2023	95.000	40.000	28.000	21.000	21.000	75	58	DE
37	2012A02-1505	Trakya Koşullarında Yetiştirilen Lavanta Bitkisinin Azot ve Fosfor İhtiyacının Belirlenmesi	GB	2022	2026	147.250	0	31.750	23.813	23.813	75	15	DE
38	2012A02-1505	Kırklareli İli Alternatif Bitkisel Üretim Desenin Belirlenmesi	GB	2022	2025	297.000	0	113.000	84.750	84.750	75	19	DE
39	2012A02-1505	Biyogaz Çıktısı Sıvı Fermente Ürünün Toprak Özellikleri ile Mısır Bitkisinin Verimi Üzerine Etkisi	GB	2022	2024	98.000	0	51.000	38.250	38.250	75	25	DE
		Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Araştırma Projeleri				997.500	0	640.250	480.188	480.188	75		
40	2012A02-1505	Kırklareli Eysel Atıksu Arıtma Tesisi Çıkış Suyunun Tarımsal Amaçlı Kullanım Olanakları ve Sera Gazı Salımlarına Etkisinin Araştırılması	GB	2022	2024	357.000	0	202.000	151.500	151.500	75	25	DE
41	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Buğday ve Ayçiçeği Bitkileri İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme	GB	2022	2024	254.000	0	173.000	129.750	129.750	75	25	DE
42	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Yonca (Medicago sativa) Bitkisi İçin Dijital Sulama Yönetimi Sistemi Geliştirme Projesi	GB	2022	2024	254.000	0	173.000	129.750	129.750	75	25	DE
43	2012A02-1505	Kırklareli Koşullarında Yapay Meralarda Su Kısıtının Verim ve Kalite Parametreleri Üzerine Etkileri	GB	2022	2024	132.500	0	92.250	69.188	69.188	75	25	DE
		Tarımsal Mekanizasyon ve Bilgi Teknolojileri Araştırmaları				530.000	100.000	430.000	322.500	322.500	75		
44	2012A02-1505	Kırklareli İlinde Tar. Mek. Pl. Yeni Tek. Kul. Ve Pol. Ar. Geliştirilmesi	GB	2020	2022	110.000	100.000	10.000	7.500	7.500	75	92	DE
45	2012A02-1505	TAGEM Araştırma Enstitülerinin Sulama Altyapılarının İyileştirilmesi ve Modernizasyonu	GB	2022	2022	420.000	0	420.000	315.000	315.000	75	75	DE
		DSİ 11. Bölge Müdürlüğü				379.897.792	11.852.492	9.000.002	9.000.000	5.555.825	62		
46	2010A02-1188	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi (40.000 hektar, 15 yerleşim yeri)	GB	2018	2023	114.897.792	11.852.492	9.000.000	9.000.000	5.555.825	62	31	DE
47	2010A02-1188	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi 2. Kısım	GB	2022	2025	130.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
48	2010A02-1188	Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projesi 3. Kısım	GB	2022	2025	135.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		İl Özel İdaresi				264.850	0	264.850	214.849	214.849	81		
49	0000000-000	Seraçılık	Öİ	2022	2022	65.000	0	65.000	65.000	65.000	100	100	BT
50	0000000-000	Lavanta Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	0	0	0	0	HB
51	0000000-000	Salep Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
52	0000000-000	Aronia Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	59.999	59.999	100	100	BT
53	0000000-000	Ayçiçeği ve Silajlık Tohum Yetiştiriciliği	Öİ	2022	2022	49.850	0	49.850	49.850	49.850	100	100	BT
54	0000000-000	Kırmızı Karınca Yuvalarının Korunması	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
		Tarım / Hayvancılık				714.984	0	689.985	441.880	441.880	64		
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				244.984	0	244.984	228.331	228.331	93		
55	0000000-000	Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele Projesi	GB	2022	2022	195.624		195.624	194.924	194.924	100	100	DE
56	0000000-000	Hayvancılığı Geliştirme Projesi	GB	2022	2022	49.360		49.360	33.407	33.407	68	68	DE
		İl Özel İdaresi				470.000	0	445.001	213.549	213.549	48		
		Hayvan İçmesuyu Göletleri (0 / 4 adet)				160.000	0	135.001	0	0	0		
57	0000000-000	K.eli Çeşmeköy HİS Göleti Yapımı	Öİ	2020	2022	25.000	0	1	0	0	0	0	DE
58	0000000-000	K.eli Çayırılı HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
59	0000000-000	Kofcaz Kocayazı HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	0	0	0	0	DE
60	0000000-000	L.burgaz Çeşmeköy HİS Göleti Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	İA
		Hayvancılık Projeleri				310.000	0	310.000	213.549	213.549	69		
61	0000000-000	Arıcılık	Öİ	2022	2022	310.000	0	310.000	213.549	213.549	69		DE

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki gerçekleşme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Tarım / Ormancilık				6.517.000	0	6.517.000	2.406.529	2.406.529	37		
		Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü				1.592.000	0	1.592.000	762.529	762.529	48		
		Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi				1.202.000	0	1.202.000	665.000	665.000	55		
62	2022A05-181731	Ağaçlandırma	ÖB	2022	2022	1.123.000	0	1.123.000	590.000	590.000	53	53	DE
63	2022A05-181731	Rehabilitasyon	ÖB	2022	2022	75.000	0	75.000	75.000	75.000	100	100	DE
64	2022A05-181731	Etüd Proje	ÖB	2022	2022	4.000	0	4.000	0	0	0		DE
		Ormancilık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				390.000	0	390.000	97.529	97.529	25		
65	2022A05-166557	B.Onarım	DS	2022	2022	390.000	0	390.000	97.529	97.529	25	25	DE
		Demirköy Orman İşletme Müdürlüğü				864.000	0	864.000	95.000	95.000	11		
		Orman Koruma ve Yangınla Mücadele				14.000	0	14.000	0	0	0		
66	2022A05-181575	Fotokapan (Otlama - Gözetleme)	ÖB	2022	2022	14.000		14.000	0	0	0		DE
		Endüstriyel Plantasyon				70.000	0	70.000	10.000	10.000	14		
67	2020A05-151908	Endüstriyel Ağaçlandırma Bakımı	ÖB	2022	2022	70.000		70.000	10.000	10.000	14	14	DE
		Ormancilık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				780.000	0	780.000	85.000	85.000	11		
68	2022A05-166557	B.Onarım	DS	2022	2022	780.000		780.000	85.000	85.000	11	11	DE
		Vize Orman İşletme Müdürlüğü				1.364.000	0	1.364.000	525.000	525.000	38		
		Ormancilık Altyapısı ve Üretim Makinası Alımı				585.000	0	585.000	125.000	125.000	21		
69	2022A05-166557	B.Onarım	DS	2022	2022	585.000	0	585.000	125.000	125.000	21	21	DE
		Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü				779.000	0	779.000	400.000	400.000	51		
70	2022A05-181925	Orman Amenajmanı ve Orman Köyleri Etüdü	DS	2022	2022	779.000		779.000	400.000	400.000	51	51	DE
		Lüleburgaz Fidanlık Müdürlüğü				2.697.000	0	2.697.000	1.024.000	1.024.000	38		
		Ormanların Geliştirilmesi ve Genişletilmesi				210.000	0	210.000	75.000	75.000	36		
71	2022A05-181915	Fidan Üretimi	ÖB	2022	2022	100.000	0	100.000	35.000	35.000	35	35	DE
72	2022A05-181917	Fidan Üretimi	ÖB	2022	2022	110.000	0	110.000	40.000	40.000	36	36	DE
		Fidan Üretimi				2.487.000	0	2.487.000	949.000	949.000	38		
73	2022A05-181915	Fidan Üretimi	DS	2022	2022	1.150.000	0	1.150.000	680.000	680.000	59	59	DE
74	2022A05-181915	Fidan Bakımı	DS	2022	2022	250.000	0	250.000	250.000	250.000	100	100	DE
75	2022A05-181915	Tohum Üretimi	DS	2022	2022	130.000	0	130.000	15.000	15.000	12	12	DE
76	2022A05-181915	Ağaç ve Tohum Islahı	DS	2022	2022	12.000	0	12.000	4.000	4.000	33	33	DE
77	2022A05-181915	Tesisler	DS	2022	2022	850.000		850.000	0	0	0		DE
78	2022A05-181915	Makine Teçhizat Alımı	DS	2022	2022	95.000		95.000	0	0	0		DE
		Tarım / Su Ürünleri				712.477	0	107.616	2.943	2.943	3		
		Ulaştırma ve Altyapı 1. Bölge Müdürlüğü				704.861	0	100.000	0	0	0		
79	2020A04-150875	D.köy İğneada Balıkçı Barınağı Etüt Proje İşleri	GB	2022	2023	704.861	0	100.000	0	0	0		DE
		İl Tarım ve Orman Müdürlüğü				7.616	0	7.616	2.943	2.943	39		
80	0000000-000	Su Ürünleri Üretimini Geliştirme Projesi	GB	2022	2022	2.643		2.643	2.292	2.292	87	87	DE
81	0000000-000	Kontrol Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2022	2022	2.401		2.401	0	0	0		DE
82	0000000-000	Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan Kirliliğin Kontrolü Projesi	GB	2022	2022	2.572		2.572	651	651	25	25	DE

Proje sayısı: 7, Proje tutarı: 269.710.200, Önceki yıllar harcaması: 2.124.000,
2022 yılı harcaması: **238.206.200**

madencilik

MTA Marmara Bölge Müdürlüğü


- Maden Arama Çalışmaları

TP Trakya Bölge Müdürlüğü

- Petrol ve Doğal Gaz Arama Çalışmaları

İl Özel İdaresi

- Jeotermal Sondajı

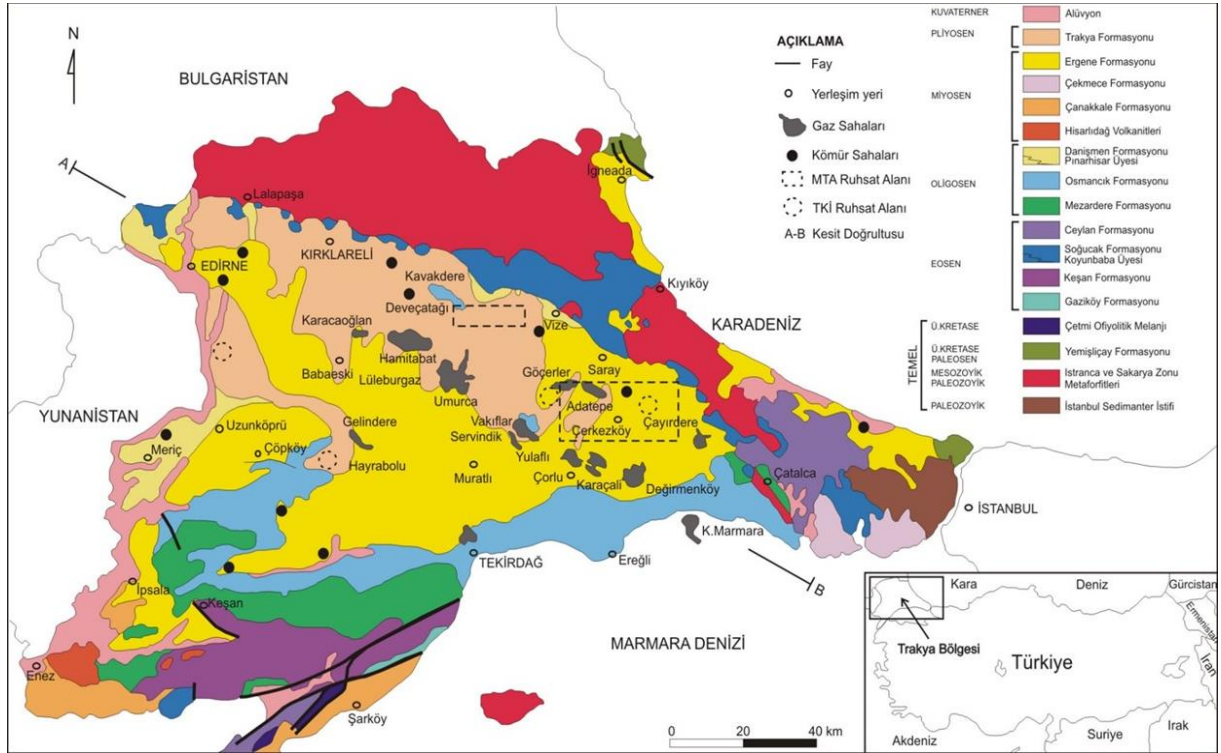

Trakya Jeoloji Haritası

							Madencilik	269.710.200	2.124.000	264.557.202	238.206.200	238.206.200	90			
							MTA Marmara Bölge Müdürlüğü	13.856.200	0	10.903.201	5.099.200	5.099.200	47			
83	0000000-000	Trakya Bölgesi Oligosen Havzası Kömür Aramaları	ÖB	2022	2022	10.903.200		0	10.903.200	5.099.200	5.099.200	47	72	DE		
84	0000000-000	Trakya Yöresi İntrüzyonlarla İlişkili Polimetal Maden Aramaları	ÖB	2022	2022	2.953.000		0	1	0	0	0	20	DE		
							TP Trakya Bölge Müdürlüğü	253.654.000	0	253.654.000	233.107.000	233.107.000	92			
85	2021B00-160841	Sondaj Yatırımları	KT	2022	2022	147.170.000		0	147.170.000	138.865.000	138.865.000	94	94	DE		
86	2021B00-157088	Petrol ve Doğal Gaz Sahaları Geliştirme Yatırımları	KT	2022	2022	50.933.000		0	50.933.000	41.195.000	41.195.000	81	81	DE		
87	2021B00-160856	Kuyu Tamamlama Yatırımları	KT	2022	2022	54.714.000		0	54.714.000	52.304.000	52.304.000	96	96	DE		
88	2021B00-158534	İdame Yenileme ve Makine Teçhizat Alımı	KT	2022	2022	837.000		0	837.000	743.000	743.000	89	89	DE		
							İl Özel İdaresi	2.200.000	2.124.000	1	0	0	0			
89	0000000-000	P.hisar Osmancık Jeotermal Sondajı (1500 m)	Öİ	2021	2022	2.200.000		2.124.000	1	0	0	0		DE		



TP Misinli-2 Kuyusu

Proje sayısı: 2, Proje tutarı: 80.296, Önceki yıllar harcaması: 0, 2022 yılı harcaması: **61.586**

İmalat

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

- Gıda hizmeti projeleri

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	İşleme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
İmalat						80.296	0	80.296	61.586	61.586	77			
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü						80.296	0	80.296	61.586	61.586	77			
90	00000000-000	Gıda Hizmetleri	GB	2022	2022	60.000		60.000	50.000	50.000	83	83	DE	
91	00000000-000	Gıda ve Yem Numunesi Alma Hizmetlerinin Geliştirilmesi Projesi	GB	2022	2022	20.296		20.296	11.586	11.586	57	57	DE	

Proje sayısı: 13, Proje tutarı: 228.821.000, Önceki yıllar harcaması: 19.909.710,
2022 yılı harcaması: **47.452.820**

enerji

TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü

- Trafo merkezi yapımı: Kırklareli OSB, Vize Pagder Aslan OSB **Toplam 2 TM**
- Trafo merkezi yenileme: Babaeski, Lüleburgaz, Hamitabat, Vize **Toplam 4 TM**
- Enerji nakil hattı: (Kırklareli – Pınarhisar Brş.) – Kırklareli OSB, **Balkaya – Vize**, Sergen – Vize, **Sergen – Evrencik**, Vize – Vize OSB, **(Babaeski – Hamitabat) – Lüleburgaz**, Demirköy – Kıyıköy **Toplam 7 hat**

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçekte harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	Açıklamalar
		Enerji				228.821.000	19.909.710	65.373.944	65.373.820	47.452.820	73	
		TEİAŞ 20. Bölge Müdürlüğü				228.821.000	19.909.710	65.373.944	65.373.820	47.452.820	73	
		Trafo Merkezleri				157.921.000	18.758.895	59.432.932	59.432.930	47.411.930	80	
92	2012D030340	Babaeski TM Yenileme (154/33 kV, 50 MVA Trafo + 154 kV 4 Fider + OG Metal Clad İlavesi)	KT	2012	2022	16.000.000	14.556.803	1	0	0	0	100 BT
93	2003D00-648-64521	L.burgaz Hamitabat TM Tevsiat 400 kV,1 Fider (Reaktör) + 400/154 kV, Ototrafo Fideri + 250 MVA Ototrafo + 420 kV, 160-250 MVA Araylanabilir Reaktör	KT	2017	2023	45.000.000	1.812.980	5.000.000	5.000.000	0	0	0 İA
94	2020D00-149430-149455	Vize 380 Havza TM Tevsiat 400 kV 3 Fider (Babaeski, Yedek, Reaktör) + 154 kV, 4 fider (Balkaya RES, Seren RES, Modern Karton, ASB)))	KT	2020	2024	25.000.000	0	1	0	0	0	0 İA
95	2020D00-149430-149508	Vize Pagder Aslan OSB TM(154/33 kV, 100 MVA + 2. Trafo Fideri)	KT	2020	2022	50.000.000	2.389.112	47.411.930	47.411.930	47.411.930	100	89 DE
96	18D002500	Lüleburgaz TM Tevsiat	KT	2021	2022	5.921.000	0	5.921.000	5.921.000	0	0	0 DE
97	2022D00-175939-176964	Kırklareli OSB TM 154/33 kV, 1. ve 2. Trafo Fideri	KT	2022	2024	16.000.000	0	1.100.000	1.100.000	0	0	0 İA
		Enerji İletim Hatları				70.900.000	1.150.815	5.941.012	5.940.890	40.890	1	
98	2001D00-634-64767	(Babaeski - Hamitabat) Brş. N. - Lüleburgaz EİH (154 kV 2x1272 MCM, 4 km)	KT	2018	2024	5.400.000	0	7.249	7.249	7.249	100	0 İA
99	2001D00-634-64788	Balkaya RES - Kıyıköy RES EİH 154 kV, 1272 MCM, 18 km	KT	2018	2024	14.000.000	150.815	100.000	100.000	0	0	0 İA
100	2020D00-149430-149454	Balkaya RES YEKA - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 14+14 km(İki Ayrı Hat)	KT	2020	2023	21.000.000	0	1	0	0	0	0 İA
101	2020D00-149430-149458	Seren RES - Vize 380 Havza EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 22 km)	KT	2020	2024	15.000.000	0	31.762	31.762	31.762	100	0 İA
102	2020D00-149430-149459	Seren RES - Evrencik RES EİH(TTFO)(154 kV, 1272 MCM, 9 km)	KT	2020	2024	6.000.000	0	2.000	1.879	1.879	94	0 İA
103	2020D00-149430-149518	(Pınarhisar - Traçım) Brş. N. - Pagder Aslan OSB EİH (TTFO)(154 kV, 1272 MCM, (6 + 6) km (İki Ayrı Hat)	KT	2020	2022	6.500.000	1.000.000	5.500.000	5.500.000	0	0	0 İA
104	2022D00-175939-176972	(Kırklareli – Pınarhisar) Brş. N. – Kırklareli OSB EİH (154 kV, 1272 MCM, 2+2 km (İki Ayrı Hat)	KT	2022	2024	3.000.000	0	300.000	300.000	0	0	0 İA



Babaeski Trafo Merkezi



Pagder Aslan OSB Trafo Merkezi

Proje sayısı: 171, Proje tutarı: 5.315.886.522, Önceki yıllar harcaması: 2.609.308.480, 2022 yılı harcaması: **802.937.216**

ulaştırma

Demiryolu

TCDD 1. Bölge Müdürlüğü

- Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı
- Demiryolları Bakım ve Onarımları

Karayolu

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü

- Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu
- (Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu
- (Pınarhisar - Vize) Ayrım - Demirköy - İğneada Yolu (9,3 km)
- Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü

İl Özel İdaresi

- Köy Yolları Yapım, Bakım ve Onarımı

Kentiçi Ulaşım

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Pehlivan köy Şehiriçi Yolları ve Kaldırım Yapımı

Halkalı – Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı

Halkalı - Çerkezköy (76 km) Çerkezköy - Kapıkule (153 km)

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Çerkezköy-Kapıkule Kesiminin İnşaatı, İlçesi: Babaeski, Lüleburgaz, Başlama ve bitiş tarihi: 2007 – 2023 (31.12.2023), Proje tutarı: 3.771.639.041, Harcama: 2.549.348.246, Nakdi gerçekleşme: % 68, Fiziki gerçekleşme: % 67

Hat bilgileri: Toplam hat: 152,906 km (İkili hat: 142,546 km + Üçlü hat: 10,360)

Toprak işleri: Güzergah ve temel kazısı: 63.792.000 m³, Dolgu:10.334.02 m³

Sanat yapıları: Menfez:175, Aç-Kapa Tünel: 8, Altgeçit: 52, Üstgeçit: 63, Demiryolu köprüsü: 33, Viyadük: 2

63.792.000 m³ kazının, 57.141.461 m³'ü (% 90) tamamlandı.

10.334.029 m³ dolgunun, 4.356.882 m³'ü (% 42) tamamlandı.

8 adet aç kapa tünel ve karayolu geçişi (6 adet tamamlandı – 2 adet devam ediyor)

2 adet viyadük (devam ediyor)

63 adet üst geçit (12 adet tamamlandı – 51 adet devam ediyor)

52 adet altgeçit (44 adet tamamlandı – 8 adet devam ediyor)

33 adet demiryolu köprüsü (7 adet tamamlandı – 26 adet devam ediyor)

175 adet menfez (116 adet tamamlandı – 59 adet devam ediyor)

353 Km'lik hattın yaklaşık 52 km'lik kısmının serimi yapılmıştır.

Projede yaklaşık 900.000 m³ balasta ihtiyaç vardır, yaklaşık 203.000 m³ balast üretimi gerçekleştirilmiş olup, 130,566 m³ balast serimi yapılmıştır.


305 deplase imalatı (196 adet tamamlandı – 108 adet devam ediyor.)

Toplam 229 km uzunluğa sahip hat tamamlandığında Halkalı - Kapıkule arası 4 saatten 1 saat 20 dakikaya düşecek, mevcut hat kapasitesi de 4 kat daha artacaktır. Ayrıca bölgedeki yoğun kara trafiğini azaltacak ulaşımın gelişmesine katkı sağlayacaktır.

Avrupa ülkeleriyle yüksek standartlı demiryolu bağlantısını sağlayacak Halkalı - Kapıkule Demiryolu Hattı, Çerkezköy-Kapıkule ve Halkalı-Çerkezköy demiryolu kesimlerinden oluşuyor. Çift hatlı, 200 km hıza uygun sinyalli ve elektrifikasyonlu olarak inşa edilen hatta yük ve yolcu trenleri çalışabilecek. Proje ile birlikte Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri hızlı tren ağına bağlanacaktır.


Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattıyla, Londra'dan Pekin'e uzanan Demir İpek Yolu'nun önemli bir parçası tamamlanmış olacaktır. Hat tamamlandığında Türkiye ve Trans Avrupa ağlarını yüksek kalitede birbirlerine bağlayacaktır. Bölgede üretilen sanayi ürünlerinin ihraç imkanları artacak, imalat sanayine gerekli olan hammaddelerin taşınması sırasında oluşacak lojistik maliyetleri azalacaktır.



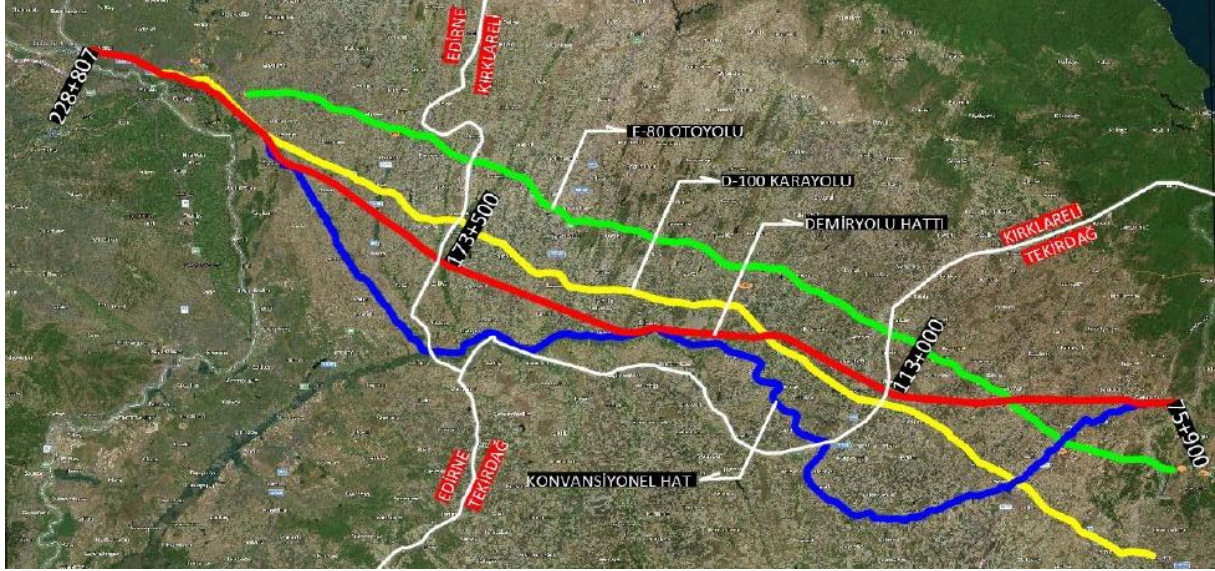

Çerkezköy 75,900 km (**Tekirdağ: 37,100 km**), Kırklareli il sınırı 113,000 km (**Kırklareli: 60,500 km**)
Kırklareli il sınırı 173,500 km, Kapıkule 228,807 km (**Edirne: 55,307 km**)

İstasyon Noktaları

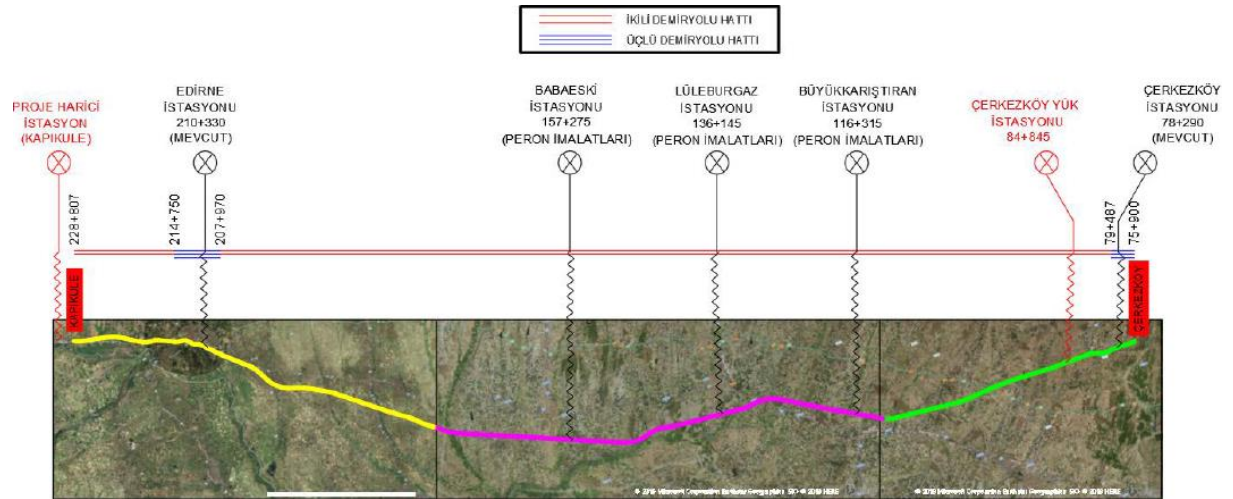

Kapıkule, Edirne (210,330), Babaeski (157,275), Lüleburgaz (136,145), Büyükkarıştıran (116,315), Çerkezköy Yük İstasyonu (84,845), Çerkezköy (78,290)



Halkalı – Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı

Kırklareli – Edirne Bölünmüş Yolu

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 26,5 / 47,5 km, Başlama ve bitiş tarihi: 2013 – 2024, Proje tutarı: 328.682.794, Harcama: 328.682.794. Kırklareli il sınırları içinde 21,5 km yol tamamlanarak hizmete açılmıştır. 391 m uzunluğunda 6 köprü (İnece, Dolapdere, Bostanlı, Akardere, Hasköy, Sazlıdere) yapılmıştır.

Saray – Kırklareli Yolu

İlçesi: Merkez, Pınarhisar, Vize, Karakteristiği: 71,1 km (32,1 BY, 39 TY), 4 köprü (186 m), Başlama ve bitiş tarihi: 2019 – 2025, Proje tutarı: 1.015.000.000, Harcama: 379.392.344

Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın video konferans ile teşrifleri ile 30 Nisan 2022 Cumartesi günü düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kırklareli'yi Saray üzerinden organize sanayi bölgeleri ve Avrupa Serbest Bölgesi ile Tekirdağ'a bağlayan Saray-Kırklareli yolu projesi kapsamında 7,4 kilometrelik Pınarhisar çevre yolu ile 3 kilometrelik Çakıllı çevre yolumuzun yapımı tamamlanarak hizmete açıldı. Açılışı yapılan kesimlerde 2 alt geçit, 6 hemzemin kavşak, 21 hidrolik sanat yapısı yer alıyor. Yolun 21,9 kilometrelik kesimi bölünmüş yol seviyesinde tamamlanacak. Kalan kesimlerde yapım çalışmaları devam ediyor.

Projenin tamamlanmasıyla, yıllık ortalama günlük trafik miktarı 7 bine yaklaşan yoldaki seyahat süresi 33 dakika kısalacak ve 78 dakikadan 45 dakikaya inecek. Yıllık toplam 128,3 milyon TL tasarruf edilecek. Karbon emisyon miktarı 7.275 ton azaltılacak.



Pınarhisar ve Çakıllı Çevre Yolları Açılış Töreni (30.04.2022)

(Pınarhisar – Vize Ayrımı) – Demirköy – İğneada Yolu Rehabilitasyonu

İlçesi: Demirköy, Karakteristiği: 9,3 km (1A, 12 m) (5,5 km Demirköy Çevre yolu), Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2024, Proje tutarı: 95.000.000, Harcama: 93.172.650



Kırklareli – Edirne Bölünmüş Yolu



Pınarhisar Çevre Yolu



Çakıllı Çevre Yolu

İl Özel İdaresi**Köy Yolları Yapım Bakım ve Onarımı**

İlçesi: Muhtelif, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 14.053.740, Harcama: 9.592.054

Köy yolları yapım, bakım ve onarımı**Sıcak asfalt kaplama 9,000 km (başlamadı)****İkinci kat asfalt kaplama 3,450 km (tamamı yapıldı)****Birinci kat asfalt kaplama 25,800 km (tamamı yapıldı)****Parke taş kaplaması 83.667 m2 (83.203 m2 yapıldı)****Köprü, menfez ve sanat yapıları 7adet (3 adet yapıldı)****KÖYDES****Köy Yolları Yapım Bakım ve Onarımı (KÖYDES)**

İlçesi: Muhtelif, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 12.976.511, Harcama: 11.110.349

Köy yolları yapım, bakım ve onarımı**İkinci kat asfalt kaplama 3,000 km (başlamadı)****Birinci kat asfalt kaplama 15,800 km (13,000 km yapıldı)****Parke taş kaplaması 10.137 m2 (897 m2 yapıldı)****Köprü, menfez ve sanat yapıları 5 adet (0 adet yapıldı)**

Deveçatağı, 20.06.2022



Kırklareli’nde 23 km Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) yol, 19 km. beton yol, 1364 km sathi asfalt kaplama yol, 244 km parke taş, 819 km stabilize yol, 91 km ham yol, 16 km tesviyeli yol olmak üzere toplam 2576 km köy yolu bulunmaktadır.

İl Özel İdaresi’nin; 20 adet binek oto, 1 adet camlı van, 12 adet pickup, 3 adet minibüs, 3 adet otobüs, 22 adet damperli kamyon, 1 adet traktör, 1 adet dozer, 9 adet greyder, 5 adet yükleyici, 1 adet ekskavatör, 2 adet çekici, 7 adet silindir, 4 adet distribütör, 2 adet tanker, 1 adet kaynak makinesi, 2 adet kar püskürtme makinesi, 3 adet treyler, 1 adet jeneratör, 4 adet vidanjör ve 9 adet çöp kamyonu bulunmaktadır.

2022 yılında, İl Özel İdaresi’nden 6,250 km. Doğal Afet ödeneğinden 23 km ve Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 11 km yolların tamamı bitirilmiştir. Ek Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 8,800 km. köyyolu İl Özel İdaresi ekiplerince pür emanet olarak yapılması çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca; İl Özel İdaresi’nden 83.667 m² parke taş, 1.250 mt trapez kanal ve 1 adet oto korkuluk yapılması planlanmıştır. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 9.713 m² parke taş, 1.050 mt trapez kanal ve 1 adet menfez yapılması planlanmıştır.

Kış şartları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımın açık tutulabilmesi amacıyla, kırsal yol ve altyapılarda meydana gelen tahribatların giderilmesi amacıyla Müdürlüğünüz bütçesine İçişleri Bakanlığı tarafından tahsis edilen 15.000.000,00 TL ödenek ile 9 km. BSK yol yapılması işi planlanmış olup ihale işlemleri devam etmektedir.

Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında tahsis edilen 16.233.796,00 TL ödenek ve Ek Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında tahsis edilen 11.653.426,00 TL ödenekler ile toplam 103 adet proje yapılması planlanmıştır.

2021 yılında Mobil Atık Toplama merkezi aracı Ford Truck, 1 adet Isuzu NPR evsel atık toplama aracı ve 78 adet çöp konteyneri alınmıştır.

2022 yılında 45 adet çöp konteyneri alınmıştır.

Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet çift kabin Ford Transit marka kamyonet satın alınmıştır.

Makine parkına iş makineleri alımı için İl Genel Meclisinden 30.000.000,00 TL borçlanma için karar alınmış olup ilgili Bakanlık onayıyla İller Bankasından kredi kullanılmıştır.

Bu kredi ile Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Komatsu Marka D85EX-15E0 Paletli Dozer, 2 adet Hidromek Marka HMK 600MG Greyder satın alınarak kurumumuzda kullanılmaya başlanmıştır.

Kredi ile Devlet Malzeme Ofisinden 1 adet Hidromek Marka HMK 300 NLC 3,07 Arm Paletli Ekskavatör ve Kırıcı ataşmanı , 3 Adet Mercedes Benz Marka Arocs 3332K/6x4/3600 14 m³ Hacimli Damperli Kamyon ve 1 Adet Mercedes Benz Marka Arocs 3345 K/6x4/3600 14 m³ Hacimli Damperli Karla Mücadele Paketli Kar Bıçağı ve Tuz Sericisi olan Kamyon sipariş edilmiş olup teslimatları beklenmektedir.

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	Açıklamalar
											leşme (%)	leşme (%)
		Ulaştırma Demiryolu				5.315.836.522	2.609.308.480	953.048.803	791.969.016	791.826.867	83	
		TCDD 1. Bölge Müdürlüğü				3.799.807.272	2.152.494.733	543.744.399	400.284.262	400.284.262	74	
105	2007E01-842	Halkalı - Kapıkule Yüksek Standartlı Demiryolu İnşaatı (60 / 230 km) Çerkezköy - Kapıkule Kesimi (60 / 153 km)	KT	2007	2023	3.771.639.041	2.152.400.024	540.000.000	396.948.222	396.948.222	74	67 DE
106	2016.E010060.27.01.0005	İstasyonların Kompanzasyon Sistemlerinin Yapılması	KT	2021	2022	107.557	94.709	12.848	0	0	0	99 DE
107	2019.E010140.01.01.0023	Çerkezköy - Kapıkule Sinyalizasyon Sistemleri İçin Kesintisiz Güç Kaynağı Temini (9 Adet)	KT	2020	2022	3.283.500	0	3.283.500	3.283.500	3.283.500	100	100 BT
108	2020.E010080.42.01.0003	Muratlı - Büyükkarıştıran Çift Hat ve Babaeski - Kırklareli - Mandıra Müselleesi ile Bağlantısı Hattı Etüt, Proje, Mühendislik ve Danışmanlık Hizmeti Alımı	KT	2020	2022	5.874.126	0	1	0	0	0	0 İA
109	2020.E010140.01.01.0024	Çerkezköy - Kapıkule Arasındaki 100 Adet Blok ve KBS Sinyallerinin Ledli Sinyalle Değişiminin Yapılması	KT	2021	2022	262.000	0	110.000	0	0	0	50 DE
110	2021.E010140.01.01.0030	Trakya Hat Kesminde Hat Boyu Sinyalizasyon Sistemlerine ait Bilgilerin F/O Kablo ile Çerkezköy Kumanda Merkezine Taşınması	KT	2021	2022	301.920	0	301.920	52.540	52.540	17	100 BT
111	2017.E010110.01.03	Alpullu Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2022	13.900	0	13.900	0	0	0	60 DE
112	2017.E010110.01.03	Lüleburgaz Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2022	7.900	0	7.900	0	0	0	60 DE
113	2017.E010110.01.03	Pehlivan köy Erişilebilirlik Projeleri Yapımı (1. Etap)	KT	2021	2022	14.328	0	14.328	0	0	0	80 DE
114	2020.E010190.01.14	Alpullu Çatalca Çorlu Kurfalı Lüleburgaz Muratlı Pehlivan köy Velimeşe Peron Peronbeji Uzatma	KT	2022	2023	9.303.000	0	1	0	0	0	0 İA
115	2020.E010190.01.21	İstasyonların Saha Aydınlatmalarının Yapılması	KT	2022	2023	9.000.000	0	1	0	0	0	0 İA
		Karayolu				1.514.853.156	456.530.851	408.587.300	391.371.764	391.229.615	96	
		Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü				1.487.872.905	456.500.338	381.637.562	381.637.561	381.637.561	100	
		Yol Yapımları				1.438.682.794	456.500.338	344.747.450	344.747.450	344.747.450	100	
116	2013E04-1777	Kınalı Ayrımı - Çerkezköy - Saray - Kırklareli Devlet Yolu (1A BSK 53 Km , BY 35 Km, İyileştirme 29 Km)	ÖB	2013	2025	1.015.000.000	218.034.344	161.358.000	161.358.000	161.358.000	100	66 DE
117	2016E04-2634	(Edirne - Havsa) Ayrımı - Hasköy - Kırklareli Bölünmüş Yolu (26,5 / 47,5 km)	ÖB	2013	2024	328.682.794	235.561.344	93.121.450	93.121.450	93.121.450	100	95 DE
118	1986E04-128-170005	(Pınarhisar-Vize)Ayr.-Demirköy-İğneada Devlet Yolu Yapımı (9,3 km)	ÖB	2021	2024	95.000.000	2.904.650	90.268.000	90.268.000	90.268.000	100	77 DE
		Köprü Yapımları				12.300.000	0	1	0	0	0	
119	2000E04-619-63099	Sokullu Mehmet Paşa Köprüsü (90 m)	ÖB	2015	2023	12.300.000	0	1	0	0	0	0 YT
		Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Çalışmaları				28.282.227	0	28.282.227	28.282.227	28.282.227	100	
120	1991E040090	Asfalt, Bakım, Onarım ve Trafik Çalışmaları	ÖB	2022	2022	28.282.227	0	28.282.227	28.282.227	28.282.227	100	DE
		Kamulaştırmalar				8.607.884	0	8.607.884	8.607.884	8.607.884	100	
121	00000000-000	Kamulaştırmalar	ÖB	2022	2022	8.607.884	0	8.607.884	8.607.884	8.607.884	100	DE
		İl Özel İdaresi				14.053.740	30.513	14.023.227	9.734.203	9.592.054	68	
	00000000-000	Köy Yolu Yapım, Bakım ve Onarımı				14.053.740	30.513	14.023.227	9.734.203	9.592.054	68	
		KÖYDES				12.926.511	0	12.926.511	0	0	0	
	00000000-000	Köy Yolu Yapım, Bakım ve Onarımı				12.926.511	0	12.926.511	0	0	0	
		Kentçi Ulaşım				1.176.094	282.896	717.104	312.990	312.990	44	
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				1.176.094	282.896	717.104	312.990	312.990	44	
271	00000000-000	Pehlivan köy Şehiriçi Yolları ve Kaldırım Yapımı	İB	2021	2022	1.176.094	282.896	717.104	312.990	312.990	44	50 DE

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Ağırlık malar
		İl Özel İdaresi				14.053.740	30.513	14.023.227	9.734.203	9.592.054	68		
		Köy Yolları Yapımı				14.053.740	30.513	14.023.227	9.734.203	9.592.054	68		
		1. Kat Asfalt Kaplama (25,800 / 25,800 km)				750.002	0	750.002	750.000	750.000	100		
122	0000000-000	Kumrular - Müsellim Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (12 km)	GB	2022	2022	1	0	1	0	0	0	100	BT
123	0000000-000	Yeşilce - Ky.İlt. (Hamdibey) Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (11 km)	GB	2022	2022	1	0	1	0	0	0	100	BT
124	0000000-000	Soğucak - Sergen Köy yolu 1. Kat Asfalt Kaplama (2,800 km)	GB	2022	2022	750.000	0	750.000	750.000	750.000	100	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (3,450 / 3,450 km)				750.000	0	750.000	0	0	0		
125	0000000-000	K.eli Dereköy Köyü Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (0,750 km)	GB	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	100	BT
126	0000000-000	K.eli Deveçatağı Köyü Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (0,750 km)	GB	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	100	BT
127	0000000-000	K.eli Koyunbaba Köyü Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (0,750 km)	GB	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	100	BT
128	0000000-000	Pınarhisar - Evçiler Köy yolu 2. Kat Asfalt Kaplama (1,200 km)	GB	2022	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	100	BT
		Beton Kaplama (9 / 9 km)				1	0	1	0	0	0		
129	0000000-000	Lüleburgaz - Umurca - Sakızköy - Emirali Ky. BSK Kaplaması (9 km)	GB	2022	2022	1	0	1	0	0	0	0	HB
		Parke Taşı Kaplaması (83.203 / 83.667 m2)				7.915.000	0	7.915.000	7.815.000	7.815.000	99		
130	0000000-000	K.eli Arızbaba Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
131	0000000-000	K.eli Asilbeyli Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
132	0000000-000	K.eli Bayramdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
133	0000000-000	K.eli Değirmencik Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.205 m²)	Öİ	2022	2022	115.000	0	115.000	115.000	115.000	100	100	BT
134	0000000-000	K.eli Dolhan Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
135	0000000-000	K.eli Düzorman Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
136	0000000-000	K.eli Erikler Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
137	0000000-000	K.eli Karadere Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
138	0000000-000	K.eli Karahamza Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
139	0000000-000	K.eli Kavakdere Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
140	0000000-000	K.eli Kayalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.257 m²)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
141	0000000-000	K.eli Kocahıdır Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
142	0000000-000	K.eli Koruköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
143	0000000-000	K.eli Paşayeri Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
144	0000000-000	K.eli Şukrûpaşa Köyü Parke Taşı Kaplaması (629 m²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
145	0000000-000	K.eli Ürünütlü Köyü Parke Taşı Kaplaması (838 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
146	0000000-000	K.eli Yoğuntaş Köyü Parke Taşı Kaplaması (733 m²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
147	0000000-000	B.eski Çavuşköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
148	0000000-000	B.eski Çengerli Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
149	0000000-000	B.eski Çiğdemli Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
150	0000000-000	B.eski Düşüncülü Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
151	0000000-000	B.eski Eriklyurdu Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
152	0000000-000	B.eski Haznedar Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
153	0000000-000	B.eski Kadıköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
154	0000000-000	B.eski Karabayır Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.311 m²)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
155	0000000-000	B.eski Karacaoğlan Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
156	0000000-000	B.eski Karamesutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
157	0000000-000	B.eski Katranca Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
158	0000000-000	B.eski Kuleli Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
159	0000000-000	B.eski Kumrular Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
160	0000000-000	B.eski Kuzuğardağı Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
161	0000000-000	B.eski Mutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
162	0000000-000	B.eski Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
163	0000000-000	B.eski Nacac Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
164	0000000-000	B.eski Nadırlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (656 m²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
165	0000000-000	B.eski Oruçlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
166	0000000-000	B.eski Osmaniye Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
167	0000000-000	B.eski Pancarköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (546 m²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
168	0000000-000	B.eski Sinanlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
169	0000000-000	B.eski Sofuhalil Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
170	0000000-000	B.eski Taşahıl Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.311 m²)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
171	0000000-000	B.eski Taşköprü Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
172	0000000-000	B.eski Terzili Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
173	0000000-000	B.eski Yeniköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
174	0000000-000	B.eski Yenimahalle Köyü Parke Taşı Kaplaması (874 m²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
175	00000000-000	D.köy Armutveren Köyü Parke Taşı Kaplaması (677 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
176	00000000-000	D.köy Beğendik Köyü Parke Taşı Kaplaması (871 m ²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
177	00000000-000	D.köy Hamdibey Köyü Parke Taşı Kaplaması (774 m ²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
178	00000000-000	D.köy Limanköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (774 m ²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
179	00000000-000	D.köy Sivrilir Köyü Parke Taşı Kaplaması (871 m ²)	Öİ	2022	2022	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
180	00000000-000	Koçgaz Aşağıkanara Köyü Parke Taşı Kaplaması (581 m ²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
181	00000000-000	Koçgaz Beyci Köyü Parke Taşı Kaplaması (484 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
182	00000000-000	Koçgaz Malkoçlar Köyü Parke Taşı Kaplaması (871 m ²)	Öİ	2022	2022	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
183	00000000-000	Koçgaz Tastepe Köyü Parke Taşı Kaplaması (387 m ²)	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	40.000	40.000	100	100	BT
184	00000000-000	Koçgaz Terzidere Köyü Parke Taşı Kaplaması (581 m ²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
185	00000000-000	L.burgaz Akçaköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
186	00000000-000	L.burgaz Alacaoğlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
187	00000000-000	L.burgaz Ayvalı Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
188	00000000-000	L.burgaz Celaliye Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
189	00000000-000	L.burgaz Çeşmekolu Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
190	00000000-000	L.burgaz Davutlu Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
191	00000000-000	L.burgaz Düğüncübaşı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
192	00000000-000	L.burgaz Emirali Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
193	00000000-000	L.burgaz Ertuğrul Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
194	00000000-000	L.burgaz Hamzabey Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
195	00000000-000	L.burgaz Karaağaç Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
196	00000000-000	L.burgaz Karamusul Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
197	00000000-000	L.burgaz Kırıkköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (2.233 m ²)	Öİ	2022	2022	200.000	0	200.000	200.000	200.000	100	100	BT
198	00000000-000	L.burgaz Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
199	00000000-000	L.burgaz Oklağlı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
200	00000000-000	L.burgaz Ovacık Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
201	00000000-000	L.burgaz Sakızköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
202	00000000-000	L.burgaz Sarıcaali Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
203	00000000-000	L.burgaz Seyitler Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
204	00000000-000	L.burgaz Seyitler Köyü Parke Taşı Kaplaması (464 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	İA
205	00000000-000	L.burgaz Tatarıköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
206	00000000-000	L.burgaz Turgutbey Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.117 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
207	00000000-000	L.burgaz Yenitaşı Köyü Parke Taşı Kaplaması (558 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
208	00000000-000	P.köy Doğanca Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.362 m ²)	Öİ	2022	2022	130.000	0	130.000	130.000	130.000	100	100	BT
209	00000000-000	P.köy İnampazarı Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.257 m ²)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
210	00000000-000	P.köy Kuştepe Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.048 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
211	00000000-000	P.köy Yeşilova Köyü Parke Taşı Kaplaması (629 m ²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
212	00000000-000	P.köy Yeşilpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (629 m ²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
213	00000000-000	P.hisar Sütüce Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.048 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
214	00000000-000	Vize Akıncılar Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
215	00000000-000	Vize Akpınar Köyü Parke Taşı Kaplaması (1.006 m ²)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
216	00000000-000	Vize Aksicim Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
217	00000000-000	Vize Balkaya Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
218	00000000-000	Vize Develi Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
219	00000000-000	Vize Doğanca Köyü Parke Taşı Kaplaması (615 m ²)	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
220	00000000-000	Vize Düzova Köyü Parke Taşı Kaplaması (604 m ²)	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
221	00000000-000	Vize Evrenli Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
222	00000000-000	Vize Kışlacık Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
223	00000000-000	Vize Küçükayla Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
224	00000000-000	Vize Müsellim Köyü Parke Taşı Kaplaması (503 m ²)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
225	00000000-000	Vize Pazarcık Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
226	00000000-000	Vize Topçuköy Köyü Parke Taşı Kaplaması (704 m ²)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
Köprü, Menfez ve Sanat Yapıları						380.000	0	380.000	0	0	0	0	
227	00000000-000	K.eli Yoğuntaş Köyü Menfez Yapımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
228	00000000-000	B.eski Sofuhalil Köyü Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	40.000	0	40.000	0	0	0	100	BT
229	00000000-000	B.eski Yenimahalle Köyü Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	100	BT
230	00000000-000	Koçgaz Beyci Köyü Kapalı İzgara ve Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
231	00000000-000	Koçgaz Devletiağaç Köyü Trapez Kanal ve İzgaralı Geçiş Yapımı	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	0	0	0	100	BT
232	00000000-000	Koçgaz Kocayazı Köyü Bariyer Yapımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	0	0	0	100	BT
233	00000000-000	Koçgaz Kocayazı Köyü Ahmetler Ayrımı Bariyer Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	100	BT
234	00000000-000	Koçgaz Tatlıpınar Köyü Trapez Kanal Yapımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	0	0	0	0	HB
235	00000000-000	Koçgaz Yukarıkanara Yaya Geçidi Köprüsü Yapımı	Öİ	2021	2022	70.000	0	70.000	0	0	0	0	HB

Sıra No	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Ağırlık malar
		Diğerleri				4.258.737	30.513	4.228.224	1.169.203	1.027.054	24		
236	0000000-000	Köy yolları Yapım, Bakım ve Onarımları	Öİ	2020	2022	3.500.000	0	3.500.000	490.467	490.467	14		DE
237	0000000-000	Araç Takip Sistemi Alımı	Öİ	2020	2022	80.000	30.513	49.487	0	0	0		DE
238	0000000-000	Yedek Parça Alımı	Öİ	2020	2022	1	0	1	0	0	0		HB
239	0000000-000	Hareketli İş Makinesi Alımı	Öİ	2022	2022	578.586	0	578.586	578.586	436.437	75		DE
240	0000000-000	Koçaz Köy Yolları Çizgilerinin Çizilmesi ve Mezarlık Yollarının Düzenlemesi	Öİ	2022	2022	100.150	0	100.150	100.150	100.150	100	100	BT
		KÖYDES				12.976.511	0	12.976.511	11.110.349	11.110.349	86		
		1. Kat Asfalt Kaplama (13 / 15,800 km)				6.241.485	0	6.241.485	5.480.088	5.480.088	88		
241	0000000-000	Dy.İlt. Paşayeri-Dolhan Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	957.253	0	957.253	540.230	540.230	56	100	BT
242	0000000-000	Kocahıdır - Arızaba Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (4 km)	KP	2022	2022	2.259.441	0	2.259.441	2.161.596	2.161.596	96		DE
243	0000000-000	Ky.İlt-Boztaş-Yığıtbaşı Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (2 km)	KP	2022	2022	774.038	0	774.038	774.038	774.038	100	100	BT
244	0000000-000	Koçaz Devletliiğaç Köy içi 1. kat Asfalt Kaplama (0,800 km)	KP	2022	2022	300.000	0	300.000	270.000	270.000	90		DE
245	0000000-000	Dy.İlt.-Ayvalı Ky. 1. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	1.016.310	0	1.016.310	1.016.310	1.016.310	100	100	BT
246	0000000-000	Vize-Develi-Çavuşköy-Doğanca (Ky.İlt.) Ky. 1. kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	934.444	0	934.444	717.914	717.914	77	100	BT
		2. Kat Asfalt Kaplama (0 / 3 km)				1.115.020	0	1.115.020	1.002.520	1.002.520	90		
247	0000000-000	Dy. İlt. - Kocatarla Ky. 2. Kat Asfalt Kaplama (3 km)	KP	2022	2022	1.115.020	0	1.115.020	1.002.520	1.002.520	90		DE
		Parke Taşı Kaplaması (897 / 10.137 m²)				1.912.705	0	1.912.705	248.036	248.036	13		
248	0000000-000	B.eski Çavuşköy Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (209 m²)	KP	2022	2022	40.000	0	40.000	38.981	38.981	97	100	BT
249	0000000-000	B.eski Haznedar Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (785 m²)	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
250	0000000-000	B.eski Karabayır Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (523 m²)	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
251	0000000-000	B.eski Katranca Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (785 m²)	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
252	0000000-000	B.eski Kuleli Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (418 m²)	KP	2022	2022	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
253	0000000-000	B.eski Nadrılı Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (261 m²)	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
254	0000000-000	B.eski Nadrılı Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (209 m²)	KP	2022	2022	40.000	0	40.000	38.981	38.981	97	100	BT
255	0000000-000	B.eski Oruncu Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (261 m²)	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
256	0000000-000	B.eski Taşgöl Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (458 m²)	KP	2022	2022	87.481	0	87.481	0	0	0	0	HB
257	0000000-000	B.eski Yeniköy Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (218 m²)	KP	2022	2022	41.535	0	41.535	40.392	40.392	97	100	BT
258	0000000-000	L.burgaz Çiftlik Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (506 m²)	KP	2022	2022	93.777	0	93.777	0	0	0	0	HB
259	0000000-000	L.burgaz Davutlu Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (432 m²)	KP	2022	2022	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
260	0000000-000	L.burgaz Karaağaç Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (684 m²)	KP	2022	2022	126.670	0	126.670	0	0	0	0	HB
261	0000000-000	L.burgaz Müsellim Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (486 m²)	KP	2022	2022	90.000	0	90.000	0	0	0	0	HB
262	0000000-000	L.burgaz Oklağlı Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (432 m²)	KP	2022	2022	80.000	0	80.000	0	0	0	0	HB
263	0000000-000	L.burgaz Sarıcaali Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (540 m²)	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
264	0000000-000	L.burgaz Tuğutbey Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (684 m²)	KP	2022	2022	126.670	0	126.670	0	0	0	0	HB
265	0000000-000	L.burgaz Tuğutbey Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (700 m²)	KP	2022	2022	129.902	0	129.902	129.682	129.682	100		DE
266	0000000-000	L.burgaz Yenitaşı Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (684 m²)	KP	2022	2022	126.670	0	126.670	0	0	0	0	HB
267	0000000-000	Vize Soğucak Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (355 m²)	KP	2022	2022	70.000	0	70.000	0	0	0	0	HB
268	0000000-000	Vize Topçuköy Köyü İçerisi Parke Taşı Yapımı (507 m²)	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
		Menfez Yapımı (0 / 5 adet)				622.879	0	622.879	118.969	118.969	19		
269	0000000-000	P.köy Akarca Trapez Kanal Yapımı ve Büz Döşenmesi	KP	2022	2022	77.583	0	77.583	69.029	69.029	89		DE
270	0000000-000	P.köy Hıdırcı Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	49.940	49.940	100		DE
271	0000000-000	P.hisar Hacıfaklı Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	36.245	0	36.245	0	0	0	0	HB
272	0000000-000	Vize Akıncılar Trapez Kanal Yapımı	KP	2022	2022	160.000	0	160.000	0	0	0	0	HB
273	0000000-000	Vize Sergen Menfez Yapımı	KP	2022	2022	299.051	0	299.051	0	0	0	0	HB
		Ortam Alım				3.084.422	0	3.084.422	4.260.736	4.260.736	138		
274	0000000-000	Yönetim Giderleri ve Ortak Alımlar	KP	2022	2022	3.084.422	0	3.084.422	4.260.736	4.260.736	138		DE

Proje sayısı: 2, Proje tutarı: 1.100.000, Önceki yıllar harcaması: 0, 2022 yılı harcaması: **761.293**

turizm

Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü

- İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Alan Düzenlemesi

Sıra no	Proje Numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para salı (TL)	Fiziki işleme (%)	Gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Turizm				1.100.000	0	1.100.000	761.293	761.293	69			
		Tarım ve Orman 1. Bölge Müdürlüğü				1.100.000	0	1.100.000	761.293	761.293	69			
275	0000000-000	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Mescit Yapımı	GB	2022	2022	600.000	0	600.000	354.350	354.350	59	100		BT
276	0000000-000	İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Yürüş Yolları ve Giriş Takı Yapımı	GB	2022	2022	500.000	0	500.000	406.943	406.943	81			DE



İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı

Proje sayısı: 1, Proje tutarı: 1.750.000, Önceki yıllar harcaması: 1.500.000, 2022 yılı harcaması: **250.000**

konut

Valilik

- Pınarhisar Kaymakam Evi

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para salı (TL)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Konut				1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100		
		Valilik				1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100		
277	0000000-000	P.hisar Kaymakamevi İnşaatı	GB	2021	2022	1.750.000	1.500.000	250.000	250.000	250.000	100		DE

Proje sayısı: 49, Proje tutarı: 525.934.444, Önceki yıllar harcaması: 65.440.639, 2022 yılı harcaması: **61.002.730**

eğitim

İlköğretim ve Genel Ortaöğretim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- **Anaokulu:** Babaeski, Lüleburgaz, Lüleburgaz Özel Eğitim
- **İlkokul:** Kırklareli
- **Ortaokul:** Kırklareli, Babaeski
- **Bilim Sanat Merkezi:** Kırklareli
- **Spor Salonu:** Babaeski
- Bakım ve onarımlar

Mesleki ve Teknik Eğitim

İl Milli Eğitim Müdürlüğü

- **Lise:** Kırklareli, Lüleburgaz, Vize
- **Spor Salonu:** Vize
- Bakım ve onarımlar

Yüksek Öğretim

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

- Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
- Muhtelif İşler
- Kampüs Altyapısı
- Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi İnşaatı
- Yayın Alımları

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

- Öğrenci Yurdu Bakım ve Onarımı

Kültür**İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü**

- Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı
- Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı
- Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadil ve Tefrişatı
- Eski Eser Restorasyonlarına Yardım
- Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım

İl Özel İdaresi

- Kırkireli Tarihi Gar Binası Röleve ve Restorasyonu
- Kırkireli Kocahıdır İlköğretim Okulu Röleve Restitüsyon ve Restorasyonu
- Kırkireli Yapraklı Mahallesindeki Taşınmazın Restitüsyon ve Restorasyonu
- Kırkireli İlim Yayma Cemiyeti Restorasyonu
- Babaeski Sinanlı Osmanlı Çeşmesi Onarımı
- Lüleburgaz Oklağlı Camii Bakım ve Onarımı
- Pınarhisar Kalesi ve Surları Koruma Planı Yapımı
- Pınarhisar Poyralı Cami Bakım ve Onarımı
- Vize Hükümet Konağı Röleve ve Restitüsyon Projesi

Beden Eğitimi ve Spor**Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü**

- Kırkireli Spor Salonu Yapımı
- Kırkireli MY Spor Tesisi Tenis Kortları Bakım ve Onarımı
- Kırkireli Hokey Sahası Tribün, Soyunma Odaları ve Aydınlatma Yapımı
- Kırkireli HS Kışlası Açık Spor Tesisleri Yapımı
- Kırkireli Armağan Spor Alanı Üzerinin Kapatılması
- Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı (2000 seyircili)
- Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı
- Lüleburgaz 8 Kasım Stadı Bakım ve Onarımı
- Pınarhisar Çim Yüzeyle Futbol Sahası Bakım ve Onarımı (Portatif Tribün + Soyunma Odası + Aydınlatma)
- Vize Spor Tesisleri Bakım ve Onarımı (İhata Duvarı + Doğal Gaz Dönüşümü)

Kırklareli Bademlik Mahallesi İlkokulu

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 16 derslik, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Proje tutarı: 30.000.000, Harcama: 5.235.138

Vize Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İlçesi: Vize, Karakteristiği: 16 derslik ve atölye, Başlama ve bitiş tarihi: 2015 – 2022, Proje tutarı: 31.881.553, Harcama: 31.881.553

Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 25 derslik, 20 laboratuvar ve 1 konferans salonu, 15.700 m2, Başlama ve bitiş tarihi: 2020 – 2023, Proje tutarı: 48.500.000, Harcama: 29.310.739



Kırklareli Bademlik (Camikebir) Mahallesi İlkokulu



Vize Meslek ve Teknik Lisesi



Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi

Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı

İlçesi: Lüleburgaz, Karakteristiği: 2.555 m2, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2023, Proje tutarı: 11.600.000, Harcama: 4.291.551

Kırklareli Spor Salonu Yapımı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: 2.000 kişilik, Başlama ve bitiş tarihi: 2015 – 2022 (Sözleşme tarihi: 29.09.2020, Bitiş tarihi: 11.02.2022), Proje tutarı: 38.775.240 (Sözleşme bedeli: 30.318.000 + KDV), Harcama: 20.115.711



Lüleburgaz İlçe Halk Kütüphanesi



Kırklareli Spor Salonu



Org. Haydar SÜKAN Kışlası Açık Spor Tesisi Yapım



Vali Mustafa Yaman Spor Tesisi Tenis Kortları Bakım ve Onarımı



Hokey Sahası



Pınarhisar Futbol Sahası

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. leşme (%)	Fiziki leşme (%)	Açıklamalar
		Eğitim				525.934.444	65.440.639	207.382.712	96.468.359	61.002.730	29		
		İlköğretim ve Genel Ortaöğretim				172.253.000	0	58.305.000	32.726.828	13.525.895	23		
		İl Millî Eğitim Müdürlüğü				172.253.000	0	58.305.000	32.726.828	13.525.895	23		
		Anaokulu İnşaatları (6 drs)				37.992.000	0	13.900.000	1.500.000	30.090	0		
278	0000000-000	B.eski Anaokulu İnşaatı (6 drs)	Öİ	2020	2023	7.832.000	0	6.500.000	1.500.000	30.090	0	0	İA
279	0000000-000	L.burgaz Anaokulu İnşaatı (6 drs)	Öİ	2022	2023	7.832.000	0	5.000.000	0	0	0	0	PA
280	0000000-000	L.burgaz Dere Mah. Özel Eğitim Anaokulu İnşaatı (12 drs)	Öİ	2022	2023	22.328.000	0	2.400.000	0	0	0	0	PA
		İlkokul İnşaatları (16 drs)				30.000.000	0	7.250.000	7.250.000	5.235.138	72		
281	0000000-000	K.eli Camikebir Mah. İlkokulu Yapımı (16 drs)	Öİ	2021	2023	30.000.000	0	7.250.000	7.250.000	5.235.138	72	25	DE
		Ortaokul İnşaatları (48 drs)				62.376.000	0	6.600.000	0	0	0		
282	0000000-000	K.eli İstiklal Ortaokulu İnşaatı (24 drs)	Öİ	2022	2023	34.672.000	0	3.600.000	0	0	0	0	İA
283	0000000-000	B.eski Ortaokulu İnşaatı (24 drs)	Öİ	2022	2023	27.704.000	0	3.000.000	0	0	0	0	PA
		Diğer Okul İnşaatları (8 derslik)				13.200.000	0	1.870.000	550.000	0	0		
284	2014H01-1567-67869	Kırklareli Bilim Sanat Merkezi İnşaatı (8 derslik)	GB	2017	2024	13.200.000	0	1.870.000	550.000	0	0	0	PA
		Diğerleri				28.685.000	0	28.685.000	23.426.828	8.260.667	29		
285	0000000-000	İlköğretim ve Genel Ortaöğretim Kurumları Bakım ve Onarımları	GB	2022	2022	28.685.000	0	28.685.000	23.426.828	8.260.667	29	69	DE
		Mesleki ve Teknik Eğitim				172.486.553	14.732.531	51.311.338	34.504.022	18.408.605	36		
		İl Millî Eğitim Müdürlüğü				172.486.553	14.732.531	51.311.338	34.504.022	18.408.605	36		
		Lise İnşaatları (56 derslik)				160.881.553	14.732.531	39.706.338	22.899.022	17.231.150	43		
286	2010H02-373	K.eli OSB Mesleki ve Teknik Lise (16 derslik + 3 Atölye + Spor Salonu)	GB	2021	2024	55.200.000	0	5.520.000	0	0	0	0	PA
287	2010H02-373-67440	Lüleburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İnşaatı (24 derslik, 3 atölye, spor salonu)	GB	2015	2024	64.800.000	82.128	15.805.188	5.417.872	0	0	0	İA
288	2010H02-373-67439	Vize Mesleki ve Teknik Lise İnşaatı (16 drs + Atölye)	GB	2015	2022	31.881.553	14.650.403	17.231.150	17.231.150	17.231.150	100	100	BT
289	2014H05-822-66397	Vize Mesleki ve Teknik Lise Spor Salonu İnşaatı	GB	2018	2024	9.000.000	0	1.150.000	250.000	0	0	0	PA
		Diğerleri				11.605.000	0	11.605.000	11.605.000	1.177.455	10		
290	0000000-000	Mesleki ve Teknik Eğitim Kurumları Bakım ve Onarımları	GB	2022	2022	11.605.000	0	11.605.000	11.605.000	1.177.455	10	68	DE
		Yüksek Öğretim				60.082.500	18.780.529	34.822.500	15.049.823	15.049.822	43		
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				59.460.000	18.780.529	34.200.000	14.684.660	14.684.659	43		
		Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi				100.000	0	100.000	0	0	0		
291	2021H03-167527	Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi	ÖB	2021	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
		Muhtelif İşler				7.500.000	0	7.500.000	1.639.083	1.639.083	22		
292	2022H03-187588	Muhtelif Bakım ve Onarımlar	ÖB	2020	2022	1.350.000	0	1.350.000	71.897	71.897	5		DE
293	2022H03-187588	Makine Teçhizat, Okul ve Büro Mefruşatı, Demirbaş, Bilgisayar, Yazılım ve Taahhüt Alımı	ÖB	2022	2022	5.500.000	0	5.500.000	1.245.953	1.245.953	23		DE
294	2022H03-187588	Rektörlük ve Bağlı Birimleri Mekanik ve Elektrik Bakım ve Onarımı	ÖB	2020	2022	650.000	0	650.000	321.233	321.233	49	100	BT
		Kampüs Altyapısı				1.000.000	0	1.000.000	619.231	619.230	62		
295	2020H03-151237	Kayalı Yerleşkesi Kampüs Girişinden Camiye Kadar Olan Hattın Peyzaj ve Aydınlatması	ÖB	2021	2022	1.000.000	759.096	240.000	214.979	214.978	90		DE
296	2020H03-151237	Diğer Kampüs Altyapı Çalışmaları	ÖB	2020	2022	760.000	0	760.000	404.252	404.252	53		DE
		Derslikler ve Merkezi Birimler İnşaatı				48.500.000	19.120.500	24.000.000	11.566.970	11.566.970	48		
297	2009H03-1060	Kayalı Yerleşkesi Tıp Fakültesi İnşaatı (... derslik, 15.700 m2)	ÖB	2020	2023	48.500.000	18.021.433	24.000.000	11.289.306	11.289.306	47	50	DE
298	0000000-000	Kesin Kabul Ödemeleri	ÖB	2022	2022	300.000	0	300.000	277.664	277.664	93		DE
		Yayın Alımları				1.300.000	0	1.300.000	859.376	859.376	66		
299	2021H03-167531	Yayın Alımları	ÖB	2020	2022	1.300.000	0	1.300.000	859.376	859.376	66		DE
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				622.500	0	622.500	365.163	365.163	59		
300	0000000-000	Kırklareli Tenis Kortu ve Erkek Öğrenci Yurdu Çatıları Bakım Onarımı	GB	2022	2022	622.500	0	622.500	365.163	365.163	59	100	BT

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Kültür				30.202.610	11.121.383	11.499.817	9.071.282	8.902.005	77		
		İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü				13.285.637	93.692	6.685.637	5.623.495	5.454.218	82		
301	0000000-000	K.eli İl Halk Kütüphanesi Tefrişi	Öİ	2022	2022	282.636	0	282.636	282.636	278.359	98		DE
302	1976H04-53	L.burgaz İlçe Halk Kütüphanesi İnşaatı (2.555 m2)	GB	2017	2023	11.600.000	93.692	5.000.000	4.197.859	4.197.859	84		DE
303	1976H04-53	Pınarhisar İlçe Halk Kütüphanesi Tadilatı	GB	2022	2022	260.000	0	260.000	0	0	0	0	İA
304	1976H04-53	Vize İlçe Halk Kütüphanesi Tadilat ve Tefrişatı	GB	2021	2022	1.073.000	0	1.073.000	1.073.000	908.000	85	100	BT
305	0000000-000	Eski Eser Restorasyonlarına Yardım	GB	2021	2022	1	0	1	0	0	0	0	HB
306	0000000-000	Yerel Kültürel Etkinliklere Yardım	GB	2021	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
		İl Özel İdaresi				16.916.973	11.027.691	4.814.180	3.447.787	3.447.787	72		
307	0000000-000	K.eli Tarihi Gar Binasının Röleve ve Restorasyon Projelerinin Uygulanması	DG	2020	2022	6.500.601	4.886.899	1.613.702	1.613.702	1.613.702	100		DE
308	0000000-000	K.eli Kocahıdır İlköğretim Okulu Röleve Restitüsyon ve Restorasyonu	Öİ	2020	2022	1.071.000	0	1	0	0	0		DE
309	0000000-000	K.eli Yapraklı Mahallesiindeki Taşınmazın Restitüsyon ve Restorasyonu	Öİ	2019	2022	6.746.265	5.818.445	927.820	927.820	927.820	100		DE
310	0000000-000	K.eli İlim Yayma Cemiyeti Restorasyonu	Öİ	2015	2022	876.136	79.149	796.987	0	0	0		DE
311	0000000-000	B.eski Sınanlı Osmanlı Çeşmesi Onarımı	Öİ	2018	2022	93.500	0	93.500	0	0	0	0	PA
312	0000000-000	L.burgaz Oklağı Camii Bakım ve Onarımı	DG	2018	2022	302.302	22.302	280.000	0	0	0	0	DE
313	0000000-000	Pınarhisar Kalesi ve Surları Koruma Planı Yapımı	DG	2020	2022	225.000	220.896	1	0	0	0		DE
314	0000000-000	Pınarhisar Poyralı Cami Bakım ve Onarımı	DG	2021	2022	102.169	0	102.169	0	0	0	0	HB
315	0000000-000	Vize Hükümet Konağı Röleve ve Restitüsyon Projesi	DG	2021	2022	1.000.000	0	1.000.000	906.265	906.265	91		DE
		Beden Eğitimi ve Spor				90.909.781	20.806.196	51.444.057	5.116.404	5.116.403	10		
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				90.909.781	20.806.196	51.444.057	5.116.404	5.116.403	10		
316	0000000-000	K.eli Spor Salonu Yapımı	GB	2015	2022	38.775.240	20.115.711	1	0	0	0	50	YK
317	0000000-000	K.eli MY Spor Tesisi Tenis Kortları Bakım ve Onarımı	GB	2021	2022	1.336.279	690.485	645.794	84.081	84.081	13	100	BT
318	0000000-000	K.eli Hokey Sahası Tribün, Soyunma Odaları ve Aydınlatma Yapımı	GB	2021	2022	1.673.927	0	1.673.927	1.673.927	1.673.926	100	43	DE
319	0000000-000	K.eli HS Kışlası Açık Spor Tesisleri Yapımı	GB	2021	2022	782.635	0	782.635	677.243	677.243	87	100	BT
320	0000000-000	K.eli Armağan Spor Alanı Üzerinin Kapatılması	DG	2021	2022	82.600	0	82.600	0	0	0	0	PA
321	0000000-000	Lüleburgaz Spor Salonu Yapımı (2000 seyircili)	DG	2021	2023	29.500.000	0	29.500.000	0	0	0	0	PA
322	0000000-000	Lüleburgaz Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Yapımı	DG	2021	2023	5.074.000	0	5.074.000	0	0	0	0	PA
323	0000000-000	Lüleburgaz 8 Kasım Stadi Bakım ve Onarımı	DG	2021	2022	8.260.000	0	8.260.000	0	0	0	0	PA
324	0000000-000	P.hisar Çim Yüzeyle Futbol Sahası Bakım ve Onarımı (Çelik Tribün + Soyunma Odası + Aydınlatma)	DG	2021	2022	3.975.100	0	3.975.100	1.763.853	1.763.853	44	44	DE
325	0000000-000	Vize Tesisleri Çevre İhata Duvarı ve Panel Çit Yapımı	DG	2021	2022	1.050.000	0	1.050.000	917.300	917.300	87	100	BT
326	0000000-000	Vize İlçe Müdürlüğü Tesisleri Doğal Gaz Dönüşümü	DG	2022	2022	400.000	0	400.000	0	0	0	75	DE

Proje sayısı: 18, Proje tutarı: 1.416.535.075, Önceki yıllar harcaması: 31.214.680, 2022 yılı harcaması: **29.392.045**

sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü

- Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)
- Kırklareli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) İnşaatı
- Babaeski Gaziosmanpaşa 112 ASHİ + 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)
- Babaeski Alpullu Aile Sağlığı Merkezi (3 AHB) + 112 ASHİ
- Demirköy İğneada Aile Sağlığı Merkezi (2 AHB) + 112 ASHİ
- Lüleburgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (SHB (B) + 8 AHB + 112 ASHİ (2 ad))
- Lüleburgaz 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)
- Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)
- Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) + 112 ASHİ
- Pınarhisar 112 ASHİ
- Kırklareli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ)
- Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü+ Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +SHM+112 ASHİ
- Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATipi) Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) +112 ASHİ
- Kırklareli Dolhan Sağlık Evi
- Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği
- Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzleme Merkezi

Kırklareli Sağlık Kompleksi İnşaatı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ, Başlama ve bitiş tarihi: 2014 – 2023, Proje tutarı: 99.992.000, Harcama: 35.366.965

Lüleburgaz Sağlık Kompleksi İnşaatı

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATipi) + Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ, Başlama ve bitiş tarihi: 2014 – 2022, Proje tutarı: 24.560.363, Harcama: 24.560.363



Kırklareli Sağlık Kompleksi



Lüleburgaz Sağlık Kompleksi



Lüleburgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi



Pınarhisar 112 ASHİ

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		Sağlık				1.416.535.075	31.214.680	29.509.730	29.509.718	29.392.045	100		
		İl Sağlık Müdürlüğü				1.416.535.075	31.214.680	29.509.730	29.509.718	29.392.045	100		
		Hastane İnşaatları				1.125.000.000	0	1	0	0	0	0	
327	2018I00-145138	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Bina İnşaatı (250 yataklı, 50.000 m2)	GB	2018	2025	1.125.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Aile Sağlığı Merkezi ve 112 ASHİ İnşaatları				101.391.354	0	65.009	65.000	65.000	100		
328	2006I00-823-133235	K.eli 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB) İnşaatı	GB	2014	2025	5.789.000	0	1	0	0	0	0	İA
329	2006I00-823-133280	B.eski Gaziosmanpaşa 112 ASHİ + 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	GB	2016	2024	7.736.300	0	1	0	0	0	0	PA
330	2006I00-823-133280	Babaeski Alpullu 3 Hekimli ASM + 112 ASHİ	GB	2021	2024	7.736.300	0	1	0	0	0	0	PA
331	2016I001500	D.köy İğneada Aile Sağlığı Merkezi (2AHB) + 112 ASHİ	GB	2022	2025	5.850.000	0	1	0	0	0	0	İA
332	2016I001500	Demirköy 112 ASHİ	GB	2022	2024	1.300.000	0	1	0	0	0	0	HB
333	2006I00-166421-166448	L.burgaz 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (SHB (B) + 8 AHB + 112 ASHİ (2 ad))	GB	2014	2024	53.651.000	0	65.000	65.000	65.000	100	0	PA
334	2006I00-823-133235	L.burgaz 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB)	GB	2018	2024	8.872.500	0	1	0	0	0	0	PA
335	0000000-000	L.burgaz Özden Gökçe Aile Sağlığı Merkezi (4 AHB)	DG	2021	2022	1	0	1	0	0	0	90	DE
336	2016I001500	Pınarhisar Aile Sağlığı Merkezi (5 AHB) + 112 Acil Sağlık İstasyonu	GB	2021	2025	9.750.000	0	1	0	0	0	0	HB
337	2016I001500	P.hisar 112 ASHİ	GB	2016	2022	706.253	0	1	0	0	0	100	BT
		Diğer İnşaatlar				189.409.364	31.214.680	28.839.399	28.839.398	28.839.398	100		
338	2006I00-166421-166445	K.eli Sağlık Kompleksi İnşaatı (İdari Hizmet Binaları + Merkez Toplum Sağlığı Merkezi + Halk Sağlığı Laboratuvarı + ASM 6 Hekim + 112 KKM + 112 ASHİ)	GB	2014	2023	99.992.000	22.974.893	12.392.072	12.392.072	12.392.072	100	45	DE
339	0000000-000	K.eli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semt Polikliniği (Toplum Sağlığı Merkezi Binasının Semt Polikliniğine Dönüştürülmesi)	GB	2021	2022	1	0	1	0	0	0	100	BT
340	2006I00-166421-166451	Babaeski İlçe Sağlık Müdürlüğü + Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + SHM + 112 ASHİ	GB	2016	2024	63.557.000	0	65.000	65.000	65.000	100	0	PA
341	2016I001500	Lüleburgaz İlçe Sağlık Müdürlüğü + Sağlıklı Hayat Merkezi (ATİP) + Lüleburgaz 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi (8 AHB) + 112 ASHİ	GB	2014	2022	24.560.363	8.239.787	16.320.576	16.320.576	16.320.576	100	73	DE
342	2006I00-823-133246	Kırklareli Dolhan Sağlık Evi	GB	2014	2024	1.300.000	0	61.750	61.750	61.750	100	0	PA
		Diğer				734.357	0	605.321	605.320	487.647	81		
343	0000000-000	Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İzlem Merkezi	GB	2021	2022	129.037	0	1	0	0	0	100	BT
344	0000000-000	Sağlık Birimleri Büyük Onarımları	GB	2022	2022	605.320	0	605.320	605.320	487.647	81		DE

Proje sayısı: 10, Proje tutarı: 28.263.505, Önceki yıllar harcaması: 16.282.600, 2022 yılı harcaması: **10.938.999**

dkh iktisadi

Genel İdare

Valilik

- Hükümet Konakları Bakım Onarımı
- Doğal Afet Giderleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü

- Hizmet Binası Bakım Onarımı

Güvenlik Hizmetleri

Valilik

- Bulgaristan Sınır Bölgesine Enerji Hattı Çekilmesi

İl Emniyet Müdürlüğü

- Hizmet Binası ve Lojman Onarımları
- Malzeme Alımı ile Diğer Bakım ve Onarımlar

İl Özel İdaresi

- Okullara Kent Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. gerçekleşme (%)	Fiziki gerçekleşme (%)	Açıklamalar
		DKH İktisadi				28.263.505	16.282.600	11.980.905	11.218.428	10.938.999	91		
		Genel İdare				22.328.108	13.058.780	9.269.328	9.109.025	9.108.612	98		
		Valilik				21.928.108	13.058.780	8.869.328	8.709.025	8.709.025	98		
345	0000000-000	K.eli Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2019	2022	839.381	115.415	723.966	710.214	710.214	98		DE
346	0000000-000	Koçgaz Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2022	2022	96.823	0	96.823	87.202	87.202	90	100	BT
347	0000000-000	L.burgaz Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2021	2022	116.601	0	116.601	0	0	0		DE
348	0000000-000	Vize Hükümet Konağı Bakım ve Onarımı	GB	2021	2022	20.329	0	20.329	0	0	0		DE
349	0000000-000	Doğal Afet Giderleri	GB	2018	2022	20.854.974	12.943.365	7.911.609	7.911.609	7.911.609	100		DE
		Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bakım ve Onarımı				400.000	0	400.000	400.000	399.587	100		
350	0000000-000	Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Bakım ve Onarımı	GB	2022	2022	400.000	0	400.000	400.000	399.587	100	100	BT
		Güvenlik Hizmetleri				5.935.397	3.223.820	2.711.577	2.109.403	1.830.387	68		
		Valilik				3.594.550	2.434.074	1.160.476	1.160.476	881.460	76		
351	0000000-000	Bulgaristan Sınır Bölgesine Enerji Hattı Çekilmesi	GB	2017	2022	3.594.550	2.434.074	1.160.476	1.160.476	881.460	76		DE
		İl Emniyet Müdürlüğü				1.450.847	0	1.450.847	948.927	948.927	65		
352	0000000-000	Hizmet Binası ve Lojman Onarımları	GB	2022	2022	108.704	0	108.704	43.070	43.070	40		DE
353	0000000-000	Malzeme Alımı ile Diğer Bakım ve Onarımlar	GB	2022	2022	1.342.143	0	1.342.143	905.857	905.857	67		DE
		İl Özel İdaresi				890.000	789.746	100.254	0	0	0		
354	0000000-000	Okullara Kent Güvenlik Kamera Sistemi Kurulması	Öİ	2018	2022	890.000	789.746	100.254	0	0	0		DE

Proje sayısı: 177, Proje tutarı: 829.951.758, Önceki yıllar harcaması: 156.746.529, 2022 yılı harcaması: **258.887.122**

dkh sosyal

İçmesuyu

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- İçmesuyu tesisleri: Kavaklı, Alpullu, İğneada, Ahmetbey, Evrensekiz, Pınarhisar
- İçmesuyu arıtma tesisleri: Alpullu, İğneada

İl Özel İdaresi

- Köy içmesuyu yapım bakım ve onarımları 81 köy

Kanalizasyon

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Kanalizasyon tesisleri: Alpullu, Ahmetbey, Pınarhisar
- Atıksu arıtma tesisleri: Çakıllı, Kıyıköy
- Yağmursuyu tesisleri: Ahmetbey, Pınarhisar

İl Özel İdaresi

- Köy kanalizasyonu yapım bakım ve onarımları 28 köy

Kırsal Alan Planlaması

İl Özel İdaresi

- Köy işleri

Belediye Hizmetleri

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- Pınarhisar İtfaiye Binası ve Müştemilatı
- Pınarhisar Güneş Enerji Santrali

Şehirleşme

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü

- İmar planları: Babaeski, Ahmetbey

Kadastro Müdürlüğü

- Kadastro Güncelleme Çalışmaları
- Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü

- Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Altyapı İnşaatı
- Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı
- Kırklareli Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi
- Lüleburgaz Büyükkarıştırın Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatı
- Lüleburgaz Büyükkarıştırın Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
- Lüleburgaz Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Altyapı (Kanalizasyon ve Yağmursuyu) İnşaatı

Teknolojik Araştırma

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü

- Gıda Odak Alan İhtisaslaşma Projesi

Afetler

İl Özel İdaresi

- Acil Arama ve Kurtarma Hizmetleri

Sosyal İçerme

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

- Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası (Etüd - proje)
- Kırklareli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m²)
- Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Büro Mefruşatı Alımı
- Kırklareli Huzurevi İhata Duvarı Yapımı ve Ek Bina Çatı Onarımı
- Kırklareli Huzurevi Röleve Projesi Hazırlanması
- Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Tefrişatı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

- Pınarhisar Gençlik Merkezi Bakım ve Onarımı

İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü**İçmesuyu İnşaatları**

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: İçmesuyu ve içmesuyu arıtma tesisi yapımı, Başlama ve bitiş tarihi: 2017 – 2023, Proje tutarı: 106.825.713, Harcama: 100.215.049

Kavaklı İçmesuyu İnşaatı **Bitti**
 Alpullu İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı **Bitti**
 İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Arıtma Tesisi İnşaatı
 Ahmetbey İçmesuyu İnşaatı
 Evrensekiz İçmesuyu İnşaatı **Bitti**
 Pınarhisar İçmesuyu İnşaatı

Kanalizasyon İnşaatları

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: Kanalizasyon ve kanalizasyon arıtma tesisi yapımı ve yağmursuyu inşaatı, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023, Proje tutarı: 106.553.603, Harcama: 90.502.528

Alpullu Kanalizasyon İnşaatı
 Ahmetbey Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı
 Pınarhisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı
 Çakıllı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı
 Kırıkköy Kanalizasyonu Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı

İl Özel İdaresi**Köy İçmesuları**

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: 81 köy, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 14.533.322, Harcama: 8.453.985
 İl Özel İdaresi: 31 köy, 663.000 / 2.782.927
 KÖYDES: 50 köy, 7.790.985 / 11.750.395

Köy Kanalizasyonları

İlçesi: Muhtelif, Karakteristiği: 28 köy, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2022, Proje tutarı: 4.320.316, Harcama: 1.852.390
 İl Özel İdaresi: 7 köy, 30.000 / 1,160.000
 KÖYDES: 21 köy, 1.822.390 / 3.160.316



Kavaklı su deposu



Çakıllı atıksu arıtma tesisi

Kırklareli Millet Bahçesi

İlçesi: Merkez, Karakteristiği: koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanları yapımı, Başlama ve bitiş tarihi: 2021 – 2023

TOKİ tarafından yapılmaktadır. Yeşillikler içerisinde, koşu, yürüyüş, bisiklet parkurları, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı olacaktır. Mevcut yeşil alan 3 kat arttıracaktır.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım Altyapı İnşaatı

İlçesi: Merkez, Başlama ve bitiş tarihi: 2005 – 2022, Harcama: 131.803.966

Yolların altyapısı tamamlanarak betonla kaplanmış, dere ıslahı yapılmış, atık su arıtma tesisinin ek yapıları ile doğal gaz ve içme suyu tesisleri bitirilmiştir.

Son 3 yılda; Beton Yollar, Kuşaklama Kanalı, 2800m³/gün Kapasiteli Atıksu Arıtma Tesisi, 8. Bulvar Peyzaj Düzenlemesi, Giriş Kapı Düzenlemesi, OSB Yönlendirme Projesi işleri yapılmış ve bitirilmiştir.

Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnşaatı

İlçesi: Merkez, Başlama ve bitiş tarihi: 2022 – 2023, Harcama: 68.304.000

OSB İlave Alan Yer Seçim ve İmar Planı yapılmış ve bitirilmiştir. Ayrıca, idari ve sosyal tesisler alanı tasarım projesi hazırlanmıştır.

Güvenlik Duvarı ve Çit Yapımı, İdari Bina Yapımı, Kreş Yapımı, Cami Yapımı, Rekreasyon Alanı Yapımı, Restoran ve Büfe Yapımı, İtfaiye, 112 Acil ve Jandarma Merkezi Yapımı, Elektrik ve Doğalgaz İşletme Binaları Yapımı, İlave Alan Altyapı Yapımı, GES, RES Fizibilite Çalışmaları devam etmektedir.



Kırklareli Millet Bahçesi



Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi



Pınarhisar itfaiye binası



Pınarhisar güneş enerji santrali

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
		DKH Sosyal İçmesuyu				830.001.758	156.746.529	299.830.399	252.332.485	249.273.747		83	
						121.359.035	34.812.013	84.722.111	66.066.036	66.066.036		78	
		İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü				106.825.713	34.812.013	72.013.699	65.403.036	65.403.036		91	
355	0000000-000	K.eli Kavaklı İçmesuyu İnşaatı	İB	2017	2022	3.597.727	1.562.703	2.035.024	2.034.558	2.034.558	100	100	BT
356	0000000-000	B.eski Alpullu İçmesuyu ve İçmesuyu Artırma Tesisi İnşaatı	İB	2020	2022	9.816.258	8.747.940	1.068.317	973.975	973.975	91	100	BT
357	0000000-000	D.köy İğneada İçmesuyu ve İçmesuyu Artırma Tesisi İnşaatı	İB	2019	2022	23.450.713	15.085.516	8.365.197	7.894.503	7.894.503	94	98	DE
358	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2023	28.500.000	6.000.000	22.500.000	21.000.000	21.000.000	93	90	DE
359	0000000-000	L.burgaz Evrensekiz İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2022	2.561.015	2.515.854	45.161	0	0	0	100	BT
360	0000000-000	Pınarhisar İçmesuyu İnşaatı	İB	2021	2023	38.900.000	900.000	38.000.000	33.500.000	33.500.000	88	77	DE
		İl Özel İdaresi				2.782.927	0	958.017	663.000	663.000		69	
		İçmesuyu (17 / 31 adet)				2.782.927	0	958.017	663.000	663.000		69	
361	0000000-000	K.eli Asilbeyli İçmesuyu Sondaj Bağlantısı	Öİ	2022	2022	140.000	0	1	0	0	0	0	DE
362	0000000-000	K.eli Bayramdere İçmesuyu Su Pompası Güneş Paneli Kurulumu	Öİ	2022	2022	430.000	0	1	0	0	0	0	DE
363	0000000-000	K.eli Çayırılı İçmesuyu Kaptaj Yapımı (2 adet)	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
364	0000000-000	K.eli Çukurpınar İçmesuyu Şebeke Hattı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
365	0000000-000	K.eli Dereköy İçmesuyu Kaptaj Yapımı ve Depo Bağlantısı	Öİ	2022	2022	50.000	0	1	0	0	0	0	DE
366	0000000-000	K.eli Erikler İçmesuyu Vana Değişimi	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
367	0000000-000	K.eli Kadıköy İçmesuyu Boru Değişimi	Öİ	2022	2022	40.000	0	1	0	0	0	0	DE
368	0000000-000	K.eli Kapaklı İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
369	0000000-000	K.eli Karahamza İçmesuyu Çeşmeköy Sondaj ve Ana Depo Bağlantısı	Öİ	2022	2022	250.000	0	1	0	0	0	100	BT
370	0000000-000	K.eli Karakoç İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
371	0000000-000	K.eli Karakoç İçmesuyu Güneş Enerji Sistemi Kurulumu	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
372	0000000-000	K.eli Yündolan İçmesuyu Kuyu Sondajı Elektrik Panosu Yapımı	Öİ	2022	2022	36.247	0	1	0	0	0	100	BT
373	0000000-000	D.köy Avcılar - Boztaş İçmesuyu Su Deposu Yapımı	Öİ	2022	2022	150.000	0	1	0	0	0	0	DE
374	0000000-000	D.köy Beğendik İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2022	2022	295.000	0	295.000	0	0	0	0	DE
375	0000000-000	D.köy Hamdibey İçmesuyu Su Pompası Alımı	Öİ	2022	2022	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
376	0000000-000	D.köy Köy İçmesuları Bakım ve Onarımları	Öİ	2022	2022	90.680	0	1	0	0	0	0	HB
377	0000000-000	Koğaz Karabalar İçmesuyu Artırma Tesisi Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	1	0	0	0	0	HB
378	0000000-000	L.burgaz Ertuğrul İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	1	0	0	0	0	DE
379	0000000-000	L.burgaz Karaağaç İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	1	0	0	0	0	DE
380	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli İçmesuyu Sondaj Pompası Değişimi	Öİ	2022	2022	12.000	0	12.000	12.000	12.000	100	100	BT
381	0000000-000	L.burgaz Oklağlı İçmesuyu Sondaj Pompası Değişimi	Öİ	2022	2022	7.000	0	7.000	7.000	7.000	100	100	BT
382	0000000-000	L.burgaz Sakızköy İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	25.000	0	1	0	0	0	0	HB
383	0000000-000	P.hisar Akören İçmesuyu Kaptaj yapımı	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
384	0000000-000	P.hisar Ataköy İçmesuyu İlave Su Deposu Yapımı	Öİ	2022	2022	200.000	0	1	0	0	0	100	BT
385	0000000-000	P.hisar Cevizköy İçmesuyu Güneş Enerji Sistemi Yapımı	Öİ	2022	2022	100.000	0	1	0	0	0	0	HB
386	0000000-000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2022	2022	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100	100	BT
387	0000000-000	P.hisar Kurudere İçmesuyu Vana Alımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	20.000	20.000	20.000	100	100	BT
388	0000000-000	P.hisar Kurudere İçmesuyu Su Tankeri Alımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	1	0	0	0	0	HB
389	0000000-000	P.hisar Osmançık İçmesuyu Su Deposu Yapımı	Öİ	2022	2022	60.000	0	1	0	0	0	0	HB
390	0000000-000	P.hisar Poyralı İçmesuyu Kuyu Sondajı	Öİ	2022	2022	160.000	0	160.000	160.000	160.000	100	100	BT
391	0000000-000	Vize Hasbuğa İçmesuyu Motopompunun Değişimi	Öİ	2022	2022	17.000	0	17.000	17.000	17.000	100	100	BT
392	0000000-000	Vize Sergen İçmesuyu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	20.000	0	1	0	0	0	0	İA
393	0000000-000	Vize Sergen İçmesuyu Su Borusu Alımı	Öİ	2022	2022	70.000	0	17.000	17.000	17.000	100	100	BT
		KÖYDES (7 / 50)				11.750.395	0	11.750.395	7.790.985	7.790.985		66	
395	0000000-000	K.eli Çeşmeköy-Karahamza İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	750.000	0	750.000	0	0	0	0	HB
396	0000000-000	K.eli Demircihalil İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	160.000	0	160.000	210.002	210.002	131	100	BT
397	0000000-000	K.eli Kocayazı Grup III (Elmacık-Kadıköy) İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	810.000	0	810.000	810.000	810.000	100		DE
398	0000000-000	K.eli Koyunbaba İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	350.000	0	350.000	0	0	0	0	HB
399	0000000-000	K.eli Yündolan İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	144.432	144.432	96		DE

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
400	0000000-000	B.eski Çiğdemli İçmesuyu 100 m³.lük Betonarme Gömme İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	148.090	148.090	99	100	BT
401	0000000-000	B.eski Ertuğrul Grubu (Taşköprü-Ertuğrul) İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	156.137	156.137	78	100	BT
402	0000000-000	B.eski Kadıköy İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	171.690	171.690	86		DE
403	0000000-000	B.eski Kuleli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	312.700	312.700	78		DE
404	0000000-000	B.eski Müsellim İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Değişimi	KP	2022	2022	260.000	0	260.000	254.762	254.762	98		DE
405	0000000-000	B.eski Osmaniye İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	183.962	183.962	92		DE
406	0000000-000	B.eski Pancarköy İçmesuyu 150 m³.lük Betonarme Ayaklı İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	147.500	147.500	98	100	BT
407	0000000-000	B.eski Taşagıl İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	312.700	312.700	78		DE
408	0000000-000	B.eski Yenimahalle İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	199.656	199.656	100	100	BT
409	0000000-000	D.köy Balaban İçmesuyu 50 m³.lük Biriktirme İçme Suyu Depo Yapımı	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	0	HB
410	0000000-000	D.köy Boztaş İçmesuyu 60 m³.lük İlave Betonarme İçme Suyu Depo Yapımı	KP	2022	2022	190.000	0	190.000	0	0	0	0	HB
411	0000000-000	D.köy Hamdibey İçmesuyu Enerji Nakil Hattı Yenilenmesi	KP	2022	2022	640.000	0	640.000	0	0	0	0	HB
412	0000000-000	D.köy Limanköy İçmesuyu Şebeke Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	140.234	0	140.234	0	0	0	0	HB
413	0000000-000	D.köy Sislioba İçmesuyu 50 m³.lük Betonarme Gömme İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100		DE
414	0000000-000	D.köy Sislioba İçmesuyu Kaptaj ve İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
415	0000000-000	Koçgaz Beyci İçmesuyu 2 Adet Maslak ve İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	286.666	0	286.666	281.312	281.312	98	100	BT
416	0000000-000	Koçgaz Kacayazı İçmesuyu Ortak Kaynak Terfi-İsale Hattı ve Biriktirme Depo Yapımı	KP	2022	2022	500.000	0	500.000	496.308	496.308	99		DE
417	0000000-000	Koçgaz Kocayazı Grup III (Elmacık-Kadıköy) İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Yapımı	KP	2022	2022	810.000	0	810.000	810.000	810.000	100		DE
418	0000000-000	L.burgaz Ayrıvalı İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	311.874	311.874	149		DE
419	0000000-000	L.burgaz Ayrıvalı İçmesuyu İlave Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100		DE
420	0000000-000	L.burgaz Ceylanköy İçmesuyu Şebeke Boru Değişimi	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	72.458	72.458	145		DE
421	0000000-000	L.burgaz Çengelli İçmesuyu Sondaj Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	192.340	192.340	92		DE
422	0000000-000	L.burgaz Çengelli İçmesuyu Sondaj Terfi Hattı Yapımı	KP	2022	2022	160.000	0	160.000	153.400	153.400	96		DE
423	0000000-000	L.burgaz Düğüncübaşı İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	60.000	0	60.000	59.000	59.000	98		DE
424	0000000-000	L.burgaz Karaağaç İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	99.710	99.710	100		DE
425	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	288.510	288.510	137		DE
426	0000000-000	L.burgaz Kayabeyli İçmesuyu İlave Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100		DE
427	0000000-000	L.burgaz Kırıkköy İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	210.000	0	210.000	288.510	288.510	137		DE
428	0000000-000	L.burgaz Kırıkköy İçmesuyu İlave Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100		DE
429	0000000-000	L.burgaz Sarıcaalı İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	141.600	141.600	94		DE
430	0000000-000	L.burgaz Turgutbay İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	200.000	0	200.000	207.000	207.000	104		DE
431	0000000-000	P.köy Doğanca İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	37.567	37.567	75		DE
432	0000000-000	P.köy Yeşilova İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	40.920	40.920	82		DE
433	0000000-000	P.hisar Ataköy İçmesuyu 100 m³.lük İlave Betonarme İçme Suyu Depo Yapımı	KP	2022	2022	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100		DE
434	0000000-000	P.hisar Hacıfaklı - Çayirdere 50 m3 İçme Suyu Deposu ve Terfi Hattı Yapımı	KP	2022	2022	604.096	0	604.096	0	0	0	0	HB
435	0000000-000	P.hisar İslambeyli İçmesuyu Sondaj Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	277.699	0	277.699	0	0	0	0	HB

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
436	00000000-000	P.hisar Poyralı İçmesuyu Sondaj Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	277.699	0	277.699	0	0	0	0	HB
437	00000000-000	Vize Aksicim İçmesuyu Su Deposu Sinyalizasyon Sistemini Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
438	00000000-000	Vize Çavuşköy İçmesuyu 50 m³.lük Biriktirme Betonarme İçme Suyu Depo Yapım ve Bağlantısı Yapımı	KP	2022	2022	310.000	0	310.000	301.991	301.991	97		DE
439	00000000-000	Vize Çövenli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Açılması	KP	2022	2022	150.000	0	150.000	224.790	224.790	150	100	BT
440	00000000-000	Vize Çövenli İçmesuyu Sondaj Kuyusu Bağlantısı	KP	2022	2022	320.000	0	320.000	0	0	0	0	HB
441	00000000-000	Vize Kışlacık İçmesuyu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	40.000	0	40.000	39.004	39.004	98		DE
442	00000000-000	Vize Kızılağaç İçmesuyu 100 m³.lük Gömme İçme Suyu Depo Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	60.000	0	60.000	59.060	59.060	98		DE
443	00000000-000	Vize Kömürköy İçmesuyu Terfi-İsale Hattı Boru Değişimi	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
444	00000000-000	Vize Kömürköy İçmesuyu Elektrik Trafosu Yenilemesi	KP	2022	2022	70.000	0	70.000	0	0	0	0	HB
445	00000000-000	Vize Köyleri İçmesuyu Boru Alımı	KP	2022	2022	144.000	0	144.000	144.000	144.000	100		DE
Kanalizasyon						110.923.919	14.254.903	93.671.063	76.277.625	76.277.625	81		
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						106.553.603	14.254.903	89.300.747	76.247.625	76.247.625	85		
446	00000000-000	B.eski Alpullu Kanalizasyon İnşaatı	İB	2021	2022	25.181.517	4.626.361	20.555.156	19.133.859	19.133.859	93	90	DE
447	00000000-000	L.burgaz Ahmetbey Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	İB	2021	2023	29.531.266	6.247.820	23.283.446	21.494.000	21.494.000	92	90	DE
448	00000000-000	P.hisar Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İnşaatı	İB	2021	2023	39.572.946	907.532	38.665.414	34.209.003	34.209.003	88	77	DE
449	00000000-000	Vize Çakıllı Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2021	2022	4.217.651	2.473.190	1.744.461	1.410.763	1.410.763	81	91	DE
450	00000000-000	Vize Kıyıköy Kanalizasyonu Paket Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	İB	2021	2023	8.050.223	0	5.052.270		0	0	0	YK
İl Özel İdaresi						1.160.000	0	1.160.000	30.000	30.000	3		
Kanalizasyon (0 / 7 adet)						1.160.000	0	1.160.000	30.000	30.000	3		
451	00000000-000	D.köy Limanköy Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
452	00000000-000	D.köy Sarpdere Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	140.000	0	140.000	0	0	0	0	İA
453	00000000-000	D.köy Köy Kanalizasyonları Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	90.000	0	90.000	0	0	0		DE
454	00000000-000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	0	0	0		DE
455	00000000-000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	0	0	0		DE
456	00000000-000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu Yapımı	Öİ	2022	2022	250.000	0	250.000	0	0	0		DE
457	00000000-000	Vize Çövenli Kanalizasyonu Tamamlama	Öİ	2022	2022	150.000	0	150.000	0	0	0		DE
KÖYDES (2 / 21)						3.160.316	0	3.160.316	1.822.390	1.822.390	58		
458	00000000-000	K.eli Geçitağzı Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	230.000	0	230.000	0	0	0	0	HB
459	00000000-000	K.eli Geçitağzı Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
460	00000000-000	B.eski Çavuşköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	48.775	48.775	98		DE
461	00000000-000	B.eski Katranca Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	399.430	399.430	100	100	BT
462	00000000-000	B.eski Müsellim Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	51.049	51.049	102		DE
463	00000000-000	B.eski Nadirli Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	48.617	48.617	97		DE
464	00000000-000	B.eski Pancarköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	50.340	50.340	101		DE
465	00000000-000	D.köy Limanköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	48.521	48.521	97	100	BT
466	00000000-000	D.köy Sarpdere Kanalizasyonu Fosseptik ve İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	240.000	0	240.000	0	0	0	0	HB
467	00000000-000	L.burgaz Akçaköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	99.999	99.999	100		DE
468	00000000-000	L.burgaz Ceylanköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	400.000	0	400.000	330.000	330.000	83		DE
469	00000000-000	L.burgaz Eskitaşlı Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	47.200	47.200	47		DE
470	00000000-000	L.burgaz Kayabeyli Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	300.000	0	300.000	250.000	250.000	83		DE
471	00000000-000	L.burgaz Tatarköy Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	95.000	95.000	95		DE
472	00000000-000	L.burgaz Umurca Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	300.000	0	300.000	254.000	254.000	85		DE
473	00000000-000	L.burgaz Yenibedir Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0	HB
474	00000000-000	Pköy Arkarca Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	99.459	99.459	99		DE
475	00000000-000	P.köy Hıdırcı Kanalizasyonu Bakım ve Onarımı	KP	2022	2022	290.316	0	290.316	0	0	0	0	HB
476	00000000-000	Vize Develi Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB
477	00000000-000	Vize Kızılağaç Kanalizasyonu İlave Şebeke Hattı Yapımı	KP	2022	2022	100.000	0	100.000	0	0	0	0	HB

Sıra No	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Ağırlık malar
Kırsal Alan Planlaması						3.423.554	290.748	3.132.806	2.868.344	2.445.836	78		
İl Özel İdaresi						3.423.554	290.748	3.132.806	2.868.344	2.445.836	78		
478	0000000-000	K.eli Geçitdağı Umumi Tuvalet Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
479	0000000-000	K.eli Karıncak Mezarlığı Duvarı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	35.000	0	35.000	35.000	35.000	100	100	BT
480	0000000-000	K.eli Kavakdere Şehitlik Çamlığı Tel Çit Yapımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
481	0000000-000	K.eli Kocahıdır Güvenlik Kamerası Kurulumu	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
482	0000000-000	K.eli Kuzulu Lojman ve WC Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	80.000	0	80.000	80.000	80.000	100	100	BT
483	0000000-000	K.eli Yörükbayır Yağmur Suyu Tahliyesi	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
484	0000000-000	K.eli Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
485	0000000-000	K.eli Köyleri Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	85.000	0	85.000	85.000	85.000	100	100	BT
486	0000000-000	Hali Hazır Harita Yapımı	Öİ	2019	2022	900.000	290.748	609.252	609.252	226.773	37		DE
487	0000000-000	B.eski Eriklyurdu Sosyal Tesis Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
488	0000000-000	B.eski Köyleri Mezarlık Çevresinin Duvar ve Çitle Çevrilmesi (2 köy)	Öİ	2022	2022	70.000	0	70.000	70.000	70.000	100	100	BT
489	0000000-000	B.eski Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100	100	BT
490	0000000-000	Koçgaz Kocatarla Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
491	0000000-000	Koçgaz Köyleri Damlama Sulama Boru Alımı	Öİ	2022	2022	48.600	0	48.600	48.600	48.600	100	100	BT
492	0000000-000	L.burgaz Çengerli Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	30.000	0	30.000	30.000	30.000	100	100	BT
493	0000000-000	L.burgaz Hamzabey Yağmur Suyu Tesisi Tahliye Hattı Yapımı	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
494	0000000-000	L.burgaz Köyleri WC Yapımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100	100	BT
495	0000000-000	L.burgaz Köylerine Haşere İlaçlama Makinesi Alımı (25 adet)	Öİ	2022	2022	400.000	0	400.000	400.000	359.971	90	100	BT
496	0000000-000	P.köy Köyleri Bakım ve Onarımları	Öİ	2022	2022	10.000	0	10.000	10.000	10.000	100	100	BT
497	0000000-000	P.köy Köyleri Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	95.000	0	95.000	95.000	95.000	100	100	BT
498	0000000-000	P.hisar Osmanlık Dükkanları Yapımının Tamamlanması	Öİ	2022	2022	55.000	0	55.000	55.000	55.000	100	100	BT
499	0000000-000	P.hisar Tozaklı Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	60.000	0	60.000	60.000	60.000	100	100	BT
500	0000000-000	P.hisar Yenice Mesire Alanı Düzenlemesi	Öİ	2022	2022	50.000	0	50.000	50.000	50.000	100	100	BT
501	0000000-000	P.hisar Köyleri Sosyal Tesisleri Bakım ve Onarımı (4 köy)	Öİ	2022	2022	283.720	0	283.720	283.720	283.720	100	100	BT
502	0000000-000	P.hisar Köyleri Çocuk Parkı Yapımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	90.000	0	90.000	90.000	90.000	100	100	BT
503	0000000-000	Vize Aksicim İmam Lojmanı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	15.000	0	15.000	15.000	15.000	100	100	BT
504	0000000-000	Vize Çavuşköy Köy Konağı Bakım ve Onarımı	Öİ	2022	2022	17.500	0	17.500	17.500	17.500	100	100	BT
505	0000000-000	Vize Pazarlı ULV Cihazı Alımı	Öİ	2022	2022	17.500	0	17.500	17.500	17.500	100	100	BT
506	0000000-000	Vize Köylerine Su Tankeri Alımı (2 köy)	Öİ	2022	2022	120.000	0	120.000	120.000	120.000	100	100	BT
507	0000000-000	Köylere Çöp Konteynırı Alımı	Öİ	2022	2022	141.234	0	141.234	140.538	140.538	100		DE
508	0000000-000	Köylere Spor Aletleri ve Çocuk Oyun Grubu Kurulumu	Öİ	2022	2022	275.000	0	275.000	11.234	11.234	4		DE
Belediye Hizmetleri						15.511.691	500.000	8.236.001	3.238.447	3.238.447	39		
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						15.511.691	500.000	8.236.001	3.238.447	3.238.447	39		
509	0000000-000	Kırklareli Yerel Yönetimleri Katı Atık Ön İşlem Tesisi Kesin Projesi Hazırlanması	İB	2021	2022	236.000	0	236.000	18.472	18.472	8	10	DE
510	0000000-000	Pınarhisar İtfaiye Binası ve Müstemilatı Yapımı	İB	2021	2022	6.012.100	500.000	1	0	0	0	100	BT
511	0000000-000	Pınarhisar Güneş Enerji Santrali Yapımı	İB	2021	2022	9.263.591	0	8.000.000	3.219.975	3.219.975	40	36	DE
Şehirci						527.883.878	106.888.865	102.986.765	101.925.323	100.194.293	97		
İller Bankası İstanbul Bölge Müdürlüğü						247.564	155.607	70.741	469	469	1		
512	0000000-000	B.eski İmar Planı	İB	2018	2022	141.482	70.742	70.740	469	469	1	50	YK
513	0000000-000	L.burgaz Ahmetbey İmar Planı	İB	2017	2022	106.082	84.865	1	0	0	0	80	YK
Tapu ve Kadastro XIV. Bölge Müdürlüğü						7.636.314	4.929.292	2.707.021	1.715.854	1.715.854	63		
514	2017K09-3825	Kırklareli 2. Grup Kadastro Güncellemesi (.... birim)	DS	2020	2022	3.355.012	2.985.531	369.480	239.368	239.368	65	100	BT
515	2008K09-958	Vize Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması	DS	2020	2022	1.997.798	1.943.761	54.037	0	0	0	100	BT
516	2008K09-958	Lüleburgaz Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması	DS	2021	2023	2.283.504	0	2.283.504	1.476.486	1.476.486	65	90	DE
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü						520.000.000	101.803.966	100.209.003	100.209.000	98.477.970	98		
517	0000000-000	Kırklareli Kavaklı Tarıma Dayalı İhtisas Süt Organize Sanayi Bölgesi	DG	2021	2023	50.000.000	0	1.905.000	1.905.000	173.970	9	0	PA
518	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi 3. Kısım Altyapı İnş.	DG	2022	2023	140.000.000	0	68.304.000	68.304.000	68.304.000	100		DE
519	0000000-000	Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi II.Kısım Altyapı İnş.	DG	2005	2022	140.000.000	101.803.966	30.000.000	30.000.000	30.000.000	100	95	DE
520	2013C33-1916	L.burgaz Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İnşaatı	DG	2020	2023	140.000.000	0	1	0	0	0	0	PA
521	2013C33-1916	L.burgaz Büyükkarıştıran Organize Sanayi Bölgesi Atıksu Arıtma Tesisi İnşaatı	DG	2020	2022	40.000.000	0	1	0	0	0	0	PA
522	2013C33-1916	L.burgaz Evrensekiz Organize Sanayi Bölgesi Altyapı (Kanalizasyon ve Yağmursuyu) İnşaatı	DG	2020	2022	10.000.000	0	1	0	0	0	0	PA

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	Açıklamalar
		Teknolojik Araştırma				15.000.000	0	4.000.000	120.000	120.000	3	
		Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğü				15.000.000	0	4.000.000	120.000	120.000	3	
523	2021K12-169139	Gıda Odak Alan. İhtisaslaşma Projesi	ÖB	2021	2025	15.000.000	0	4.000.000	120.000	120.000	3	HB
		Afetler				630.521	0	630.521	65.813	65.813	10	
		İl Özel İdaresi				630.521	0	630.521	65.813	65.813	10	
524	0000000-000	Acil Arama ve Kurtarma Hizmetleri	Öİ	2022	2022	630.521	0	630.521	65.813	65.813	10	DE
		Sosyal İçerme				35.269.160	0	2.451.132	1.770.897	865.697	35	
		Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü				34.616.915	0	1.798.887	1.118.652	213.452	12	
525	2018K170390	K.eli Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi Hizmet Binası (Etüd - proje)	GB	2018	2023	498.263	0	1	0	0	0	HB
526	1991K171310	K.eli Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi İnşaatı (100 kişilik, 10.000 m ²)	GB	2014	2023	33.000.000	0	680.234	0	0	0	HB
527	0000000-000	Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Büro Mefruşatı Alımı	GB	2022	2022	82.611	0	82.611	82.611	82.611	100	DE
528	0000000-000	Kırklareli Huzurevi İhata Duvarı Yapımı	GB	2022	2022	429.619	0	429.619	429.619	0	0	İA
529	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Ek Bina Çatı Onarımı	GB	2022	2022	216.213	0	216.213	216.213	0	0	İA
530	0000000-000	Kırklareli Huzurevi Röleve Projesi Hazırlanması	GB	2022	2022	216.334	0	216.334	216.334	0	0	İA
531	0000000-000	Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Tefrişatı	GB	2022	2022	173.875	0	173.875	173.875	130.841	75	DE
		Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü				652.245	0	652.245	652.245	652.245	100	
532	0000000-000	P.hisar Gençlik Merkezi Kenet Sistem Çatı Örtüsü Bakım ve Onarımı	DG	2022	2022	652.245	0	652.245	652.245	652.245	100	BT

Proje sayısı: 58, Proje tutarı: 257.110.039, Önceki yıllar harcaması: 122.794.005, 2022 yılı harcaması: **26.882.905**

belediyeler

Sıra no	Sektör	Proje sayısı	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı harcamaları (TL)	Para sal gerçek leşme (%)
	Toplam	58	257.110.039	122.794.005	91.581.203	26.882.905	26.882.905	29
1	Kırklareli	6	10.284.871	2.254.192	8.030.680	1.500.679	1.500.679	19
2	İnece	0	0	0	0	0	0	0
3	Kavaklı	0	0	0	0	0	0	0
4	Üsküp	4	2.818.229	0	2.818.229	441.877	441.877	16
5	Babaeski	2	2.309.880	0	2.309.880	2.270.714	2.270.714	98
6	Alpullu	1	3.013.620	0	3.013.620	1.013.620	1.013.620	34
7	Büyükmandıra	9	2.000.000	0	2.000.000	0	0	0
8	Karahalil	0	0	0	0	0	0	0
9	Demirköy	4	8.793.336	0	3.169.855	171.217	171.217	5
10	İğneada	0	0	0	0	0	0	0
11	Koçgaz	0	0	0	0	0	0	0
12	Lüleburgaz	13	183.646.002	120.505.929	46.586.936	19.949.910	19.949.910	43
13	Ahmetbey	2	427.682	33.884	393.798	43.758	43.758	11
14	Büyükkarıştıran	4	4.344.960	0	4.344.960	0	0	0
15	Evrensekiz	3	8.321.941	0	8.321.941	417.979	417.979	5
16	Pehlivan köy	5	16.956.000	0	3.098.304	0	0	0
17	Pınarhisar	2	11.720.933	0	5.265.000	0	0	0
18	Kaynarca	0	0	0	0	0	0	0
19	Vize	2	2.100.000	0	2.100.000	945.151	945.151	45
20	Çakıllı	0	0	0	0	0	0	0
21	Kıyıköy	1	372.585	0	128.000	128.000	128.000	100



Kırklareli Sungurbey Caddesi



Üsküp yeşil alan düzenlemesi



Demirköy



Lüleburgaz



Lüleburgaz solar çamur kurutma tesisi



Büyükkarıştıran aydınlatma



Evrensekiz içmesuyu kuyusu açılması



Pehlivan köy yol yapımı

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. Fiziki	Açıklamalar
											leşme (%)	leşme (%)
		Toplam				257.110.039	122.794.005	91.581.203	26.882.905	26.882.905	29	
		Kırklareli				10.284.871	2.254.192	8.030.680	1.500.679	1.500.679	19	
		Ulaştırma				10.284.871	2.254.192	8.030.680	1.500.679	1.500.679	19	
1	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolların Asfalt Tamiri ve Hız Kesici Yapımı	BL	2021	2022	2.254.192	2.254.192	1	0	0	0	100 BT
2	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolların Parke Taş Kaplaması	BL	2021	2022	761.679	0	761.679	761.679	761.679	100	100 BT
3	0000000-000	K.eli Sungurbey Caddesi Dekortif Baskı Beton Kaldırım Yapılması	BL	2021	2022	336.000	0	336.000	336.000	336.000	100	100 BT
4	0000000-000	K.eli Sungurbey Caddesi Aydınlatması	BL	2022	2022	403.000	0	403.000	403.000	403.000	100	100 BT
5	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolların Asfalt Tamiri ve Hız Kesici Yapımı	BL	2022	2023	5.430.000	0	5.430.000	0	0	0	DE
6	0000000-000	K.eli Şehiriçi Yolların Parke Taş Kaplaması ve Bordür Düzenlenmesi	BL	2022	2023	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	DE
		Üsküp				2.818.229	0	2.818.229	441.877	441.877	16	
		Ulaştırma				1.212.922	0	1.212.922	157.932	157.932	13	
7	0000000-000	Üsküp Yol Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	1.212.922	0	1.212.922	157.932	157.932	13	13 DE
		İçmesuyu				266.153	0	266.153	78.786	78.786	30	
8	0000000-000	Üsküp İçmesuyu Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	266.153	0	266.153	78.786	78.786	30	30 DE
		Kanalizasyon				54.751	0	54.751	0	0	0	
9	0000000-000	Üsküp Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	54.751	0	54.751	0	0	0	DE
		Diğerleri				1.284.403	0	1.284.403	205.159	205.159	16	
10	0000000-000	Üsküp Yapım ve Onarım İşleri	BL	2022	2022	1.284.403	0	1.284.403	205.159	205.159	16	16 DE
		Babaeski				2.309.880	0	2.309.880	2.270.714	2.270.714	98	
		Ulaştırma				1.663.600	0	1.663.600	1.624.434	1.624.434	98	
11	0000000-000	B.eski Şehiriçi Yolların Parke Taş Kaplaması	BL	2022	2022	1.663.600	0	1.663.600	1.624.434	1.624.434	98	100 BT
		Diğerleri				646.280	0	646.280	646.280	646.280	100	
12	0000000-000	Babaeski Hayvan Barınağı Bina Yapımı	BL	2022	2022	646.280	0	646.280	646.280	646.280	100	100 BT
		Alpullu				3.013.620	0	3.013.620	1.013.620	1.013.620	34	
		Ulaştırma				3.013.620	0	3.013.620	1.013.620	1.013.620	34	
13	0000000-000	Alpullu Şehiriçi Yolların Parke Taş Kaplaması	BL	2022	2022	3.013.620	0	3.013.620	1.013.620	1.013.620	34	34 DE
		Büyükmandıra				2.000.000	0	2.000.000	0	0	0	
		Ulaştırma				200.000	0	200.000	0	0	0	
14	0000000-000	B.mandıra Şehiriçi Yol Yapımı ve Bakımı	BL	2022	2022	200.000	0	200.000	0	0	0	DE
		Mekanik ve Taş Tozu Alımı				250.000	0	250.000	0	0	0	
		İçmesuyu				250.000	0	250.000	0	0	0	0 PA
15	0000000-000	B.mandıra İçmesuyu Kuyru Açılması	BL	2020	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	
		Kanalizasyon				50.000	0	50.000	0	0	0	
16	0000000-000	B.mandıra Kanalizasyon Şebekesi Yapımı	BL	2020	2022	50.000	0	50.000	0	0	0	0 HB
		Diğerleri				1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	
17	0000000-000	B.mandıra Cenaze Aracı Alımı	BL	2020	2022	200.000	0	200.000	0	0	0	0 HB
18	0000000-000	B.mandıra Traktör Alımı	BL	2021	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	0 HB
19	0000000-000	B.mandıra Çocuk Oyun Grubu Alımı	BL	2021	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	0 HB
20	0000000-000	B.mandıra Çöp Konteyneri Alımı	BL	2021	2022	250.000	0	250.000	0	0	0	0 HB
21	0000000-000	B.mandıra Kültür Parkı Kafeterya Binası Yapımı	BL	2021	2022	300.000	0	300.000	0	0	0	0 HB
22	0000000-000	B.mandıra Kültür Parkı Bakım ve Onarımı	BL	2021	2022	150.000	0	150.000	0	0	0	0 HB
		Demirköy				8.793.336	0	3.169.855	171.217	171.217	5	
		Ulaştırma				5.860.000	0	939.153	23.010	23.010	2	
23	0000000-000	D.köy Şehiriçi Yol Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	5.860.000	0	939.153	23.010	23.010	2	DE
		İçmesuyu				750.000	0	101.478	101.478	101.478	100	
24	0000000-000	D.köy İçme Suyu Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	750.000	0	101.478	101.478	101.478	100	DE
		Kanalizasyon				100.841	0	46.729	46.729	46.729	100	
25	0000000-000	D.köy Kanalizasyon Yapım, Bakım ve Onarımı	BL	2022	2022	100.841	0	46.729	46.729	46.729	100	DE
		Diğerleri				2.082.495	0	2.082.495	0	0	0	
26	0000000-000	D.köy Bal Dolum Tesisi Yapımı	BL	2022	2022	2.082.495	0	2.082.495	0	0	0	0 HB
		Lüleburgaz				183.646.002	120.505.929	46.586.936	19.949.910	19.949.910	43	
		Ulaştırma				20.046.781	10.791.327	8.920.000	5.879.497	5.879.497	66	
27	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Yollar Asfalt Kaplama Yapımı	BL	2021	2022	18.596.781	10.596.781	8.000.000	5.147.232	5.147.232	64	75 DE
28	0000000-000	L.burgaz Şehiriçi Yollar Parketaş Yol Yapımı	BL	2020	2022	1.450.000	194.546	920.000	732.265	732.265	80	50 DE
		İçmesuyu				2.530.923	490.890	2.001.603	201.603	201.603	10	
29	0000000-000	L.burgaz İçmesuyu Su Abonelerinde Kullanılmak Üzere Akıllı Su Sayacı ve Mekaniz Su Sayacı Alımı	BL	2021	2022	2.329.320	490.890	1.800.000	0	0	0	35 DE
30	0000000-000	L.burgaz İçme Suyu Hat Döşenmesi, Depo Hatlarının Birbiri ile Olan Bağlantılarının Yenilenmesi	BL	2022	2022	201.603	0	201.603	201.603	201.603	100	100 BT
		Kanalizasyon				33.590.566	9.975.233	23.615.333	12.138.753	12.138.753	51	
31	0000000-000	L.burgaz Kanal Açma Hizmetleri	BL	2021	2024	32.609.944	9.609.944	23.000.000	11.543.617	11.543.617	50	30 DE
32	0000000-000	L.burgaz Atıksu Arıtma Tesisinden Çıkan Çamurun Bertarafı	BL	2021	2022	465.289	365.289	100.000	79.803	79.803	80	99 DE
33	0000000-000	L.burgaz Kanalizasyon Tahliye Hattı Yapılması, Saha düzenlenmesi ve Eski Bacaların İptal Edilerek Yeni Baca İmalatı Yapılması	BL	2022	2022	471.083	0	471.083	471.083	471.083	100	100 BT

Sıra no	Proje numarası	Proje adı	Bütçe türü	Başlama tarihi	Bitiş tarihi	Proje tutarı (TL)	Önceki yıllar harcamaları (TL)	2022 yılı programı (TL)	2022 yılında gönderilen ödenek (TL)	2022 yılı gerçek harcamaları (TL)	Para sal. (%)	Fiziki işleme (%)	Açıklamalar
34	0000000-000	L.burgaz Yağmur Suyu Hattı Bakım ve Onarımı (Araç Kiralama) Diğerleri	BL	2022	2022	44.250	0	44.250	44.250	44.250	100	100	BT
35	0000000-000	Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisi	BL	2016	2022	127.477.732	99.248.479	12.050.000	1.730.057	1.730.057	14		
36	0000000-000	L.burgaz Solar Çamur Kurutma Tesisi Yapımı	BL	2021	2022	113.215.110	96.535.857	500.000	0	0	0	99	DE
37	0000000-000	L.burgaz Okul Bakım ve Onarımları	BL	2021	2022	8.540.222	2.540.222	6.000.000	339.633	339.633	6	70	DE
38	0000000-000	L.burgaz Kent Ormanı Alan Düzenlemesi ve Kır Kahvesi Binası Yapımı	BL	2021	2022	422.400	172.400	250.000	245.441	245.441	98	85	DE
38	0000000-000	L.burgaz Kent Ormanı Alan Düzenlemesi ve Kır Kahvesi Binası Yapımı	BL	2022	2022	5.000.000	0	5.000.000	896.245	896.245	18	30	DE
39	0000000-000	L.burgaz 8 Kasım Mahallesi Pazar Yeri Çevre Duvarı Yapımı	BL	2022	2022	300.000	0	300.000	248.738	248.738	83	100	BT
		Ahmetbey				427.682	33.884	393.798	43.758	43.758	11		
		Ulaştırma				427.682	33.884	393.798	43.758	43.758	11		
40	0000000-000	Ahmetbey Şehiriçi Stabilize Yol Yapımı	BL	2021	2022	228.977	33.884	195.093	43.758	43.758	22		DE
41	0000000-000	Ahmetbey Şehiriçi Tretuvar Düzenlemesi	BL	2022	2022	198.705	0	198.705	0	0	0	0	DE
		Büyükkaştrın				4.344.960	0	4.344.960	0	0	0		
		Ulaştırma				2.972.620	0	2.972.620	0	0	0		
42	0000000-000	Büyükkaştrın Şehiriçi Yol Yapımı (Kilit Taş, Prizma Taş, Bordür Taşı ve Yağmur Oluğu Alımı)	BL	2022	2022	1.551.700	0	1.551.700	0	0	0	30	DE
43	0000000-000	Büyükkaştrın Şehiriçi Yol Yapımı (Taş Tozu, Mekanik Malzeme Alımı (5000ton-3000ton))	BL	2022	2022	1.109.600	0	1.109.600	0	0	0	40	DE
44	0000000-000	Büyükkaştrın Şehiriçi Yol Yapımı (Dekoratif Aydınlatma Direği Alımı (10mt-140w))	BL	2022	2022	311.320	0	311.320	0	0	0	100	BT
		Diğerleri				1.372.340	0	1.372.340	0	0	0		
45	0000000-000	Küçükkaştrın Çok Amaçlı Sundurma Yapım (306 m2)	BL	2022	2022	1.372.340	0	1.372.340	0	0	0	50	DE
		Evrensekiz				8.321.941	0	8.321.941	417.979	417.979	5		
		Ulaştırma				7.344.966	0	7.344.966	0	0	0		
46	0000000-000	Evrensekiz Şehiriçi Yolları Parke Taş Kaplaması ve Kaldırım Düzenlemesi	BL	2022	2023	7.344.966	0	7.344.966	0	0	0	0	İY
		İçmesuyu				417.979	0	417.979	417.979	417.979	100		
47	0000000-000	Evrensekiz İçmesuyu Kuyusu Sondajı	BL	2022	2022	417.979	0	417.979	417.979	417.979	100	100	BT
		Diğerleri				558.996	0	558.996	0	0	0		
48	0000000-000	Evrensekiz Belediye Binası Çatısının Yenilenmesi	BL	2022	2022	558.996	0	558.996	0	0	0	100	BT
		Pehlivanlık				16.956.000	0	3.098.304	0	0	0		
		Ulaştırma				8.456.000	0	3.098.302	0	0	0		
49	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Asfalt Kaplama Yapımı	BL	2022	2023	3.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
50	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Meydan Düzenlemesi	BL	2022	2023	1.400.000	0	1	0	0	0	0	HB
51	0000000-000	P.köy Şehiriçi Yollar Kaldırım Düzenlemesi	BL	2022	2023	3.656.000	0	3.098.300	0	0	0	0	DE
		Diğerleri				8.500.000	0	2	0	0	0		
52	0000000-000	P.köy Kültür Merkezi Yapımı	BL	2022	2024	4.500.000	0	1	0	0	0	0	HB
53	0000000-000	P.köy Küçük Sanayi Sitesi Yapımı	BL	2022	2024	4.000.000	0	1	0	0	0	0	HB
		Pınarhisar				11.720.933	0	5.265.000	0	0	0		
		Diğerleri				11.720.933	0	5.265.000	0	0	0		
54	0000000-000	Pınarhisar Seracılık ve Kuluçka Merkezi	BL	2021	2022	2.260.633	0	1.500.000	0	0	0	0	YT
55	0000000-000	Pınarhisar Belediyesi Spor Kompleksi	BL	2021	2023	9.460.300	0	3.765.000	0	0	0	0	DE
		Vize				2.100.000	0	2.100.000	945.151	945.151	45		
		Ulaştırma				2.100.000	0	2.100.000	945.151	945.151	45		
56	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Parke Taş Yol Yapımı (6.550 m2 parke, 800 m bordür, 500 m oluk taşı)	BL	2022	2022	1.500.000	0	1.500.000	617.258	617.258	41	70	DE
57	0000000-000	Vize Şehiriçi Yolları Yol Yapımı (500 m3 hazır beton alımı)	BL	2022	2022	600.000	0	600.000	327.893	327.893	55	55	DE
		Kıyıköy				372.585	0	128.000	128.000	128.000	100		
		Ulaştırma				372.585	0	128.000	128.000	128.000	100		
58	0000000-000	Kıyıköy Şehiriçi Yollar Parke Taşı Yol Yapımı	BL	2021	2022	372.585	0	128.000	128.000	128.000	100	100	BT

